

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO (SEF)

RELATÓRIO TÉCNICO:

EVOLUÇÃO DO MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES E DA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO 2º TRIMESTRE/2017 (Abril a Junho)

USP LESTE
São Paulo/SP

Contrato nº 010/2014
Processo nº 14.1.607.82.2
Projeto Weber nº 311.1264.14/E13VMGS-VS.01
Julho/2017



WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LIMITADA

PROJETO 311.1264.14/E13VMGS SEF – EACH/USP	Versão nº: 01 Data: 18/07/2017	Versão nº: Data:	Versão nº: Data:
---	-----------------------------------	---------------------	---------------------

ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO.....	5
2.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA.....	5
2.2 SOBRE A PRESENÇA DE GASES	6
2.3 SOBRE A VENTILAÇÃO DOS GASES	6
2.4 DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO	7
2.4.1 POÇOS DE MONITORAMENTO	7
2.4.2 INFRAESTRUTURA	7
2.5 SOBRE MONITORAMENTO EM ANOS ANTERIORES.....	12
3 METODOLOGIA DO MONITORAMENTO	14
3.1 PLANO DE AÇÃO	16
4 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO TRIMESTRE	17
4.1 RESULTADO DO MONITORAMENTO EM POÇOS E NA INFRAESTRUTURA	17
4.2 RESULTADO OBTIDO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO.....	35
5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	39
6 SOBRE CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS.....	43
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES.....	44
8 EQUIPE TÉCNICA	45
9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	46

FIGURAS e FOTOS

FIGURA 2.1.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO.....	5
FIGURA 2.3.1 ILUSTRAÇÃO DO CONCEITO DO SISTEMA	6
FIGURA 2.4.1.1 LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS DE MONITORAMENTO	10
FIGURA 2.4.2.1 LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO NA INFRAESTRUTURA	11
FIGURA 3.1 ESQUEMA DA FAIXA DE INFLAMABILIDADE DO METANO E SUA COMBUSTÃO	15
FIGURA 4.1.1 CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS COM CONCENTRAÇÃO IGUAL OU MAIOR A 1%VOL (ABR A JUN/17)	20

TABELAS e GRÁFICOS

TABELA 2.4.1.1 DISTRIBUIÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO NOS EDIFÍCIOS.....	8
TABELA 2.4.2.1 DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA NOS EDIFÍCIOS	9
TABELA 4.1.1 RELAÇÃO ENTRE QUANTIDADE DE POÇOS X POÇOS EM CONCENTRAÇÃO IGUAL OU MAIOR QUE 1%VOL (ABR A JUN/17)	19
TABELA 4.1.2 APRESENTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE FLUXO E PRESENÇA DE ÁGUA NOS POÇOS (ABR A JUN/17)	21
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN/2017– EDIFÍCIO I-1	22
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN /2017– EDIFÍCIO I-3	23
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN /2017– EDIFÍCIO I-4	24
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN /2017– LABORATÓRIO A1.....	25
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN /2017– LABORATÓRIO A2.....	27
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN /2017– LABORATÓRIO A3.....	29
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN /2017– BLOCO INICIAL	31
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN /2017– ENFERMARIA	32
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN /2017– GINÁSIO	33
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO ABR A JUN /2017– TRANSPORTES	34
TABELA 4.2.1 LOCALIZAÇÃO DOS EXAUSTORES DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO	35

GRÁFICOS DE VARIAÇÃO DA PRESSÃO CÉLULA DE VÁCUO X ENTRADA DOS EXAUSTORES I1(1), I1(2), I5 AUDITÓRIOS E BIBLIOTECA.....	36
GRÁFICOS DE VARIAÇÃO DA PRESSÃO CÉLULA DE VÁCUO X ENTRADA DOS EXAUSTORES PORTARIA 3, GINÁSIO, ENFERMARIA, CAT1, CAT2, TRANSPORTES, MI (B1), MI (B2), MI (B3) E AUDITÓRIO 1	37
GRÁFICOS DE VARIAÇÃO DA PRESSÃO CÉLULA DE VÁCUO X ENTRADA DOS EXAUSTORES AUDITÓRIO 2, CANTINA, CORREDOR, CONJ. LAB. (A1), CONJ. LAB. (A2), CONJ. LAB. (A3), I4, GUARDA	38

ANEXOS

ANEXO I – CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

ANEXO II – PLANO DE AÇÃO

ANEXO III – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM PMG COM GEM 5000 (ABR A JUN/17)

ANEXO IV – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM PMG COM MX6 (ABR A JUN /17)

ANEXO V – TABELAS DE MEDIÇÕES QUINZENAIS NA INFRAESTRUTURA COM MX6 (ABR A JUN /17)

ANEXO VI – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM EXAUSTORES (ABR A JUN /17)

ANEXO VII – EVOLUÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES X PRESSÃO (ABR/14 A MAR/17)

ANEXO VIII – EVOLUÇÃO DA PRESENÇA DE ÁGUA/RESTRIÇÃO FLUXO X PRESSÃO (ABR/14 A MAR/17)

ANEXO IX – LISTA DE PRESENÇA DO TREINAMENTO

ANEXO X – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

1 INTRODUÇÃO

A Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada foi contratada pela Superintendência do Espaço Físico (SEF) da Universidade de São Paulo para a realização da Complementação dos Serviços de Ventilação de Vapores do Solo emanados na USP Leste, situada na Rua Arlindo Bettio, 1000 – Vila Guaraciaba – São Paulo/SP.

A contratação foi realizada em Cumprimento à Informação Técnica CETESB 006/2014/CA de 24 de janeiro de 2014, bem como para substituição do contrato emergencial nº 004/2014, de mesmo objeto e dar continuidade às campanhas de monitoramento e à exaustão de gases eventualmente confinados sob as lajes, evitando assim a intrusão desses gases nos ambientes fechados em todos os edifícios da USP Leste, a fim de garantir que medidas eficientes para afastar o risco de eventual explosão estão sendo tomados. Em 22 de setembro de 2016, foi assinado o aditivo do processo, acrescentando uma prorrogação no prazo de 06 meses a partir de 25/12/2016.

O escopo definido a ser realizado durante o período de 24 meses foi o seguinte:

- Execução, Detalhamento de Execução e Instalação de 24 equipamentos de ventilação de vapores do solo abaixo da laje de todos os edifícios e/ou construções;
- Construção de 21 abrigos para os equipamentos (sendo que já há 03 abrigos existentes);
- Operação do Sistema de Ventilação;
- Monitoramento sistemático e programado da intrusão dos vapores de solo em ambientes e espaços confinados do pavimento térreo;
- Gerenciamento técnico;
- Datas previstas → Início: 05/01/2015 e Término: 22/06/2017, com o prazo prorrogado.

O presente relatório técnico trimestral tem como objetivo avaliar a **Evolução dos Resultados** de Monitoramento da intrusão de gases em ambientes fechados e da Operação do sistema de ventilação ao longo do **Segundo Trimestre/2017 (Abril a Junho)**, bem como, comparar com os resultados obtidos desde o início dos trabalhos (março/2014).

O Sistema de Ventilação é individual e específico para cada edificação. De uma forma geral é composto por Elementos de Subsuperfície (colchão de brita, pontos de captação de ar atmosférico e de extração de gases e/ou tubulação geomecânica), por Elementos de Superfície (tubulação de interconexão dos pontos de extração de gases) e por Exaustores (montados com compressor, célula de vácuo e painel elétrico).

O objetivo da etapa do Monitoramento Preventivo da Intrusão de Gases é a elaboração de um diagnóstico contínuo avaliando a situação das leituras nas edificações da USP Leste. Os resultados obtidos nesses trabalhos permitem estabelecer e monitorar a situação da área e indicar as sequências das etapas que deverão ser executadas.

Os trabalhos foram realizados conforme a metodologia CETESB apresentada na “Decisão de Diretoria 103/2007 – CETESB” e atualizado pela “Decisão de Diretoria 038/2017”, bem como no “Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas” – (CETESB, 2001), além de demais normas e referências pertinentes.

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

2.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

A área objeto de estudo é parte da USP LESTE e está inserida no Município de São Paulo/SP na Zona Leste, Subprefeitura da Penha, bairro Vila Guaraciaba, registrada na Rua Armando Bettio, 1000. Existem três portarias principais, a P1 situada na Rodovia Parque (na margem da Rodovia Ayrton Senna), a P2 situada na Rua Arlindo Bettio e a P3 acesso pela Estação da CPTM USP Leste. A **Figura 2.1.1** Indica a localização da área.

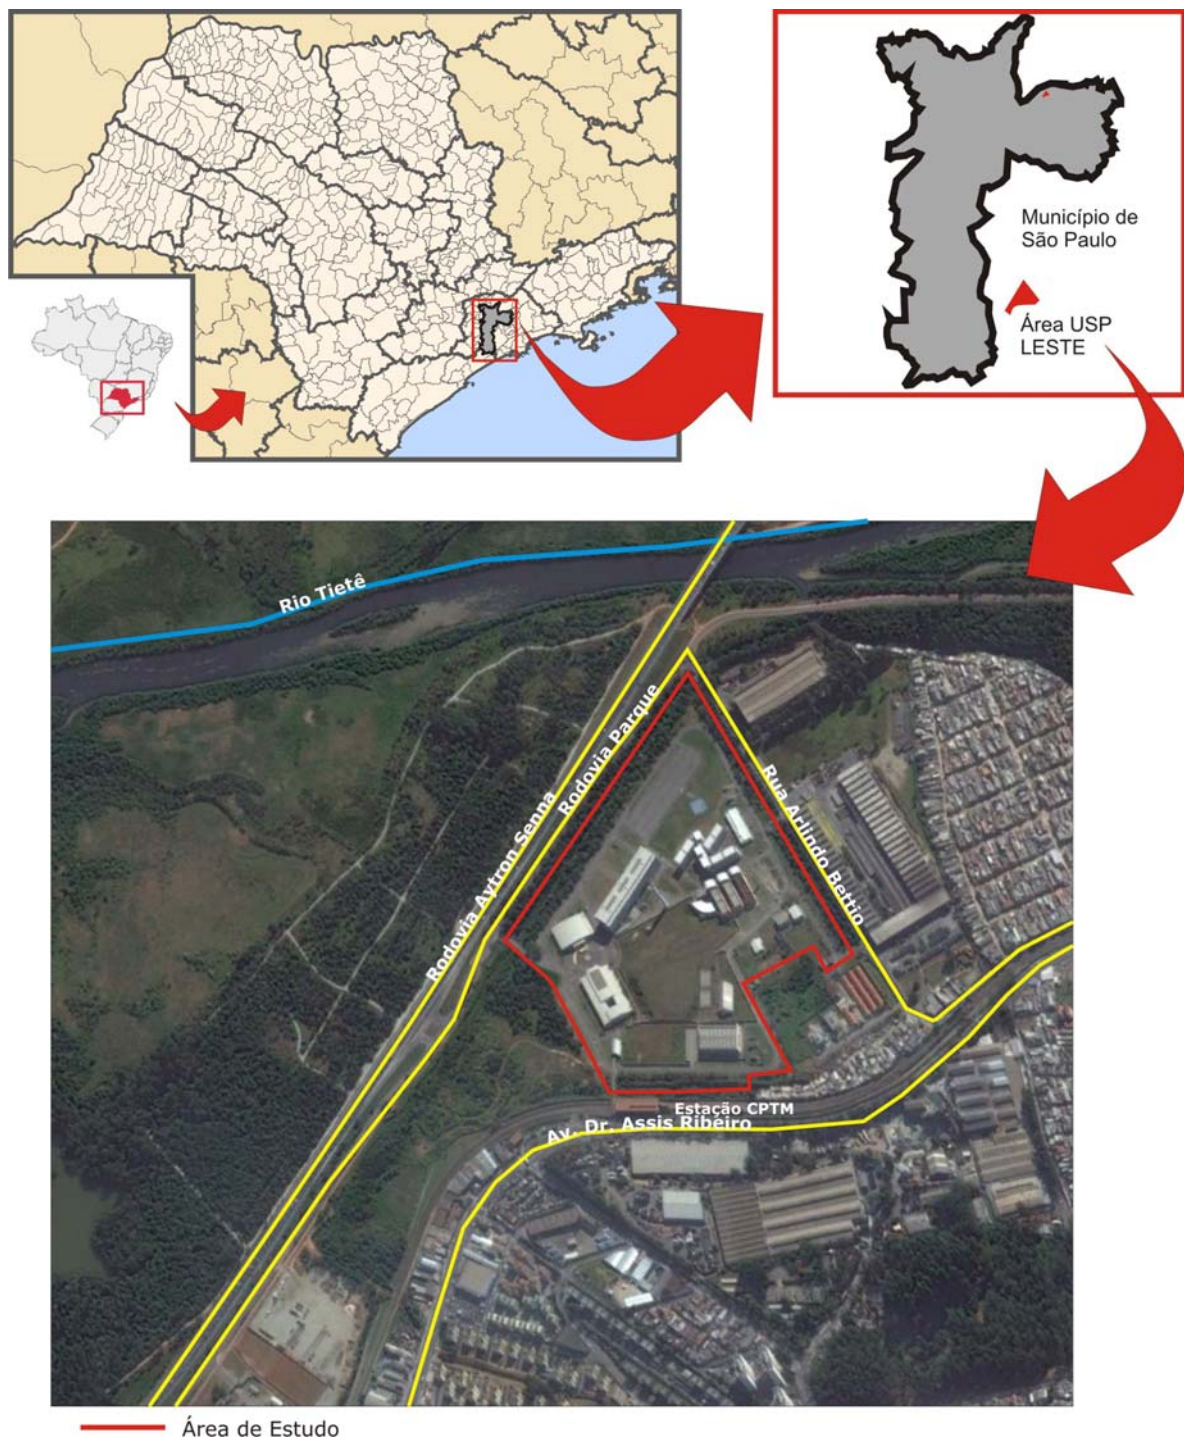


Figura 2.1.1 Localização da área de estudo

Fonte: Adaptado de Google Earth, imagem de 03/07/2014.

2.2 SOBRE A PRESENÇA DE GASES

Os diversos estudos realizados na Gleba I da USP LESTE identificaram a ocorrência de gás metano na área, proveniente da matéria orgânica presente tanto nas camadas de origem antrópica oriundas da dragagem do rio Tietê quanto nas camadas naturais pertencentes aos depósitos aluviais quaternários associados ao Rio Tietê.

Os resultados das medições em campo levam a crer que o composto químico preponderante na atmosfera gasosa dos poros do solo na área é o gás metano, com ocorrência menos frequente de vapores orgânicos voláteis.

Em função desta ocorrência de gases foi projetado e instalado um sistema de ventilação cujo objetivo é impedir entrada de gás nos edifícios.

2.3 SOBRE A VENTILAÇÃO DOS GASES

O conceito do projeto estabelecido é a implantação de Sistema de ventilação (circulação de ar) nos tapetes de brita, logo abaixo da laje dos prédios, não propriamente visando a remediação do solo, mas sim mantendo o tapete ventilado impedindo o acúmulo e intrusão de gases nas edificações (IPT, 2007).

Os gases e vapores que eventualmente adentrem o tapete drenante de brita sob a laje das edificações são arrastados em um fluxo contínuo de ar limpo (promovido por um exaustor para ventilação forçada) e conduzidos a sistema de dispersão na atmosfera.

Mantendo-se ventilado o tapete de brita, garante-se que os gases e vapores que eventualmente emanem do subsolo não atinjam o edifício pela sua laje.

Inicialmente e, como forma de contingência emergencial, os exaustores foram conectados às tubulações drenantes previamente existentes nos edifícios. Ao longo dos meses de Março/14 a Julho/14 os sistemas de ventilação foram devidamente reajustados às características de cada edificação e os exaustores conectados à situação definitiva.

A eficiência é monitorada através de medições de concentração de metano e VOC e de pressão em poços de monitoramento em duas profundidades distintas. Demonstrando que o gás metano está presente no solo, porém, com a ativação do sistema, não se acumula no tapete de brita, ou nem mesmo, alcança este.

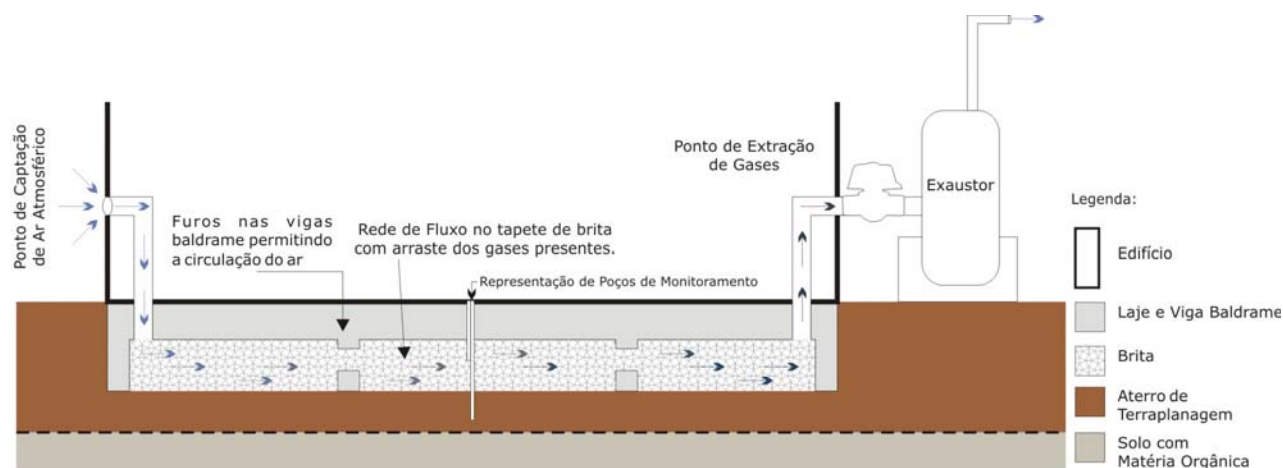


Figura 2.3.1 Ilustração do Conceito do Sistema

Fonte: Adaptado de Relatório de Instalação de Sistemas (Weber, Ago/14).

2.4 DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO

Os pontos de monitoramento se subdividem em Poços de Monitoramento e na Infraestrutura:

2.4.1 POÇOS DE MONITORAMENTO

Atualmente estão instalados na área de estudo 121 (cento e vinte e um) conjuntos de poços de monitoramento de gases, distribuídos nos Edifícios I-1, I-3 (Auditórios-I5 e Biblioteca), I-4 (Serviços), Conjunto Laboratorial, Bloco Inicial (Conjunto Didático), Enfermaria, CAT, Incubadora, Ginásio, Guarda Universitária, Portaria P3 e Transportes. Os 03 conjuntos de poços existentes no Edifício Laranjinha foram encerrados com a demolição do prédio.

Entre Agosto e Novembro de 2013 foram instalados 107 (cento e sete) pares de poços de monitoramento de gases, com duas profundidades distintas, e 08 (oito) poços de monitoramento de gases rasos (SERVMAR/2014), sendo PMG-00 **A** (profundidade de aproximadamente 0,30 m – Sob as lajes/no tapete de brita) e PMG-00 **B** (profundidade de aproximadamente 1,00 m – no Solo).

Em Março/14 os poços A e B encontravam-se conectados em uma mesma mangueira. No início do mês de Abril/14, foram inseridas válvulas de individualização dos poços, as quais os mantêm fechados, sendo abertos somente no momento da medição após a conexão da mangueira do equipamento, permitindo-se assim a leitura da pressão e das concentrações de uma profundidade sem interferência da outra ou da atmosfera (Weber, Jan/2015).

Em de Julho/2015 foram instalados novos 09 (nove) conjuntos de poços de monitoramento nos edifícios da Guarda Universitária, Portaria P3 e Transportes. O monitoramento nesses poços se iniciou em agosto/2015.

Nos edifícios Guarda Universitária e Transpores, na porção rasa foi instalado o poço de monitoramento tipo *subslab Vapor Pin* (**A**) e na porção profunda, com o mesmo perfil construtivo dos já existentes (**B**). Na portaria P3, foi detectada uma segunda laje sob o piso, sendo assim os poços de monitoramento neste edifício foram instalados em três profundidades: **A** → sob a primeira laje (~0,30m); **B** → sob a segunda laje no tapete de brita (~0,50m) e **C** → no solo (~1,30m).

A **Tabela 2.4.1.1** demonstra o quantitativo de poços distribuídos nos edifícios (totalizando 236 poços de monitoramento em solo/laje). E a **Figura 2.4.1.1** ilustra a localização dos poços de monitoramento.

2.4.2 INFRAESTRUTURA

Além dos poços de monitoramento, foi realizado o levantamento dos ralos, tomadas e grelhas, a fim de incluí-los nas medições e assim avaliar a intrusão dos gases nas construções. E definiu-se o monitoramento em ralos e caixas de passagem numerados e cadastrados em cada prédio.

As tomadas não têm contato direto com o solo. Durante a construção dos edifícios a presença de gás foi detectada e por isso, como forma de prevenção, o sistema elétrico foi instalado em tubulações aéreas, chegando às salas via canaletas.

Foram definidos também espaços com pouca circulação de ar, a partir de vistoria em toda a área de estudo.

A **Tabela 2.4.2.1** demonstra a distribuição de pontos de infraestrutura distribuídos nos edifícios (totalizando 173 pontos de medição na infraestrutura). E a **Figura 2.4.2.1** ilustra a localização dos pontos de monitoramento na Infraestrutura.

Tabela 2.4.1.1 Distribuição de poços de monitoramento nos edifícios

Relação de Poços x Edificações																																																																													
<table><tr><th colspan="4">Poços</th></tr><tr><td rowspan="18">Edifício I-1</td><td rowspan="18">Parte 1</td><td>PMG-16 A</td><td rowspan="18">17 pares</td></tr><tr><td>PMG-16 B</td></tr><tr><td>PMG-17 A</td></tr><tr><td>PMG-17 B</td></tr><tr><td>PMG-18 A</td></tr><tr><td>PMG-18 B</td></tr><tr><td>PMG-20 A</td></tr><tr><td>PMG-20 B</td></tr><tr><td>PMG-22 A</td></tr><tr><td>PMG-22 B</td></tr><tr><td>PMG-23 A</td></tr><tr><td>PMG-23 B</td></tr><tr><td>PMG-113 A</td></tr><tr><td>PMG-113 B</td></tr><tr><td>PMG-114 A</td></tr><tr><td>PMG-114 B</td></tr><tr><td>PMG-115 A</td></tr><tr><td>PMG-115 B</td></tr><tr><td rowspan="18">Edifício I-1</td><td rowspan="18">Parte 2</td><td>PMG-14 A</td><td rowspan="18">17 pares</td></tr><tr><td>PMG-14 B</td></tr><tr><td>PMG-21 A</td></tr><tr><td>PMG-21 B</td></tr><tr><td>PMG-15 A</td></tr><tr><td>PMG-15 B</td></tr><tr><td>PMG-13 A</td></tr><tr><td>PMG-13 B</td></tr><tr><td>PMG-19 A</td></tr><tr><td>PMG-19 B</td></tr><tr><td>PMG-11 A</td></tr><tr><td>PMG-11 B</td></tr><tr><td>PMG-12 A</td></tr><tr><td>PMG-12 B</td></tr><tr><td>PMG-24 A</td></tr><tr><td>PMG-24 B</td></tr></table>				Poços				Edifício I-1	Parte 1	PMG-16 A	17 pares	PMG-16 B	PMG-17 A	PMG-17 B	PMG-18 A	PMG-18 B	PMG-20 A	PMG-20 B	PMG-22 A	PMG-22 B	PMG-23 A	PMG-23 B	PMG-113 A	PMG-113 B	PMG-114 A	PMG-114 B	PMG-115 A	PMG-115 B	Edifício I-1	Parte 2	PMG-14 A	17 pares	PMG-14 B	PMG-21 A	PMG-21 B	PMG-15 A	PMG-15 B	PMG-13 A	PMG-13 B	PMG-19 A	PMG-19 B	PMG-11 A	PMG-11 B	PMG-12 A	PMG-12 B	PMG-24 A	PMG-24 B																														
Poços																																																																													
Edifício I-1	Parte 1	PMG-16 A	17 pares																																																																										
		PMG-16 B																																																																											
		PMG-17 A																																																																											
		PMG-17 B																																																																											
		PMG-18 A																																																																											
		PMG-18 B																																																																											
		PMG-20 A																																																																											
		PMG-20 B																																																																											
		PMG-22 A																																																																											
		PMG-22 B																																																																											
		PMG-23 A																																																																											
		PMG-23 B																																																																											
		PMG-113 A																																																																											
		PMG-113 B																																																																											
		PMG-114 A																																																																											
		PMG-114 B																																																																											
		PMG-115 A																																																																											
		PMG-115 B																																																																											
Edifício I-1	Parte 2	PMG-14 A	17 pares																																																																										
		PMG-14 B																																																																											
		PMG-21 A																																																																											
		PMG-21 B																																																																											
		PMG-15 A																																																																											
		PMG-15 B																																																																											
		PMG-13 A																																																																											
		PMG-13 B																																																																											
		PMG-19 A																																																																											
		PMG-19 B																																																																											
		PMG-11 A																																																																											
		PMG-11 B																																																																											
		PMG-12 A																																																																											
		PMG-12 B																																																																											
		PMG-24 A																																																																											
		PMG-24 B																																																																											
		<table><tr><th colspan="4">Poços</th></tr><tr><td rowspan="15">Edifício I-3 Auditórios (15)</td><td rowspan="15"></td><td>PMG-25 A</td><td rowspan="15">21 pares</td></tr><tr><td>PMG-25 B</td></tr><tr><td>PMG-26 A</td></tr><tr><td>PMG-26 B</td></tr><tr><td>PMG-27 A</td></tr><tr><td>PMG-27 B</td></tr><tr><td>PMG-28 A</td></tr><tr><td>PMG-28 B</td></tr><tr><td>PMG-29 A</td></tr><tr><td>PMG-29 B</td></tr><tr><td>PMG-44 A</td></tr><tr><td>PMG-44 B</td></tr><tr><td>PMG-45 A</td></tr><tr><td>PMG-45 B</td></tr><tr><td>PMG-30 A</td></tr><tr><td rowspan="27">Edifício I-3 Biblioteca</td><td rowspan="29"></td><td>PMG-30 B</td><td rowspan="29">21 pares</td></tr><tr><td>PMG-31 A</td></tr><tr><td>PMG-31 B</td></tr><tr><td>PMG-32 A</td></tr><tr><td>PMG-32 B</td></tr><tr><td>PMG-33 A</td></tr><tr><td>PMG-33 B</td></tr><tr><td>PMG-34 A</td></tr><tr><td>PMG-34 B</td></tr><tr><td>PMG-35 A</td></tr><tr><td>PMG-35 B</td></tr><tr><td>PMG-36 A</td></tr><tr><td>PMG-36 B</td></tr><tr><td>PMG-37 A</td></tr><tr><td>PMG-37 B</td></tr><tr><td>PMG-38 A</td></tr><tr><td>PMG-38 B</td></tr><tr><td>PMG-39 A</td></tr><tr><td>PMG-39 B</td></tr><tr><td>PMG-40 A</td></tr><tr><td>PMG-40 B</td></tr><tr><td>PMG-41 A</td></tr><tr><td>PMG-41 B</td></tr><tr><td>PMG-42 A</td></tr><tr><td>PMG-42 B</td></tr><tr><td>PMG-43 A</td></tr><tr><td>PMG-43 B</td></tr></table>				Poços				Edifício I-3 Auditórios (15)		PMG-25 A	21 pares	PMG-25 B	PMG-26 A	PMG-26 B	PMG-27 A	PMG-27 B	PMG-28 A	PMG-28 B	PMG-29 A	PMG-29 B	PMG-44 A	PMG-44 B	PMG-45 A	PMG-45 B	PMG-30 A	Edifício I-3 Biblioteca		PMG-30 B	21 pares	PMG-31 A	PMG-31 B	PMG-32 A	PMG-32 B	PMG-33 A	PMG-33 B	PMG-34 A	PMG-34 B	PMG-35 A	PMG-35 B	PMG-36 A	PMG-36 B	PMG-37 A	PMG-37 B	PMG-38 A	PMG-38 B	PMG-39 A	PMG-39 B	PMG-40 A	PMG-40 B	PMG-41 A	PMG-41 B	PMG-42 A	PMG-42 B	PMG-43 A	PMG-43 B																				
		Poços																																																																											
Edifício I-3 Auditórios (15)		PMG-25 A	21 pares																																																																										
		PMG-25 B																																																																											
		PMG-26 A																																																																											
		PMG-26 B																																																																											
		PMG-27 A																																																																											
		PMG-27 B																																																																											
		PMG-28 A																																																																											
		PMG-28 B																																																																											
		PMG-29 A																																																																											
		PMG-29 B																																																																											
		PMG-44 A																																																																											
		PMG-44 B																																																																											
		PMG-45 A																																																																											
		PMG-45 B																																																																											
		PMG-30 A																																																																											
Edifício I-3 Biblioteca		PMG-30 B	21 pares																																																																										
		PMG-31 A																																																																											
		PMG-31 B																																																																											
		PMG-32 A																																																																											
		PMG-32 B																																																																											
		PMG-33 A																																																																											
		PMG-33 B																																																																											
		PMG-34 A																																																																											
		PMG-34 B																																																																											
		PMG-35 A																																																																											
		PMG-35 B																																																																											
		PMG-36 A																																																																											
		PMG-36 B																																																																											
		PMG-37 A																																																																											
		PMG-37 B																																																																											
		PMG-38 A																																																																											
		PMG-38 B																																																																											
		PMG-39 A																																																																											
		PMG-39 B																																																																											
		PMG-40 A																																																																											
		PMG-40 B																																																																											
		PMG-41 A																																																																											
		PMG-41 B																																																																											
		PMG-42 A																																																																											
		PMG-42 B																																																																											
		PMG-43 A																																																																											
		PMG-43 B																																																																											
<table><tr><th colspan="4">Poços</th></tr><tr><td rowspan="12">Edifício I-4</td><td rowspan="12"></td><td>PMG-63 A</td><td rowspan="12">12 pares</td></tr><tr><td>PMG-63 B</td></tr><tr><td>PMG-64 A</td></tr><tr><td>PMG-64 B</td></tr><tr><td>PMG-65 A</td></tr><tr><td>PMG-65 B</td></tr><tr><td>PMG-66 A</td></tr><tr><td>PMG-66 B</td></tr><tr><td>PMG-67 A</td></tr><tr><td>PMG-67 B</td></tr><tr><td>PMG-68 A</td></tr><tr><td>PMG-68 B</td></tr><tr><td rowspan="46">Conjunto Laboratorial</td><td rowspan="48"></td><td>PMG-69 A</td><td rowspan="48">17 pares</td></tr><tr><td>PMG-69 B</td></tr><tr><td>PMG-77 A</td></tr><tr><td>PMG-77 B</td></tr><tr><td>PMG-78 A</td></tr><tr><td>PMG-78 B</td></tr><tr><td>PMG-79 A</td></tr><tr><td>PMG-79 B</td></tr><tr><td>PMG-80 A</td></tr><tr><td>PMG-80 B</td></tr><tr><td>PMG-81 A</td></tr><tr><td>PMG-81 B</td></tr><tr><td>PMG-46 A</td></tr><tr><td>PMG-46 B</td></tr><tr><td>PMG-47 A</td></tr><tr><td>PMG-47 B</td></tr><tr><td>PMG-48 A</td></tr><tr><td>PMG-48 B</td></tr><tr><td>PMG-49 A</td></tr><tr><td>PMG-49 B</td></tr><tr><td>PMG-50 A</td></tr><tr><td>PMG-50 B</td></tr><tr><td>PMG-51 A</td></tr><tr><td>PMG-51 B</td></tr><tr><td>PMG-52 A</td></tr><tr><td>PMG-52 B</td></tr><tr><td>PMG-53 A</td></tr><tr><td>PMG-53 B</td></tr><tr><td>PMG-54 A</td></tr><tr><td>PMG-54 B</td></tr><tr><td>PMG-55 A</td></tr><tr><td>PMG-55 B</td></tr><tr><td>PMG-56 A</td></tr><tr><td>PMG-56 B</td></tr><tr><td>PMG-57 A</td></tr><tr><td>PMG-57 B</td></tr><tr><td>PMG-58 A</td></tr><tr><td>PMG-58 B</td></tr><tr><td>PMG-59 A</td></tr><tr><td>PMG-59 B</td></tr><tr><td>PMG-60 A</td></tr><tr><td>PMG-60 B</td></tr><tr><td>PMG-61 A</td></tr><tr><td>PMG-61 B</td></tr><tr><td>PMG-62 A</td></tr><tr><td>PMG-62 B</td></tr></table>				Poços				Edifício I-4		PMG-63 A	12 pares	PMG-63 B	PMG-64 A	PMG-64 B	PMG-65 A	PMG-65 B	PMG-66 A	PMG-66 B	PMG-67 A	PMG-67 B	PMG-68 A	PMG-68 B	Conjunto Laboratorial		PMG-69 A	17 pares	PMG-69 B	PMG-77 A	PMG-77 B	PMG-78 A	PMG-78 B	PMG-79 A	PMG-79 B	PMG-80 A	PMG-80 B	PMG-81 A	PMG-81 B	PMG-46 A	PMG-46 B	PMG-47 A	PMG-47 B	PMG-48 A	PMG-48 B	PMG-49 A	PMG-49 B	PMG-50 A	PMG-50 B	PMG-51 A	PMG-51 B	PMG-52 A	PMG-52 B	PMG-53 A	PMG-53 B	PMG-54 A	PMG-54 B	PMG-55 A	PMG-55 B	PMG-56 A	PMG-56 B	PMG-57 A	PMG-57 B	PMG-58 A	PMG-58 B	PMG-59 A	PMG-59 B	PMG-60 A	PMG-60 B	PMG-61 A	PMG-61 B	PMG-62 A	PMG-62 B						
Poços																																																																													
Edifício I-4		PMG-63 A	12 pares																																																																										
		PMG-63 B																																																																											
		PMG-64 A																																																																											
		PMG-64 B																																																																											
		PMG-65 A																																																																											
		PMG-65 B																																																																											
		PMG-66 A																																																																											
		PMG-66 B																																																																											
		PMG-67 A																																																																											
		PMG-67 B																																																																											
		PMG-68 A																																																																											
		PMG-68 B																																																																											
Conjunto Laboratorial		PMG-69 A	17 pares																																																																										
		PMG-69 B																																																																											
		PMG-77 A																																																																											
		PMG-77 B																																																																											
		PMG-78 A																																																																											
		PMG-78 B																																																																											
		PMG-79 A																																																																											
		PMG-79 B																																																																											
		PMG-80 A																																																																											
		PMG-80 B																																																																											
		PMG-81 A																																																																											
		PMG-81 B																																																																											
		PMG-46 A																																																																											
		PMG-46 B																																																																											
		PMG-47 A																																																																											
		PMG-47 B																																																																											
		PMG-48 A																																																																											
		PMG-48 B																																																																											
		PMG-49 A																																																																											
		PMG-49 B																																																																											
		PMG-50 A																																																																											
		PMG-50 B																																																																											
		PMG-51 A																																																																											
		PMG-51 B																																																																											
		PMG-52 A																																																																											
		PMG-52 B																																																																											
		PMG-53 A																																																																											
		PMG-53 B																																																																											
		PMG-54 A																																																																											
		PMG-54 B																																																																											
		PMG-55 A																																																																											
		PMG-55 B																																																																											
		PMG-56 A																																																																											
		PMG-56 B																																																																											
		PMG-57 A																																																																											
		PMG-57 B																																																																											
		PMG-58 A																																																																											
		PMG-58 B																																																																											
		PMG-59 A																																																																											
		PMG-59 B																																																																											
		PMG-60 A																																																																											
		PMG-60 B																																																																											
		PMG-61 A																																																																											
		PMG-61 B																																																																											
		PMG-62 A																																																																											
		PMG-62 B																																																																											
<table><tr><th colspan="4">Poços</th></tr><tr><td rowspan="14">Bloco Inicial (conjunto didático)</td><td rowspan="14"></td><td>PMG-01 A</td><td rowspan="14">14 pares</td></tr><tr><td>PMG-01 B</td></tr><tr><td>PMG-02 A</td></tr><tr><td>PMG-02 B</td></tr><tr><td>PMG-03 A</td></tr><tr><td>PMG-03 B</td></tr><tr><td>PMG-04 A</td></tr><tr><td>PMG-04 B</td></tr><tr><td>PMG-05 A</td></tr><tr><td>PMG-05 B</td></tr><tr><td>PMG-06 A</td></tr><tr><td>PMG-06 B</td></tr><tr><td>PMG-07 A</td></tr><tr><td>PMG-07 B</td></tr><tr><td rowspan="14">Enfermaria</td><td rowspan="14"></td><td>PMG-08 A</td><td rowspan="14">07 pares</td></tr><tr><td>PMG-08 B</td></tr><tr><td>PMG-09 A</td></tr><tr><td>PMG-09 B</td></tr><tr><td>PMG-10 A</td></tr><tr><td>PMG-10 B</td></tr><tr><td>PMG-84 A</td></tr><tr><td>PMG-84 B</td></tr><tr><td>PMG-85 A</td></tr><tr><td>PMG-85 B</td></tr><tr><td>PMG-86 A</td></tr><tr><td>PMG-86 B</td></tr><tr><td>PMG-87 A</td></tr><tr><td>PMG-87 B</td></tr><tr><td rowspan="14">CAT</td><td rowspan="14"></td><td>PMG-70 A</td><td rowspan="14">07 pares</td></tr><tr><td>PMG-70 B</td></tr><tr><td>PMG-71 A</td></tr><tr><td>PMG-71 B</td></tr><tr><td>PMG-72 A</td></tr><tr><td>PMG-72 B</td></tr><tr><td>PMG-73 A</td></tr><tr><td>PMG-73 B</td></tr><tr><td>PMG-74 A</td></tr><tr><td>PMG-74 B</td></tr><tr><td>PMG-75 A</td></tr><tr><td>PMG-75 B</td></tr><tr><td>PMG-76 A</td></tr><tr><td>PMG-76 B</td></tr><tr><td rowspan="14">CAT</td><td rowspan="14"></td><td>PMG-82 A</td><td rowspan="14">07 pares</td></tr><tr><td>PMG-82 B</td></tr><tr><td>PMG-83 A</td></tr><tr><td>PMG-83 B</td></tr><tr><td>PMG-94 A</td></tr><tr><td>PMG-94 B</td></tr><tr><td>PMG-95 A</td></tr><tr><td>PMG-95 B</td></tr><tr><td>PMG-96 A</td></tr><tr><td>PMG-96 B</td></tr><tr><td>PMG-97 A</td></tr><tr><td>PMG-97 B</td></tr><tr><td>PMG-98 A</td></tr><tr><td>PMG-98 B</td></tr></table>				Poços				Bloco Inicial (conjunto didático)		PMG-01 A	14 pares	PMG-01 B	PMG-02 A	PMG-02 B	PMG-03 A	PMG-03 B	PMG-04 A	PMG-04 B	PMG-05 A	PMG-05 B	PMG-06 A	PMG-06 B	PMG-07 A	PMG-07 B	Enfermaria		PMG-08 A	07 pares	PMG-08 B	PMG-09 A	PMG-09 B	PMG-10 A	PMG-10 B	PMG-84 A	PMG-84 B	PMG-85 A	PMG-85 B	PMG-86 A	PMG-86 B	PMG-87 A	PMG-87 B	CAT		PMG-70 A	07 pares	PMG-70 B	PMG-71 A	PMG-71 B	PMG-72 A	PMG-72 B	PMG-73 A	PMG-73 B	PMG-74 A	PMG-74 B	PMG-75 A	PMG-75 B	PMG-76 A	PMG-76 B	CAT		PMG-82 A	07 pares	PMG-82 B	PMG-83 A	PMG-83 B	PMG-94 A	PMG-94 B	PMG-95 A	PMG-95 B	PMG-96 A	PMG-96 B	PMG-97 A	PMG-97 B	PMG-98 A	PMG-98 B		
Poços																																																																													
Bloco Inicial (conjunto didático)		PMG-01 A	14 pares																																																																										
		PMG-01 B																																																																											
		PMG-02 A																																																																											
		PMG-02 B																																																																											
		PMG-03 A																																																																											
		PMG-03 B																																																																											
		PMG-04 A																																																																											
		PMG-04 B																																																																											
		PMG-05 A																																																																											
		PMG-05 B																																																																											
		PMG-06 A																																																																											
		PMG-06 B																																																																											
		PMG-07 A																																																																											
		PMG-07 B																																																																											
Enfermaria		PMG-08 A	07 pares																																																																										
		PMG-08 B																																																																											
		PMG-09 A																																																																											
		PMG-09 B																																																																											
		PMG-10 A																																																																											
		PMG-10 B																																																																											
		PMG-84 A																																																																											
		PMG-84 B																																																																											
		PMG-85 A																																																																											
		PMG-85 B																																																																											
		PMG-86 A																																																																											
		PMG-86 B																																																																											
		PMG-87 A																																																																											
		PMG-87 B																																																																											
CAT		PMG-70 A	07 pares																																																																										
		PMG-70 B																																																																											
		PMG-71 A																																																																											
		PMG-71 B																																																																											
		PMG-72 A																																																																											
		PMG-72 B																																																																											
		PMG-73 A																																																																											
		PMG-73 B																																																																											
		PMG-74 A																																																																											
		PMG-74 B																																																																											
		PMG-75 A																																																																											
		PMG-75 B																																																																											
		PMG-76 A																																																																											
		PMG-76 B																																																																											
CAT		PMG-82 A	07 pares																																																																										
		PMG-82 B																																																																											
		PMG-83 A																																																																											
		PMG-83 B																																																																											
		PMG-94 A																																																																											
		PMG-94 B																																																																											
		PMG-95 A																																																																											
		PMG-95 B																																																																											
		PMG-96 A																																																																											
		PMG-96 B																																																																											
		PMG-97 A																																																																											
		PMG-97 B																																																																											
		PMG-98 A																																																																											
		PMG-98 B																																																																											
<table><tr><th colspan="4">Poços</th></tr><tr><td rowspan="12">Incubadora</td><td rowspan="12"></td><td>PMG-88 A</td><td rowspan="12">06 pares</td></tr><tr><td>PMG-88 B</td></tr><tr><td>PMG-89 A</td></tr><tr><td>PMG-89 B</td></tr><tr><td>PMG-90 A</td></tr><tr><td>PMG-90 B</td></tr><tr><td>PMG-91 A</td></tr><tr><td>PMG-91 B</td></tr><tr><td>PMG-92 A</td></tr><tr><td>PMG-92 B</td></tr><tr><td>PMG-93 A</td></tr><tr><td>PMG-93 B</td></tr><tr><td rowspan="14">Ginásio Poliesportivo</td><td rowspan="14"></td><td>PMG-102</td><td rowspan="14">8 simples + 3 pares</td></tr><tr><td>PMG-103</td></tr><tr><td>PMG-104</td></tr><tr><td>PMG-105</td></tr><tr><td>PMG-106</td></tr><tr><td>PMG-107</td></tr><tr><td>PMG-108</td></tr><tr><td>PMG-109 A</td></tr><tr><td>PMG-109 B</td></tr><tr><td>PMG-110 A</td></tr><tr><td>PMG-110 B</td></tr><tr><td>PMG-111 A</td></tr><tr><td>PMG-111 B</td></tr><tr><td>PMG-112</td></tr><tr><td rowspan="4">Guarda Univer.</td><td rowspan="4"></td><td>PMG-116 A</td><td rowspan="4">3 pares</td></tr><tr><td>PMG-116 B</td></tr><tr><td>PMG-117 A</td></tr><tr><td>PMG-117 B</td></tr><tr><td rowspan="4">Portaria P3</td><td rowspan="4"></td><td>PMG-118 A</td><td rowspan="4">2 trios</td></tr><tr><td>PMG-118 B</td></tr><tr><td>PMG-119 A</td></tr><tr><td>PMG-119 B</td></tr><tr><td rowspan="8">Transportes</td><td rowspan="14"></td><td>PMG-119 C</td><td rowspan="15">4 pares</td></tr><tr><td>PMG-120 A</td></tr><tr><td>PMG-120 B</td></tr><tr><td>PMG-120 C</td></tr><tr><td>PMG-121 A</td></tr><tr><td>PMG-121 B</td></tr><tr><td>PMG-122 A</td></tr><tr><td>PMG-122 B</td></tr><tr><td>PMG-123 A</td></tr><tr><td>PMG-123 B</td></tr><tr><td>PMG-124 A</td></tr><tr><td>PMG-124 B</td></tr></table>				Poços				Incubadora		PMG-88 A	06 pares	PMG-88 B	PMG-89 A	PMG-89 B	PMG-90 A	PMG-90 B	PMG-91 A	PMG-91 B	PMG-92 A	PMG-92 B	PMG-93 A	PMG-93 B	Ginásio Poliesportivo		PMG-102	8 simples + 3 pares	PMG-103	PMG-104	PMG-105	PMG-106	PMG-107	PMG-108	PMG-109 A	PMG-109 B	PMG-110 A	PMG-110 B	PMG-111 A	PMG-111 B	PMG-112	Guarda Univer.		PMG-116 A	3 pares	PMG-116 B	PMG-117 A	PMG-117 B	Portaria P3		PMG-118 A	2 trios	PMG-118 B	PMG-119 A	PMG-119 B	Transportes		PMG-119 C	4 pares	PMG-120 A	PMG-120 B	PMG-120 C	PMG-121 A	PMG-121 B	PMG-122 A	PMG-122 B	PMG-123 A	PMG-123 B	PMG-124 A	PMG-124 B									
Poços																																																																													
Incubadora		PMG-88 A	06 pares																																																																										
		PMG-88 B																																																																											
		PMG-89 A																																																																											
		PMG-89 B																																																																											
		PMG-90 A																																																																											
		PMG-90 B																																																																											
		PMG-91 A																																																																											
		PMG-91 B																																																																											
		PMG-92 A																																																																											
		PMG-92 B																																																																											
		PMG-93 A																																																																											
		PMG-93 B																																																																											
Ginásio Poliesportivo		PMG-102	8 simples + 3 pares																																																																										
		PMG-103																																																																											
		PMG-104																																																																											
		PMG-105																																																																											
		PMG-106																																																																											
		PMG-107																																																																											
		PMG-108																																																																											
		PMG-109 A																																																																											
		PMG-109 B																																																																											
		PMG-110 A																																																																											
		PMG-110 B																																																																											
		PMG-111 A																																																																											
		PMG-111 B																																																																											
		PMG-112																																																																											
Guarda Univer.		PMG-116 A	3 pares																																																																										
		PMG-116 B																																																																											
		PMG-117 A																																																																											
		PMG-117 B																																																																											
Portaria P3		PMG-118 A	2 trios																																																																										
		PMG-118 B																																																																											
		PMG-119 A																																																																											
		PMG-119 B																																																																											
Transportes		PMG-119 C	4 pares																																																																										
		PMG-120 A																																																																											
		PMG-120 B																																																																											
		PMG-120 C																																																																											
		PMG-121 A																																																																											
		PMG-121 B																																																																											
		PMG-122 A																																																																											
		PMG-122 B																																																																											
PMG-123 A																																																																													
PMG-123 B																																																																													
PMG-124 A																																																																													
PMG-124 B																																																																													
Laranjinha (Prédio demolido) <table><tr><td>PMG-99</td></tr><tr><td>PMG-100</td></tr><tr><td>PMG-101</td></tr></table>				PMG-99	PMG-100	PMG-101																																																																							
PMG-99																																																																													
PMG-100																																																																													
PMG-101																																																																													
<table><tr><th colspan="4">Quantitativo Poços</th></tr><tr><th>Edifício</th><th>Conj.</th><th>Tipo</th><th>Qtd Poço</th></tr><tr><td>I-1</td><td>17</td><td>par</td><td>34</td></tr><tr><td>I-3</td><td>21</td><td>par</td><td>42</td></tr><tr><td>I-4</td><td>12</td><td>par</td><td>24</td></tr><tr><td>LAB</td><td>17</td><td>par</td><td>34</td></tr><tr><td>INIC</td><td>14</td><td>par</td><td>28</td></tr><tr><td>ENF</td><td>7</td><td>par</td><td>14</td></tr><tr><td>CAT</td><td>7</td><td>par</td><td>14</td></tr><tr><td>INC</td><td>6</td><td>par</td><td>12</td></tr><tr><td>Gin</td><td>8</td><td>simples</td><td>8</td></tr><tr><td>Gin</td><td>3</td><td>par</td><td>6</td></tr><tr><td>GU</td><td>3</td><td>par</td><td>6</td></tr><tr><td>P3</td><td>2</td><td>trio</td><td>6</td></tr><tr><td>TRANS</td><td>4</td><td>par</td><td>8</td></tr><tr><td colspan="3">121</td><td>236</td></tr></table>				Quantitativo Poços				Edifício	Conj.	Tipo	Qtd Poço	I-1	17	par	34	I-3	21	par	42	I-4	12	par	24	LAB	17	par	34	INIC	14	par	28	ENF	7	par	14	CAT	7	par	14	INC	6	par	12	Gin	8	simples	8	Gin	3	par	6	GU	3	par	6	P3	2	trio	6	TRANS	4	par	8	121			236										
Quantitativo Poços																																																																													
Edifício	Conj.	Tipo	Qtd Poço																																																																										
I-1	17	par	34																																																																										
I-3	21	par	42																																																																										
I-4	12	par	24																																																																										
LAB	17	par	34																																																																										
INIC	14	par	28																																																																										
ENF	7	par	14																																																																										
CAT	7	par	14																																																																										
INC	6	par	12																																																																										
Gin	8	simples	8																																																																										
Gin	3	par	6																																																																										
GU	3	par	6																																																																										
P3	2	trio	6																																																																										
TRANS	4	par	8																																																																										
121			236																																																																										

Tabela 2.4.2.1 Distribuição de pontos monitoramento de infraestrutura nos edifícios


Relação de Pontos da Infraestrutura x Edificações				
Pontos	Edifício I-1 Parte 1	Ralos	Pontos	Edifício I-1 Parte 2
12				01
17				05
16				04
14				03
15				09
18				08
19				07
20				06
13				02
25				
22				
21				
32				
30				
31				
28				
26				
24				
27				
23				
Pontos	I-3 Auditórios (15)	Ralos	Pontos	Edifício I-4
160			95	
159			97	
162			99	
165			106	
164			96	
176			104	
177			307	
174			122	
171			111	
148			117	
149			100	
150			101	
147			105	
139			91	
140			102	
141			88	
151			108	
145			107	
144			94	
143			92	
142			90	
146			89	
Pontos	Edifício I-4	Ralos	Pontos	Conjunto Laboratorial
95			34	
97			36	
99			53	
106			69	
96			70	
104			71	
307			67	
122			66	
111			64	
117			65	
100			63	
101			62	
105			56	
91			60	
102			58	
88			55	
108			54	
107			57	
94			42	
92			44	
90			43	
89			41	
87			38	
123			32	
121			61	
120			37	
119			45	
114			46	
113			40	
112			47	
109			48	
110			49	
			50	
Pontos	Bloco inicial	Ralos	Pontos	Enferma- ria
74			74	
75			75	
76			76	
77			77	
78			78	
79			79	
80			80	
81			81	
82			82	
83			83	
84			84	
85			85	
86			86	
124			124	
125			125	
126			126	
127			127	
136			136	
137			137	
138			138	
187			187	
186			186	
132			132	
133			133	
134			134	
135			135	
Pontos	Incuba- dora	Ra- los	Pontos	CAT
53			53	
55			55	
40			40	
38			38	
24			24	
15			15	
13			13	
28			28	
33			33	
37			37	
16			16	
18			18	
21			21	
39			39	
Pontos	Caixas	Pontos	Pontos	Espaços com pouca circulação de ar
53	Enfermaria	59	1	Depósito do Auditório Vermelho
55	Enfermaria	57	2	Depósito do Auditório Verde
40	Laboratórios	60	3	Depósito do Edifício I-3
38	Laboratórios	67	4	Depósito da Enfermaria
24	Laboratórios	58	5	Arquivo da Enfermaria
15	Laboratórios	72	6	Caixa de inspeção da caixa d'água
13	Laboratórios	73	7	Depósito de dentro do Almojarifado
28	Laboratórios	74	8	Depósito de fora do Almojarifado
33	Laboratórios		9	Casa de Máquinas (Hidrante)
37	Laboratórios			
16	Laboratórios			
18	Laboratórios			
21	Laboratórios			
39	Laboratórios			



LEGENDA:

---	Guia e Estacionamento
---	Cerca de divisa
---	Edificações
	Taludes
	Poço de monitoramento de gás
	Abrigo para equipamento
0	Quantidade de exaustores dentro do abrigo
---	Área cercada

Escala Gráfica:




Fonte: Adaptado de Projeto de Implantação geral
Enviado pela Superintendência do Espaço Físico de 02/02/2015

Cliente:	SEF
----------	-----

Projeto 311.1264.14: As-Built dos Sistemas de Ventilação de Gases
--

Figura 2.4.1.1: Distribuição dos poços de monitoramento de gás e abrigos de exaustores
--

Elaborado por: Victor Acras de Souza	Revisado por: Paula Ramos	
Aprovado por: Carlos Frederico Egli	Data Rev.: 08/12/2016	Revisão: 08
	Arquivo: 311.1264.14-Planta Base_cliente-VS01	

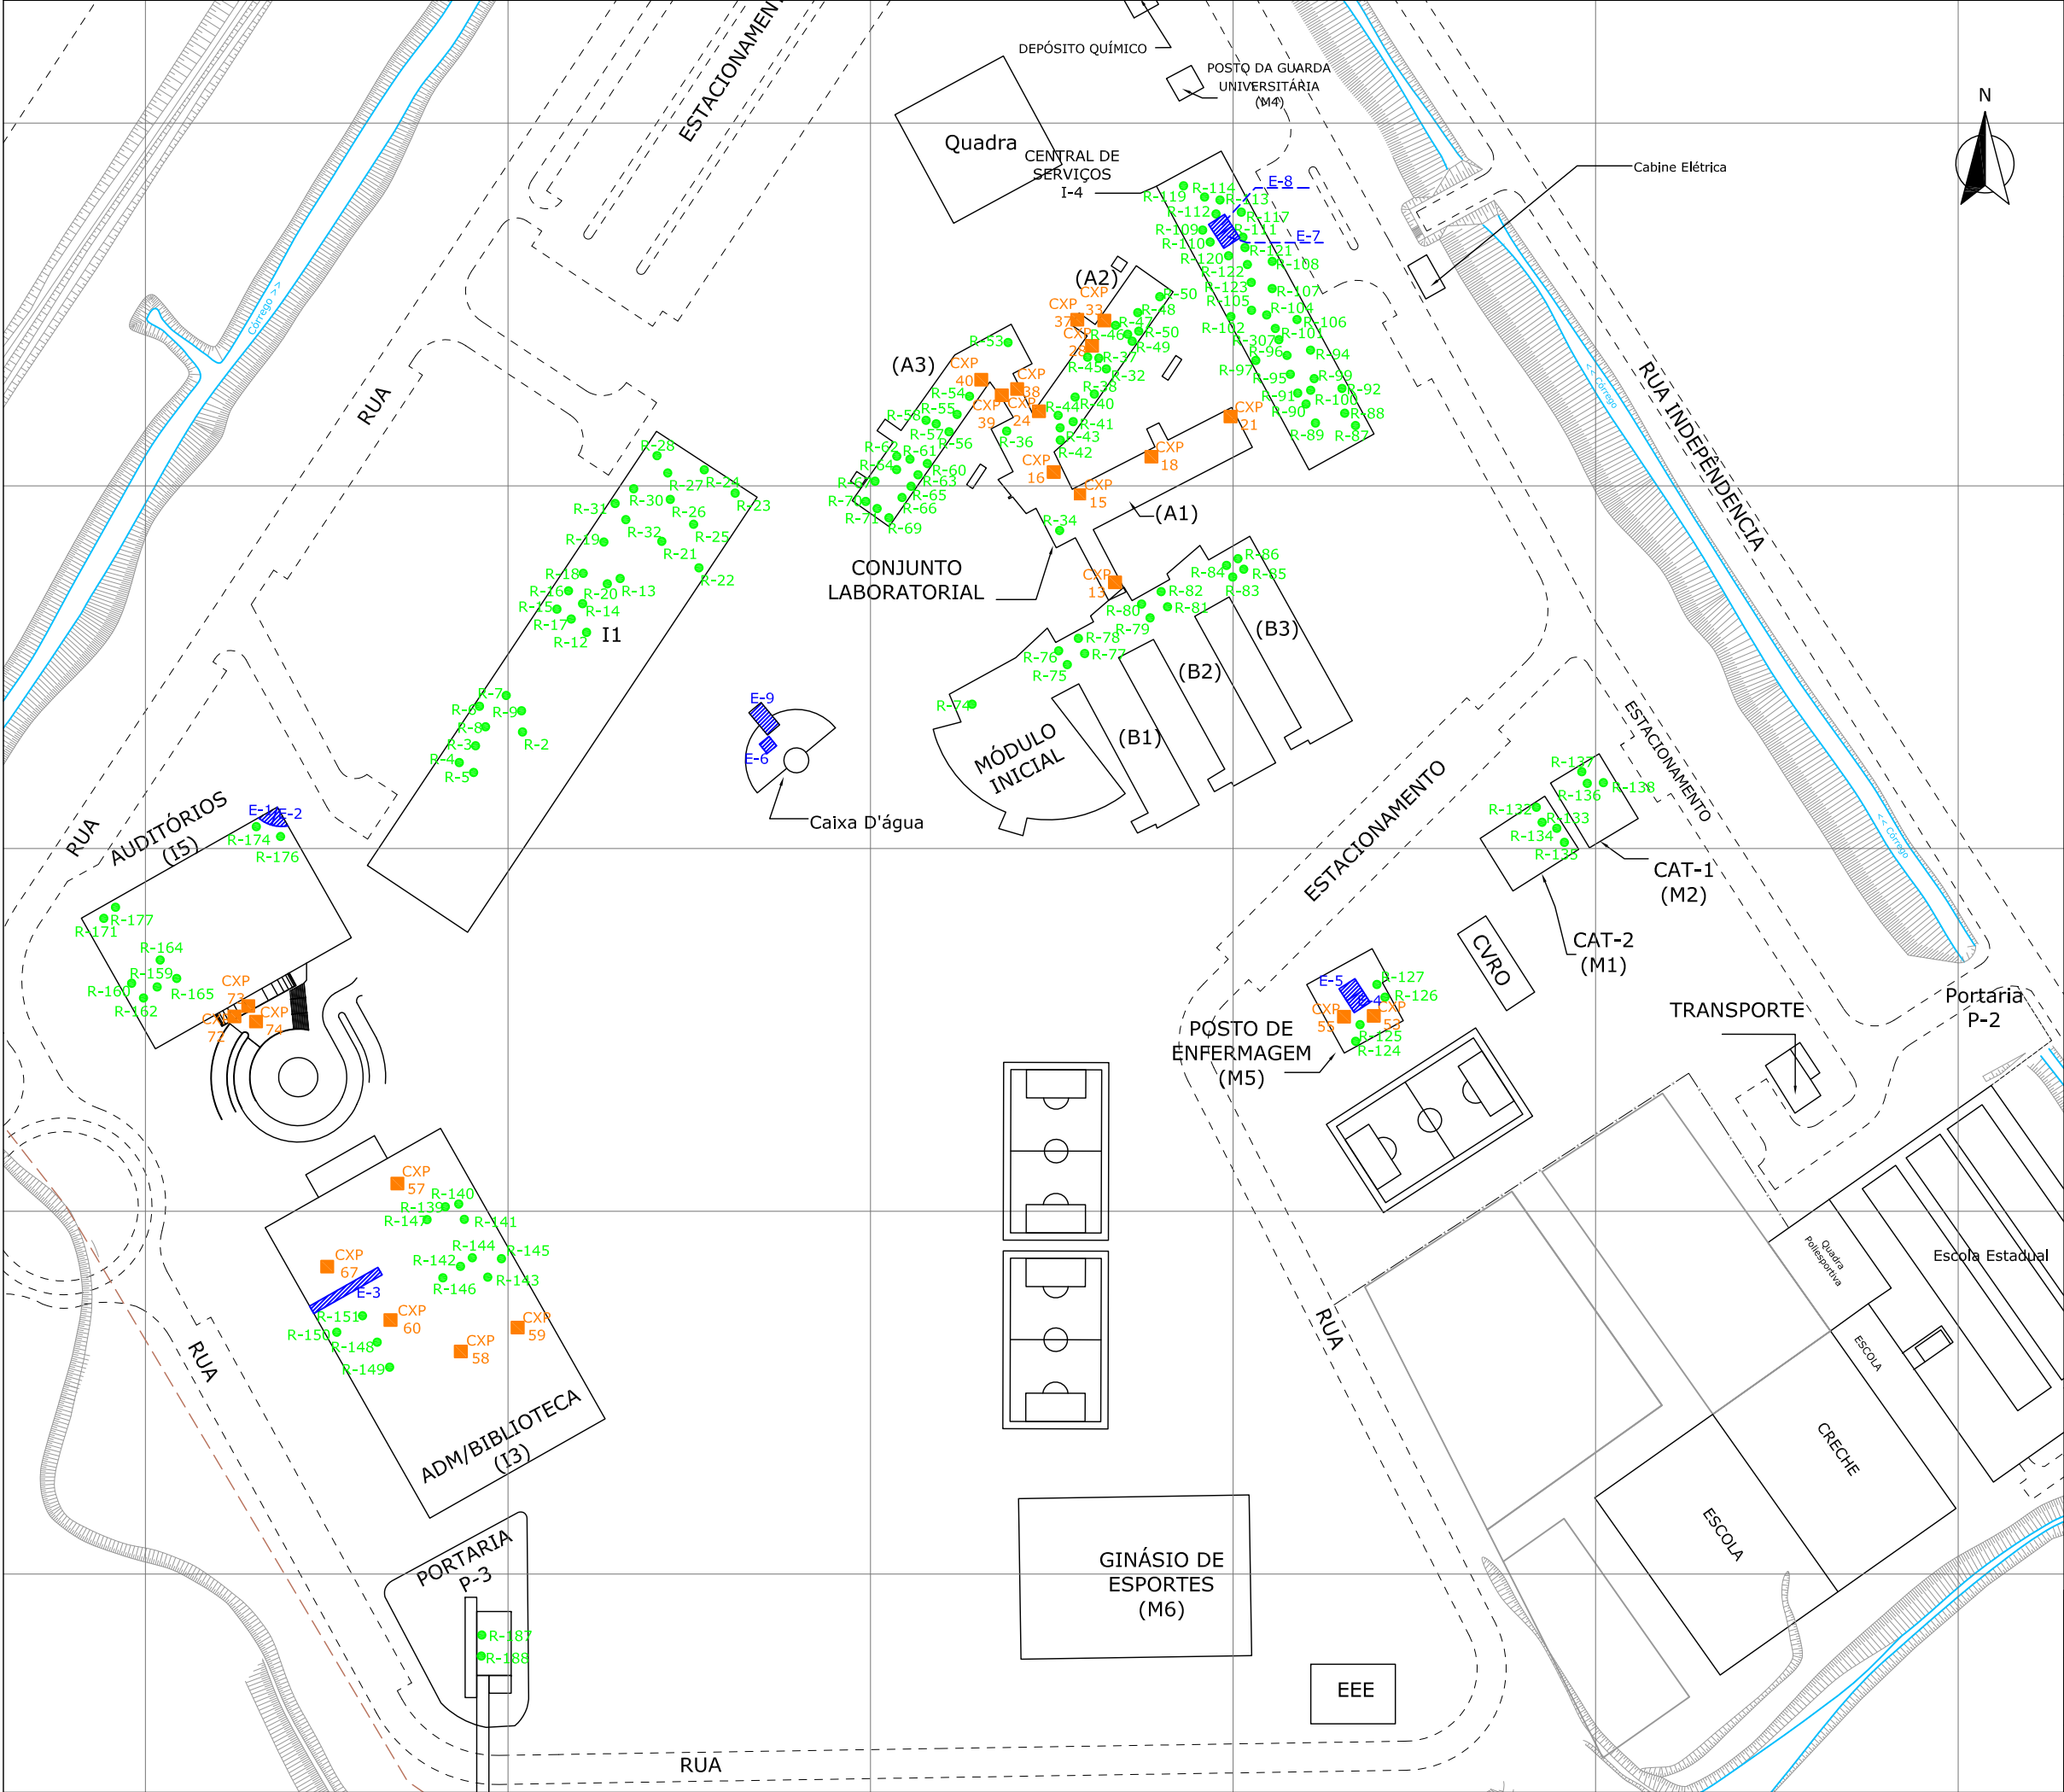

LEGENDA:

---	Guia e Estacionamento
---	Cerca de divisa
---	Edificações
---	Taludes
●	Ralos
■	Caixas de passagem
■	Espaço com pouca ventilação
---	Área cercada

Escala Gráfica:



Fonte: Adaptado de Projeto de Implantação geral
Enviado pela Superintendência do Espaço Físico de 02/02/2015

Cliente: SEF

Projeto 311.1264.14:
VENTILAÇÃO E MONITORAMENTO GASES_EACH

Figura 2.4.2.1:
Localização dos Pontos de Monitoramento de Gases
na infraestrutura dos Edifícios

Elaborado por: Victor Acras de Souza	Revisado por: Paula Ramos
Aprovado por: Carlos Frederico Egli	Data Rev.: 08/10/2015 Revisão: 05 Arquivo: 311.1264.14-Planta Base_cliente-VS01

2.5 SOBRE MONITORAMENTO EM ANOS ANTERIORES

→ MONITORAMENTO EM 2014

Os serviços de monitoramento de gases foram executados no período de Março/14 a Dezembro/14. As medições realizadas indicaram que as concentrações de metano, estão localizadas em pontos específicos, e não abrangem toda a extensão dos edifícios (detectaram-se concentrações acima em 15 a 25 poços dos 216 existentes).

Observou-se ainda, que em sua maioria essas concentrações estão localizadas apenas nas porções mais profundas (cerca de 1,0m) e em alguns pontos alcançam os poços subslab, imediatamente abaixo das edificações (0,30m).

Os sistemas foram ligados da forma como existiam em Março/14, neste mês havia 08 poços com concentração de metano na porção rasa, em Abril/14 havia 04, em Maio havia apenas 01 e em Junho (ao final da instalação/readequação dos sistemas de ventilação) não havia nenhum poço com concentração na porção rasa. Nos meses seguintes as concentrações na porção rasa se mantiveram nulas, e quando eventualmente apareciam, o sistema de ventilação era redirecionado, voltando rapidamente às concentrações nulas.

Quanto às medições de VOC, H₂S e CO, não foram detectadas concentrações significativas em nenhum dos pontos monitorados (abaixo de 100 ppm). Sobre as medidas de pressão foi observada em alguns poços de monitoramento, tanto positiva quanto negativa, indicando a movimentação promovida pelo sistema, e da movimentação natural do nível d'água na região.

Além das medições em poços de monitoramento foram realizadas medições em ralos e caixas de passagem em todas as edificações, bem como no mês agosto incluíram-se os espaços com pouca circulação de ar, e não foi detectada nenhuma indicação de inflamabilidade nesses pontos e concentrações muito pequenas (entre 0 a 4,3 ppm) de VOC. Indicando assim que mesmo com eventuais pressões positivas não ocorreu intrusão dos gases nos ambientes.

→ MONITORAMENTO EM 2015

Os serviços de monitoramento de gases foram executados no período de Janeiro/15 a Dezembro/15. As medições realizadas indicaram que as concentrações de metano, estão localizadas em pontos específicos, e não abrangem toda a extensão dos edifícios (detectaram-se concentrações acima de 4%Vol em 10 a 22 poços dos 236 existentes).

Observou-se ainda que essas concentrações estão localizadas apenas nas porções profundas (cerca de 1,0m), não alcançando os poços subslab (imediatamente abaixo das edificações - 0,30m), ou indicando que estes estão sendo arrastados pelo sistema de exaustão.

Quanto às medições de VOC, H₂S e CO, não foram detectadas concentrações significativas em nenhum dos pontos monitorados (abaixo de 100 ppm). Sobre as medidas de pressão foi observada em alguns poços de monitoramento, tanto positiva quanto negativa, indicando a movimentação promovida pelo sistema, bem como da movimentação natural do nível d'água na região.

Além das medições em poços de monitoramento foram realizadas medições na infraestrutura (ralos, caixas de passagem e espaços com pouca circulação de ar), e não foi detectada nenhuma indicação de inflamabilidade nesses pontos e concentrações muito pequenas (entre 0 a 5,8 ppm) de VOC. Indicando assim que mesmo com eventuais pressões positivas não ocorreu intrusão dos gases nos ambientes.

→ MONITORAMENTO EM 2016

As medições realizadas indicaram que as concentrações de metano, estão localizadas em pontos específicos, e não abrangem toda a extensão dos edifícios (detectaram-se concentrações acima de 4%Vol em 10 a 24 poços dos 236 existentes) no período de Janeiro/16 a Dezembro/16.

Observou-se ainda que essas concentrações estão localizadas apenas nas porções profundas (cerca de 1,0m), não alcançando os poços subslab (imediatamente abaixo das edificações - 0,30m), ou indicando que estes estão sendo arrastados pelo sistema de exaustão.

Quanto às medições de VOC, H₂S e CO, não foram detectadas concentrações significativas em nenhum dos pontos monitorados (abaixo de 100 ppm). Sobre as medidas de pressão foi observada em alguns poços de monitoramento, tanto positiva quanto negativa, indicando a movimentação promovida pelo sistema, bem como da movimentação natural do nível d'água na região.

Além das medições em poços de monitoramento foram realizadas medições na infraestrutura (ralos, caixas de passagem e espaços com pouca circulação de ar), e não foi detectada nenhuma indicação de inflamabilidade nesses pontos e concentrações muito pequenas de VOC. Indicando assim que mesmo com eventuais pressões positivas não ocorreu intrusão dos gases nos ambientes.

O equipamento GEM 5000 foi enviado para manutenção entre Julho a Agosto/2016, durante esse período o monitoramento foi realizado somente com o equipamento MX6 (%LEL e PID), dessa forma não havendo paralisação da avaliação de intrusão.

No último trimestre de 2016, foi realizada vistoria que identificou que duas das tubulações de captação de ar do Edifício Módulo Inicial estavam direcionadas para dentro da área da lanchonete. Em novembro de 2016 as duas captações foram readequadas com a troca dos vidros e reposicionamento dessas.

Ainda no último trimestre foi realizado um levantamento detalhado com a finalidade de realizar manutenção nas tubulações de entrada e saída dos sistemas em todos os prédios. Foi necessário o ajuste nas tubulações do Bloco I, II e III do Conjunto Básico e em uma tubulação no prédio da biblioteca. A manutenção foi realizada em Outubro, para evitar entrada ou saída de ar nas tubulações que possam interferir nos sistemas. Durante a vistoria, verificou-se que a extremidade da tubulação de sucção do sistema no Ginásio deveria estar tamponada, essa correção foi efetuada.

3 METODOLOGIA DO MONITORAMENTO

O Monitoramento da Intrusão dos Gases/Vapores do Solo em Ambientes Fechados e Espaços com pouca Circulação de Ar do pavimento térreo, ou seja, que tem contato direto com o solo, é realizado de forma sistemática e programado, visando afastar o risco eventual de explosividade nas edificações da USP LESTE.

As leituras são realizadas em poços de monitoramento situados sob a laje (no tapete de brita) e no solo à profundidade aproximada de 1,0 m, bem como em ralos e caixas de passagem, distribuídos e numerados nas edificações, e também em alguns espaços confinados, ou com pouca ventilação (conforme se apresentou nos itens 2.2.1 e 2.2.2).

A sistemática ficou programada da seguinte forma:

- **Poços de Monitoramento:** Medições semanais com o equipamento GEM 5000 para avaliação da concentração de Metano e de nível de Pressão e com o equipamento MX6 para avaliação da presença de outros VOCs (Compostos Orgânicos Voláteis), totalizando 236 poços de monitoramento em solo/laje;
- **Infraestrutura:** Medições quinzenais, com o equipamento MX6 para medição do nível de explosividade que a possível presença de metano e/ou outros voláteis podem conferir ao ambiente, totalizando 173 pontos de medição na infraestrutura;
- **Exaustores:** O monitoramento sistemático nos exaustores de cada sistema de ventilação dos edifícios, realizando-se medições semanais de metano e pressão com o equipamento GEM 5000 e VOCs com o equipamento MX6, bem como leitura de pressão na célula de vácuo, totalizando 22 pontos de medição em exaustores.

O monitoramento é realizado por Técnicos de Campo e Auxiliares, treinados e capacitados, e supervisionado por Engenheira Ambiental. E as leituras são realizadas por meio de equipamentos calibrados e certificados da marca Industrial Scientific, modelo MX6 iBrid e da marca Landtec, modelo GEM 5000. No **Anexo I** apresentam-se os certificados de calibração dos equipamentos utilizados.

O equipamento **MX6 iBrid** é um instrumento portátil utilizado em avaliações de passivos para detectar compostos voláteis e inclui até cinco sensores simultâneos. As unidades utilizadas neste projeto estão configuradas com um sensor PID 10,6eV para medição de VOC em PPM e de um sensor catalítico para medição de LEL (Low Explosivity Level ou Limite Inferior de Inflamabilidade - LII) em porcentagem.

O MX6 tem calibração com validade de até 6 meses, e são realizadas verificações/ajustes semanais com gás referência para garantia das medições. (Equipamentos USP Nº Série: 130203S-001 e 15010T3-001).

O equipamento **GEM 5000** é um equipamento portátil especificamente utilizado para monitoramento da migração de gases (por exemplo, em aterros). Ele é composto de célula infravermelha de comprimento de onda duplo com canal de referência para leitura de Metano-CH₄ em e Dióxido de Carbono-CO₂ em %Volume, de célula eletroquímica para medição de Oxigênio-O₂, Monóxido de Carbono-CO e Sulfeto de Hidrogênio-H₂S em PPM e de transdutor para medição da Pressão.

O GEM5000 tem uma calibração anual. Além disso, diariamente é realizada a verificação com ar ambiente antes do início das medições para garantia das medições. (Equipamento USP N° Série G500491).

O **Metano** n° CAS 74-82-8 é um gás inflamável, comumente encontrado em material orgânico devido à presença de bactérias decompositoras. Apresenta faixa de inflamabilidade entre 5% a 15% em volume, isto é, concentrações do gás/vapor que em contato com o ar forma uma mistura inflamável na presença de uma fonte de ignição (mistura ideal). As concentrações abaixo ou acima dessa faixa não propagam chama, uma vez, que a quantidade de gás/vapor é muito pequena (mistura pobre) ou muito elevada (mistura rica) para queimar ou explodir, conforme descrito no manual de produtos químicos (CETESB, 2003).

Para que ocorra a inflamabilidade, seria necessária a concentração do gás, em sua mistura ideal com oxigênio em um ambiente confinado, e um meio de ignição. Observou-se em vistoria que, em geral, o perfil construtivo das edificações apresenta ventilação fixa, o que dificulta o acúmulo do gás nesses ambientes. A **Figura 3.1** ilustra a faixa de inflamabilidade do Gás Metano, bem como a faixa de medição do equipamento utilizado, e o esquema de combustão.

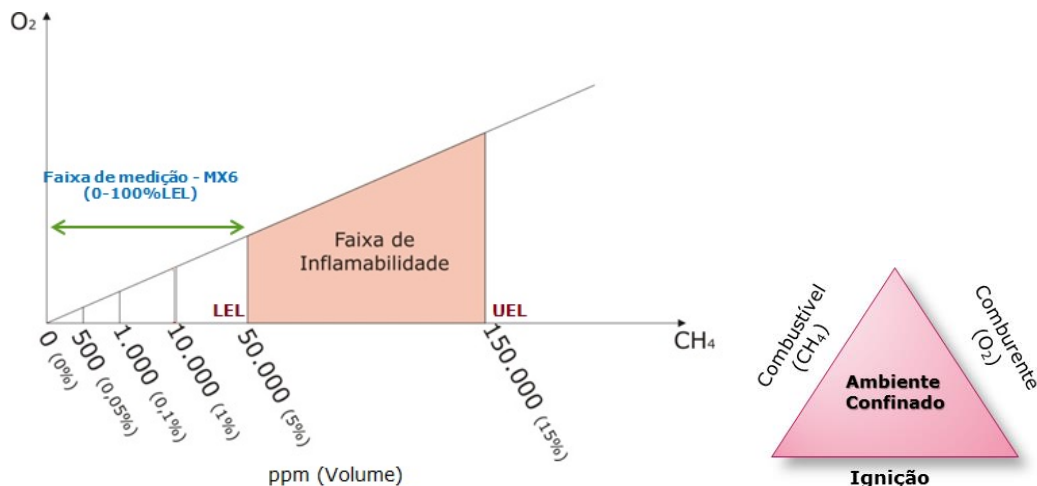


Figura 3.1 Esquema da faixa de inflamabilidade do metano e sua combustão

3.1 PLANO DE AÇÃO

Um plano de ação foi estabelecido para garantia da segurança durante a realização dos trabalhos de monitoramento e ventilação dos gases.

O plano completo e detalhado se apresenta no **Anexo II**. E a seguir se apresentam as principais ações relacionadas às concentrações de metano obtidas:

Sistema Inoperante: Verificar as causas e buscar as soluções, monitorar diariamente os poços de monitoramento sob influência até o reinício da operação;

Ponto de Alerta (PMG "B" com concentração de Metano acima de 5%vol): Monitorar a profundidade rasa "A" para verificar movimentação do gás para o tapete de brita;

Ponto Crítico (PMG "A" com concentração de Metano entre 5% e 15%vol): Ajustar as válvulas do sistema de ventilação direcionando o fluxo para o ponto e monitorar a redução da concentração; Monitorar a Infraestrutura até que as concentrações no ponto estejam abaixo de 5%;

Ponto Extremamente Crítico (PMG "A" com concentração de Metano acima de 15%vol): Ajustar as válvulas do sistema de ventilação direcionando o fluxo para o ponto e monitorar a redução da concentração; Monitorar a Infraestrutura até que as concentrações no ponto estejam abaixo de 5%, Manter o ambiente ventilado;

Pontos de Infraestrutura em ambientes internos com concentração acima de 20%LEL (ou 1%volCH₄): Ventilar o ambiente, Remover as pessoas do ambiente, eliminar fontes de ignição, identificar os pontos de entradas de gás no ambiente e selar;

Entrada dos Exaustores com concentração acima de 20%LEL (ou 1%volCH₄): Aumentar a frequência do compressor, para aumentar o vácuo e o fluxo e por consequência a diluição.

4 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO TRIMESTRE

As medições no primeiro trimestre de 2017 (03 de Abril a 30 de Junho de 2017) ocorreram de forma efetiva e de acordo com a sistemática programada, em poços de monitoramento e nos pontos da Infraestrutura. Os sistemas de ventilação operaram normalmente.

Os resultados de monitoramento e operação estão apresentados e compilados neste relatório trimestral de forma a abordar uma visão geral sobre a variação da concentração de metano na área, e principalmente, da intrusão em ambientes fechados.

A seguir apresenta-se a compilação dos dados de monitoramento (item 4.1) e de operação dos sistemas (item 4.2).

4.1 RESULTADO DO MONITORAMENTO EM POÇOS E NA INFRAESTRUTURA

O nível d'água no local apresenta-se raso, muitas vezes cobrindo os poços com profundidade de 1,0 m e algumas vezes os de 0,30 m, impedindo assim a medição nesses pontos. Além disso, alguns poços por vezes entopem, não permitindo o fluxo da bomba do equipamento de medição.

As medições realizadas em poços de monitoramento indicaram que as concentrações de metano acima de 1%vol, estão localizadas em pontos específicos, e não abrangem toda a extensão dos edifícios, além de estarem localizadas nas porções mais profundas (cerca de 1,0m). Não foram detectadas concentrações significativas (>1%) em nenhum dos poços rasos (~0,30m) nem nos diretamente sob a laje (*vapor pin*).

Quanto às medições em poços de monitoramento para H₂S e CO foram obtidas baixas concentrações de até 2,0 ppm para ambos compostos, já para VOC as concentrações em geral foram nulas ou de até 0,80 ppm.

Nas medições em ralos e caixas de passagem em todas as edificações, bem como em ambientes com pouca circulação de ar detectaram-se concentrações nulas de VOC e de inflamabilidade (LEL/Metano), exceto na caixa der passagem nº 55 situada na enfermaria que no dia 02/05/2017 teve a leitura realizada logo após a utilização de produtos de limpeza na pia, nesse momento foi detectado 1,1 ppm de VOC e 7% LEL.

Sobre as medidas de pressão, os valores entre -0,2 a 0,2 mbar são considerados como a faixa de variação do equipamento. Foi observada pressão em alguns poços de monitoramento, positiva de até 34,78 mbar e negativa de até -36,0 mbar. Essa variação de pressão pode relacionar-se com a operação dos sistemas e/ou com a variação do nível d'água local, os poços com maiores pressão apresentaram água e/ou restrição de fluxo. (Como comparativo segue o seguinte dado: 1 mBar = 0,001 atm).

Nos **Anexos III, IV e V** seguem as planilhas de monitoramento individual semanal para cada poço de monitoramento e quinzenal na Infraestrutura.

De forma a facilitar a visualização dos resultados obtidos, foram destacados na **Tabela 4.1.1** e na **Figura 4.1.1** os poços que apresentaram concentração de metano pelo menos uma vez acima de 1%vol, a fim de avaliar a distribuição os poços com concentrações próximas ou na faixa de inflamabilidade do metano.



A **Tabela 4.1.2** mostra os poços que apresentaram restrição de fluxo e/ou presença de água.

Os **Gráficos de concentração** demonstram a variação da concentração semanal de metano nos poços de monitoramento que apresentaram pelo menos uma vez concentração de metano acima de 1%vol. A fim de acompanhar a presença recorrente de metano em poços, mesmo que abaixo da faixa de inflamabilidade.

O **Anexo VII** apresenta a evolução das concentrações e pressões obtidas desde o início do monitoramento em Abril/14 até Junho/17.

Tabela 4.1.1 Relação entre Quantidade de Poços x Poços em concentração igual ou maior que 1%Vol (Abr a Jun/17)

Distribuição dos Gases nos Edifícios												
311.1264.14/E13VMGS - SEF - EACH												
EDIFÍCIO	Total de Poços	abr/17				mai/17				jun/17		
		Poços ≥1%volCH ₄	Posição	≥ Faixa 5-15%	Poços ≥1%volCH ₄	Posição	≥ Faixa 5-15%	Poços ≥1%volCH ₄	Posição	≥ Faixa 5-15%		
I-1	17 pares	2	PMG-114 Profunda (1,0m)	-	2	PMG-114 Profunda (1,0m)	-	2	PMG-114 Profunda (1,0m)	-		
			PMG-11 Profunda (1,0m)	sim		PMG-11 Profunda (1,0m)	sim		PMG-11 Profunda (1,0m)	sim		
I-3	21 pares	1	-	-	1	-	-	2	PMG-31 Profunda (1,0m)	sim		
			PMG-39 Profunda (1,0m)	-		PMG-39 Profunda (1,0m)	-		PMG-39 Profunda (1,0m)	-		
I-4	12 pares	1	PMG-66 Profunda (1,0m)	sim	Nenhum				Nenhum			
Conjunto Laboratorial	17 pares	12	PMG-46 Profunda (1,0m)	-	10	PMG-46 Profunda (1,0m)	-	11	PMG-46 Profunda (1,0m)	-		
			PMG-48 Profunda (1,0m)	-		PMG-48 Profunda (1,0m)	-		PMG-48 Profunda (1,0m)	-		
			PMG-49 Profunda (1,0m)	-		PMG-49 Profunda (1,0m)	-		PMG-49 Profunda (1,0m)	-		
			PMG-50 Profunda (1,0m)	-		PMG-50 Profunda (1,0m)	-		-	-		
			PMG-51 Profunda (1,0m)	sim		PMG-51 Profunda (1,0m)	sim		-	-		
			PMG-53 Profunda (1,0m)	-		-	-		-	-		
			PMG-54 Profunda (1,0m)	sim		PMG-54 Profunda (1,0m)	sim		-	-		
			PMG-55 Profunda (1,0m)	-		PMG-55 Profunda (1,0m)	-		PMG-55 Profunda (1,0m)	-		
			PMG-59 Profunda (1,0m)	sim		PMG-59 Profunda (1,0m)	sim		PMG-59 Profunda (1,0m)	sim		
			PMG-60 Profunda (1,0m)	sim		PMG-60 Profunda (1,0m)	sim		PMG-60 Profunda (1,0m)	sim		
			PMG-61 Profunda (1,0m)	sim		PMG-61 Profunda (1,0m)	sim		PMG-61 Profunda (1,0m)	sim		
			PMG-62 Profunda (1,0m)	-		PMG-62 Profunda (1,0m)	-		PMG-62 Profunda (1,0m)	-		
Bloco Inicial	14 pares	2	PMG-06 Profunda (1,0m)	-	1	PMG-06 Profunda (1,0m)	-	1	PMG-06 Profunda (1,0m)	-		
			PMG-08 Profunda (1,0m)	-		-	-		-	-		
Enfermaria	7 pares	1	PMG-74 Profunda (1,0m)	sim	1	PMG-74 Profunda (1,0m)	sim	1	PMG-74 Profunda (1,0m)	-		
CAT	7 pares	Nenhum				Nenhum						
Incubadora	6 pares	Nenhum				Nenhum						
Ginásio	11 pares	1	PMG-110 Profunda (1,0m)	-	1	PMG-110 Profunda (1,0m)	sim	1	PMG-110 Profunda (1,0m)	-		
Guarda Univer.	3 pares	Nenhum				Nenhum						
Portaria P3	2 trios	Nenhum				Nenhum						
Transportes	4 pares	1	PMG-122 Profunda (1,0m)	-	Nenhum				Nenhum			

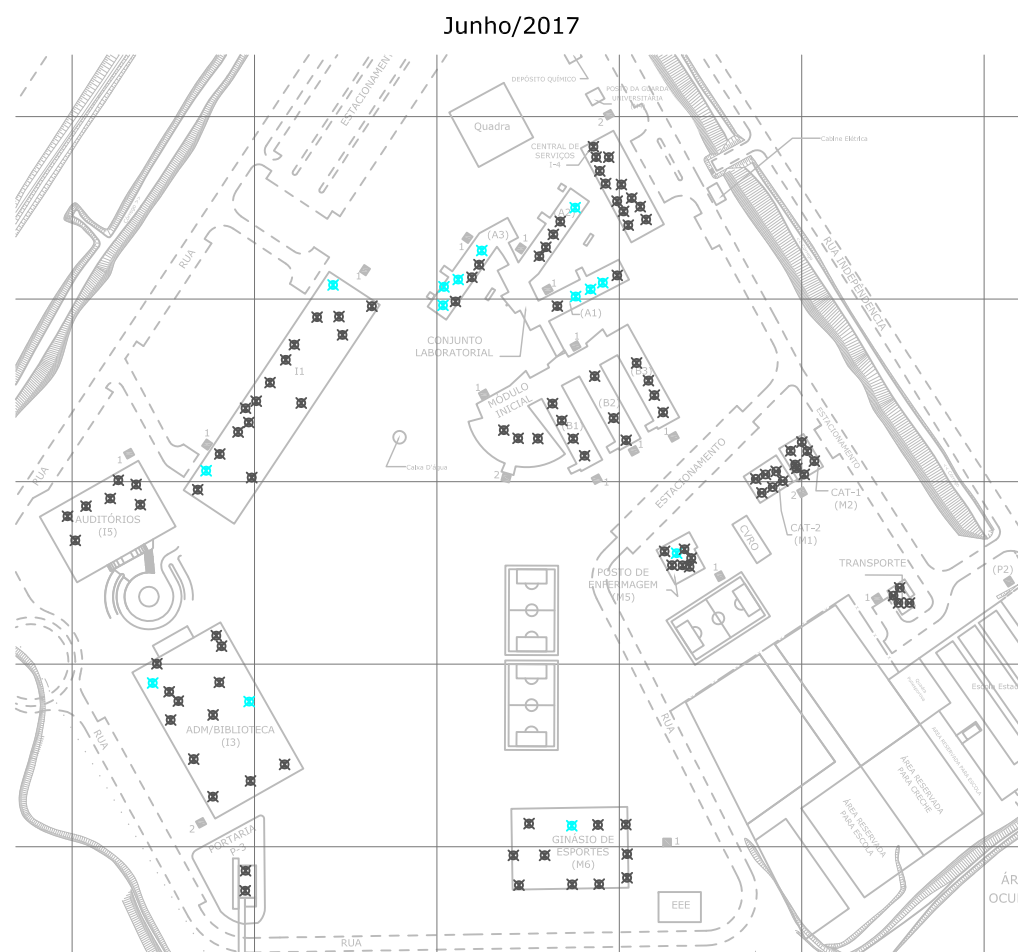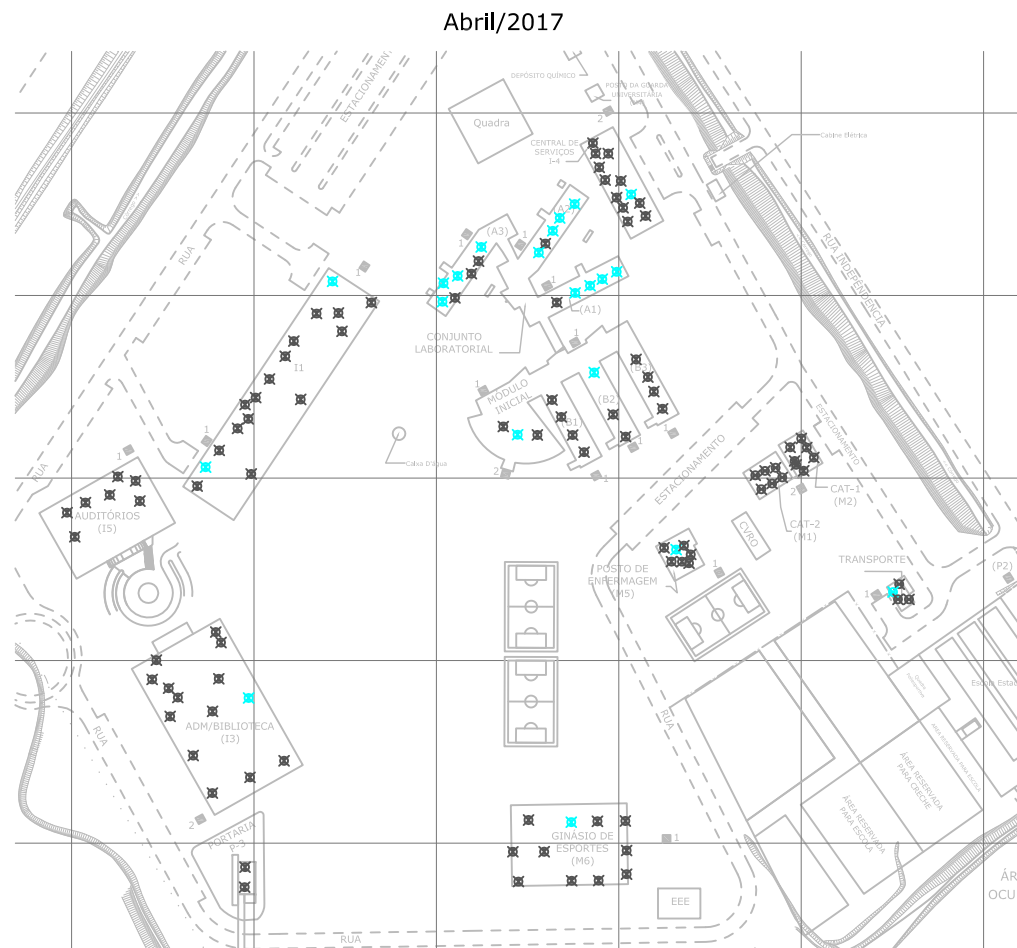

LEGENDA:

	Guia e Estacionamento
	Cerca de divisa
	Edificações
	Taludes
	Poço de monitoramento de gás
	Concentração de ch_4 > 1% porção subslab(0,30m)
	Concentração de ch_4 > 1% porção profunda(1,00m)



Escala Gráfica:



Fonte: Adaptado de Projeto de Implantação geral
Enviado pela Superintendência do Espaço Físico de 02/02/2015

Cliente: _____

Projeto 311.1264.14:
VENTILAÇÃO E MONITORAMENTO GASES_EACH

Figura 4.1.1:






Croqui ilustrativo da distribuição das concentrações detectadas acima de 1%
Período de Abril a Junho 2017






Elaborado por: Victor Acras de Souza	Revisado por: Paula Ramos	
Aprovado por: Carlos Frederico Egli	Data Rev.: 06/07/2017	Revisão: 00
Arquivo: 311.1264.14-Planta Base_cliente-VSC		



Tabela 4.1.2 Apresentação de Restrição de Fluxo e Presença de Água nos Poços (Abr a Jun/17)

Mês		abr/17				mai/17					jun/17			
Semana		1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
POÇOS		E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água												
Edifício I-1	PMG-114	A												
	PMG-114	B	E	E	E					A	A	A	A	A
	PMG-12	A												
	PMG-12	B	A	A	A					A		A	A	A
Edifício I-4	PMG-64	A												
	PMG-64	B	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	
	PMG-65	A												
	PMG-65	B	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A
	PMG-66	A												
	PMG-66	B				A	A	A	A		A	A	A	A
	PMG-68	A												
	PMG-68	B							A	A	A	A	A	A
	PMG-69	A												
	PMG-69	B							A	A	A	A	A	A
	PMG-77	A												
	PMG-77	B												
	PMG-81	A												
	PMG-81	B	A					A		A	A	A	A	A
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A												
	PMG-48	B	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
	PMG-49	A												
	PMG-49	B	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
	PMG-51	A												
	PMG-51	B						A	A	A	A	A	A	A
	PMG-54	A												
	PMG-54	B	A	A		A		A	A	A	A	A	A	A
	PMG-55	A												
	PMG-55	B	E					A			A			
	PMG-60	A												
	PMG-60	B	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
	PMG-62	A												
	PMG-62	B	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

Mês		abr/17				mai/17					jun/17			
Semana		1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
POÇOS		E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água												
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A												
	PMG-01	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	PMG-02	A												
	PMG-02	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	PMG-03	A												
	PMG-03	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	PMG-04	A												
	PMG-04	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	PMG-05	A												
	PMG-05	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	PMG-06	A												
	PMG-06	B	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
	PMG-07	A												
	PMG-07	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	PMG-08	A												
	PMG-08	B	A	A	A	A				A	A	A	A	A
	PMG-09	A												
	PMG-09	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Enfermaria	PMG-10	A												
	PMG-10	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	PMG-70	A												
	PMG-70	B	A							A				
	PMG-71	A								A				
	PMG-71	B								A				
	PMG-72	A												
	PMG-72	B												
	PMG-74	A												
	PMG-74	B	A	A	A					A	A	A	A	A
	PMG-75	A												
	PMG-75	B										A	A	A
CAT	PMG-95	A												
	PMG-95	B	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Gin	PMG-110	A												
	PMG-110	B	A	A	A						A	A		A
	PMG-119	A												
Portaria P3	PMG-119	B												
	PMG-119	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	PMG-120	A												
	PMG-120	B												
	PMG-120	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	PMG-121	A												
Transportes	PMG-121	B								A		A	A	
	PMG-122	A												
	PMG-122	B								A	A	A	A	
	PMG-123	A												
	PMG-123	B								A	A	A	A	
	PMG-124	A												
	PMG-124	B		A	A					A		A	A	
	PMG-124	C												

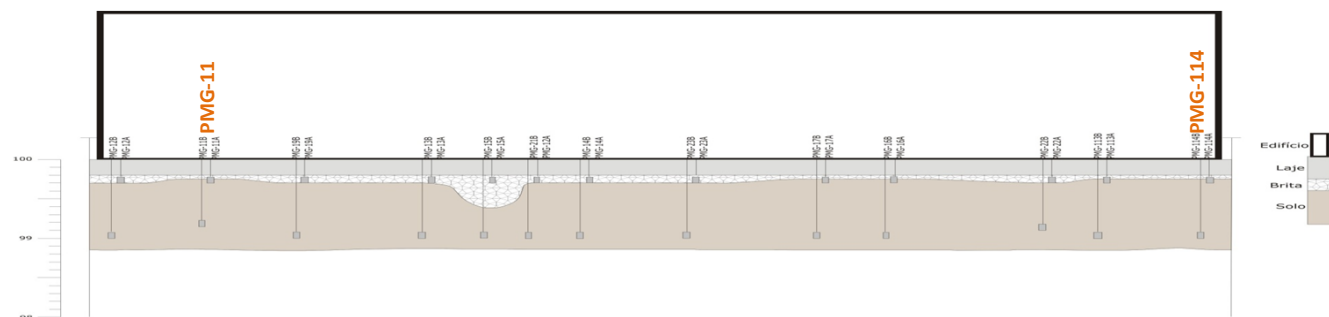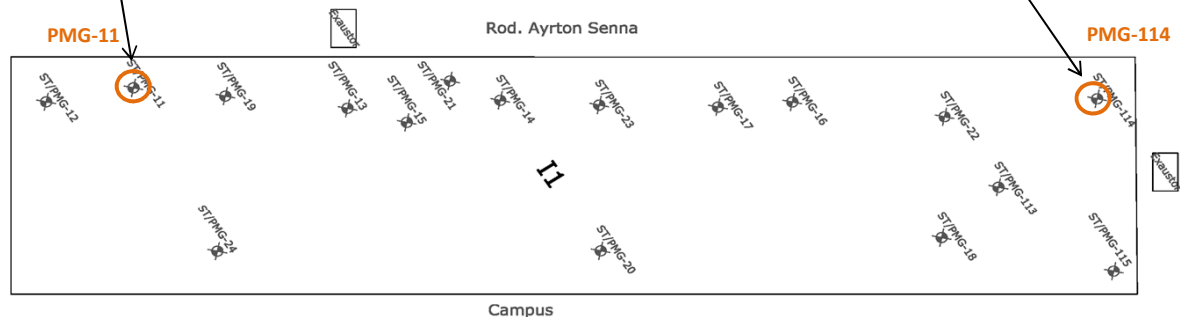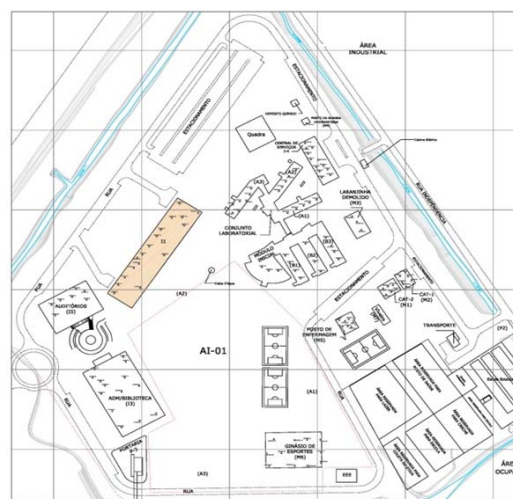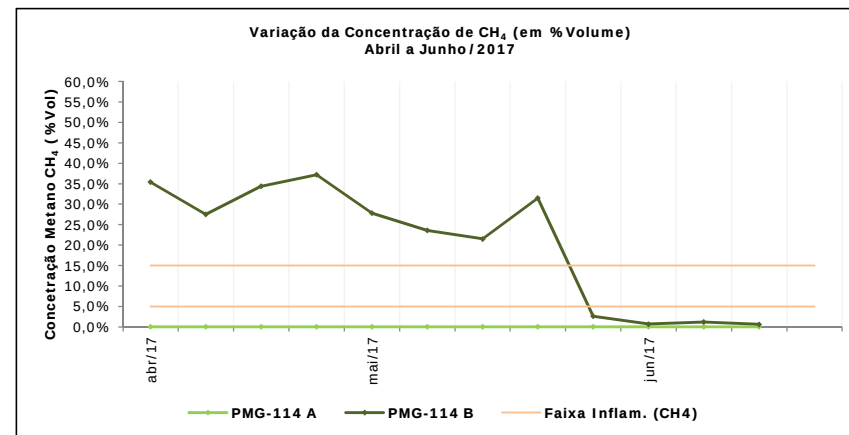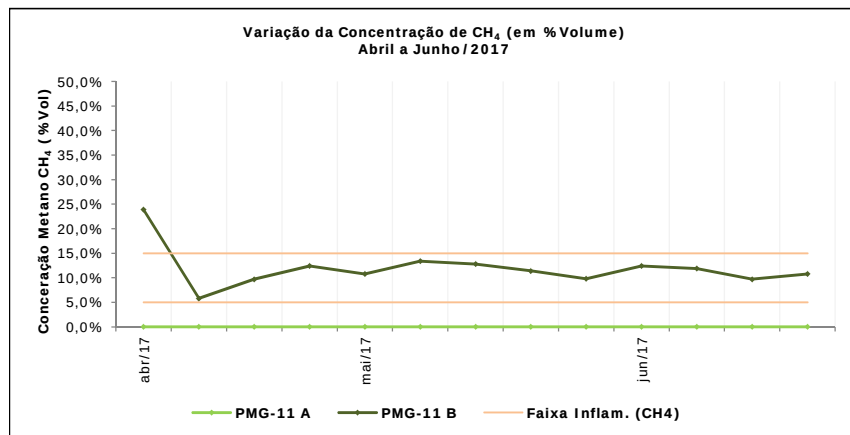

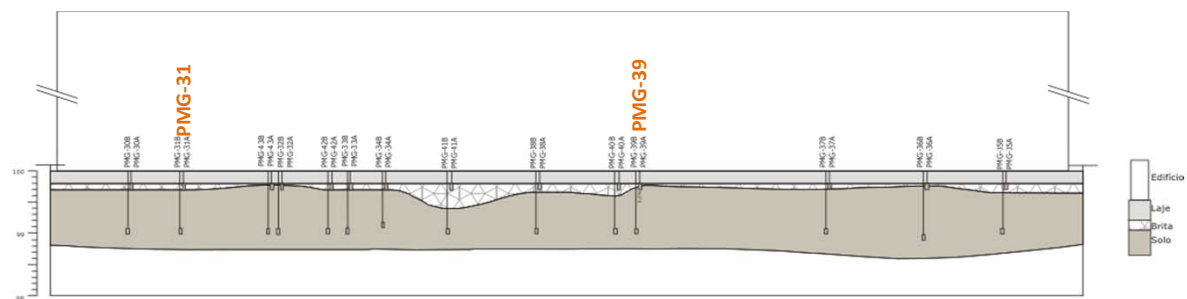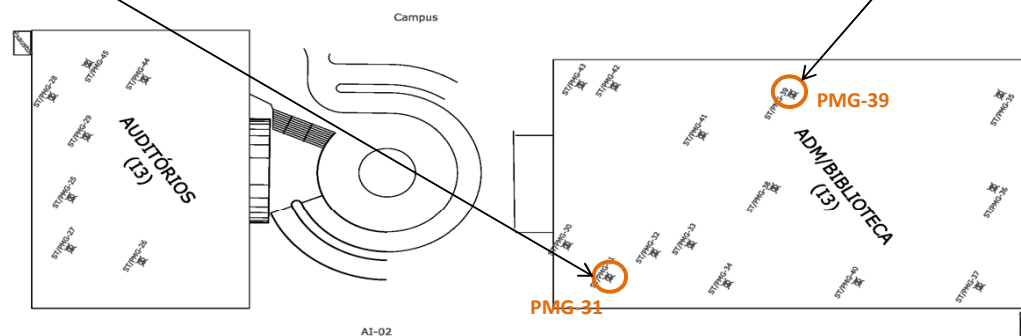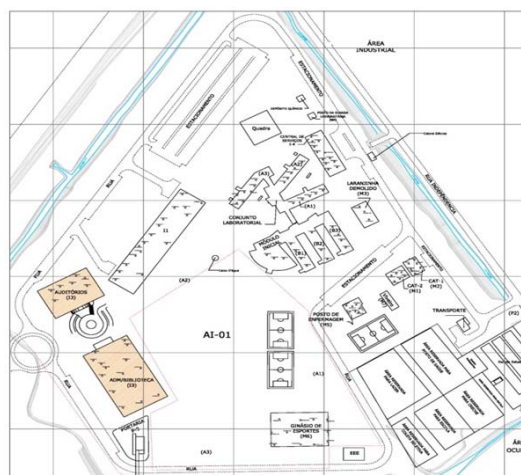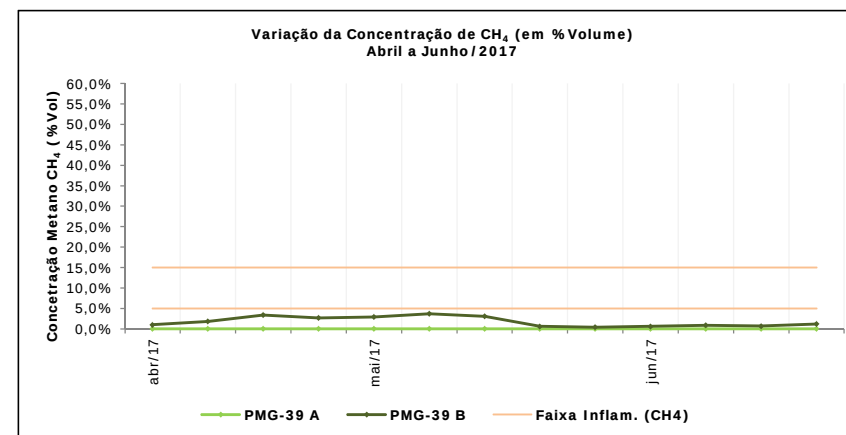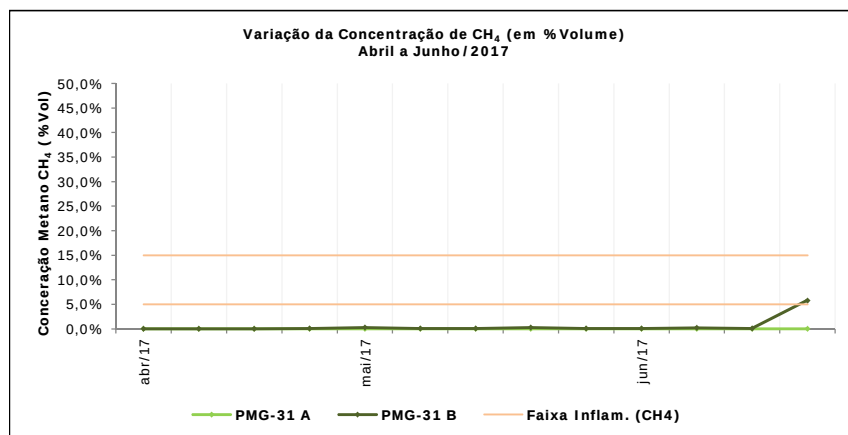

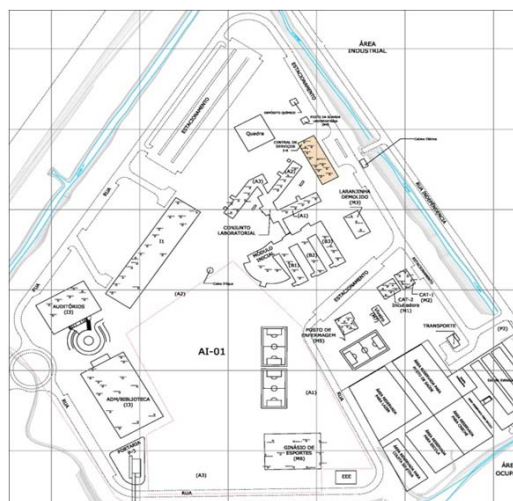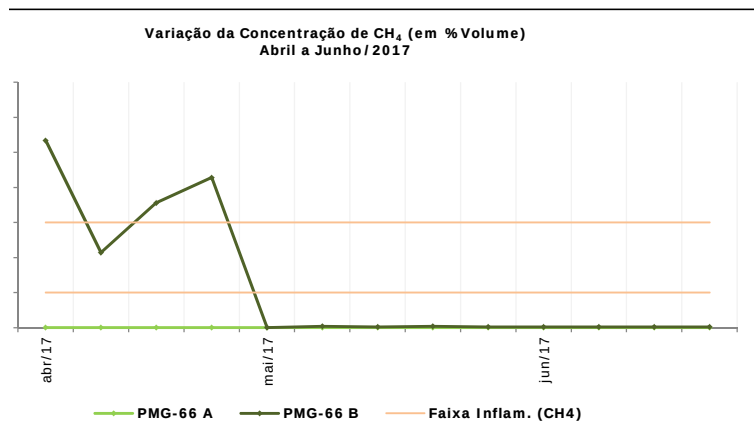


Exaustores





Rua de Acesso











Conjunto Laboratorial




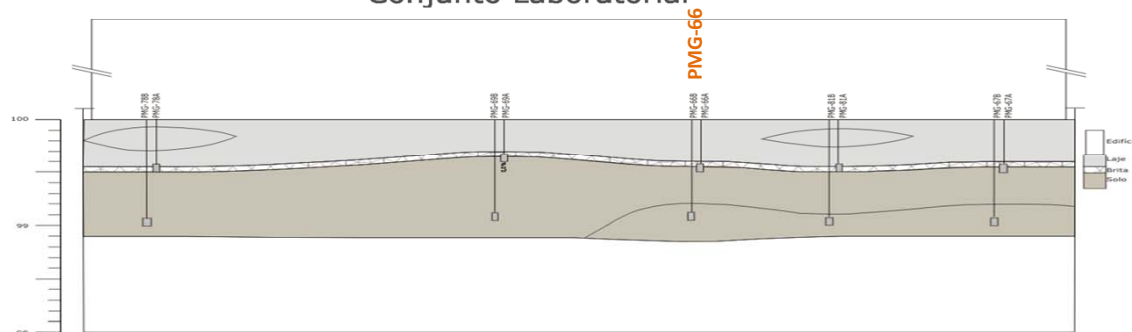






**CENTRAL DE
SERVIÇOS
I-4**

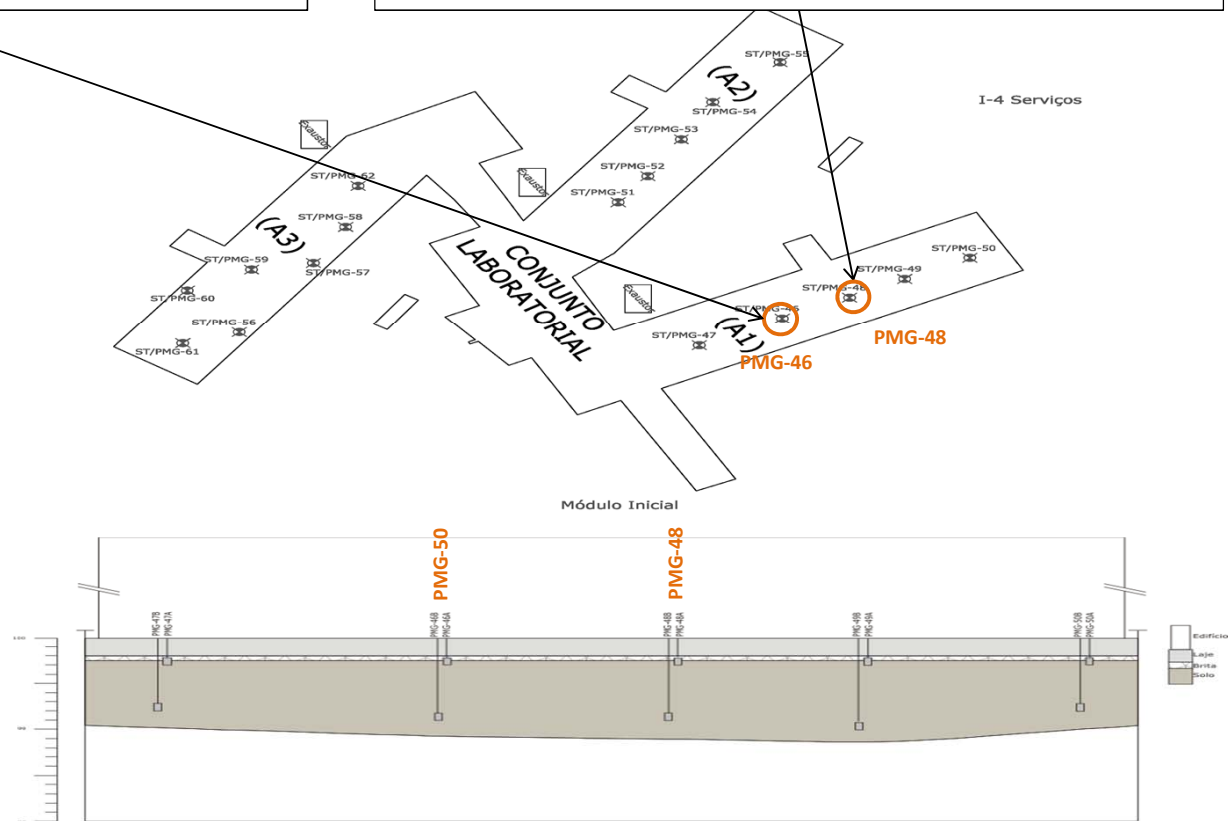
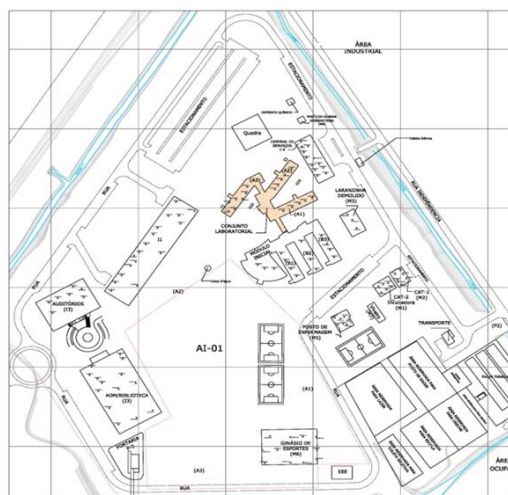
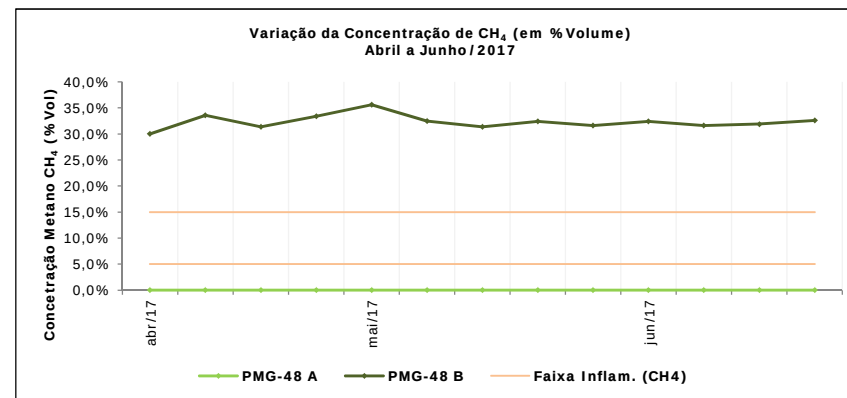
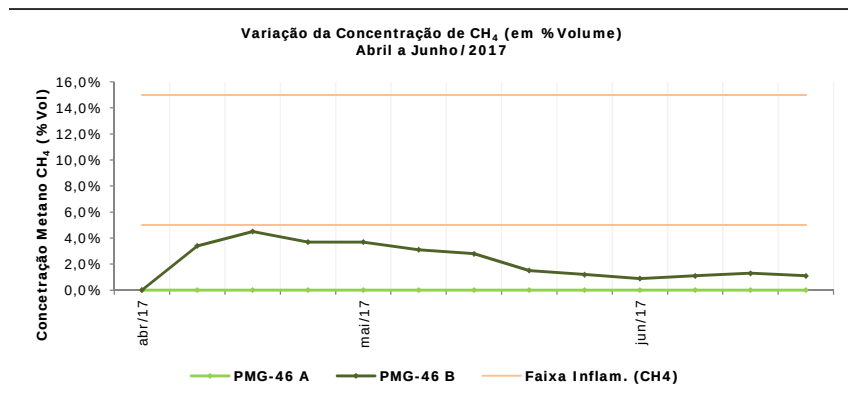


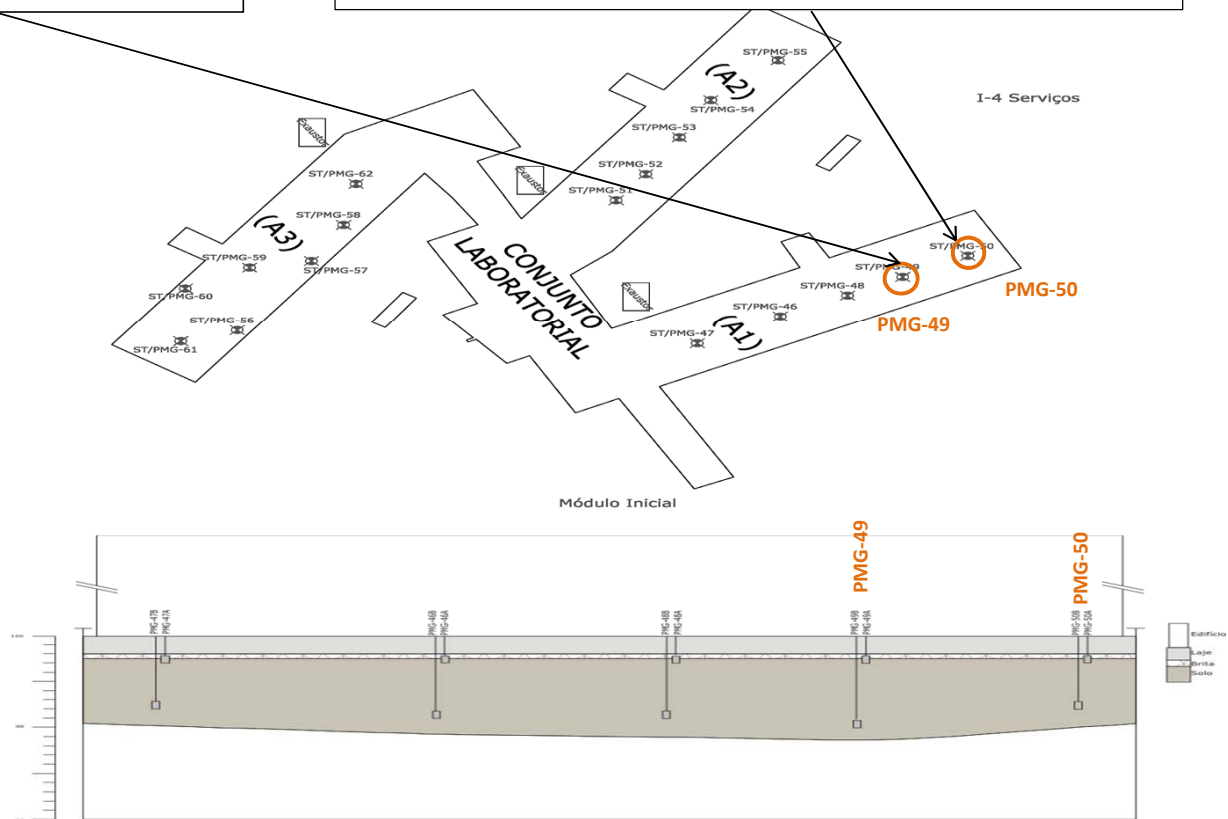
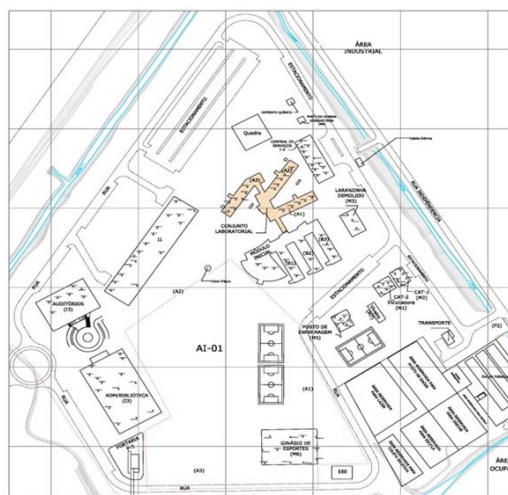
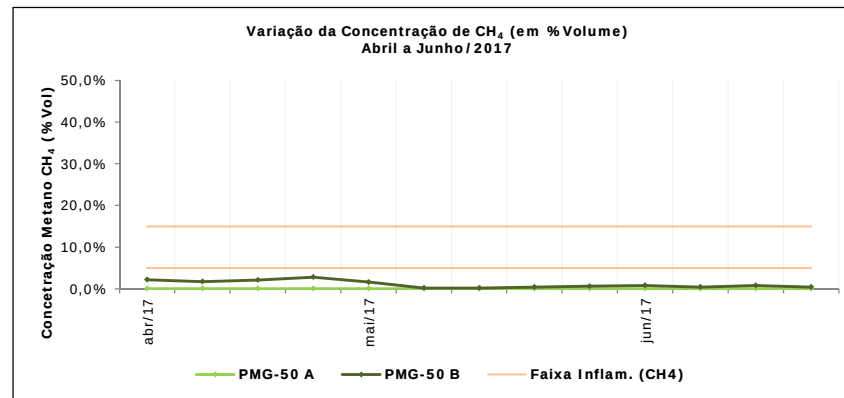
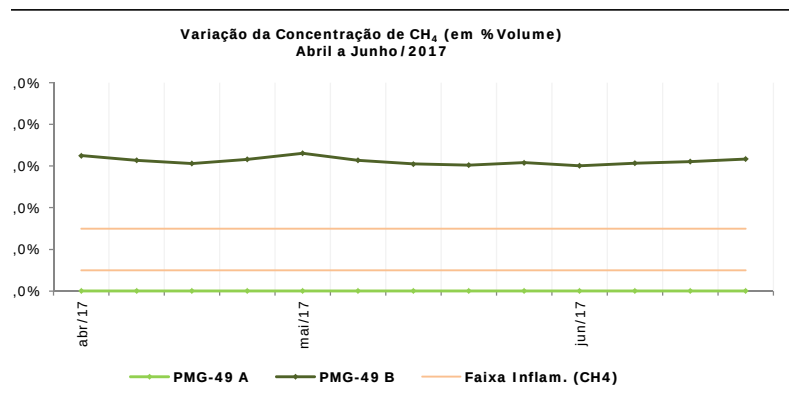


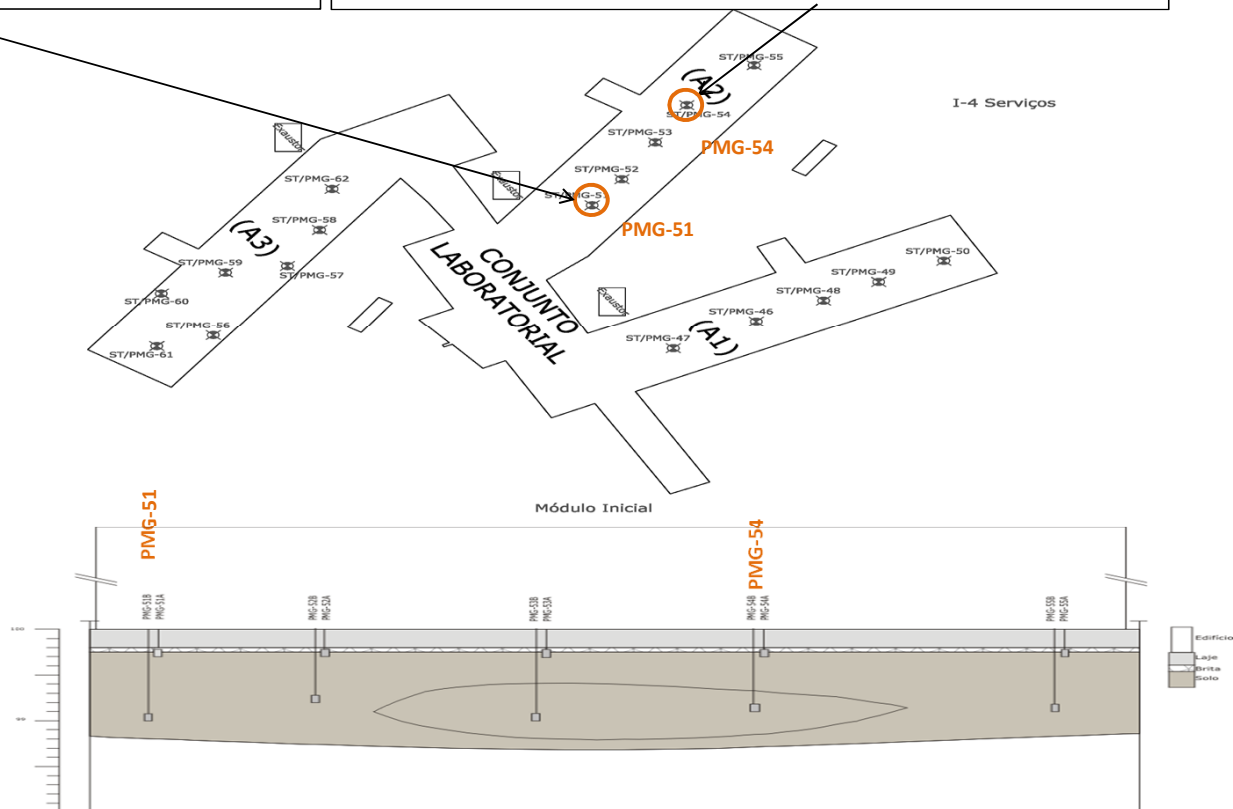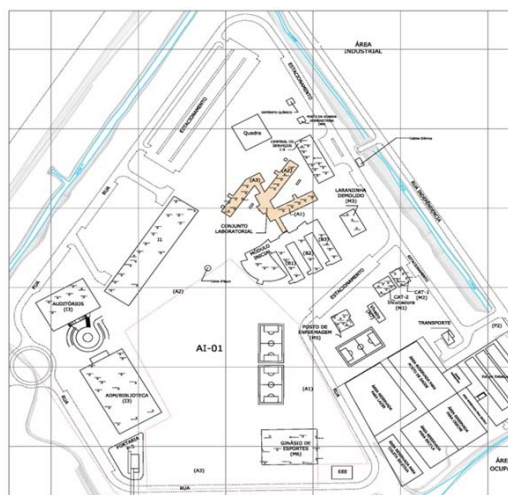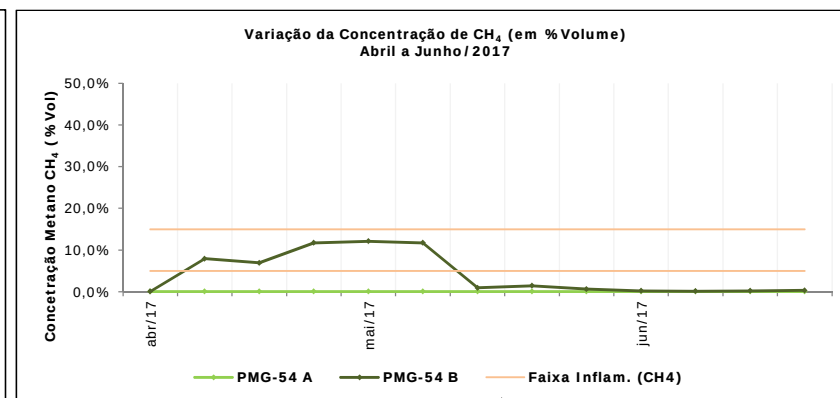
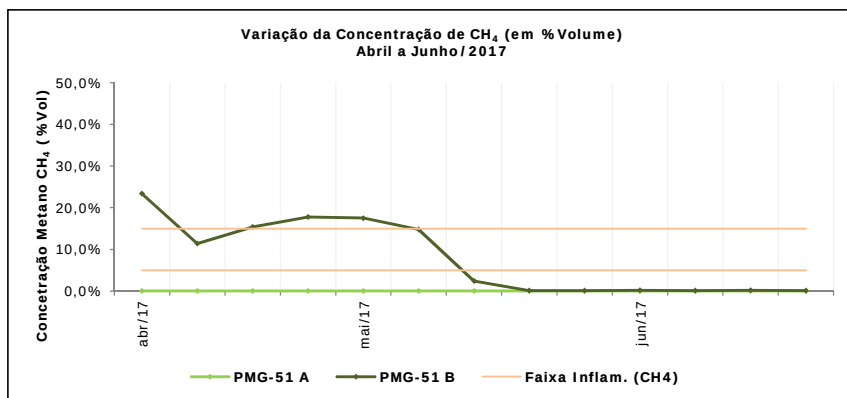


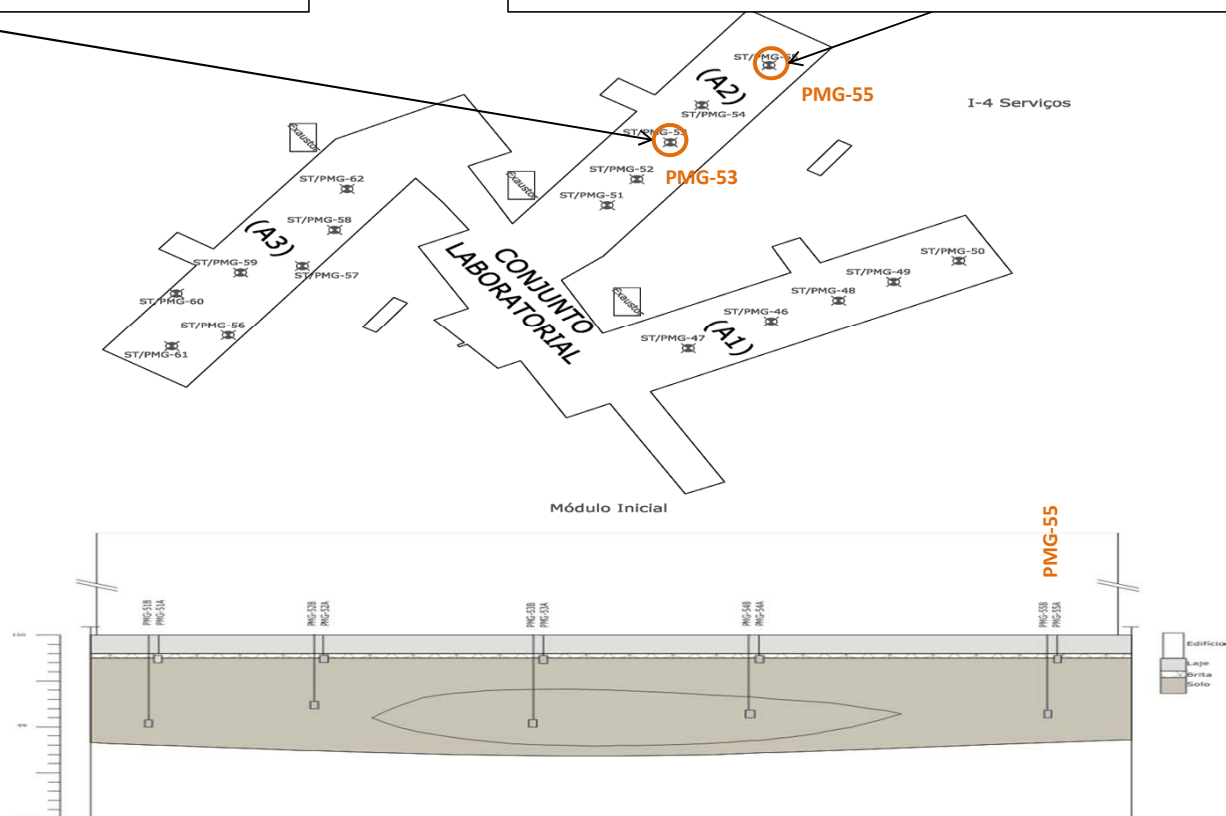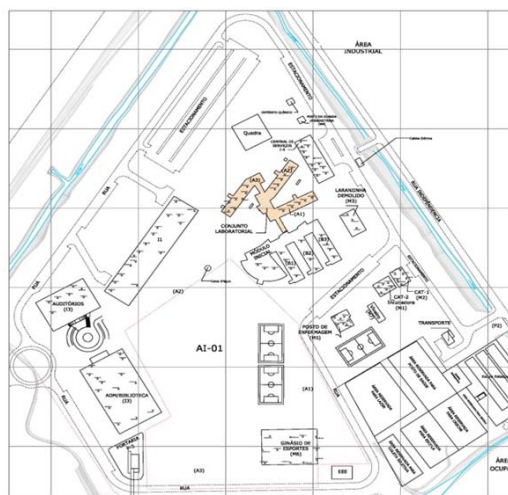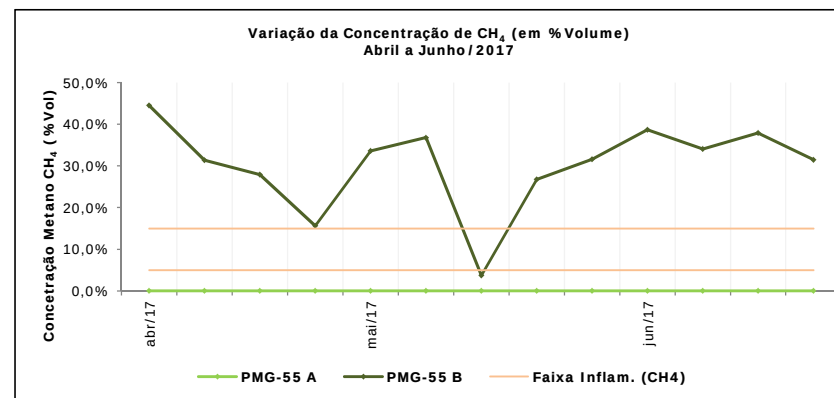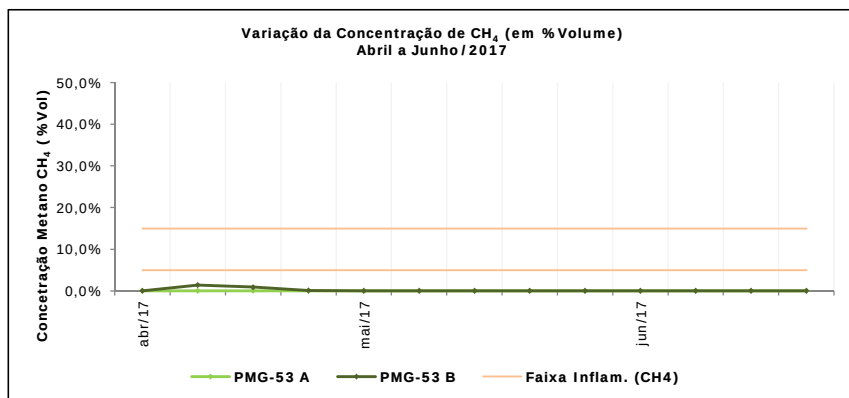

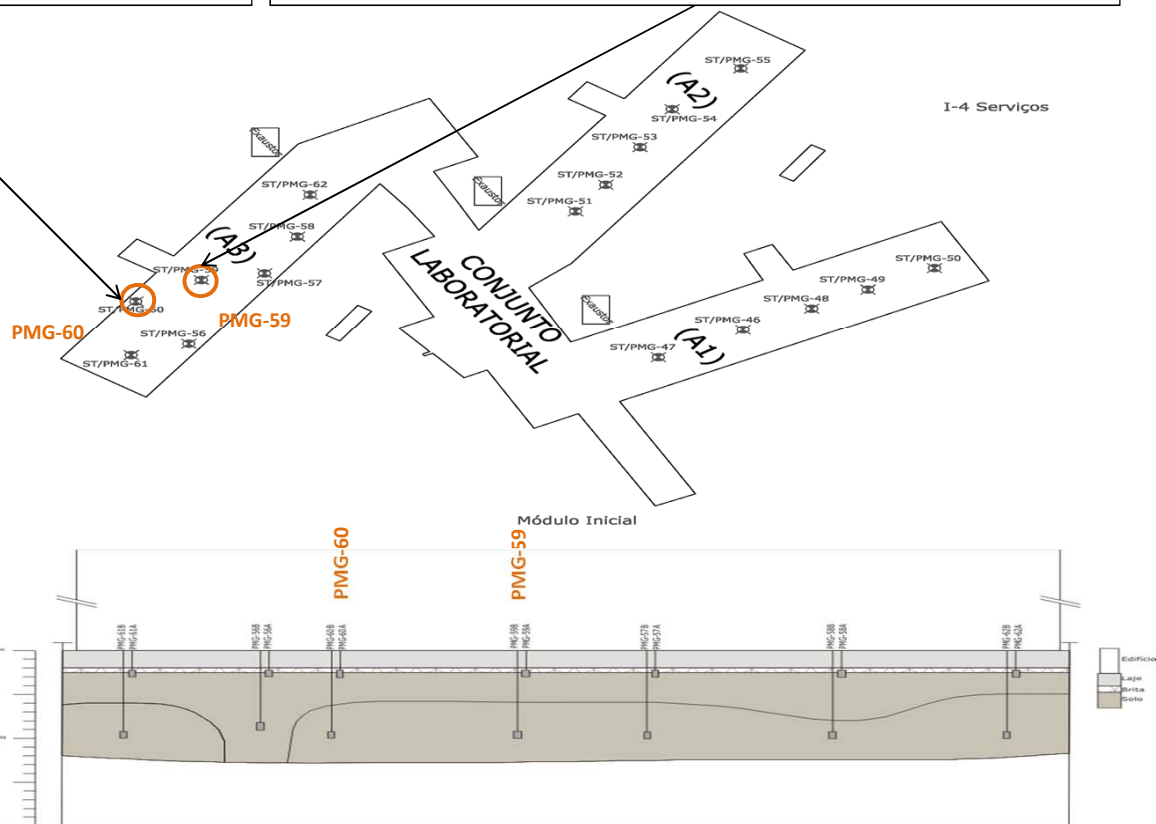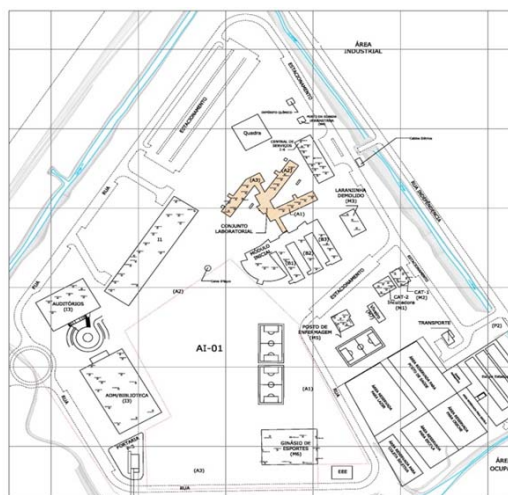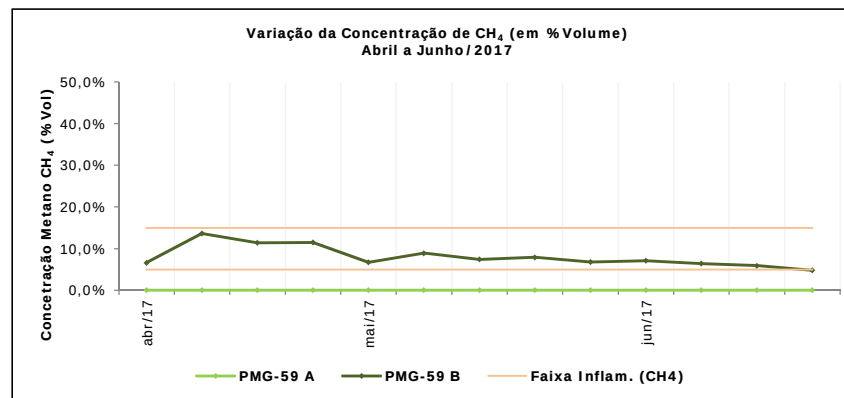
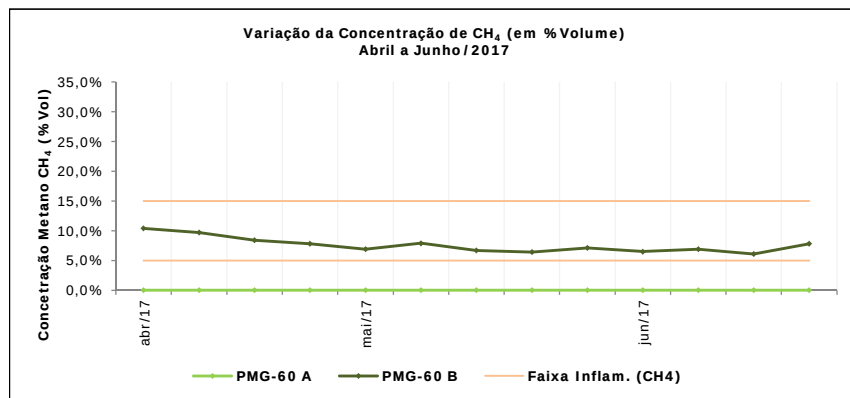


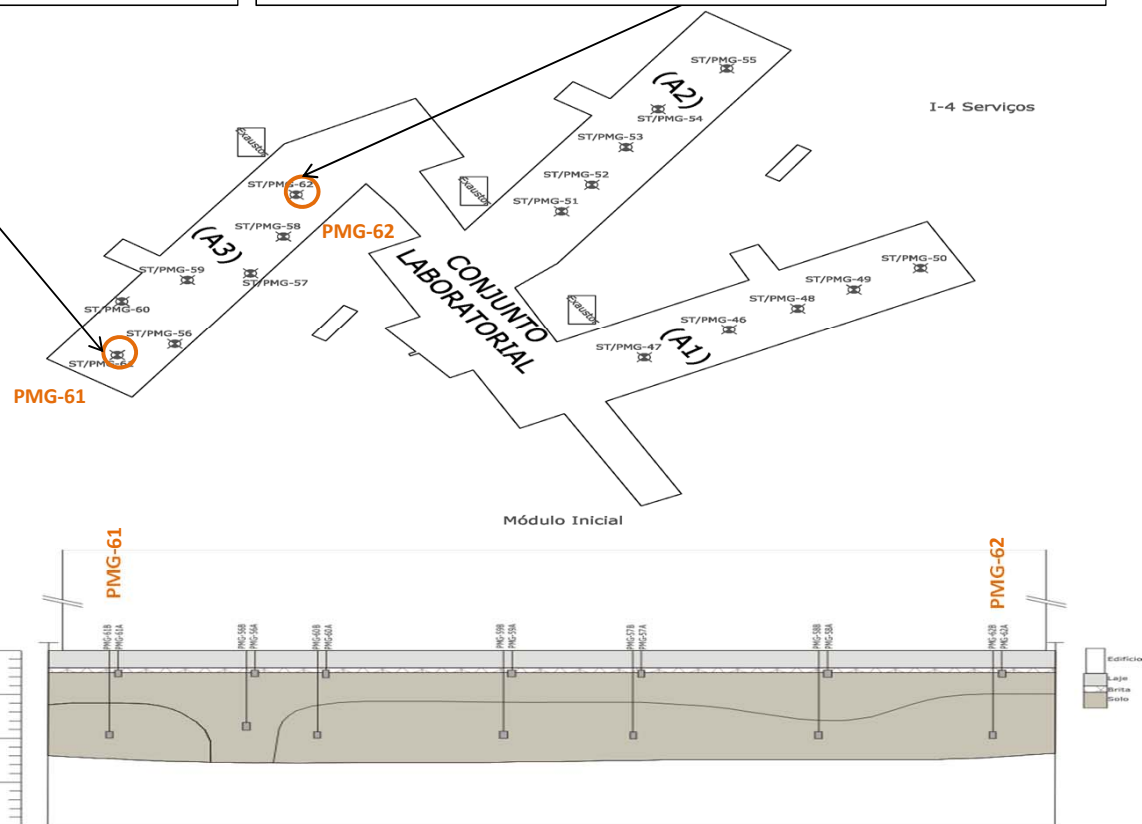
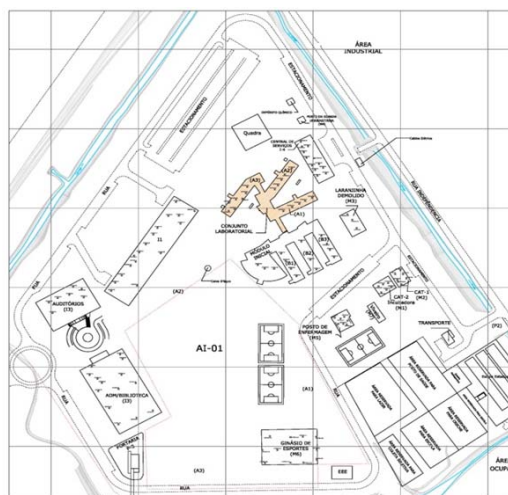
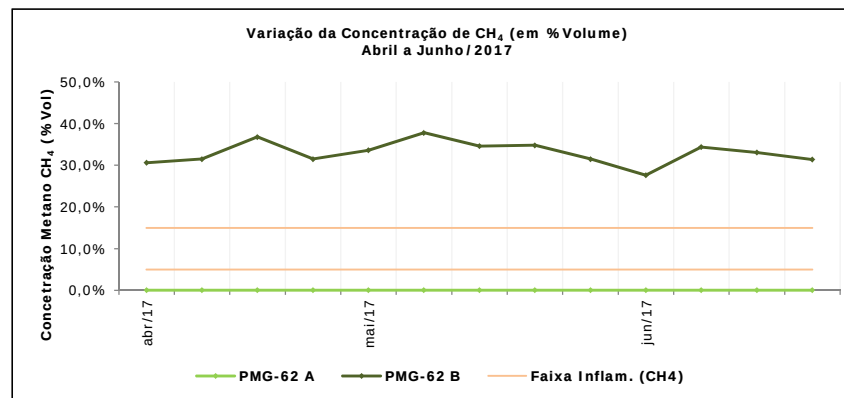
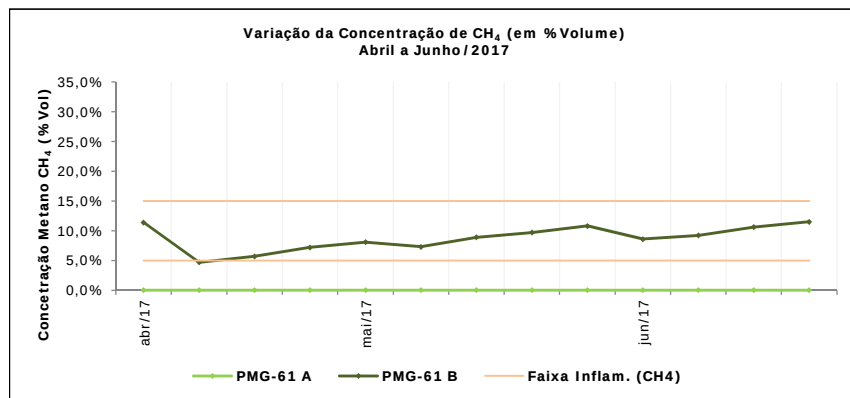


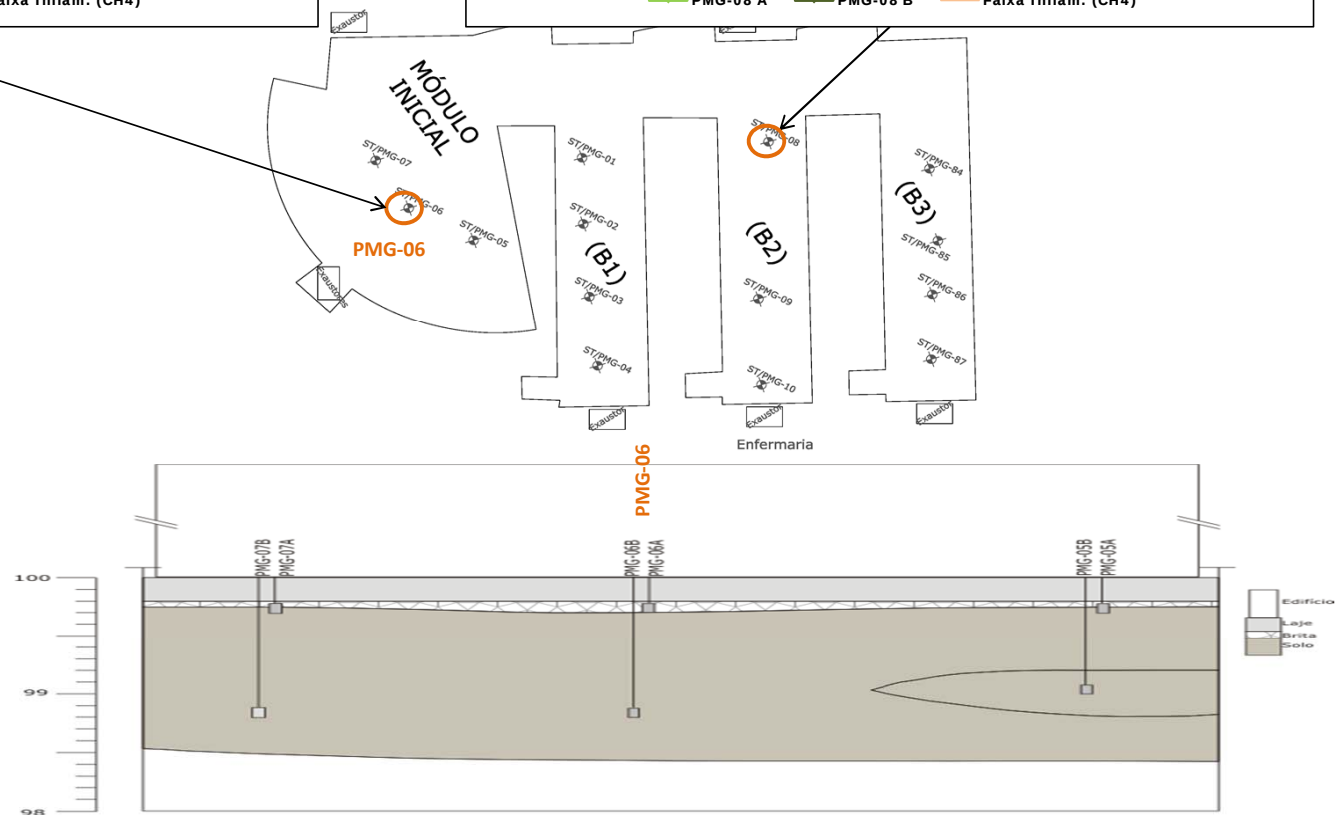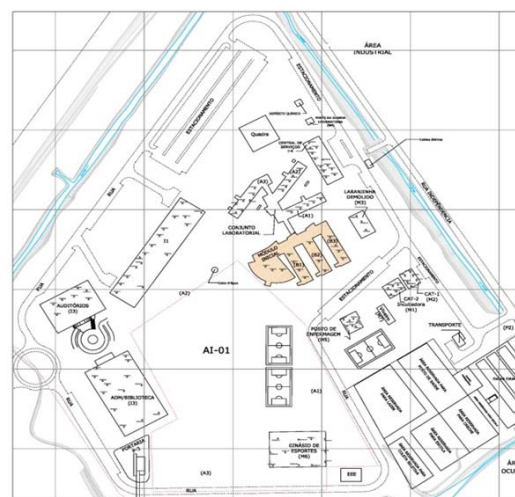
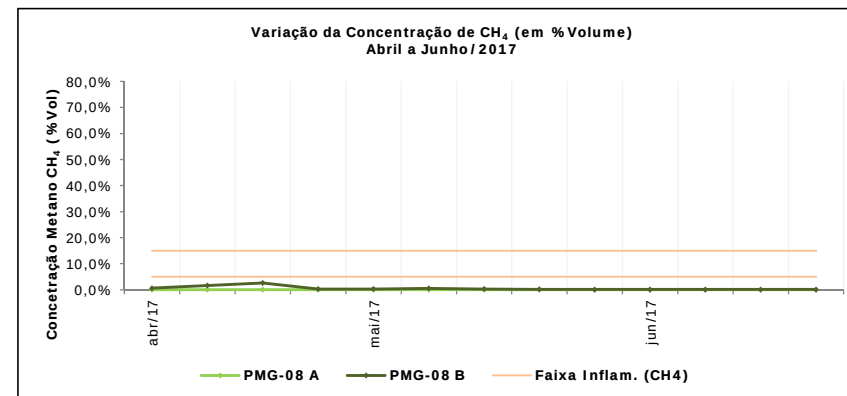
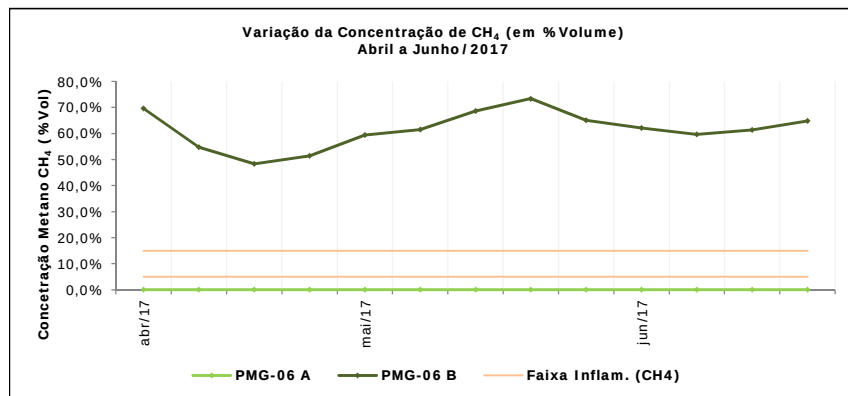


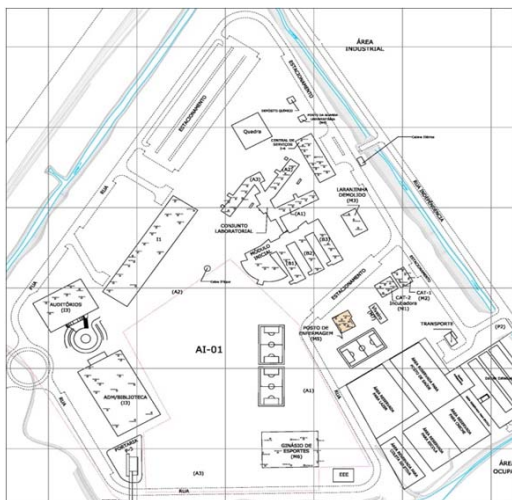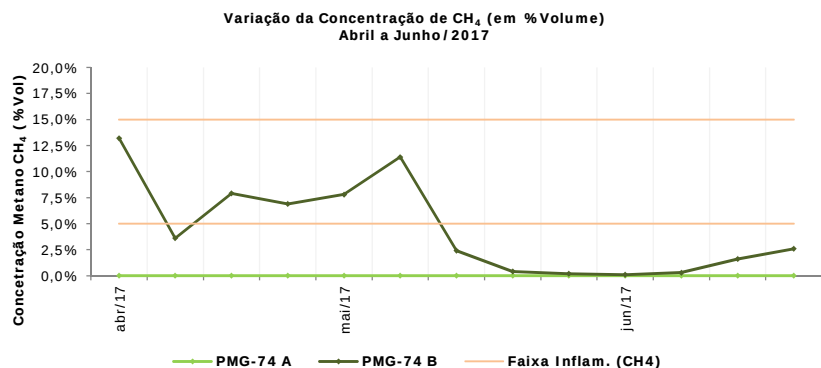

**POSTO DE
ENFERMAGEM
(M5)**

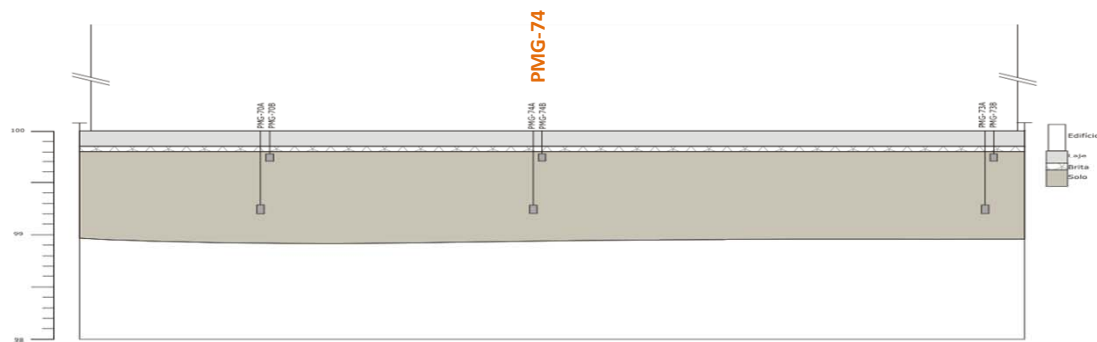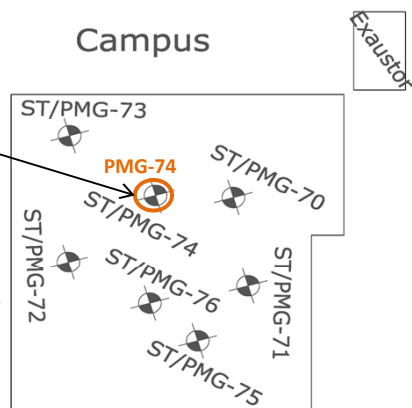

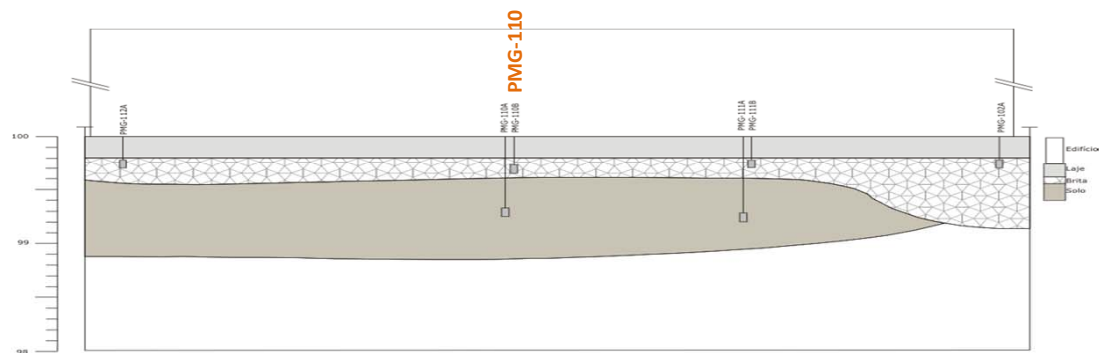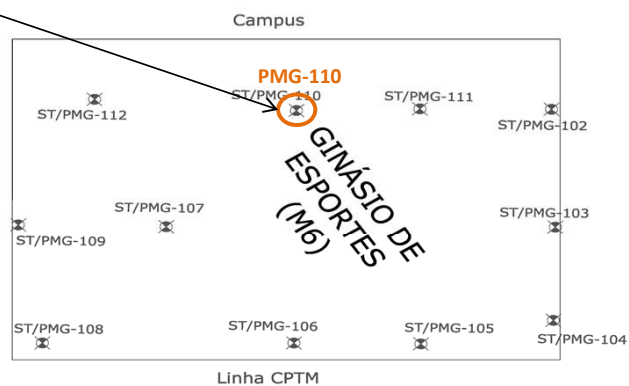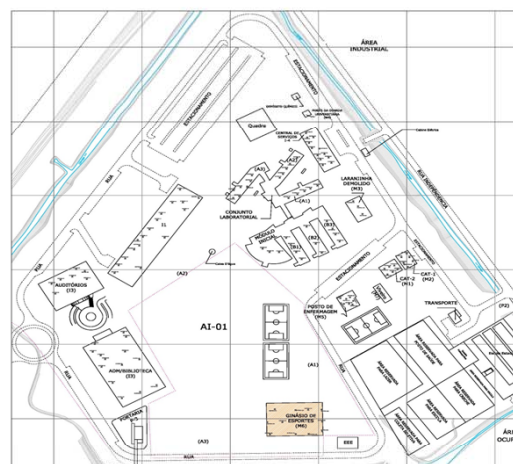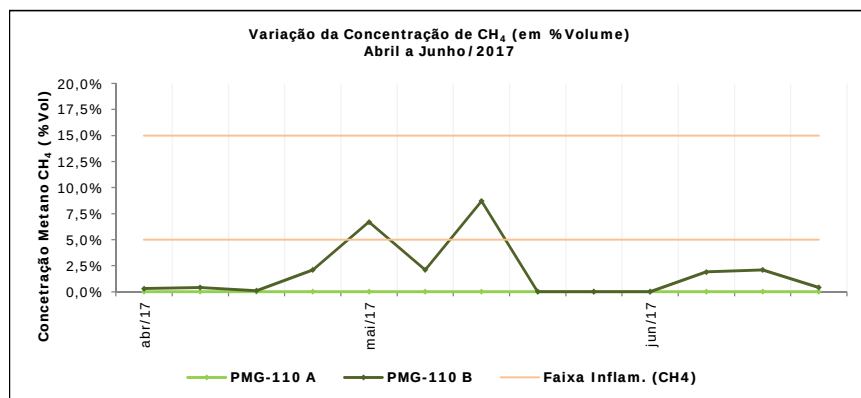

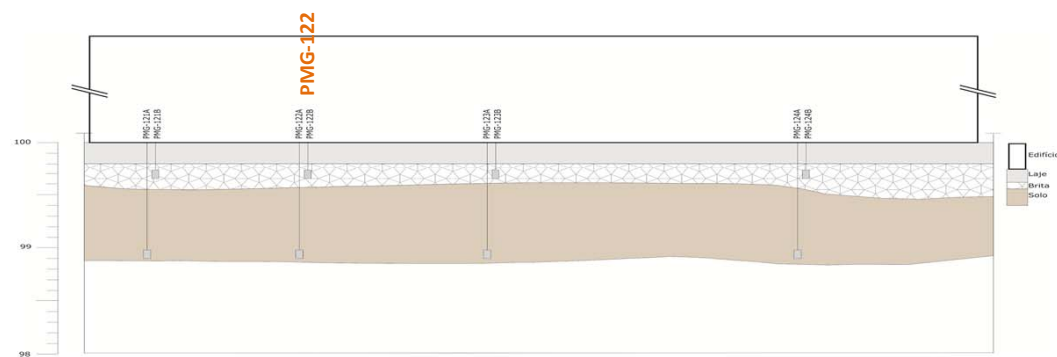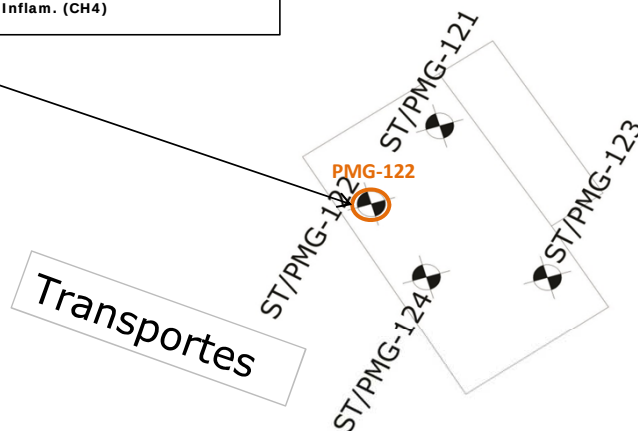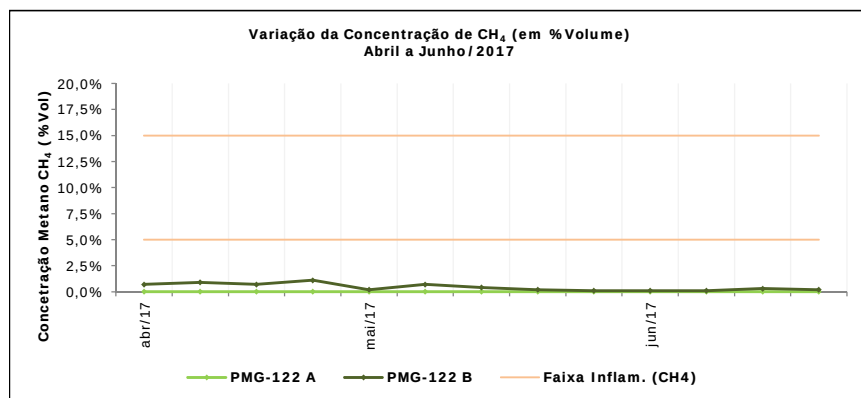

4.2 RESULTADO OBTIDO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO

A avaliação da eficiência dos Sistemas de Ventilação (circulação de ar nos tapetes de brita, logo abaixo da laje das edificações) é realizada através da avaliação dos resultados do monitoramento das concentrações de metano e da variação da pressão, em poços de monitoramento em duas profundidades distintas, bem como da operação ininterrupta dos sistemas (24h por dia, 30 dias por mês).

O Sistema de Ventilação é individual e específico para cada edificação. De uma forma geral é composto por *Elementos de Subsuperfície* (colchão de brita, pontos de captação de ar atmosférico e de extração de gases e/ou tubulação geomecânica), por *Elementos de Superfície* (tubulação de interconexão dos pontos de extração de gases) e por *Exaustores* (montados com compressor, célula de vácuo e painel elétrico).

No total foram contemplados 24 exaustores para ventilação forçada, sendo que estão instaladas 22 unidades e 02 adicionais para serem utilizados em caso da necessidade de substituição e encaminhamento de algum dos exaustores em operação para manutenção preventiva ou corretiva.

Os exaustores estão distribuídos em 18 abrigos, já que foi possível posicionar dois exaustores em alguns abrigos. A distribuição de exaustores e abrigos se apresenta na **Tabela 4.2.1**.

Tabela 4.2.1 Localização dos exaustores dos Sistemas de Ventilação

Identificação do Exaustor	Edifício a que está conectado	Identificação do Abrigo
Exaustor I1 (1)	Edifício I1 Parte 1	Abrigo I1 (1)
Exaustor I1 (2)	Edifício I1 Parte 2	Abrigo I1 (2)
Exaustor I5 Auditórios	Edifício I5 Auditórios	Abrigo I5 Auditórios
Exaustor Biblioteca	Edifício I3 Biblioteca	Abrigo I3 Biblioteca
Exaustor Portaria 3	Portaria P3	Abrigo I3 Biblioteca
Exaustor Ginásio	Ginásio	Abrigo Ginásio
Exaustor Enfermaria	Enfermaria	Abrigo Enfermaria
Exaustor CAT1	CAT 1	Abrigo Incubadora
Exaustor CAT2	Incubadora (CAT 2)	Abrigo Incubadora
Exaustor Transportes	Transportes	Abrigo Transportes
Exaustor MI (B1)	Módulo Inicial – Bloco 1	Abrigo Módulo Inicial (B1)
Exaustor MI (B2)	Módulo Inicial – Bloco 2	Abrigo Módulo Inicial (B2)
Exaustor MI (B3)	Módulo Inicial – Bloco 3	Abrigo Módulo Inicial (B3)
Exaustor Auditório 1	Módulo Inicial – Auditórios 1	Abrigo Auditórios
Exaustor Auditório 2	Módulo Inicial – Auditórios 2	Abrigo Auditórios
Exaustor Cantina	Módulo Inicial – Cantina	Abrigo Cantina
Exaustor Corredor	Módulo Inicial – Corredor	Abrigo Módulo Inicial (Corredor)
Exaustor Conj. Lab. (A1)	Conjunto Laboratorial Edifício A1	Abrigo Conjunto Laboratorial (A1)
Exaustor Conj. Lab. (A2)	Conjunto Laboratorial Edifício A2	Abrigo Conjunto Laboratorial (A2)
Exaustor Conj. Lab. (A3)	Conjunto Laboratorial Edifício A3	Abrigo Conjunto Laboratorial (A3)
Exaustor I4	Edifício I4	Abrigo I4
Exaustor Guarda	Guarda Universitária	Abrigo I4
Exaustor Reserva 1	Reserva 1 (sala E-02 Edifício I1)	
Exaustor Reserva 2	Reserva 2 (sala E-02 Edifício I1)	

Os sistemas apresentam-se eficientes no seu propósito de promover a circulação do ar no tapete de brita evitando o acúmulo e confinamento de gases sob a laje dos edifícios.

Essa eficiência pode ser confirmada pela ausência de metano nos poços instalados no tapete de brita, imediatamente sob a laje (A: 0,30cm e *Vapor pin*), conforme se apresenta nos gráficos do monitoramento de poços. Além disso, observa-se que mesmos nos poços de monitoramento instalados na profundidade do solo (B: 1,0m) algumas concentrações diminuíram.


Verifica-se ainda a variação da pressão nos poços, o que pode indicar a movimentação do ar promovida pelo sistema, bem como a movimentação do nível d'água local.

Observa-se que os sistemas de extração instalados com a metodologia de furos na laje (ex. Módulo Inicial) tem atuação diferente daquele que manteve a ventilação via dutos enterrados, no Conjunto Laboratorial. Ambos os tipos de sistema são eficientes e capazes de eliminar as concentrações no tapete de brita logo abaixo da laje, porém os dados podem indicar que o primeiro é capaz de diminuir concentrações também em solo, logo após a camada de brita.


Em Fevereiro/16 iniciou-se o monitoramento sistemático nos exaustores de cada sistema de ventilação dos edifícios, realizando-se medições semanais de Metano e Pressão com o equipamento GEM 5000 e VOCs com o equipamento MX6, bem como leitura de pressão na célula de vácuo.

Neste Trimestre (Abr a Jun/17) todos os exaustores operaram com pressão de -2,0 mmHg (2,66 mBar). E não foram detectadas concentrações para VOC e para Metano.


Nos **gráficos** a seguir demonstra-se a variação da pressão na célula de vácuo em comparação com a entrada dos exaustores. No **Anexo VI** seguem as planilhas de monitoramento individual semanal em cada Exaustor.

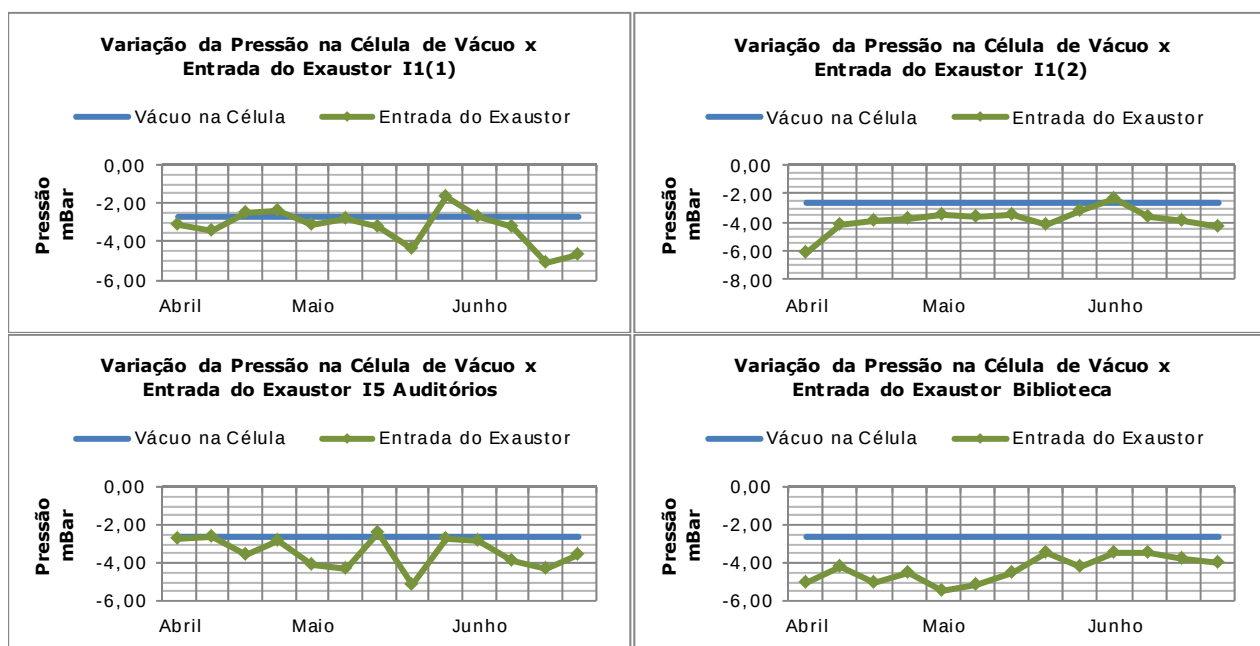

Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores I1(1), I1(2), 15 Auditórios e Biblioteca

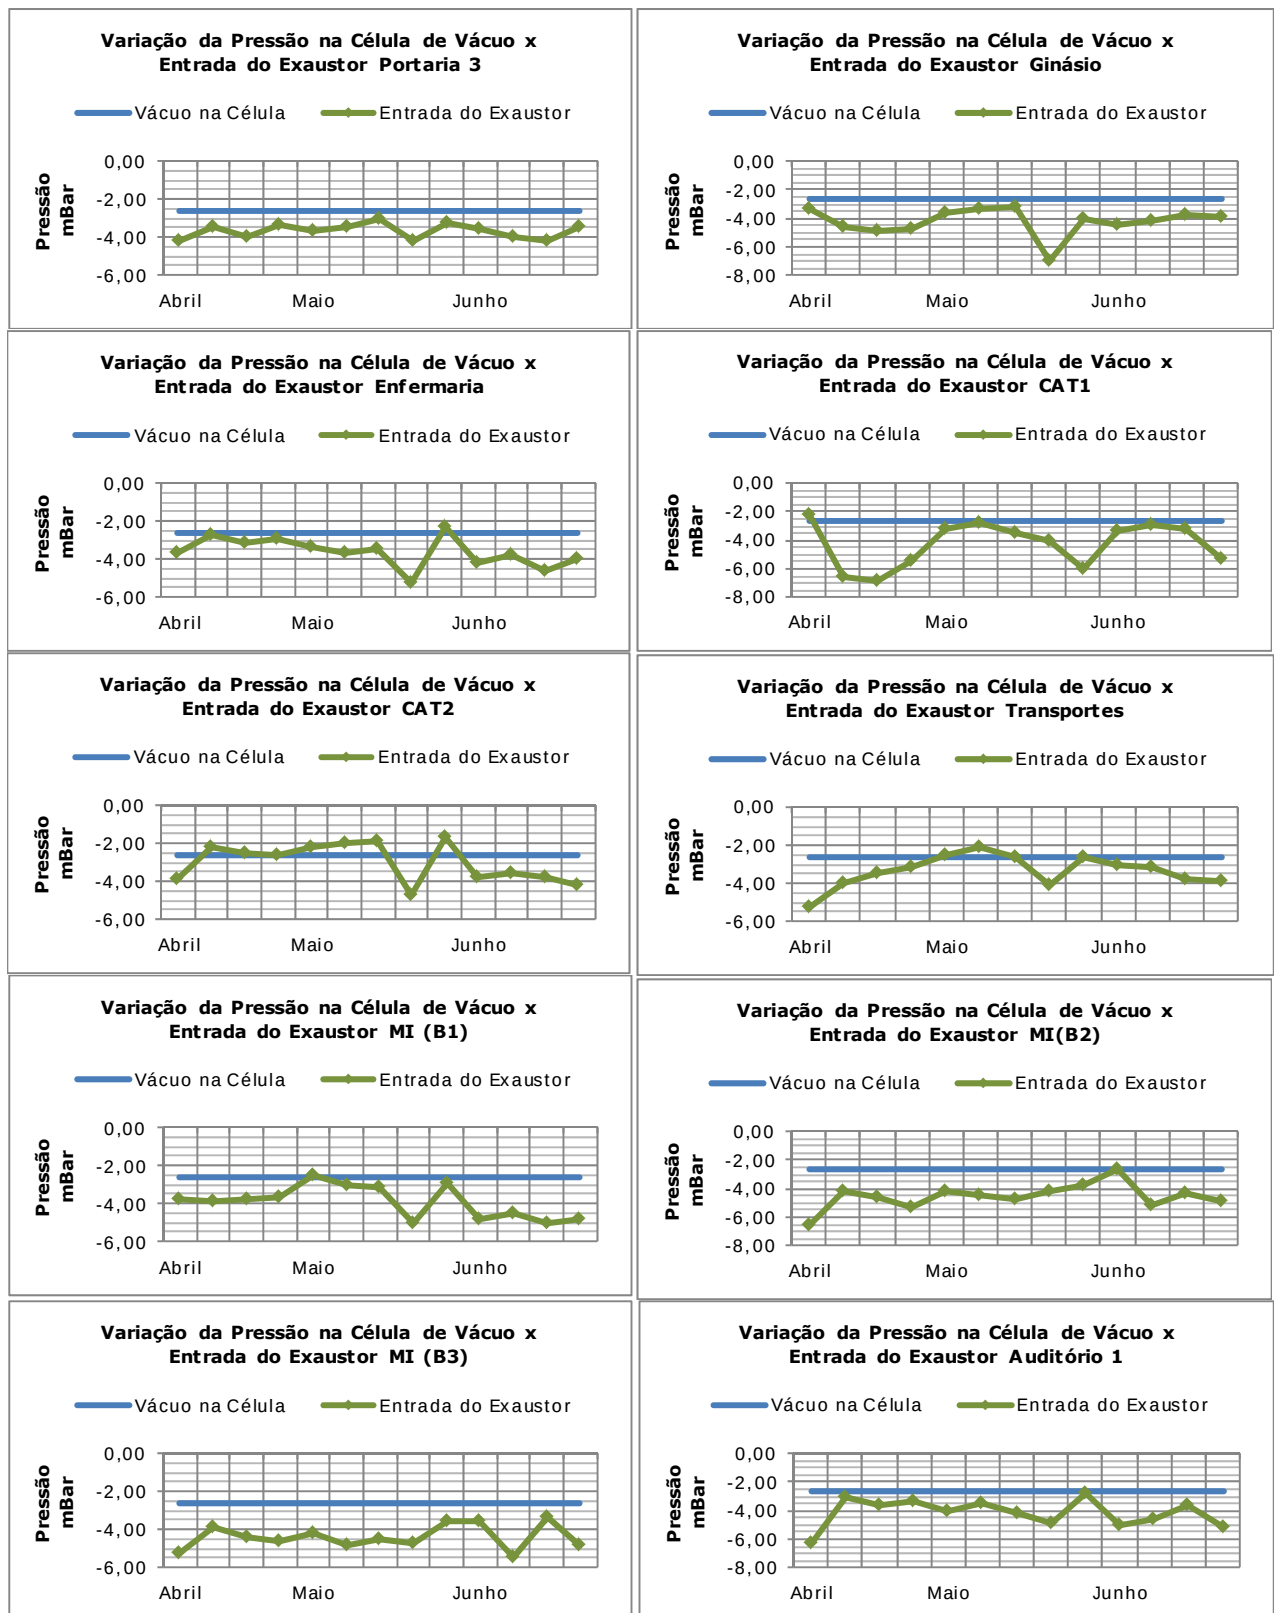

Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores Portaria 3, Ginásio, Enfermaria, CAT1, CAT2, Transportes, MI (B1), MI (B2), MI (B3) e Auditório 1

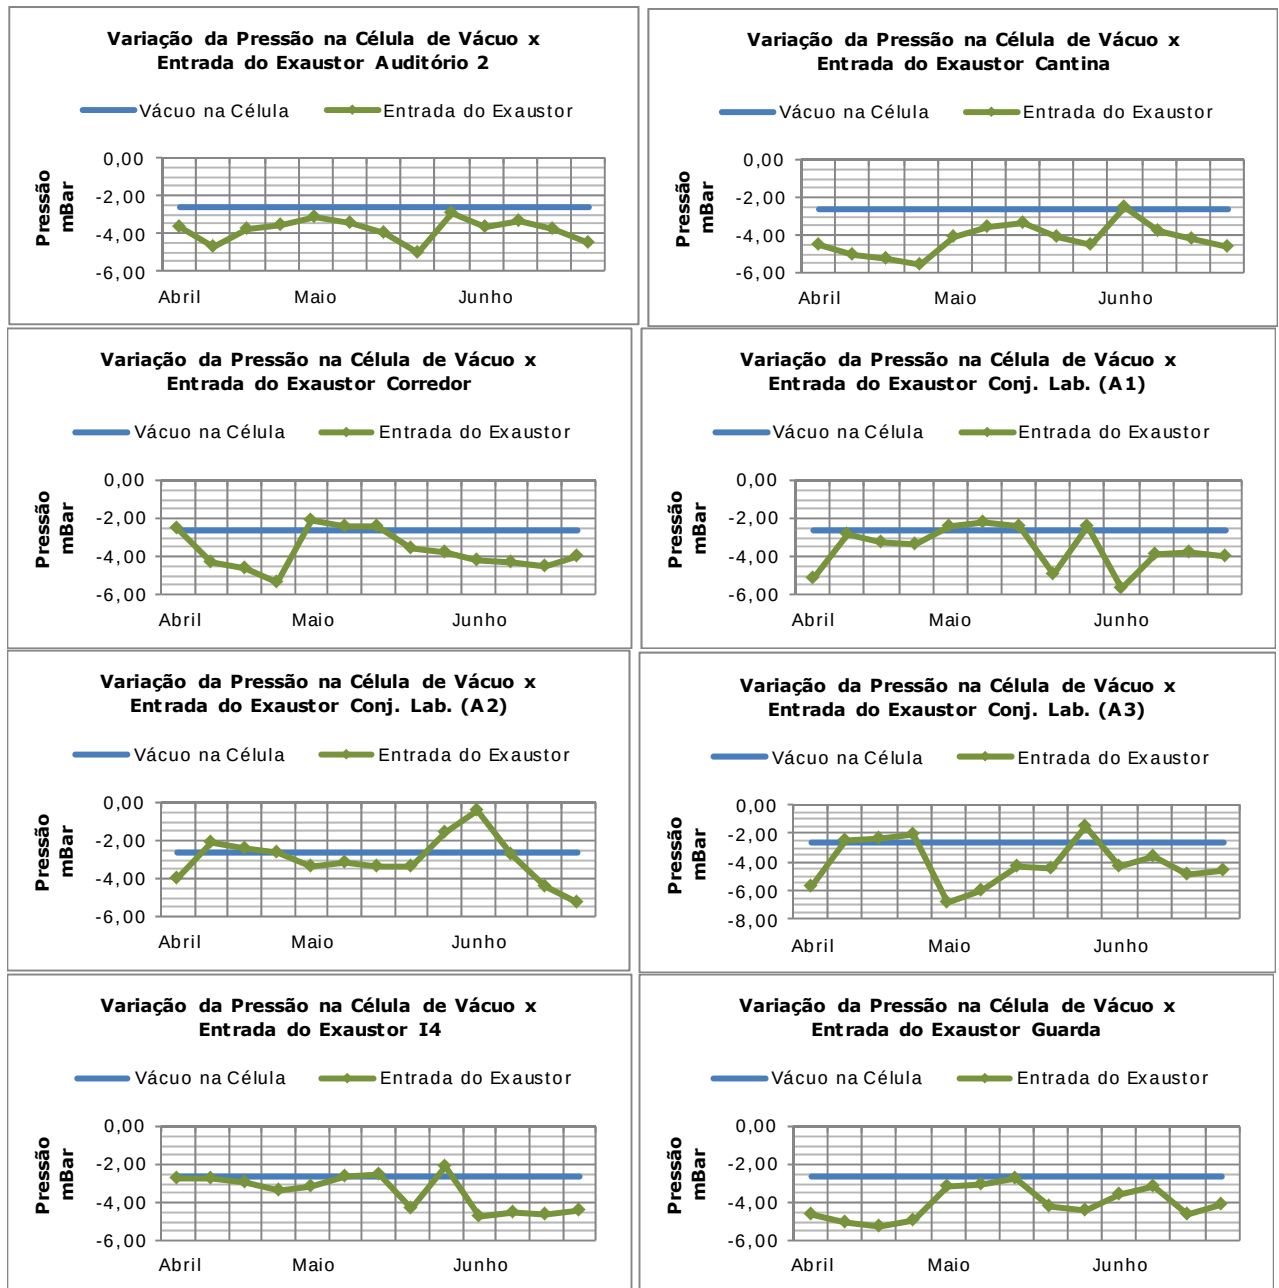

Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores Auditório 2, Cantina, Corredor, Conj. Lab. (A1), Conj. Lab. (A2), Conj. Lab. (A3), I4, Guarda

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Com relação à presença de gases e vapores na USP LESTE, os dados monitorados indicam principalmente a presença de metano, e baixas ou nulas concentrações dos outros parâmetros monitorados (H_2S , CO e VOC).

Observa-se que o metano gerado na área pela decomposição da matéria orgânica presente tanto nos sedimentos naturais da formação do quartenário, quanto no material disposto da dragagem do rio Tietê, não alcança a laje dos edifícios ou é arrastado pelo sistema de exaustão.

O nível d'água raso existente na área tende a dificultar essa migração vertical do gás, bem como as medidas já adotadas ao longo do tempo (construções com ventilação fixa, colchão de brita em subsuperfície, drenos geomecânicos) colaboram com a mitigação da possibilidade de intrusão de gás.

A instalação dos sistemas de exaustão nos tubos drenantes pré-existentes, bem como na nova solução proposta pelo IPT (furos na laje para captação de ar atmosférico e extração de gases) se mostrou efetiva em manter o tapete de brita ventilado, não permitindo a intrusão de gases em nenhum edifício no período monitorado (Abril/17 a Junho/2017).

Os **Anexos VII** e **VIII** apresentam em gráficos os dados do monitoramento no período de Abril/2014 a Junho/2017, relacionando a variação da concentração e pressão e a variação da pressão e presença de água e/ou restrição de fluxo, respectivamente.

A seguir descrevem-se as observações em cada edifício, no segundo trimestre de 2017 e a relação ao longo de Abril/14 a Junho/17.

➔ **EDIFÍCIO I-1:** dos 17 pares de poços de monitoramento distribuídos pelo edifício, somente dois pares apresentaram concentrações significativas de metano ($>1\%Vol$), um em cada extremo do prédio, durante o segundo trimestre/2017.

Tanto o PMG-11 quanto o PMG-114 apresentaram concentrações de metano, variando entre $1,2\%Vol$ e $37,2\%Vol$, somente na porção profunda (B $\sim 1,0m$). Não foram detectadas concentrações na porção rasa (A $\sim 0,30m$ sob laje) mesmo quando foram medidas pressões positivas de até 22,69 mBar.

Ao longo de três anos de monitoramento (Abr/14 a Jun/17) não foram detectadas concentrações de metano nos poços rasos próximos à laje do edifício. Percebe-se que com o início da operação do sistema de ventilação (Jul/14) houve diminuição imediata das concentrações de metano na porção profunda, porém mantiveram-se presentes e variando durante todo o monitoramento nos poços PMG-11B e PMG-114B. É possível notar que a diminuição das concentrações tende a ocorrer nos períodos de Julho a Novembro e que os picos de concentração ocorrem juntamente com momentos de restrição de fluxo.

➔ **EDIFÍCIO I-3:** dos 21 pares de poços de monitoramento distribuídos pelo edifício (7 nos auditórios e 14 na biblioteca), somente dois pares, localizados na biblioteca, apresentaram concentrações significativas de metano ($>1\%Vol$) durante o segundo trimestre/2017.

Tanto o PMG-31 como o PMG-39 apresentaram concentrações de metano, variando entre 1%Vol e 5,8%Vol, somente na porção profunda (B ~1,0m). Não foram detectadas concentrações na porção rasa (A ~0,30m sob laje). Houve variação da pressão nos poços existentes entre -3,32 e 3,28 mBar.

Ao longo de três anos de monitoramento (Abr/14 a Jun/17) não foram detectadas concentrações de metano nos poços rasos próximos à laje do edifício. Percebe-se que com o início da operação do sistema de ventilação (Jul/14) houve diminuição imediata das concentrações de metano na porção profunda, porém mantiveram-se presentes e variando durante todo o monitoramento nos poços PMG-31B e PMG-39B. É possível notar que ocorrem picos de concentração nos períodos entre Abril e Junho e que picos negativos de pressão estão correlacionados com a restrição de fluxo no poço.

→ EDIFÍCIO I-4: dos 12 pares de poços de monitoramento distribuídos pelo edifício, somente um par apresentou concentrações significativas de metano (>1%Vol), durante o segundo trimestre/2017.

O PMG-66 apresentou concentrações de metano, variando entre 10,7%Vol e 26,7%Vol somente na porção profunda (B ~1,0m). Não foram detectadas concentrações na porção rasa (A ~0,30 sob laje). Houve variação da pressão nos poços existentes entre -4,58 a 7,53 mBar.

Ao longo de três anos de monitoramento (Abr/14 a Jul/17) não foram detectadas concentrações de metano nos poços rasos próximos à laje do edifício. Na porção profunda percebe-se a persistência das concentrações nos PMG-64B e PMG-66B, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (Jun/14). É possível notar que há intervalos com maiores concentrações, normalmente entre Maio e Novembro.

→ CONJUNTO LABORATORIAL: dos 17 pares de poços de monitoramento distribuídos pelos edifícios (5 no A1, 5 no A2 e 7 no A3), doze pares apresentaram concentrações significativas de metano (>1%Vol), distribuídos nos prédios A1, A2 e A3, durante o segundo trimestre/2017.

Os PMG-46, PMG-48, PMG-49, PMG-50, PMG-51, PMG-53, PMG-54, PMG-55, PMG-59, PMG-60, PMG-61 e PMG-62, apresentam concentrações de metano, variando entre 1,1%Vol e 44,5%Vol, apenas na porção profunda (B ~1,0m). Não foram detectadas concentrações na porção rasa (A ~0,30 sob laje). Houve variação da pressão nos poços existentes entre -8,03 a 9,54 mBar.

Ao longo de três anos de monitoramento (Abr/14 a Jun/17) não foram detectadas concentrações de metano nos poços rasos próximos à laje do edifício, exceto o PMG-53A que em novembro/14 apresentou concentração dentro da faixa de inflamabilidade e posteriormente manteve concentrações nulas ou abaixo de 1%Vol. Na porção profunda percebe-se a persistência das concentrações, mesmo após o início da operação do sistema (Abr/14). É possível notar que as concentrações no Conjunto Laboratorial são bastante variadas. Os poços situados no Bloco A1 e A3 não apresentam tendências de concentração maior ou menor de acordo com o período do ano, porém verifica-se que o poço PMG-49 e PMG-62 vêm tendo aumento nas suas concentrações enquanto que o PMG-50 e PMG-61 vêm diminuindo. Nos poços situados no Bloco A2 nota-se que em geral as maiores concentrações se apresentam nos períodos entre Maio a Novembro. Os poços apresentam constantemente presença de água e restrição de fluxo, o PMG-53B apresenta poucos episódios de água, mas nota-se que a pressão torna-se negativa nesses momentos.

→ **BLOCO INICIAL:** dos 14 pares de poços de monitoramento distribuídos pelos edifícios (4 no B1, 3 no B2, 4 no B3, 3 no Auditório) dois pares apresentaram concentrações significativas de metano ($>1\%Vol$), distribuídas nos prédios B2 e Auditórios, durante o segundo trimestre/2017.

Os PMG-08 (Bloco B2) e PMG-06 (Auditórios) apresentaram concentrações variando entre $1,6\%Vol$ até $73,4\%Vol$, apenas na porção profunda (B $\sim 1,0m$). Não foram detectadas concentrações na porção rasa (A $\sim 0,30$ sob laje) mesmo quando foram medidas pressões positivas de até $34,78$ mBar.

Ao longo de três anos de monitoramento (Abr/14 a Jun/17) não foram detectadas concentrações de metano nos poços rasos próximos à laje do edifício, exceto o PMG-09A que em Abril a Jul/14 apresentou concentração próximo à faixa de inflamabilidade e posteriormente manteve concentrações nulas ou abaixo de $1\%Vol$. Na porção profunda percebe-se a persistência das concentrações, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (Abr/14). É possível notar que as concentrações no Bloco Inicial são bastante variadas. Os poços situados nos Bloco B1 e B2 apresentaram diminuição significativa das concentrações na porção profunda a partir de Junho/2015, mantendo em geral concentrações abaixo da faixa de inflamabilidade. No Anfiteatro o PMG-06B apresenta concentrações constantes acima da faixa de inflamabilidade e no Bloco B3 nenhum poço apresentou concentrações acima de $1\%Vol$. Os poços apresentam frequentemente presença de água e eventualmente restrição de fluxo.

→ **ENFERMARIA:** dos 7 pares de poços de monitoramento distribuídos pelo edifício apenas um par apresentou concentrações significativas de metano ($>1\%Vol$), durante o segundo trimestre/2017.

O PMG-74 apresentou concentrações de metano ao longo dos três meses de monitoramento, variando entre $1,6\%Vol$ até $13,2\%Vol$, apenas na porção profunda (B $\sim 1,0m$). Não houve grande variação da pressão nos poços existentes, apresentando valores entre $-1,54$ e $2,56$ mBar.

Ao longo de três anos de monitoramento (Abr/14 a Jun/17) não foram detectadas concentrações de metano nos poços rasos próximos à laje do edifício. Percebe-se que com o início da operação do sistema de ventilação (Jun/14) houve diminuição das concentrações de metano na porção profunda, porém mantiveram-se presentes e variando durante todo o monitoramento, e verifica-se aumento das concentrações no período de Janeiro a Maio de 2016. Os poços indicam eventualmente presença de água, geralmente nos períodos de chuva.

→ **CAT-1:** dos 7 pares de poços de monitoramento distribuídos pelo edifício, nenhum par apresentou concentrações significativas de metano ($>1\%Vol$), durante o segundo trimestre/2017.

Ao longo de três anos de monitoramento (Abr/14 a Jun/17) não foram detectadas concentrações de metano nos poços rasos próximos à laje do edifício, exceto o PMG-95A que entre Abril e Novembro de 2014 apresentou concentrações próximas da faixa de inflamabilidade e posteriormente manteve concentrações nulas ou abaixo de $1\%Vol$. Percebe-se que com o início da operação do sistema de ventilação (Jul/14) houve diminuição das concentrações de metano na porção profunda, mantendo-se abaixo da faixa de inflamabilidade. Apenas o PMG-95B apresenta restrição de fluxo constante, os demais não indicam presença de água ou restrição de fluxo.

→ **INCUBADORA (CAT 2):** dos 6 pares de poços de monitoramento distribuídos pelo edifício, nenhum par apresentou concentrações significativas de metano ($>1\%Vol$), durante todo o período de monitoramento (Abril/14 a Junho/17).

→ **GINÁSIO:** dos 11 pares de poços de monitoramento distribuídos pelo edifício, somente o PMG-110 apresentou concentrações significativas de metano ($>1\%Vol$), durante o primeiro trimestre/2017.

Ao longo de três anos de monitoramento (Abr/14 a Jun/17) não foram detectadas concentrações de metano nos poços rasos próximos à laje do edifício. Apenas o PMG-110 apresentou concentrações na porção profunda e percebe-se que com o início da operação do sistema de ventilação (Set/15) houve aumento imediato das concentrações, a partir de junho de 2016 diminuíram até estarem abaixo de $1\%Vol$ no atual semestre. Esse poço indica constante presença de água.

→ **GUARDA UNIVERSITÁRIA:** dos 3 pares de poços de monitoramento distribuídos pelo edifício, nenhum par apresentou concentrações significativas de metano ($>1\%Vol$), durante todo o período de monitoramento (Agosto/15 a Junho/17). Eventualmente detecta-se a presença de água, nos meses de chuva, e percebe-se a influência na pressão do poço.

→ **PORTARIA P3:** dos 2 trios de poços de monitoramento distribuídos pelo edifício, nenhum par apresentou concentrações significativas de metano ($>1\%Vol$), durante o segundo trimestre/2017.

Ao longo do monitoramento entre Agosto/2015 e Junho/2017 não se detectaram concentrações significativas ($>1\%$) nos poços rasos (próximos às duas lajes 0,30 m e 0,50 m). Percebe-se que nos meses seguintes à instalação dos poços de monitoramento (Agosto e Setembro/15) foram detectadas concentrações nos poços profundos, posteriormente as concentrações mantiveram-se nulas ou abaixo de $1\%Vol$, permanecendo assim até o segundo trimestre de 2017. Os poços profundos (1,30 m) apresentaram constantemente água.

→ **TRANSPORTES:** dos 4 pares de poços de monitoramento distribuídos pelo edifício, apenas um par apresentou concentrações significativas de metano ($>1\%Vol$), durante o segundo trimestre/2017.

O PMG-122 apresentou concentrações de metano de até $1,1\%Vol$, apenas na porção profunda (B ~1,0m). Não foram detectadas concentrações na porção rasa (A ~0,30 sob laje).

Ao longo do monitoramento entre Agosto/2015 e Junho/2017 não se detectaram concentrações significativas ($>1\%$) nos poços rasos (próximos à laje). Percebe-se que o PMG-112B apresenta concentração próxima a $1,0\%Vol$ no mês de Abril/2016 e final do mês de Mar/2017. Os poços profundos apresentaram água frequentemente.

6 SOBRE CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS

No dia 28 de junho de 2017 foi realizado Treinamento para Operação e Monitoramento dos Sistemas de Ventilação Instalados na USP LESTE com duração de 2 horas para capacitação de funcionários do *Campus*.

O treinamento foi constituído de uma etapa Teórica, aplicada pela Engenheira Ambiental Paula Ramos, e outra etapa Prática, aplicada pelo Analista Ambiental Renan Feres. Na sequência apresenta-se a pauta:

Etapa teórica (30 min):

- Existência de Gases na área e importância da necessidade da operação do Sistema;
- Apresentação de Plantas com distribuição de Pontos e Poços de Medição e localização dos exaustores;
- Apresentação do Plano de Contingência;
- Apresentação do Manual de Operação/Manutenção dos sistemas e equipamentos;
- Apresentação de fichas de campo.

Etapa Prática (1h30):

- Visita a um abrigo e demonstração detalhada da operação do exaustor e prática;
- Operação dos equipamentos de medição (GEM 5000 e MX6);
- Realização de demonstração e prática de medição em poços de monitoramento e pontos de infraestrutura;
- Demonstração de manobras no sistema (conforme plano de contingência).

Segue no **Anexo IX** a lista de presença dos participantes. Reforça-se que mesmo com a realização do treinamento, se faz importante o uso do manual de operação dos sistemas, bem como dos equipamentos.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

O objetivo da operação dos sistemas de extração é impedir o acúmulo de gases sob a laje dos edifícios, aliado ao monitoramento preventivo de intrusão nos ambientes com pouca circulação de ar, através da execução de leituras de gases em todos os poços de monitoramento e pontos da infraestrutura.

Ao longo do segundo trimestre de 2017 foram detectadas concentrações, acima de 1,0%vol de Metano, apenas na porção profunda em 22 dos 121 conjuntos de poços de gases monitorados. Na porção rasa (subslab/sob a laje) não foram detectadas concentrações significativas de metano (>1%Vol).

Quanto às medições em poços de monitoramento para H₂S e CO foram obtidas baixas concentrações de até 2,0 ppm para ambos compostos. Houve presença de VOC baixa de até 0,8 ppm.

Além disso, as medições realizadas neste trimestre, na infraestrutura (ralos e caixas de passagem) em todas as edificações, bem como em ambientes com pouca circulação de ar, detectaram-se concentrações nulas de VOC e de inflamabilidade (LEL/Metano), exceto na caixa de passagem nº 55 situada na enfermaria que no dia 02/05/2017 teve a leitura realizada logo após a utilização de produtos de limpeza na pia, nesse momento foi detectado 1,1 ppm de VOC e 7% LEL.

Os sistemas de ventilação operaram por 24 horas diariamente durante todo o período do trimestre. Foi possível observar que vêm sendo eficientes, de forma a não permitir que os gases existentes no solo se acumulem no tapete de brita (poços a 0,3m) ou diretamente sob a laje (*vapor pin*), bem como diminuindo eventualmente até mesmo as concentrações no solo imediatamente abaixo do tapete de brita (poços a 1,0m), por influência da ventilação.

O nível d'água raso existente na área tende a dificultar a migração vertical do gás, bem como as medidas já adotadas ao longo do tempo (construções com ventilação fixa, colchão de brita em subsuperfície, drenos geomecânicos) colaboram com a mitigação da possibilidade de intrusão de gás.

Dessa forma, com base nos resultados avaliados ao longo do segundo trimestre/2017 e observando-se o monitoramento ao longo de três anos (Abr/14 a Jun/17) verifica-se que não está havendo a intrusão de gases nos ambientes fechados, já que as concentrações de metano existentes no solo (1,0m), mesmo com a presença de pressão positiva, não alcançam o tapete de brita (Sob a Laje/Subslab) ou, quando alcançam são arrastadas pelo sistema de ventilação, e, principalmente por que não há concentração em nenhum dos pontos da infraestrutura.

No relatório do primeiro trimestre/2017 foram apresentadas considerações e recomendações sobre o parecer técnico nº100/16/CAAA emitido pela CETESB em Set/2016. Entre elas destaca-se que foi apresentado um plano de substituição de poços com restrição de fluxo e/ou presença de água considerando avaliação de distribuição e períodos de chuva, esse plano será programado pela SEF para implementação.

8 EQUIPE TÉCNICA

Carlos Frederico Egli
Eng. Civil
CREA 600493705

Alessandro Perencin
Advogado
OAB 170030

Paula Ramos
Engenheira Ambiental
CRQ 04263483 / CREA 5083314530

Ariane Mantovani
Engenheira Ambiental
CREA 5063299002

Luciana Barbieri Trevisan
Engenheira Ambiental
CREA 5063657086

Maria Gabriela Silva
Engenheira Ambiental
CREA 5063852735

Luiz Carlos Storino Filho
Engenheiro Químico
CREA 5061531080/D

Tasso Slongo Trindade
Geólogo
CREA 1400005160

Renan Albuquerque Feres
Analista Ambiental

São Paulo, 20 de Julho de 2017. – *Versão 01.*

Carlos Egli
Engenheiro Civil
CREA 600493705
WEBER Consultoria Ambiental LTDA

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CETESB-GTZ. *Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas*. 2.ed; São Paulo: CETESB, 2001.

CETESB. *Manual de Produtos Químicos. Constituído de um Guia Técnico e 879 Fichas de Informação de Produto Químico*. 2003.

CETESB. *Decisão de Diretoria CETESB nº 103/2007 de Junho de 2007*.

CETESB. *Decisão de Diretoria CETESB nº 038/2017 de Fevereiro de 2017*.

IPT. *Relatório Técnico 92353-205 - Avaliação e sugestões de aperfeiçoamento para alguns dos sistemas de ventilação de gás e vapor do subsolo de edifícios do campus da USP Leste - resultados preliminares*. São Paulo: IPT, 02 de abril de 2007.

SERVMAR. *Relatório de Investigação Detalhada, Avaliação de Risco à Saúde Humana e Plano de Intervenção na AI-01 e Investigação Detalhada de Gases – MA/12936/14/BLS*. São Paulo: SERVMAR, 01 de Fevereiro de 2014.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Instalação do Sistema de Exaustão de Gases do Solo sob os Edifícios – Ago/14. Projeto 311.1205.14 – USP LESTE*. São Paulo, Agosto/2014.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento da Intrusão de Vapores – Setembro a Dezembro/14. Projeto: 311.1206.14 – USP LESTE*. São Paulo, Janeiro/2015.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento da Intrusão de Vapores – 4º Trimestre/2015. Projeto: 311.1206.14/E7VMGS – USP LESTE*. São Paulo, Janeiro/2016.

WEBER AMBIENTAL. *Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento da Intrusão de Vapores – 4º Trimestre/2016. Projeto: 311.1206.14/E11VMGS – USP LESTE*. São Paulo, Janeiro/2017.

ANEXOS

ANEXO I – CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Certificado de Calibração nº.: RBC.0334.17.rev.00

Controle Interno: 3265

Dados do Cliente:

Nome: Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda
Endereço: Avenida Vereador José Diniz, nº 3725 - São Paulo/SP

Local da realização do serviço de calibração:

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil

Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Detector Portátil de Gás, Landtec, GEM 5000
Nº. Série: G500491
Nº. Patrimônio: 086018480
Ident. Adicional: Não Consta

Data da Calibração: 17/04/2017**Método Utilizado:** Cal. Interna - Procedimento 12.04.01.32-11

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 21,8 °C ± 0,2 °C Umidade relativa: 70 %UR ± 2 %UR

Dado(s) do(s) Instrumento(s) Utilizado(s):

Termohigrômetro digital de identificação TMHG-04 calibrado sob o número de certificado LV26624-16-R1 pela empresa Visomes (RBC).

Materiais de Referência:

Material de referência	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Multigás (G)	QCSPC016693	NATA	04/10/2018
Dióxido de Carbono II	QCSPC013191	NATA	07/11/2017

Legendas:

%LEL: Lower Explosive Limit (Limite Inferior de Explosividade);
ppm: Partes Por Milhão;

U₉₅: Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;

K: Fator de abrangência;
V_{eff}: Grau de liberdade efetivo.

Certificado de Calibração nº.: RBC.0334.17.rev.00

Controle Interno: 3265

Resultados da Calibração:

Sensor	Gás de Ref. Aplicado	Medição Antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	U ₉₅	k	Veff
CH ₄ (Metano)	50 %LEL	48 %LEL	46 %LEL	-4 %LEL	4 %LEL	2,03	94
O ₂ (Oxigênio)	18,0 %mol/mol	18,1 %mol/mol	19,4 %mol/mol	1,4 %mol/mol	1,3 %mol/mol	2,08	33
H ₂ S (Sulfeto de Hidrogênio)	25 ppm	33 ppm	31 ppm	6 ppm	2 ppm	2,25	11
CO (Monóxido de Carbono)	101 ppm	106 ppm	104 ppm	3 ppm	8 ppm	2,00	Infinito
CO ₂ (Dióx. Carbono II)	4047 ppm	4000 ppm	4000 ppm	-47 ppm	287 ppm	2,15	18

Notas:

- 1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
- 2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
- 3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
- 4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis e a marca cancelada;
- 5 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para k = 2, se tem uma distribuição normal e para k > 2, se tem uma distribuição t com v_{eff} graus de liberdade efetivos, que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02;
- 6 - Manutenções e Ajuste não fazem parte do escopo de acreditação;
- 7 - Unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol;
- 8 - Conversões de unidades: 1 %vol = 10.000 ppm / 1 %vol de CH₄ = 20 %LEL.


Observações:

Nenhuma.

Data da Emissão: 18/04/2017



 Técnico Executante
 Pietro Dragonetti



 Signatária Autorizada
 Valéria Moraes

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

EXECUTADO POR: CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENG & COM LTDA.

Data de Calibração: 17 abril 2017

Número do Certificado: 0027/17

Página 1 de 1

Aprovado por Assinatura



CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENG & COM LTDA.
RUA BARTOLOMEU BUENO DA SILVA 457/477
VALINHOS, SP 13279-392

www.clean.com.br

Pietro Dragonetti

Técnico Responsável

Cliente: Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda

Avenida Vereador José Diniz, nº 3725
São Paulo/SP

Descrição: Analisador de Gás

Modelo: GEM5000

Número de Série: G500491

Metano (CH ₄)	
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)
5.1	5.2
15.0	15.1
50.1	49.9

Dióxido de Carbono (CO ₂)	
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)
5.1	5.1
15.0	15.0
49.9	50.3

Oxigênio (O ₂)	
Gás Certificado (%)	Leitura do Instrumento (%)
20.9	20.9

Barômetro (mbar)	
Referência	Leitura do Instrumento
938 mbar	940 mbar

Células de Gás Adicionais		
Gás	Gás Certificado (ppm)	Leitura do Instrumento (ppm)
H ₂ S	198	198
CO	512	506

Todas as concentrações são molar

Leituras de CH₄, CO₂ registradas a:

33.6 °C

Leitura de O₂ registrada a:

24.2 °C

Pressão Barométrica:

938 mbar

Método do Teste: O analisador é calibrado em uma câmara, com temperatura controlada, que utiliza gases de referência.

Fim do Certificado

Certificado de Calibração nº.: RBC.0429.17.rev.00

Controle Interno: 2895

Dados do Cliente:

Nome: Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda
Endereço: Avenida Vereador José Diniz, nº 3725 - São Paulo/SP

Local da realização do serviço de calibração:

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil

Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Detector Portátil de Gás, Industrial Scientific, iBrid MX6
Nº. Série: 15010T3-001
Nº. Patrimônio: 086.018479
Ident. Adicional: Infra

Data da Calibração: 15/05/2017**Método Utilizado:** Cal. Interna - Procedimento 12.04.01.32-11

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 22,0 °C ± 0,2 °C Umidade relativa: 74 %UR ± 2 %UR**Dado(s) do(s) Instrumento(s) Utilizado(s):**

Termohigrômetro digital de identificação TMHG-04 calibrado sob o número de certificado LV26624-16-R1 pela empresa Visomes (RBC).

Materiais de Referência:

Material de referência	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Multigás (G)	QCSPC016693	NATA	04/10/2018
Isobutileno I	QCSPC013286	NATA	07/11/2017
Isobutileno II	QCSPC013285	NATA	07/11/2017

Legendas:**%LEL:** Lower Explosive Limit (Limite Inferior de Explosividade);**ppm:** Partes Por Milhão;**U₉₅:** Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;**K:** Fator de abrangência;**Veff:** Grau de liberdade efetivo.

Certificado de Calibração nº.: RBC.0429.17.rev.00
 Controle Interno: 2895

Resultados da Calibração:

Sensor	Gás de Ref. Aplicado	Medição Antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	U ₉₅	k	Veff
CH4 (Metano)	50 %LEL	XXXX %LEL	49 %LEL	-1 %LEL	4 %LEL	2,03	94
O2 (Oxigênio)	XXXX %mol/mol	XXXX %mol/mol	XXXX %mol/mol	XXXX %mol/mol	XXXX %mol/mol	XXXX	XXXX
H2S (Sulfeto de Hidrogênio)	XXXX ppm	XXXX ppm	XXXX ppm	XXXX ppm	XXXX ppm	XXXX	XXXX
CO (Monóxido de Carbono)	XXXX ppm	XXXX ppm	XXXX ppm	XXXX ppm	XXXX ppm	XXXX	XXXX
C4H8 (Isobutileno I)	98,2 ppm	86,2 ppm	98,9 ppm	0,7 ppm	7,0 ppm	2,04	69
C4H8 (Isobutileno II)	455,0 ppm	376,2 ppm	413,7 ppm	-41,3 ppm	33,0 ppm	2,04	72

Notas:

- 1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros; mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
- 2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
- 3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
- 4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis e a marca cancelada;
- 5 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para k = 2, se tem uma distribuição normal e para k > 2, se tem uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02;
- 6 - Manutenções e Ajuste não fazem parte do escopo de acreditação;
- 7 - Unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol;
- 8 - Conversões de unidades: 1 %vol = 10.000 ppm / 1 %vol de CH4 = 20 %LEL.

Observações:

Nenhuma.

Data da Emissão: 16/05/2017

Gabriel F. F. Trombetta

Técnico Executante
Gabriel Trombetta

Valéria Morais

Signatária Autorizada
Valéria Morais

Certificado de Calibração nº.: RBC.0328.17.rev.00

Controle Interno: 3260

Dados do Cliente:

Nome: Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda
Endereço: Avenida Vereador José Diniz, nº 3725 - São Paulo/SP

Local da realização do serviço de calibração:

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil

Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Detector Portátil de Gás, Industrial Scientific, iBrid MX6
Nº. Série: 130203S-001
Nº. Patrimônio: 086-018478
Ident. Adicional: Não Consta

Data da Calibração: 13/04/2017**Método Utilizado:** Cal. Interna - Procedimento 12.04.01.32-11

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 22,2 °C ± 0,2 °C Umidade relativa: 70 %UR ± 2 %UR

Dado(s) do(s) Instrumento(s) Utilizado(s):

Termohigrômetro digital de identificação TMHG-04 calibrado sob o número de certificado LV26624-16-R1 pela empresa Visomes (RBC).

Materiais de Referência:

Material de referência	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Multigás (G)	QCSPC016693	NATA	04/10/2018
Isobutileno I	QCSPC013286	NATA	07/11/2017
Isobutileno II	QCSPC013285	NATA	07/11/2017

Legendas:

%LEL: Lower Explosive Limit (Limite Inferior de Explosividade);

ppm: Partes Por Milhão;

U_{95} : Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;

K: Fator de abrangência;

V_{eff} : Grau de liberdade efetivo.

Certificado de Calibração nº.: RBC.0328.17.rev.00

Controle Interno: 3260

Resultados da Calibração:

Sensor	Gás de Ref. Aplicado	Medição Antes do Ajuste	Média das Medições	Erro de Medição	U ₉₅	k	Veff
CH4 (Metano)	50 %LEL	47 %LEL	46 %LEL	-4 %LEL	4 %LEL	2,23	12
O2 (Oxigênio)	XXXX %mol/mol	XXXX %mol/mol	XXXX %mol/mol	XXXX %mol/mol	XXXX %mol/mol	XXXX	XXXX
H2S (Sulfeto de Hidrogênio)	XXXX ppm	XXXX ppm	XXXX ppm	XXXX ppm	XXXX ppm	XXXX	XXXX
CO (Monóxido de Carbono)	XXXX ppm	XXXX ppm	XXXX ppm	XXXX ppm	XXXX ppm	XXXX	XXXX
C4H8 (Isobutileno I)	98,2 ppm	87,4 ppm	102,1 ppm	3,9 ppm	7,0 ppm	2,04	61
C4H8 (Isobutileno II)	455,0 ppm	395,9 ppm	433,5 ppm	-21,5 ppm	33,0 ppm	2,03	73

Notas:

- 1 - O serviço de calibração realizado nesse equipamento não se estende a outros, mesmo que de mesma marca, lote ou modelo;
- 2 - Este certificado de calibração poderá ser reproduzido somente por inteiro, sem nenhuma alteração;
- 3 - Esta calibração não desobriga o usuário a testar o equipamento antes de cada utilização, de acordo com a exigência da NR-33;
- 4 - Este certificado só é válido com as assinaturas dos responsáveis e a marca cancelada;
- 5 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para k = 2, se tem uma distribuição normal e para k > 2, se tem uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, que corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02;
- 6 - Manutenções e Ajuste não fazem parte do escopo de acreditação;
- 7 - Unidade %mol/mol equivalente a unidade %vol;
- 8 - Conversões de unidades: 1 %vol = 10.000 ppm / 1 %vol de CH4 = 20 %LEL.


Observações:

Nenhuma.

Data da Emissão: 13/04/2017

Gabriel F. F. Trombetta

 Técnico Executante
 Gabriel Trombetta



 Signatária Autorizada
 Valéria Moraes

Certificado de Calibração nº.: RBC.0910.16.rev.00

Controle Interno: 2376

Dados do Cliente:

Nome: Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda
Endereço: Avenida Vereador José Diniz, nº 3725 - São Paulo/SP

Local da realização do serviço de calibração:

Laboratório de calibração da Clean Environment Brasil

Dados do Instrumento Calibrado:

Identificação: Detector Portátil de Gás, Industrial Scientific, iBrid MX6
Nº. Série: 12101TR-009
Nº. Patrimônio: 192
Ident. Adicional: Não Consta

Data da Calibração: 11/11/2016**Método Utilizado:** Cal. Interna - Procedimento 12.04.01.32-09

Método comparativo. Aplicado diferentes misturas gasosas com padrões compatíveis com a escala de medição do monitor e calculado a incerteza de medição em função das indicações do mesmo.

Condições Ambientais: Temperatura: 21,1 °C ± 0,2 °C Umidade relativa: 61 %UR ± 1 %UR

Dado(s) do(s) Instrumento(s) Utilizado(s):

Termohigrômetro digital de identificação TMHG-04 calibrado sob o número de certificado LV26624-16-R1 pela empresa Visomes (RBC).

Materiais de Referência:

Material de referência	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Multigás (G)	QCSPC016693	NATA	04/10/2018
Isobutileno I	QCSPC013286	NATA	07/11/2017
Isobutileno II	QCSPC013285	NATA	07/11/2017

Legendas:

%LEL: Lower Explosive Limit (Limite Inferior de Explosividade);

ppm: Partes Por Milhão;

U₉₅: Incerteza de medição para um nível de confiança de 95,45%. Parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a um mensurando;

K: Fator de abrangência;

Veff: Grau de liberdade efetivo.

ANEXO II – PLANO DE AÇÃO

Local	Ação Preventiva (Controle)	Responsável	Situação	Ação de Resposta (Emergência)	Responsável
Todos os Edifícios/Blocos Existentes (aplicável aos futuros)	- Avaliar funcionamento do Sistema de Exaustão de Gases.	Técnico de Campo e Engenheiro Ambiental	Sistema Inoperante	Comunicar situação de emergência; Verificar alimentação de energia, drenos e outras possíveis falhas; Solucionar falhas e retomar operação; Efetuar a medição nos poços de monitoramento influenciados diariamente até o reinício da operação; Caso sejam detectadas concentrações nos poços de monitoramento e nos pontos de infra estrutura, aplicar ações específicas, descritas neste plano de contingência conforme o resultado obtido.	Tec. Campo->Eng.Amb. Tec. Manutenção Tec. Manutenção Tec. Campo Eng.Ambiental
	- Monitoramento da concentração de Metano em Poços de Gases (PMG) (Equipamento GEM5000 ou Similar); - Avaliar os resultados das Medições Semanais.	Técnico de Campo e Engenheiro Ambiental	Ponto de Alerta Concentração de Metano (CH ₄): Acima de 5%vol Poço Profundo PMG-B - 1,00m (Solo abaixo do tapete de brita)	Acompanhar monitoramento da profundidade A (Rasa) para verificar se há movimentação do gás para o tapete do brita.	Tec. Campo
			Ponto Crítico Concentração de Metano (CH ₄): Entre 5% e 15%vol Poço Raso PMG-A - 0,30m (Sob a laje, no tapete de brita)	Comunicar situação de emergência; Ajustar válvulas do sistema de exaustão a fim de direcionar o fluxo da ventilação para o ponto detectado; Ventilar o ambiente; Efetuar medições após o ajuste da ventilação;	Tec. Campo->Eng.Amb. Tec. Campo Tec. Manutenção Tec. Campo
				. Caso as medições permeneçam nulas ou inferiores a 5% considera-se a situação sob controle; . Caso as medições permaneçam entre 5% e 15%vol:	
				- Efetuar a medição nos pontos de infra estrutura diariamente até que a concentração no Ponto Crítico diminua; - Caso sejam detectadas concentrações nos pontos de infra estrutura, aplicar ações específicas, descritas neste plano de contingência conforme o resultado obtido.	Tec. Campo Eng.Ambiental
				Comunicar situação de emergência; Ajustar válvulas do sistema de exaustão a fim de direcionar o fluxo da ventilação para o ponto detectado; Ventilar o ambiente; Efetuar medições após o ajuste da ventilação;	Tec. Campo->Eng.Amb. Tec. Campo Tec. Manutenção Tec. Campo/Eng.Amb
				. Caso as medições permeneçam nulas ou inferiores a 5% considera-se a situação sob controle; . Caso as medições permaneçam acima de 15%vol:	
				- Efetuar a medição nos pontos de infra estrutura duas vezes ao dia até que a concentração no Ponto Extremamente Crítico diminua; - Caso sejam detectadas concentrações nos pontos de infra estrutura, aplicar ações específicas, descritas neste plano de contingência conforme o resultado obtido.	Tec. Campo Eng.Ambiental
			Poços com concentração persistente de metano ainda que abaixo de 5%vol	Acompanhar monitoramento da profundidade A (Rasa) para verificar se há movimentação do gás para o tapete do brita. Acompanhar o monitoramento dos pontos de Infra-estrutura para verificar a intrusão de gases	Tec. Campo
	-> Monitoramento da inflamabilidade em caixas de passagem, ralos, grelhas, ambientes pouco ventilados, redes subterrâneas. (Equipamento MX6 ou Similar); -> Vistoriar semanalmente ambientes para identificar fissuras e outros possível pontos de entrada de gases; -> Avaliar os resultados das Medições Semanais.	Técnico de Campo e Engenheiro Ambiental	Medição de Inflamabilidade: Acima de 20% LII (1% vol CH ₄) nos pontos de infra em AMBIENTES INTERNOS	Comunicar situação de emergência; Remover as pessoas da sala/edifício; Eliminação de fontes de ignição e desligamento da energia elétrica; Ventilar o ambiente; Identificar os pontos de entradas de gás e selar; Verificar o funcionamento dos sistemas de ventilação sob a laje; Efetuar outras três medições em intervalos de 1 hora após a ventilação e selamento de fissura;	Tec. Campo->Eng.Amb. Comissão Tec. Manutenção Tec. Manutenção Tec. Manutenção Tec. Campo/Eng.Amb Tec. Campo/Eng.Amb
				. Caso as medições permeneçam nulas considera-se a situação sob controle; . Caso as medições permaneçam superiores as 20%LII, evacuar o bloco atingido e acionar os órgãos:	
				- CIPA EACH - Bombeiros - 193 - Subprefeitura / Defesa Civil - 199 - CETESB Emergências: 3133-4000 ou 0800 11 3560	Membro Diretoria
				Comunicar situação de emergência; Aumentar frequência do compressor a fim de aumentar o vácuo e o fluxo e por consequência a diluição; Efetuar medições após o ajuste da ventilação;	Tec. Campo->Eng.Amb. Tec. Campo Tec. Campo
				. Caso as medições permeneçam nulas considera-se a situação sob controle; . Caso as medições permaneçam superiores as 20%LII, evacuar o bloco atingido e acionar os órgãos:	
				- CIPA EACH - Bombeiros - 193 - Subprefeitura / Defesa Civil - 199 - CETESB Emergências: 3133-4000 ou 0800 11 3560	Membro Diretoria

**ANEXO III – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM PMG COM GEM
5000 (ABR A JUN / 17)**

DATA		Semana 1: 03/04 a 07/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1	Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	6,2%	14,5%	0,0	0,0	79,3%	0,01
		PMG-16 B	0,0%	0,0%	9,7%	11,6%	0,0	0,0	78,7%	0,15
		PMG-17 A	0,0%	0,0%	3,6%	17,5%	0,0	0,0	78,9%	0,05
		PMG-17 B	0,0%	0,0%	5,8%	15,5%	0,0	0,0	78,7%	-0,21
		PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,3%	0,0	0,0	79,2%	0,03
		PMG-18 B	0,0%	0,0%	5,1%	14,9%	0,0	0,0	80,0%	0,01
		PMG-20 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,0%	0,0	0,0	79,2%	0,03
		PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,8%	18,5%	0,0	0,0	79,7%	0,08
		PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	0,01
		PMG-22 B	0,0%	0,0%	2,1%	18,2%	0,0	0,0	79,7%	0,09
		PMG-23 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	0,0	0,0	79,4%	0,02
		PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,4%	0,0	0,0	79,2%	0,09
		PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	0,0	0,0	79,3%	0,15
		PMG-113 B	0,0%	0,0%	2,0%	18,2%	0,0	0,0	79,8%	-0,11
		PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	0,06
		PMG-114 B	35,4%	35,4%	4,8%	7,0%	0,0	0,0	52,8%	22,69 E
		PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,0%	0,0	0,0	79,3%	-0,04
		PMG-115 B	0,0%	0,0%	3,6%	16,9%	0,0	0,0	79,5%	0,12
Edifício I-1	Parte 2	PMG-11 A	0,0%	0,0%	1,9%	18,8%	0,0	0,0	79,3%	0,08
		PMG-11 B	23,9%	24,5%	14,5%	2,4%	0,0	0,0	59,2%	0,15
		PMG-12 A	0,0%	0,0%	3,5%	17,1%	0,0	0,0	79,4%	0,06
		PMG-12 B	0,0%	0,0%	5,0%	15,5%	0,0	0,0	79,5%	0,08
		PMG-13 A	0,0%	0,0%	5,8%	15,1%	0,0	0,0	79,1%	0,01
		PMG-13 B	0,0%	0,0%	6,7%	14,0%	0,0	0,0	79,3%	0,10
		PMG-14 A	0,0%	0,0%	4,0%	16,0%	0,0	0,0	80,0%	0,03
		PMG-14 B	0,0%	0,0%	9,2%	10,6%	0,0	0,0	80,2%	0,13
		PMG-15 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,8%	0,0	0,0	78,8%	0,04
		PMG-15 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,8%	0,0	0,0	79,0%	0,25
		PMG-19 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,1%	0,0	0,0	78,7%	0,05
		PMG-19 B	0,0%	0,0%	1,6%	19,1%	0,0	0,0	79,3%	0,10
		PMG-21 A	0,0%	0,0%	2,0%	19,2%	0,0	0,0	78,8%	0,05
		PMG-21 B	0,0%	0,0%	5,0%	15,8%	0,0	0,0	79,2%	0,03
I-3 Auditórios		PMG-24 A	0,0%	0,0%	1,7%	18,5%	0,0	0,0	79,8%	0,01
		PMG-24 B	0,0%	0,0%	2,7%	17,7%	0,0	0,0	79,6%	-0,03
		PMG-25 A	0,0%	0,0%	1,0%	18,8%	0,0	0,0	79,2%	0,05
		PMG-25 B	0,0%	0,0%	1,9%	18,3%	0,0	0,0	79,8%	0,02
		PMG-26 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,1%	0,0	0,0	78,9%	0,01
		PMG-26 B	0,0%	0,0%	4,9%	15,0%	0,0	0,0	80,1%	-0,05
		PMG-27 A	0,0%	0,0%	2,3%	18,0%	0,0	0,0	79,7%	0,12
		PMG-27 B	0,0%	0,0%	8,3%	11,2%	0,0	0,0	80,5%	0,04
		PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,6%	17,5%	0,0	0,0	79,9%	-0,02
		PMG-28 B	0,0%	0,0%	11,7%	8,9%	0,0	0,0	79,4%	0,05
		PMG-29 A	0,0%	0,0%	2,0%	18,7%	0,0	0,0	79,3%	-0,04
		PMG-29 B	0,0%	0,0%	3,4%	16,8%	0,0	0,0	79,8%	-0,03
		PMG-44 A	0,0%	0,0%	1,6%	18,9%	0,0	0,0	79,5%	0,02
		PMG-44 B	0,0%	0,0%	2,6%	18,1%	0,0	0,0	79,3%	0,03
		PMG-45 A	0,0%	0,0%	2,6%	18,2%	0,0	0,0	79,2%	-0,06
		PMG-45 B	0,0%	0,0%	2,5%	18,3%	0,0	0,0	79,2%	0,21

DATA		Semana 1: 03/04 a 07/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,1%	0,0	0,0	79,7%	-0,01	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	3,4%	16,7%	0,0	0,0	79,9%	-0,01	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	0,08	
	PMG-31 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	0,33	A
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,5%	0,0	0,0	78,5%	0,05	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	4,1%	16,7%	0,0	0,0	79,2%	0,03	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,4%	0,0	0,0	78,7%	0,08	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	12,9%	6,1%	0,0	0,0	81,0%	0,03	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,04	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	3,9%	17,0%	0,0	0,0	79,1%	0,08	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0,0	0,0	79,0%	0,02	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	4,3%	16,0%	0,0	0,0	79,7%	-0,01	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0,0	0,0	79,3%	0,03	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	13,8%	4,7%	0,0	0,0	81,5%	0,02	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	0,03	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	3,8%	16,7%	0,0	0,0	79,0%	0,21	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,2%	0,0	0,0	79,2%	0,02	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,2%	0,0	0,0	79,6%	0,01	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	0,0	79,4%	-0,01	
	PMG-39 B	1,0%	1,2%	15,9%	0,9%	0,0	0,0	82,2%	0,01	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	79,1%	0,03	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,6%	0,0	0,0	79,2%	0,14	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,7%	0,0	0,0	79,0%	-0,01	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,3%	20,6%	0,0	0,0	79,1%	0,13	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	7,7%	11,9%	0,0	0,0	80,4%	0,08	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	16,1%	3,1%	0,0	0,0	80,8%	0,02	
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,6%	0,0	0,0	78,9%	0,09	
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	3,1%	18,3%	0,0	0,0	78,6%	-0,03	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,8%	0,0	0,0	78,9%	0,08	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	3,0%	17,5%	0,0	0,0	79,5%	-0,41	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,7%	0,0	0,0	79,1%	0,05	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,4%	0,0	0,0	79,4%	-0,25	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	79,2%	0,03	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	5,1%	12,4%	0,0	0,0	82,5%	-0,31	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,8%	0,0	0,0	78,9%	-0,03	
	PMG-66 B	26,7%	33,1%	20,0%	1,6%	0,0	0,0	51,7%	0,15	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,9%	0,0	0,0	78,6%	0,13	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,0%	0,0	0,0	78,9%	0,31	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,8%	0,0	0,0	78,7%	0,06	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	2,6%	17,8%	0,0	0,0	79,6%	-0,25	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	0,07	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	13,4%	1,5%	0,0	0,0	85,1%	0,05	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0,0	0,0	78,7%	0,07	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	2,6%	16,4%	0,0	0,0	81,0%	0,05	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	0,09	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	4,6%	15,0%	0,0	0,0	80,4%	0,18	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	0,10	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	0,21	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,7%	0,0	0,0	78,7%	0,14	
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	1,4%	18,3%	0,0	0,0	80,3%	-0,07	
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,8%	0,0	0,0	78,5%	0,08	
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	2,2%	18,3%	0,0	0,0	79,4%	-0,10	

DATA		Semana 1: 03/04 a 07/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	2,1%	21,2%	0,0	0,0	76,7%	0,02	
	PMG-46 B	0,0%	0,0%	11,9%	1,5%	0,0	0,0	86,6%	-0,03	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,2%	0,0	0,0	80,0%	0,05	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	7,3%	13,6%	0,0	0,0	79,1%	0,11	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,4%	0,0	0,0	77,7%	-0,09	
	PMG-48 B	30,0%	20,0%	5,1%	1,4%	0,0	0,0	63,5%	-7,05	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,4%	0,0	0,0	78,5%	-0,02	
	PMG-49 B	32,5%	32,5%	9,8%	2,1%	0,0	0,0	55,6%	-4,71	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,02	
	PMG-50 B	2,2%	2,4%	17,0%	2,6%	0,0	0,0	78,2%	-0,01	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	1,0%	22,2%	0,0	0,0	76,8%	-0,02	
	PMG-51 B	23,4%	25,6%	3,5%	17,4%	0,0	0,0	55,7%	0,06	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,9%	22,5%	0,0	0,0	76,2%	0,17	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	1,8%	23,2%	0,0	0,0	75,0%	0,08	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,2%	22,4%	0,0	0,0	77,4%	0,04	
	PMG-53 B	0,0%	0,0%	8,1%	12,6%	0,0	0,0	79,3%	0,21	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	0,0	0,0	79,5%	0,07	
	PMG-54 B	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	0,0	0,0	79,0%	-2,16	A
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	1,0%	22,4%	0,0	0,0	76,6%	0,04	
	PMG-55 B	44,5%	47,8%	15,4%	2,9%	0,0	0,0	37,2%	0,27	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	1,1%	18,6%	0,0	0,0	80,3%	-0,15	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	5,3%	16,7%	0,0	0,0	78,0%	0,22	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,8%	0,0	0,0	77,5%	-0,18	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	12,4%	4,5%	0,0	0,0	82,7%	0,11	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,6%	0,0	0,0	78,2%	0,06	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	4,0%	17,4%	0,0	0,0	78,6%	-0,04	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,6%	22,0%	0,0	0,0	77,4%	0,01	
	PMG-59 B	6,6%	12,7%	12,9%	7,2%	0,0	0,0	73,3%	0,04	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,0%	18,3%	0,0	0,0	80,7%	0,02	
	PMG-60 B	10,4%	16,4%	0,8%	5,2%	0,0	0,0	83,6%	-8,03	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,2%	0,0	0,0	78,1%	-0,08	
	PMG-61 B	11,4%	13,7%	8,1%	2,4%	0,0	0,0	78,1%	0,05	
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,02	
	PMG-62 B	30,6%	30,6%	15,3%	3,3%	0,0	0,0	50,8%	-3,18	E

DATA		Semana 1: 03/04 a 07/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	1,5%	21,0%	0,0	0,0	77,5%	-0,05	
	PMG-01 B	0,3%	0,6%	0,2%	22,3%	0,0	0,0	77,3%	0,08	A
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,9%	17,4%	0,0	0,0	81,7%	0,15	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	1,0%	22,4%	0,0	0,0	76,6%	-2,11	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,1%	21,9%	0,0	0,0	78,0%	-0,02	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	0,6%	17,9%	0,0	0,0	81,5%	-1,06	A
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,7%	23,4%	0,0	0,0	75,9%	0,01	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	0,5%	22,4%	0,0	0,0	77,1%	-0,08	A
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,7%	22,4%	0,0	0,0	76,8%	0,05	
	PMG-05 B	0,1%	0,1%	1,4%	23,6%	0,0	0,0	74,9%	-1,72	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	1,2%	25,2%	0,0	0,0	73,6%	0,03	
	PMG-06 B	69,6%	69,6%	4,8%	1,9%	0,0	0,0	23,7%	16,98	E
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,4%	22,3%	0,0	0,0	77,3%	0,05	
	PMG-07 B	0,1%	0,1%	0,1%	21,4%	0,0	0,0	78,4%	0,91	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,6%	0,0	0,0	79,7%	-0,03	
	PMG-08 B	0,6%	0,7%	13,7%	0,9%	0,0	0,0	84,8%	-2,18	A
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	5,7%	16,2%	0,0	0,0	78,1%	0,05	
	PMG-09 B	0,1%	0,1%	1,7%	23,2%	0,0	0,0	75,0%	-0,02	A
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	0,1%	22,2%	0,0	0,0	77,7%	-0,09	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	1,1%	23,9%	0,0	0,0	75,0%	-1,07	A
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	0,2%	19,2%	0,0	0,0	80,6%	0,02	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	0,2%	22,9%	0,0	0,0	76,9%	-0,12	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	4,7%	19,4%	0,0	0,0	75,9%	-0,01	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	12,0%	11,9%	0,0	0,0	76,1%	-0,12	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	1,9%	12,0%	0,0	0,0	85,9%	-0,28	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	3,8%	18,1%	0,0	0,0	78,1%	-0,07	
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	4,7%	9,1%	0,0	0,0	86,0%	0,04	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	9,0%	1,3%	0,0	0,0	89,7%	0,02	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	0,14	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	1,4%	18,1%	0,0	0,0	80,5%	-0,35	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	0,12	
	PMG-71 B	0,6%	0,6%	2,4%	0,6%	0,0	0,0	96,4%	0,25	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,0%	0,0	0,0	79,7%	0,05	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	2,1%	13,1%	0,0	0,0	84,8%	0,03	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,5%	0,0	0,0	79,0%	0,06	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0,0	0,0	79,0%	-0,01	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,8%	18,2%	0,0	0,0	81,0%	0,08	
	PMG-74 B	13,2%	13,2%	1,0%	0,7%	0,0	0,0	85,1%	0,20	
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	0,13	
	PMG-75 B	0,2%	0,2%	6,4%	0,6%	0,0	0,0	92,8%	0,10	
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,01	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	1,7%	19,2%	0,0	0,0	79,1%	0,17	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	5,2%	15,2%	0,0	0,0	79,6%	0,14	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	17,1%	4,0%	0,0	0,0	78,9%	0,10	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	3,0%	18,6%	0,0	0,0	78,4%	0,05	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	12,3%	8,7%	0,0	0,0	79,0%	0,11	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,6%	0,0	0,0	78,4%	0,05	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	15,7%	3,6%	0,0	0,0	80,7%	0,01	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	4,7%	15,0%	0,0	0,0	80,3%	0,15	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	11,2%	10,9%	0,0	0,0	77,9%	0,10	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,1%	0,0	0,0	79,5%	0,08	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	12,6%	1,0%	0,0	0,0	86,4%	0,20	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,7%	0,0	0,0	78,6%	0,15	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	5,8%	14,3%	0,0	0,0	79,9%	-0,03	
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,5%	0,0	0,0	78,5%	0,14	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	2,8%	17,9%	0,0	0,0	79,3%	0,09	

DATA		Semana 1: 03/04 a 07/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	0,2%	19,6%	0,0	0,0	80,2%	-0,02	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	2,0%	16,6%	0,0	0,0	81,4%	-0,06	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,7%	22,9%	0,0	0,0	76,4%	0,01	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	2,9%	20,2%	0,0	0,0	76,9%	-0,09	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,9%	0,0	0,0	77,0%	0,11	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	2,6%	19,2%	0,0	0,0	78,2%	-0,12	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	0,8%	18,3%	0,0	0,0	80,9%	0,16	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	0,8%	17,0%	0,0	0,0	82,2%	0,00	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	0,8%	22,2%	0,0	0,0	77,0%	0,05	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	2,6%	18,2%	0,0	0,0	79,2%	0,01	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0,0	0,0	78,8%	0,03	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	2,1%	19,8%	0,0	0,0	78,1%	-0,04	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,5%	22,0%	0,0	0,0	77,5%	0,21	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	0,0	0,0	79,3%	0,17	
	PMG-104	0,0%	0,0%	1,2%	23,4%	0,0	0,0	75,4%	-0,01	
	PMG-105	0,0%	0,0%	0,3%	20,2%	0,0	0,0	79,5%	-0,01	
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,8%	22,2%	0,0	0,0	77,0%	0,02	
	PMG-107	0,0%	0,0%	5,0%	14,6%	0,0	0,0	80,4%	0,01	
	PMG-108	0,0%	0,0%	0,3%	22,2%	0,0	0,0	77,5%	-0,09	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	0,8%	18,9%	0,0	0,0	80,3%	0,15	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	5,4%	18,4%	0,0	0,0	76,2%	0,07	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,2%	22,4%	0,0	0,0	77,4%	-0,06	
	PMG-110 B	0,3%	0,3%	1,1%	21,2%	0,0	0,0	77,4%	0,05	A
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,6%	0,0	0,0	79,9%	0,01	
Guarda Universitário	PMG-111 B	0,0%	0,0%	2,3%	20,6%	0,0	0,0	77,1%	-0,04	
	PMG-112	0,0%	0,0%	2,9%	18,4%	0,0	0,0	78,7%	0,05	
	PMG-116 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,0%	0,0	0,0	79,6%	0,01	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	0,7%	18,6%	0,0	0,0	80,7%	0,07	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	1,2%	17,4%	0,0	0,0	81,4%	-0,06	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,6%	0,0	0,0	78,0%	0,05	
Portaria P3	PMG-118 A	0,0%	0,0%	0,6%	22,4%	0,0	0,0	77,0%	0,08	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	0,5%	21,6%	0,0	0,0	77,9%	-0,07	
	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,9%	0,0	0,0	77,7%	-0,01	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,6%	19,2%	0,0	0,0	80,2%	0,08	
	PMG-119 C	0,1%	0,1%	0,6%	21,9%	0,0	0,0	77,4%	2,17	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	0,0	0,0	79,3%	0,11	
Transportes	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,8%	22,4%	0,0	0,0	76,8%	0,15	
	PMG-120 C	0,1%	0,1%	0,4%	19,9%	0,0	0,0	79,7%	-2,22	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	0,3%	19,6%	0,0	0,0	80,1%	0,01	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	0,6%	21,2%	0,0	0,0	78,2%	0,09	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	0,4%	18,9%	0,0	0,0	80,7%	-0,17	
	PMG-122 B	0,7%	0,8%	0,3%	23,6%	0,0	0,0	75,4%	1,01	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	0,8%	22,9%	0,0	0,0	76,3%	0,02	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	1,0%	21,3%	0,0	0,0	77,7%	-0,15	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,2%	19,2%	0,0	0,0	80,6%	0,22	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	0,1%	21,3%	0,0	0,0	78,6%	-0,09	

DATA		Semana 2: 10/04 a 13/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	10,1%	12,3%	0,0	0,0	77,6%	-0,01	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	11,6%	10,4%	0,0	0,0	78,0%	-0,14	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	5,9%	15,3%	0,0	0,0	78,8%	-0,03	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	7,5%	14,8%	0,0	0,0	77,7%	-0,01	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	2,4%	18,3%	0,0	0,0	79,3%	0,02	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	6,6%	13,4%	0,0	0,0	80,0%	-0,01	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	2,6%	18,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,07	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,26	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,1%	0,0	0,0	80,0%	-0,14	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	7,7%	12,9%	0,0	1,0	79,4%	-0,15	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	2,7%	20,3%	1,0	0,0	77,0%	-0,03	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	4,0%	18,6%	0,0	0,0	77,4%	-0,08	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,5%	0,0	0,0	79,8%	-0,09	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	5,6%	18,5%	0,0	0,0	75,9%	-0,01	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	3,2%	20,6%	0,0	0,0	76,2%	-0,05	
	PMG-114 B	27,5%	27,5%	10,5%	1,5%	0,0	0,0	53,4%	-1,89	E
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	2,1%	20,5%	0,0	0,0	77,4%	-0,28	
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	6,1%	16,0%	0,0	0,0	77,9%	-0,01	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11 A	0,0%	0,0%	6,2%	18,6%	0,0	0,0	75,2%	-0,14	
	PMG-11 B	5,8%	6,7%	15,0%	1,7%	0,0	0,0	77,5%	0,06	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	6,9%	12,6%	0,0	0,0	80,5%	0,37	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	4,5%	21,4%	0,0	0,0	74,1%	-0,04	A
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	6,0%	17,7%	0,0	0,0	76,3%	0,73	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	8,7%	17,0%	0,0	0,0	74,3%	0,02	
	PMG-14 A	0,0%	0,0%	6,8%	16,1%	0,0	0,0	77,1%	0,08	
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	11,2%	10,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,21	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	2,5%	23,1%	0,0	0,0	74,4%	0,26	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	1,5%	22,0%	0,0	0,0	76,5%	-0,14	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,8%	0,0	0,0	79,4%	-0,08	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	3,1%	19,9%	0,0	0,0	77,0%	0,03	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	3,3%	19,6%	0,0	0,0	77,1%	0,01	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	5,9%	15,7%	0,0	0,0	78,4%	-0,12	
I-3 Auditórios	PMG-24 A	0,0%	0,0%	3,4%	18,9%	0,0	0,0	77,7%	-0,14	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	3,8%	19,3%	0,0	0,0	76,9%	-0,22	
	PMG-25 A	0,0%	0,0%	4,3%	16,7%	0,0	0,0	79,0%	0,02	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	5,4%	17,8%	0,0	0,0	76,8%	-0,36	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	4,5%	18,0%	0,0	0,0	77,5%	-0,02	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	6,8%	15,5%	0,0	0,0	77,7%	-0,35	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	5,4%	18,5%	0,0	0,0	76,1%	0,06	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	12,0%	9,5%	1,0	0,0	78,5%	0,08	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	5,2%	17,5%	0,0	0,0	77,3%	-0,28	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	14,5%	9,7%	0,0	0,0	75,8%	-0,02	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	2,8%	18,9%	0,0	0,0	78,3%	-0,09	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	4,1%	16,7%	0,0	0,0	79,2%	-0,52	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	1,4%	16,4%	0,0	0,0	82,2%	-0,19	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	4,1%	18,6%	0,0	0,0	77,3%	-0,03	
	PMG-45 A	0,0%	0,0%	3,3%	18,9%	0,0	0,0	77,8%	-0,17	
	PMG-45 B	0,0%	0,0%	6,0%	16,4%	0,0	0,0	77,6%	-0,22	

DATA		Semana 2: 10/04 a 13/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	3,3%	18,4%	0,0	0,0	78,3%	0,05	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	11,3%	11,8%	0,0	0,0	76,9%	-0,69	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	3,3%	19,2%	0,0	0,0	77,5%	0,14	
	PMG-31 B	0,0%	0,0%	4,6%	19,2%	0,0	0,0	76,2%	-1,83	A
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	4,4%	20,6%	0,0	0,0	75,0%	-0,62	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	9,3%	13,1%	0,0	0,0	77,6%	-0,35	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	3,6%	19,7%	0,0	0,0	76,7%	0,07	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	14,7%	7,2%	0,0	0,0	78,1%	0,31	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	2,7%	16,2%	0,0	0,0	81,1%	0,35	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	5,5%	15,6%	0,0	0,0	78,9%	0,12	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	1,2%	16,2%	0,0	0,0	82,6%	-0,07	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	8,2%	10,5%	0,0	0,0	81,3%	0,02	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	1,6%	18,6%	0,0	0,0	79,8%	-0,05	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	15,8%	3,6%	0,0	0,0	80,6%	-0,06	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,3%	0,0	0,0	78,2%	-0,01	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	5,7%	18,1%	0,0	0,0	76,2%	-0,03	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,1%	0,0	0,0	79,4%	-0,10	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	2,9%	20,0%	0,0	0,0	77,1%	-0,24	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	2,7%	16,8%	0,0	0,0	80,5%	0,03	
	PMG-39 B	1,8%	2,6%	13,2%	0,7%	0,0	0,0	84,2%	0,01	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	4,3%	22,5%	0,0	0,0	73,2%	-0,09	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	3,9%	19,2%	0,0	0,0	76,9%	-0,09	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	4,1%	19,2%	0,0	0,0	76,7%	-0,01	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	4,2%	19,9%	0,0	0,0	75,9%	0,17	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	11,3%	11,7%	0,0	0,0	77,0%	0,13	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	14,5%	7,2%	1,0	0,0	78,2%	0,01	
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	4,4%	19,9%	0,0	0,0	75,7%	0,08	
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	3,8%	19,3%	0,0	0,0	76,9%	0,06	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	1,3%	21,0%	0,0	0,0	77,7%	0,41	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	5,5%	19,9%	0,0	0,0	74,6%	0,29	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,9%	21,9%	0,0	0,0	77,2%	0,38	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	8,8%	4,6%	1,0	0,0	84,2%	-0,91	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,1%	0,0	0,0	77,8%	0,32	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	1,5%	19,3%	0,0	0,0	79,2%	2,66	A
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	3,0%	20,7%	0,0	0,0	76,3%	-0,61	
	PMG-66 B	10,7%	11,5%	3,0%	8,3%	0,0	0,0	78,0%	-0,09	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	2,4%	18,4%	0,0	0,0	79,2%	0,03	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	5,8%	19,9%	0,0	0,0	74,3%	-0,32	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	2,1%	19,9%	0,0	0,0	78,0%	-0,21	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	3,1%	19,4%	0,0	0,0	77,5%	-0,01	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	4,1%	20,1%	0,0	0,0	75,8%	-0,21	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	9,5%	12,7%	0,0	0,0	77,8%	0,02	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	2,5%	21,9%	0,0	1,0	75,6%	-0,48	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	1,6%	21,0%	0,0	0,0	77,4%	0,07	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,1%	0,0	0,0	78,1%	-0,03	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	0,8%	21,8%	0,0	0,0	77,4%	0,52	A
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,2%	0,0	0,0	80,1%	0,05	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0,0	0,0	79,3%	0,11	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,6%	18,3%	0,0	0,0	81,1%	-0,02	
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	0,8%	21,2%	0,0	0,0	78,0%	-0,16	
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	2,0%	20,2%	0,0	0,0	77,8%	-0,03	
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	1,6%	16,6%	0,0	0,0	81,8%	-0,33	A

DATA		Semana 2: 10/04 a 13/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	4,1%	18,4%	0,0	0,0	77,5%	-0,04	
	PMG-46 B	3,4%	4,7%	14,9%	0,4%	0,0	0,0	81,2%	-0,43	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	5,0%	19,3%	0,0	0,0	75,7%	-0,25	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	9,6%	13,8%	0,0	0,0	76,6%	-0,31	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	6,1%	19,9%	0,0	0,0	74,0%	-0,22	
	PMG-48 B	33,6%	33,6%	4,6%	3,0%	0,0	0,0	58,8%	0,56	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	3,4%	18,8%	0,0	1,0	77,8%	-0,07	
	PMG-49 B	31,4%	31,4%	9,1%	1,8%	0,0	0,0	57,4%	0,09	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	2,9%	18,6%	0,0	0,0	78,5%	-0,03	
	PMG-50 B	1,7%	2,9%	13,8%	1,4%	0,0	0,0	83,0%	-0,25	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	1,3%	16,1%	0,0	0,0	82,6%	0,01	
	PMG-51 B	11,4%	13,5%	7,1%	8,6%	0,0	0,0	72,6%	0,04	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0,0	1,0	79,0%	0,04	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	1,1%	18,9%	0,0	0,0	80,0%	0,05	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0,0	0,0	78,8%	0,01	
	PMG-53 B	1,4%	2,1%	10,8%	1,2%	0,0	0,0	85,1%	0,04	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	3,2%	21,7%	0,0	0,0	75,1%	0,09	
	PMG-54 B	7,9%	8,1%	13,0%	0,9%	0,0	0,0	77,2%	-2,15	A
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	4,4%	19,9%	0,0	0,0	75,7%	0,06	
	PMG-55 B	31,4%	41,7%	0,6%	3,2%	0,0	0,0	64,5%	-3,70	E
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	3,3%	19,7%	0,0	0,0	77,0%	-0,02	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	7,9%	16,2%	0,0	0,0	75,9%	-0,04	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	4,2%	20,6%	0,0	0,0	75,2%	-0,03	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	10,0%	6,8%	0,0	0,0	83,2%	0,06	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,2%	0,0	0,0	78,5%	-0,37	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	7,2%	12,0%	0,0	0,0	80,8%	-0,08	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	2,4%	21,0%	0,0	0,0	76,6%	-0,06	
	PMG-59 B	13,6%	17,8%	14,0%	1,4%	1,0	0,0	71,0%	-0,04	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,4%	17,0%	0,0	0,0	81,6%	-0,81	
	PMG-60 B	9,7%	9,7%	5,7%	1,6%	0,0	0,0	82,9%	0,43	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,5%	21,9%	0,0	0,0	76,6%	0,06	
	PMG-61 B	4,7%	5,1%	7,9%	1,4%	0,0	0,0	86,0%	-0,05	
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,07	
	PMG-62 B	31,5%	31,5%	17,2%	1,5%	0,0	0,0	46,9%	5,27	E

DATA		Semana 2: 10/04 a 13/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	2,1%	19,0%	0,0	0,0	78,9%	-0,48	
	PMG-01 B	0,6%	0,7%	17,8%	0,3%	0,0	0,0	81,3%	0,26	A
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	5,2%	18,8%	0,0	0,0	76,0%	0,02	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	3,1%	16,3%	0,0	0,0	80,6%	0,23	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	4,6%	20,0%	0,0	0,0	75,4%	0,21	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	4,6%	19,1%	0,0	0,0	76,3%	-1,22	A
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	3,6%	19,9%	0,0	0,0	76,5%	0,01	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	7,8%	16,4%	0,0	0,0	75,8%	0,28	A
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	4,2%	18,9%	0,0	0,0	76,9%	0,18	
	PMG-05 B	0,2%	0,2%	1,3%	21,2%	0,0	0,0	77,2%	0,24	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,4%	0,0	0,0	78,6%	-0,07	
	PMG-06 B	54,8%	54,8%	10,6%	1,4%	0,0	0,0	28,9%	15,90	E
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	1,1%	18,1%	0,0	0,0	80,8%	0,12	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0,0	0,0	79,1%	1,98	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,8%	0,0	0,0	78,0%	0,06	
	PMG-08 B	1,6%	2,3%	1,5%	14,9%	0,0	0,0	81,9%	-0,25	A
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	7,9%	14,1%	0,0	0,0	78,0%	0,04	
	PMG-09 B	0,2%	0,2%	4,0%	20,1%	0,0	0,0	75,4%	0,01	A
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	3,9%	18,6%	0,0	0,0	77,5%	0,01	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	4,6%	19,8%	1,0	0,0	75,6%	-0,63	A
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	3,0%	21,8%	0,0	0,0	75,2%	0,02	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	10,5%	12,3%	0,0	0,0	77,2%	-0,01	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	9,4%	16,7%	0,0	0,0	73,9%	0,15	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	12,2%	12,3%	0,0	0,0	75,5%	-0,07	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	3,0%	19,3%	0,0	0,0	77,7%	-0,09	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	6,5%	17,5%	0,0	0,0	76,0%	0,05	
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	7,5%	12,9%	0,0	0,0	79,6%	0,10	
	PMG-87 B	0,0%	0,1%	8,3%	17,4%	0,0	0,0	74,2%	-0,14	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,9%	0,0	0,0	79,2%	-0,25	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	1,3%	20,3%	0,0	0,0	78,4%	0,01	A
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	2,2%	21,9%	0,0	0,0	75,9%	0,01	
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	2,6%	0,6%	0,0	0,0	96,6%	0,06	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	3,5%	14,9%	0,0	0,0	81,6%	0,04	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	2,7%	20,5%	0,0	0,0	76,8%	-0,21	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	1,8%	16,3%	0,0	0,0	81,9%	0,08	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	2,2%	18,4%	0,0	0,0	79,4%	0,02	A
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	5,7%	14,8%	0,0	0,0	79,5%	0,21	
	PMG-74 B	3,6%	4,9%	3,3%	14,5%	0,0	0,0	78,6%	0,57	A
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	3,5%	18,4%	0,0	0,0	78,1%	-0,11	
	PMG-75 B	0,1%	0,2%	2,9%	2,8%	0,0	0,0	94,0%	0,23	
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	3,0%	21,1%	0,0	0,0	75,9%	-0,17	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	6,7%	13,9%	0,0	0,0	79,4%	-0,03	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	8,8%	13,6%	0,0	0,0	77,6%	-0,25	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	16,9%	6,2%	0,0	0,0	76,9%	0,12	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	4,9%	18,6%	0,0	0,0	76,5%	0,04	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	14,5%	7,3%	0,0	0,0	78,2%	-0,22	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,4%	0,0	0,0	80,0%	0,06	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	17,2%	4,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,22	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	5,9%	14,7%	1,0	0,0	79,4%	-0,32	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	10,5%	11,6%	0,0	0,0	77,9%	-0,49	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	4,9%	16,5%	0,0	0,0	78,6%	0,04	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	16,8%	0,1%	0,0	0,0	83,1%	-0,14	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	3,0%	16,9%	0,0	1,0	80,1%	0,06	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	8,6%	12,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,19	
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	2,6%	22,5%	0,0	0,0	74,9%	0,04	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	4,2%	17,9%	0,0	0,0	77,9%	0,09	

DATA		Semana 2: 10/04 a 13/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	3,6%	21,8%	0,0	0,0	74,6%	0,05	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	2,9%	20,4%	0,0	0,0	76,7%	0,55	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,9%	0,0	0,0	77,5%	0,13	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	3,5%	20,0%	0,0	0,0	76,5%	0,33	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,4%	0,0	0,0	78,1%	-0,14	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	2,9%	18,9%	0,0	0,0	78,2%	-0,21	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	2,5%	21,8%	0,0	0,0	75,7%	0,09	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	5,2%	17,4%	0,0	0,0	77,4%	-0,02	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	2,5%	20,8%	0,0	0,0	76,7%	-0,05	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	4,2%	18,3%	0,0	0,0	77,5%	-0,09	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	1,9%	18,4%	0,0	0,0	79,7%	-0,16	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	4,9%	18,5%	0,0	0,0	76,6%	0,06	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	1,7%	21,5%	0,0	0,0	76,8%	-0,19	
	PMG-103	0,0%	0,0%	1,4%	21,3%	0,0	0,0	77,3%	-0,07	
	PMG-104	0,0%	0,0%	5,2%	21,5%	0,0	0,0	73,3%	0,07	
	PMG-105	0,0%	0,0%	7,2%	18,7%	0,0	0,0	74,1%	-0,30	
	PMG-106	0,0%	0,0%	4,5%	21,5%	0,0	0,0	74,0%	-0,18	
	PMG-107	0,0%	0,0%	4,2%	21,3%	0,0	0,0	74,5%	0,11	
	PMG-108	0,0%	0,0%	2,0%	21,9%	0,0	0,0	76,1%	0,02	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	3,4%	20,4%	0,0	1,0	76,2%	0,09	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	4,8%	17,4%	0,0	0,0	77,8%	-0,01	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,9%	18,9%	0,0	0,0	80,2%	0,03	
	PMG-110 B	0,4%	0,4%	7,9%	10,2%	0,0	0,0	81,0%	2,65	A
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	1,1%	16,4%	0,0	0,0	82,5%	-0,62	
	PMG-111 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,9%	0,0	0,0	78,0%	-0,21	
	PMG-112	0,0%	0,0%	0,6%	21,7%	0,0	0,0	77,7%	0,06	
Guarda Universitário	PMG-116 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,6%	0,0	0,0	77,3%	-0,23	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	2,9%	19,6%	0,0	0,0	77,5%	-0,01	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	2,7%	22,2%	0,0	0,0	75,1%	-0,02	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	6,5%	16,9%	0,0	0,0	76,6%	-0,06	
	PMG-118 A	0,0%	0,0%	2,1%	18,1%	0,0	0,0	79,8%	0,36	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	5,1%	18,9%	0,0	0,0	76,0%	-0,43	
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	2,1%	18,5%	0,0	0,0	79,4%	0,13	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	3,2%	16,4%	0,0	1,0	80,4%	-0,10	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	5,4%	18,8%	0,0	0,0	75,8%	2,02	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	2,0%	21,5%	0,0	0,0	76,5%	-0,35	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,8%	21,1%	0,0	0,0	78,1%	-0,25	
Transportes	PMG-120 C	0,0%	0,0%	1,4%	19,7%	0,0	0,0	78,9%	-2,89	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	1,3%	22,2%	0,0	0,0	76,5%	0,09	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	0,9%	16,9%	0,0	0,0	82,2%	-0,13	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,4%	0,0	0,0	77,8%	0,06	
	PMG-122 B	0,9%	0,9%	0,1%	20,4%	0,0	0,0	78,5%	-0,01	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	1,9%	16,0%	0,0	0,0	82,1%	-0,03	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	1,8%	18,7%	0,0	0,0	79,5%	-0,38	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,6%	0,0	0,0	77,9%	0,08	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	3,5%	18,4%	0,0	0,0	78,1%	-1,48	A

DATA		Semana 3: 17/04 a 20/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	10,3%	14,3%	0,0	0,0	75,4%	0,10	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	12,1%	11,4%	0,0	0,0	76,5%	-0,37	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	6,3%	17,3%	0,0	0,0	76,4%	-0,25	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	7,6%	12,8%	0,0	0,0	79,6%	0,21	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	2,7%	19,3%	0,0	0,0	78,0%	0,04	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	7,1%	15,4%	0,0	0,0	77,5%	-0,30	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	3,1%	17,9%	0,0	0,0	79,0%	-0,18	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,3%	22,5%	0,0	0,0	76,2%	0,22	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	1,4%	18,2%	0,0	0,0	80,4%	0,01	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	8,1%	11,7%	0,0	1,0	80,2%	0,23	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	2,8%	21,5%	1,0	0,0	75,7%	0,01	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	4,3%	19,7%	0,0	0,0	76,0%	0,22	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	1,2%	18,3%	0,0	0,0	80,5%	0,36	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	6,5%	19,3%	0,0	0,0	74,2%	0,03	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	4,1%	19,5%	0,0	0,0	76,4%	0,06	
	PMG-114 B	34,4%	34,4%	11,0%	0,5%	0,0	0,0	54,1%	5,47	E
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	2,3%	21,5%	0,0	0,0	76,2%	0,02	
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	6,4%	18,0%	0,0	0,0	75,6%	0,02	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11 A	0,0%	0,0%	6,6%	19,6%	0,0	0,0	73,8%	0,04	
	PMG-11 B	9,7%	11,4%	15,2%	3,7%	0,0	0,0	71,4%	0,14	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	7,4%	15,6%	0,0	0,0	77,0%	0,14	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	4,9%	23,4%	0,0	0,0	71,7%	0,28	A
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	6,3%	18,7%	0,0	0,0	75,0%	0,25	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	9,0%	16,0%	0,0	0,0	75,0%	0,01	
	PMG-14 A	0,0%	0,0%	7,1%	17,1%	0,0	0,0	75,8%	0,00	
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	11,5%	12,2%	0,0	0,0	76,3%	0,32	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	2,8%	24,1%	0,0	0,0	73,1%	0,05	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	2,0%	20,0%	0,0	0,0	78,0%	-0,20	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,6%	0,0	0,0	78,0%	-0,27	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	3,3%	20,8%	0,0	0,0	75,9%	-0,01	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	3,6%	21,1%	0,0	0,0	75,3%	0,42	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	5,4%	16,7%	0,0	0,0	77,9%	0,04	
I-3 Auditórios	PMG-24 A	0,0%	0,0%	4,2%	19,9%	0,0	0,0	75,9%	0,11	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	3,9%	20,3%	0,0	0,0	75,8%	-0,04	
	PMG-25 A	0,0%	0,0%	4,5%	18,7%	0,0	0,0	76,8%	0,22	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	6,3%	15,8%	0,0	0,0	77,9%	0,01	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	4,7%	21,0%	0,0	0,0	74,3%	0,13	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	7,3%	16,5%	0,0	0,0	76,2%	0,17	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	6,0%	20,5%	0,0	0,0	73,5%	0,21	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	12,2%	8,5%	1,0	0,0	79,3%	0,14	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	5,5%	19,5%	0,0	0,0	75,0%	-0,14	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	14,9%	12,7%	0,0	0,0	72,4%	-0,01	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	3,0%	19,9%	0,0	0,0	77,1%	0,01	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	4,2%	18,7%	0,0	0,0	77,1%	0,06	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	1,9%	13,4%	0,0	0,0	84,7%	-0,14	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	4,7%	20,6%	0,0	0,0	74,7%	-0,58	
	PMG-45 A	0,0%	0,0%	3,5%	19,9%	0,0	0,0	76,6%	0,06	
	PMG-45 B	0,0%	0,0%	6,2%	14,4%	0,0	0,0	79,4%	-0,05	

DATA		Semana 3: 17/04 a 20/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	3,5%	21,4%	0,0	0,0	75,1%	0,38	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	11,7%	13,8%	0,0	0,0	74,5%	0,04	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	3,4%	21,2%	0,0	0,0	75,4%	0,31	
	PMG-31 B	0,0%	0,0%	4,9%	22,2%	0,0	0,0	72,9%	-1,78	A
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	4,9%	22,6%	0,0	0,0	72,5%	0,01	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	9,5%	14,1%	0,0	0,0	76,4%	0,02	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	4,2%	21,7%	0,0	0,0	74,1%	0,41	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	14,9%	8,2%	0,0	0,0	76,9%	0,45	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	2,9%	14,4%	0,0	0,0	82,7%	0,41	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	5,6%	16,6%	0,0	0,0	77,8%	0,01	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	1,6%	18,2%	0,0	0,0	80,2%	0,01	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	8,7%	13,5%	0,0	0,0	77,8%	-0,73	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	2,2%	20,6%	0,0	0,0	77,2%	0,26	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	15,9%	6,6%	0,0	0,0	77,5%	0,04	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	2,1%	18,3%	0,0	0,0	79,6%	0,04	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	5,8%	21,1%	0,0	0,0	73,1%	0,30	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	1,1%	23,1%	0,0	0,0	75,8%	-0,08	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	3,0%	22,0%	0,0	0,0	75,0%	0,05	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	3,0%	13,8%	0,0	0,0	83,2%	0,36	
	PMG-39 B	3,4%	4,1%	13,7%	1,9%	0,0	0,0	81,0%	0,48	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	5,1%	23,4%	0,0	0,0	71,5%	0,01	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	4,1%	18,3%	0,0	0,0	77,6%	-0,17	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	4,3%	20,6%	0,0	0,0	75,1%	0,21	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	4,4%	19,1%	0,0	0,0	76,5%	0,29	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	11,5%	10,7%	0,0	0,0	77,8%	0,29	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	14,7%	9,2%	1,0	0,0	76,1%	0,56	
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	4,9%	21,9%	0,0	0,0	73,2%	-0,38	
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	4,3%	20,3%	0,0	0,0	75,4%	0,23	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	1,9%	23,0%	0,0	0,0	75,1%	0,14	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	5,6%	17,9%	0,0	0,0	76,5%	0,20	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	1,4%	18,9%	0,0	0,0	79,7%	-0,49	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	8,9%	6,6%	1,0	0,0	84,5%	-2,58	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	1,2%	21,4%	0,0	0,0	77,4%	-0,14	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	1,6%	18,8%	0,0	0,0	79,6%	4,92	A
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	3,6%	21,5%	0,0	0,0	74,9%	0,04	
	PMG-66 B	17,8%	17,9%	3,1%	7,3%	0,0	0,0	71,8%	4,64	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	2,9%	19,4%	0,0	0,0	77,7%	0,29	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	6,6%	18,9%	0,0	0,0	74,5%	-0,34	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	2,3%	21,9%	0,0	0,0	75,8%	-0,30	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	3,3%	18,4%	0,0	0,0	78,3%	0,29	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	4,2%	21,1%	0,0	0,0	74,7%	0,04	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	9,8%	11,7%	0,0	0,0	78,5%	0,70	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	3,0%	22,9%	0,0	1,0	74,1%	0,06	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	1,9%	19,0%	0,0	0,0	79,1%	0,37	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	1,3%	24,1%	0,0	0,0	74,6%	0,04	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	1,1%	23,8%	0,0	0,0	74,9%	2,20	A
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	1,6%	20,2%	0,0	0,0	78,2%	0,08	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,7%	19,1%	0,0	0,0	80,2%	0,31	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	0,0	0,0	78,8%	0,29	
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	1,1%	22,2%	0,0	0,0	76,7%	-0,06	
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	2,4%	19,2%	0,0	0,0	78,4%	0,04	
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	1,7%	15,6%	0,0	0,0	82,7%	-0,28	

DATA		Semana 3: 17/04 a 20/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	4,4%	16,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,67	
	PMG-46 B	4,5%	5,1%	15,3%	2,4%	0,0	0,0	77,8%	-0,64	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	5,2%	20,3%	0,0	0,0	74,5%	-0,54	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	10,1%	15,8%	0,0	0,0	74,1%	-0,31	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	6,2%	20,9%	0,0	0,0	72,9%	0,02	
	PMG-48 B	31,4%	31,4%	5,0%	4,0%	0,0	0,0	59,4%	1,70	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	3,5%	20,1%	0,0	1,0	76,4%	0,04	
	PMG-49 B	30,6%	30,6%	9,3%	0,5%	0,0	0,0	59,5%	1,06	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	3,1%	19,9%	0,0	0,0	77,0%	0,05	
	PMG-50 B	2,1%	2,6%	13,9%	3,4%	0,0	0,0	80,6%	0,02	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	1,8%	13,1%	0,0	0,0	85,1%	-0,04	
	PMG-51 B	15,4%	16,8%	7,7%	9,6%	0,0	0,0	67,3%	-0,20	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	1,1%	22,3%	0,0	1,0	76,6%	0,33	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,9%	0,0	0,0	78,9%	0,06	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	1,0%	23,4%	0,0	0,0	75,6%	0,03	
	PMG-53 B	0,9%	1,5%	10,9%	2,2%	0,0	0,0	86,0%	-0,53	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	3,7%	22,7%	0,0	0,0	73,6%	0,10	
	PMG-54 B	6,9%	9,7%	13,4%	1,9%	0,0	0,0	77,8%	0,58	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	4,7%	21,4%	0,0	0,0	73,9%	0,06	
	PMG-55 B	27,9%	38,7%	0,7%	4,4%	0,0	0,0	67,0%	6,78	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	3,8%	21,0%	0,0	0,0	75,2%	-0,37	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	8,8%	17,4%	0,0	0,0	73,8%	0,02	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	4,6%	22,7%	0,0	0,0	72,7%	-0,96	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	10,4%	3,8%	0,0	0,0	85,8%	0,03	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	1,4%	22,2%	0,0	0,0	76,4%	0,06	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	7,5%	13,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,10	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	2,6%	19,0%	0,0	0,0	78,4%	-0,17	
	PMG-59 B	11,4%	15,4%	14,1%	2,4%	1,0	0,0	72,1%	0,04	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,8%	18,2%	0,0	0,0	80,0%	0,06	
	PMG-60 B	8,4%	8,4%	5,5%	3,6%	0,0	0,0	82,0%	1,69	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	2,1%	22,9%	0,0	0,0	75,0%	0,07	
	PMG-61 B	5,7%	6,8%	8,0%	2,4%	0,0	0,0	83,9%	0,05	
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	1,5%	21,9%	0,0	0,0	76,6%	0,06	
	PMG-62 B	36,8%	36,8%	17,2%	3,5%	0,0	0,0	42,3%	7,89	E

DATA		Semana 3: 17/04 a 20/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	2,4%	20,0%	0,0	0,0	77,6%	0,06	
	PMG-01 B	0,5%	0,5%	18,2%	1,1%	0,0	0,0	80,0%	1,02	A
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	5,3%	19,8%	0,0	0,0	74,9%	0,05	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	3,2%	17,3%	0,0	0,0	79,5%	0,03	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	4,9%	18,0%	0,0	0,0	77,1%	0,01	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	5,1%	20,0%	0,0	0,0	73,8%	-1,81	A
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	4,2%	16,9%	0,0	0,0	78,9%	0,01	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	7,9%	17,6%	0,0	0,0	74,5%	1,26	A
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	4,4%	20,9%	0,0	0,0	74,7%	0,36	
	PMG-05 B	0,1%	0,1%	1,6%	21,8%	0,0	0,0	76,3%	1,34	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	1,9%	20,6%	0,0	0,0	77,5%	0,26	
	PMG-06 B	48,4 %	48,4 %	10,8%	3,4%	0,0	0,0	37,4%	15,64	E
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	1,3%	15,1%	0,0	0,0	83,6%	0,05	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	1,0%	18,1%	0,0	0,0	80,6%	-0,05	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	2,0%	19,8%	0,0	0,0	78,2%	0,01	
	PMG-08 B	2,6 %	3,4 %	1,7%	16,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,20	A
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	8,1%	15,1%	0,0	0,0	76,8%	0,11	
	PMG-09 B	0,2%	0,2%	4,0%	21,1%	0,0	0,0	74,6%	-1,56	A
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	4,2%	19,6%	0,0	0,0	76,2%	0,13	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	4,6%	17,8%	1,0	0,0	77,4%	0,92	A
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	3,2%	24,8%	0,0	0,0	72,0%	0,25	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	10,9%	12,4%	0,0	0,0	76,7%	0,13	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	9,9%	18,7%	0,0	0,0	71,4%	0,37	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	12,3%	9,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,26	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	3,5%	21,3%	0,0	0,0	75,2%	-0,33	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	7,1%	16,5%	0,0	0,0	76,4%	-0,16	
Enfermaria	PMG-87 A	0,0%	0,0%	7,6%	14,9%	0,0	0,0	77,5%	0,74	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	8,4%	18,9%	0,0	0,0	72,7%	-0,17	
	PMG-70 A	0,0%	0,0%	1,4%	21,2%	0,0	0,0	77,4%	0,03	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	1,9%	21,5%	0,0	0,0	76,6%	0,09	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	2,7%	19,8%	0,0	0,0	77,5%	0,08	
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	3,4%	2,4%	0,0	0,0	94,2%	0,09	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	3,9%	16,9%	0,0	0,0	79,2%	0,22	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	2,9%	17,5%	0,0	0,0	79,6%	0,04	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	2,3%	17,5%	0,0	0,0	80,2%	0,12	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	2,6%	16,3%	0,0	0,0	81,1%	0,26	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	5,9%	17,8%	0,0	0,0	76,3%	-0,23	
	PMG-74 B	7,9 %	8,4 %	3,5%	13,5%	0,0	0,0	74,9%	1,26	A
CAT	PMG-75 A	0,0%	0,0%	3,6%	19,4%	0,0	0,0	77,0%	0,88	
	PMG-75 B	0,0%	0,1%	3,2%	0,8%	0,0	0,0	96,0%	0,05	
	PMG-76 A	0,0%	0,0%	3,2%	19,1%	0,0	0,0	77,7%	-0,49	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	7,5%	12,9%	0,0	0,0	79,6%	-0,03	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	8,9%	12,6%	0,0	0,0	78,5%	-0,11	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	17,1%	8,2%	0,0	0,0	74,7%	0,38	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	5,3%	19,6%	0,0	0,0	75,1%	0,67	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	14,9%	8,3%	0,0	0,0	76,8%	0,06	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	1,1%	17,4%	0,0	0,0	81,5%	0,01	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	17,7%	5,0%	0,0	0,0	77,3%	0,08	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	6,0%	16,7%	1,0	0,0	77,3%	0,23	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	10,4%	14,6%	0,0	0,0	74,8%	-0,43	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	5,4%	18,5%	0,0	0,0	76,1%	-0,20	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	17,2%	1,1%	0,0	0,0	81,7%	-0,43	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	3,1%	18,9%	0,0	1,0	78,0%	0,22	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	9,1%	11,1%	0,0	0,0	79,8%	0,09	
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	3,1%	24,9%	0,0	0,0	72,0%	0,39	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	4,4%	19,9%	0,0	0,0	75,7%	-0,09	

DATA		Semana 3: 17/04 a 20/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	4,1%	19,7%	0,0	0,0	76,2%	-0,09	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	3,2%	21,6%	0,0	0,0	75,2%	0,17	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,5%	0,0	0,0	78,8%	0,58	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	3,9%	21,2%	0,0	0,0	74,9%	-0,06	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	1,8%	22,4%	0,0	0,0	75,8%	0,04	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	3,4%	20,9%	0,0	0,0	75,7%	-5,84	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	3,3%	20,8%	0,0	0,0	75,9%	0,40	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	5,3%	16,9%	0,0	0,0	77,8%	-0,32	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	2,7%	19,8%	0,0	0,0	77,5%	0,09	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	4,3%	18,7%	0,0	0,0	77,0%	0,21	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	2,2%	18,9%	0,0	0,0	78,9%	0,06	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	5,0%	16,5%	0,0	0,0	78,5%	-0,08	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	2,0%	23,5%	0,0	0,0	74,5%	0,04	
	PMG-103	0,0%	0,0%	2,0%	19,2%	0,0	0,0	78,8%	-0,06	
	PMG-104	0,0%	0,0%	5,6%	23,9%	0,0	0,0	70,5%	-0,06	
	PMG-105	0,0%	0,0%	7,7%	16,4%	0,0	0,0	75,9%	-0,25	
	PMG-106	0,0%	0,0%	4,7%	24,2%	0,0	0,0	71,1%	-0,77	
	PMG-107	0,0%	0,0%	4,3%	24,1%	0,0	0,0	71,6%	0,06	
	PMG-108	0,0%	0,0%	2,5%	21,5%	0,0	0,0	76,0%	0,67	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	4,0%	19,2%	0,0	1,0	76,8%	-0,04	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	5,1%	16,0%	0,0	0,0	78,9%	-0,03	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,62	
	PMG-110 B	0,1%	0,1%	7,8%	11,2%	0,0	0,0	80,7%	2,69	A
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	1,6%	14,4%	0,0	0,0	84,0%	-0,59	
	PMG-111 B	0,0%	0,0%	1,4%	21,9%	0,0	0,0	76,7%	-1,00	
	PMG-112	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	0,0	0,0	79,2%	0,03	
Guarda Universitário	PMG-116 A	0,0%	0,0%	1,9%	22,6%	0,0	0,0	75,5%	0,06	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	2,9%	19,7%	0,0	0,0	77,4%	0,07	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	2,9%	22,5%	0,0	0,0	74,6%	0,04	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	7,1%	17,4%	0,0	0,0	75,5%	-0,06	
	PMG-118 A	0,0%	0,0%	2,9%	17,3%	0,0	0,0	79,8%	0,99	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	5,4%	19,9%	0,0	0,0	74,7%	-1,03	
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	2,5%	18,0%	0,0	0,0	79,5%	0,32	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	3,5%	18,4%	0,0	1,0	78,1%	-0,02	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	5,7%	17,8%	0,0	0,0	76,4%	4,38	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	4,0%	22,5%	0,0	0,0	73,5%	-0,32	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,9%	23,1%	0,0	0,0	76,0%	-0,17	
Transportes	PMG-120 C	0,0%	0,0%	1,5%	21,7%	0,0	0,0	76,7%	0,34	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	1,8%	23,1%	0,0	0,0	75,1%	0,57	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	1,3%	17,9%	0,0	0,0	80,8%	-2,09	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	1,2%	23,4%	0,0	0,0	75,4%	0,06	
	PMG-122 B	0,7%	0,8%	0,6%	21,4%	0,0	0,0	77,3%	0,08	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	2,1%	17,0%	0,0	0,0	80,9%	0,19	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	1,9%	20,7%	0,0	0,0	77,4%	0,08	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	2,0%	21,6%	0,0	0,0	76,4%	0,15	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	4,1%	18,6%	0,0	0,0	77,3%	-2,66	A

DATA		Semana 4: 24/04 a 28/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	10,7%	13,1%	0,0	0,0	76,2%	-0,01	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	11,6%	12,2%	0,0	0,0	76,2%	-0,14	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	6,1%	16,2%	0,0	0,0	77,7%	-0,03	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	7,3%	11,8%	0,0	0,0	80,9%	-0,01	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	2,3%	20,3%	0,0	0,0	77,4%	0,02	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	6,9%	17,4%	0,0	0,0	75,7%	-0,01	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	2,6%	18,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,07	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	0,9%	24,5%	0,0	0,0	74,6%	0,04	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,2%	0,0	0,0	77,7%	0,03	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	7,6%	13,7%	0,0	1,0	78,7%	0,09	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	3,7%	22,5%	1,0	0,0	73,8%	0,21	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	4,7%	18,7%	0,0	0,0	76,6%	0,06	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,3%	0,0	0,0	79,8%	0,03	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	6,0%	21,3%	0,0	0,0	72,7%	-0,02	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	3,5%	20,5%	0,0	0,0	76,0%	-0,05	
	PMG-114 B	37,2%	38,1%	10,8%	2,8%	0,0	0,0	49,2%	0,01	
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	2,0%	22,3%	0,0	0,0	75,7%	0,02	
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	6,9%	18,9%	0,0	0,0	74,2%	-0,04	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11 A	0,0%	0,0%	5,8%	21,1%	0,0	0,0	73,1%	-0,14	
	PMG-11 B	12,4%	13,8%	15,1%	4,7%	0,0	0,0	67,8%	-0,23	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	7,9%	16,6%	0,0	0,0	75,5%	0,03	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	4,0%	24,2%	0,0	0,0	71,6%	-0,04	A
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	6,1%	20,7%	0,0	0,0	73,2%	-0,47	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	8,5%	14,0%	0,0	0,0	77,5%	-0,05	
	PMG-14 A	0,0%	0,0%	6,7%	20,1%	0,0	0,0	73,2%	0,08	
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	11,4%	13,2%	0,0	0,0	75,4%	-0,21	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	2,5%	26,1%	0,0	0,0	71,4%	0,26	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	1,5%	19,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,14	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	2,2%	22,6%	0,0	0,0	75,2%	-0,08	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	3,1%	21,8%	0,0	0,0	75,1%	0,03	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	3,1%	23,1%	0,0	0,0	73,8%	0,01	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	5,0%	14,7%	0,0	0,0	80,3%	-0,12	
I-3 Auditórios	PMG-24 A	0,0%	0,0%	4,1%	20,9%	0,0	0,0	75,0%	-0,14	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	3,6%	22,3%	0,0	0,0	74,1%	-0,22	
	PMG-25 A	0,0%	0,0%	4,0%	17,7%	0,0	0,0	78,3%	0,02	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	5,4%	17,8%	0,0	0,0	76,8%	0,15	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	4,4%	20,1%	0,0	0,0	75,5%	0,06	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	6,8%	15,3%	0,0	0,0	77,9%	0,55	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	6,8%	21,7%	0,0	0,0	71,5%	0,06	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	12,0%	9,6%	1,0	0,0	78,4%	-0,31	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	5,7%	22,5%	0,0	0,0	71,8%	-0,28	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	15,7%	14,7%	0,0	0,0	69,6%	-0,02	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	2,9%	20,9%	0,0	0,0	76,2%	-0,09	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	3,8%	20,7%	0,0	0,0	75,5%	-0,01	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	1,4%	14,4%	0,0	0,0	84,2%	-0,19	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	4,1%	18,8%	0,0	0,0	77,1%	-0,03	
	PMG-45 A	0,0%	0,0%	3,4%	20,9%	0,0	0,0	75,7%	0,69	
	PMG-45 B	0,0%	0,0%	5,6%	16,4%	0,0	0,0	78,0%	-0,22	

DATA		Semana 4: 24/04 a 28/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	3,4%	24,4%	0,0	0,0	72,2%	0,05	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	12,1%	15,8%	0,0	0,0	72,1%	0,58	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	3,3%	24,2%	0,0	0,0	72,5%	0,14	
	PMG-31 B	0,1%	0,1%	4,5%	20,2%	0,0	0,0	75,1%	-0,41	A
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	4,4%	25,6%	0,0	0,0	70,0%	0,03	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	8,7%	17,1%	0,0	0,0	74,2%	0,01	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	4,6%	23,7%	0,0	0,0	71,7%	0,07	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	14,4%	5,2%	0,0	0,0	80,4%	0,31	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	2,3%	15,6%	0,0	0,0	82,1%	0,35	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	5,8%	17,5%	0,0	0,0	76,7%	0,12	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	1,3%	17,3%	0,0	0,0	81,4%	-0,14	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	8,3%	15,5%	0,0	0,0	76,2%	0,02	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	2,0%	23,6%	0,0	0,0	74,4%	0,08	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	15,8%	7,6%	0,0	0,0	76,6%	0,01	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	1,6%	20,3%	0,0	0,0	78,1%	0,06	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	5,2%	18,1%	0,0	0,0	76,7%	0,01	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	1,2%	25,1%	0,0	0,0	73,7%	-0,10	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	3,2%	23,0%	0,0	0,0	73,8%	0,37	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	3,5%	11,8%	0,0	0,0	84,7%	0,06	
	PMG-39 B	2,7%	3,5%	13,3%	4,9%	0,0	0,0	79,1%	0,01	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	5,0%	25,4%	0,0	0,0	69,6%	-0,04	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	4,3%	20,3%	0,0	0,0	75,4%	-0,09	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	4,1%	22,6%	0,0	0,0	73,3%	-0,01	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	4,3%	18,1%	0,0	0,0	77,6%	0,17	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	11,2%	11,7%	0,0	0,0	77,1%	0,13	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	14,2%	8,2%	1,0	0,0	77,6%	0,01	
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	4,6%	22,9%	0,0	0,0	72,5%	0,08	
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	3,8%	18,3%	0,0	0,0	77,9%	0,06	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	1,4%	26,0%	0,0	0,0	72,6%	-0,34	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	4,7%	19,9%	0,0	0,0	75,4%	0,29	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,9%	0,0	0,0	78,8%	0,38	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	9,2%	5,6%	1,0	0,0	85,0%	-0,91	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	1,8%	23,4%	0,0	0,0	74,8%	0,32	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	1,6%	19,8%	0,0	0,0	78,5%	0,59	A
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	3,5%	20,5%	0,0	0,0	76,0%	0,03	
	PMG-66 B	21,4%	22,6%	2,8%	8,7%	0,0	0,0	67,1%	-0,56	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	2,5%	18,6%	0,0	0,0	78,9%	0,03	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	6,4%	17,9%	0,0	0,0	75,7%	-0,32	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	1,8%	23,9%	0,0	0,0	74,3%	-0,21	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	3,7%	20,4%	0,0	0,0	75,9%	-0,01	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	4,0%	22,1%	0,0	0,0	73,9%	-0,21	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	9,6%	13,7%	0,0	0,0	76,7%	0,02	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	2,8%	20,9%	0,0	1,0	76,3%	0,03	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	1,7%	16,0%	0,0	0,0	82,3%	0,07	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	1,1%	26,1%	0,0	0,0	72,8%	0,07	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	0,6%	24,1%	0,0	0,0	75,3%	0,52	A
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	0,0	0,0	79,2%	0,05	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,1%	19,9%	0,0	0,0	80,0%	0,11	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,3%	0,0	0,0	79,9%	-0,02	
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	0,6%	23,2%	0,0	0,0	76,2%	-0,16	
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	3,0%	18,2%	0,0	0,0	78,8%	-0,73	
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	1,6%	16,6%	0,0	0,0	81,8%	-0,33	

DATA		Semana 4: 24/04 a 28/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5 % e 15 % ; maior que 15 % . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	4,9%	18,4%	0,0	0,0	76,7%	-0,04	
	PMG-46 B	3,7 %	4,3 %	14,7%	3,4%	0,0	0,0	78,2%	-0,43	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	5,1%	23,3%	0,0	0,0	71,6%	-0,25	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	9,6%	13,8%	0,0	0,0	76,6%	-0,31	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	5,4%	21,9%	0,0	0,0	72,7%	-0,01	
	PMG-48 B	33,4 %	33,4 %	5,1%	2,0%	0,0	0,0	59,1%	0,56	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	2,9%	21,6%	0,0	1,0	75,5%	0,67	
	PMG-49 B	31,6 %	31,7 %	9,0%	1,7%	0,0	0,0	57,5%	0,74	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	3,6%	21,2%	0,0	0,0	75,2%	0,79	
	PMG-50 B	2,8 %	3,1 %	14,5%	4,6%	0,0	0,0	78,1%	0,06	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	1,9%	15,2%	0,0	0,0	82,9%	0,01	
	PMG-51 B	17,8 %	21,4 %	7,3%	6,6%	0,0	0,0	68,3%	0,04	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	1,0%	24,3%	0,0	1,0	74,7%	0,04	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,9%	0,0	0,0	78,0%	0,01	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,4%	0,0	0,0	77,9%	0,42	
	PMG-53 B	0,1%	0,2%	10,4%	3,2%	0,0	0,0	86,3%	0,04	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	3,1%	23,9%	0,0	0,0	73,0%	0,09	
	PMG-54 B	11,7 %	12,6 %	13,5%	0,9%	0,0	0,0	73,9%	0,09	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	4,5%	19,4%	0,0	0,0	76,1%	0,06	
	PMG-55 B	15,6 %	22,4 %	0,2%	1,4%	0,0	0,0	82,8%	1,58	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	2,9%	22,0%	0,0	0,0	75,1%	-0,02	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	8,6%	19,4%	0,0	0,0	72,0%	0,03	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	4,4%	23,7%	0,0	0,0	71,9%	-0,03	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	9,9%	5,0%	0,0	0,0	85,1%	0,06	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,6%	23,5%	0,0	0,0	75,9%	0,42	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	7,3%	11,8%	0,0	0,0	80,9%	-0,08	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	2,4%	20,3%	0,0	0,0	77,3%	-0,06	
	PMG-59 B	11,5 %	14,9 %	14,5%	4,4%	1,0	0,0	69,6%	-0,88	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,9%	15,2%	0,0	0,0	82,9%	0,02	
	PMG-60 B	7,8 %	8,1 %	5,4%	5,6%	0,0	0,0	80,9%	0,43	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	2,4%	19,9%	0,0	0,0	77,7%	-0,03	
	PMG-61 B	7,2 %	7,9 %	8,1%	0,4%	0,0	0,0	84,3%	0,05	
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,9%	0,0	0,0	78,1%	-0,14	
	PMG-62 B	31,5 %	33,2 %	15,4%	5,5%	0,0	0,0	45,9%	2,04	E

DATA		Semana 4: 24/04 a 28/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	1,9%	21,0%	0,0	0,0	77,1%	0,38	
	PMG-01 B	0,1%	0,2%	17,6%	2,1%	0,0	0,0	80,0%	0,26	A
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	5,2%	20,8%	0,0	0,0	74,0%	0,02	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	3,5%	15,3%	0,0	0,0	81,2%	-0,58	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	5,4%	21,0%	0,0	0,0	73,6%	-0,57	
	PMG-03 B	0,2%	0,2%	5,0%	20,1%	0,0	0,0	74,7%	-1,22	A
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	3,7%	18,9%	0,0	0,0	77,4%	0,06	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	7,3%	14,6%	0,0	0,0	78,1%	0,28	A
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	4,6%	22,9%	0,0	0,0	72,5%	0,18	
	PMG-05 B	0,1%	0,1%	1,7%	20,8%	0,0	0,0	77,2%	0,24	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	2,3%	22,6%	0,0	0,0	75,1%	-0,07	
	PMG-06 B	51,4%	51,2%	10,9%	4,9%	0,0	0,0	32,7%	-1,23	E
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	1,8%	16,4%	0,0	0,0	81,8%	-0,43	
	PMG-07 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,1%	0,0	0,0	79,3%	-2,65	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	2,1%	20,8%	0,0	0,0	77,1%	-0,43	
	PMG-08 B	0,3%	0,6%	1,8%	17,9%	0,0	0,0	79,8%	-0,25	A
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	7,6%	17,1%	0,0	0,0	75,3%	0,04	
	PMG-09 B	0,2%	0,2%	2,9%	23,1%	0,0	0,0	73,6%	-1,47	A
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	3,8%	20,6%	0,0	0,0	75,6%	0,01	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	4,2%	18,8%	1,0	0,0	77,0%	1,31	A
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	3,1%	25,8%	0,0	0,0	71,1%	0,02	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	10,6%	13,4%	0,0	0,0	76,0%	-0,01	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	10,4%	16,7%	0,0	0,0	72,9%	0,15	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	13,2%	11,3%	0,0	0,0	75,5%	-0,07	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	3,1%	18,3%	0,0	0,0	78,6%	-0,09	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	7,3%	17,7%	0,0	0,0	75,0%	0,05	
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	7,1%	16,9%	0,0	0,0	76,0%	0,10	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	7,9%	19,5%	0,0	0,0	72,6%	-0,14	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	2,0%	21,4%	0,0	0,0	76,6%	0,91	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	1,8%	22,5%	0,0	0,0	75,7%	0,01	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	2,2%	20,8%	0,0	0,0	77,0%	0,01	
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	3,0%	0,4%	0,0	0,0	96,6%	0,06	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	3,8%	17,9%	0,0	0,0	78,3%	0,04	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	2,4%	19,5%	0,0	0,0	78,1%	0,38	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	1,8%	20,5%	0,0	0,0	77,7%	0,08	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	3,4%	18,3%	0,0	0,0	78,3%	0,02	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	5,4%	18,8%	0,0	0,0	75,8%	0,21	
	PMG-74 B	6,9%	7,8%	3,9%	15,5%	0,0	0,0	73,7%	-0,71	A
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	3,7%	17,9%	0,0	0,0	78,4%	-0,11	
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	2,8%	3,2%	0,0	0,0	94,0%	0,01	
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	2,9%	21,1%	0,0	0,0	76,0%	-0,17	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	7,0%	10,8%	0,0	0,0	82,2%	-0,03	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	8,1%	13,8%	0,0	0,0	78,1%	-0,25	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	17,0%	6,8%	0,0	0,0	76,2%	0,12	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	5,1%	20,8%	0,0	0,0	74,1%	0,04	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	14,8%	10,3%	0,0	0,0	74,9%	-0,06	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,5%	18,6%	0,0	0,0	80,9%	0,01	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	17,6%	2,9%	0,0	0,0	79,5%	-0,56	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	6,4%	14,3%	1,0	0,0	79,3%	-0,32	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	9,9%	16,1%	0,0	0,0	73,5%	-0,49	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	4,8%	15,5%	0,0	0,0	79,7%	0,04	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	16,7%	2,3%	0,0	0,0	81,0%	-0,14	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	2,3%	16,8%	0,0	1,0	80,9%	0,06	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	8,7%	14,1%	0,0	0,0	77,2%	-0,19	
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	2,9%	23,9%	0,0	0,0	73,2%	0,04	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	3,9%	20,9%	0,0	0,0	75,2%	-0,49	

DATA		Semana 4: 24/04 a 28/04								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	3,7%	17,7%	0,0	0,0	78,6%	0,03	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	3,3%	19,6%	0,0	0,0	77,1%	0,08	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,3%	19,5%	0,0	0,0	80,2%	0,13	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	3,8%	20,2%	0,0	0,0	76,0%	-0,06	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	1,5%	24,4%	0,0	0,0	74,1%	-0,14	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	3,9%	20,5%	0,0	0,0	75,6%	-0,21	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	2,5%	19,6%	0,0	0,0	77,9%	0,09	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	5,2%	15,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,02	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	3,0%	21,0%	0,0	0,0	76,0%	-0,05	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	3,9%	19,7%	0,0	0,0	76,4%	-0,09	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	1,4%	16,9%	0,0	0,0	81,7%	-0,16	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	5,6%	17,5%	0,0	0,0	76,9%	0,06	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	2,1%	21,5%	0,0	0,0	76,4%	-0,66	
	PMG-103	0,0%	0,0%	1,4%	20,2%	0,0	0,0	78,4%	0,01	
	PMG-104	0,0%	0,0%	5,8%	24,0%	0,0	0,0	70,2%	0,07	
	PMG-105	0,0%	0,0%	7,4%	16,7%	0,0	0,0	75,9%	-0,30	
	PMG-106	0,0%	0,0%	4,3%	24,7%	0,0	0,0	71,0%	-0,18	
	PMG-107	0,0%	0,0%	4,8%	23,3%	0,0	0,0	71,9%	0,11	
	PMG-108	0,0%	0,0%	2,1%	22,5%	0,0	0,0	75,4%	0,02	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	4,1%	18,7%	0,0	1,0	77,2%	-0,06	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	5,4%	18,0%	0,0	0,0	76,6%	-0,58	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,1%	0,0	0,0	79,7%	0,03	
	PMG-110 B	2,1%	3,6%	7,3%	12,2%	0,0	0,0	78,4%	0,19	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	1,2%	16,4%	0,0	0,0	82,4%	-0,62	
	PMG-111 B	0,0%	0,0%	1,0%	23,9%	0,0	0,0	75,1%	-0,21	
	PMG-112	0,0%	0,0%	0,6%	21,7%	0,0	0,0	77,7%	0,05	
Guarda Universitário	PMG-116 A	0,0%	0,0%	1,7%	21,6%	0,0	0,0	76,7%	0,32	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	2,8%	19,2%	0,0	0,0	78,0%	0,04	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	2,4%	21,5%	0,0	0,0	76,1%	-0,01	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	6,5%	17,8%	0,0	0,0	75,7%	-0,06	
	PMG-118 A	0,0%	0,0%	3,2%	17,8%	0,0	0,0	79,0%	0,36	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	5,3%	17,9%	0,0	0,0	76,8%	-0,43	
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	2,2%	20,0%	0,0	0,0	77,8%	0,13	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	4,0%	16,3%	0,0	1,0	79,7%	-0,10	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	6,5%	20,2%	0,0	0,0	73,3%	0,85	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	4,2%	20,2%	0,0	0,0	75,6%	-0,35	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,7%	25,8%	0,0	0,0	73,5%	-0,25	
Transportes	PMG-120 C	0,0%	0,0%	1,3%	24,5%	0,0	0,0	73,9%	-2,36	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	1,3%	24,1%	0,0	0,0	74,6%	0,09	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	0,7%	18,9%	0,0	0,0	80,4%	-0,13	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	1,3%	25,4%	0,0	0,0	73,3%	-0,26	
	PMG-122 B	1,1%	1,2%	0,1%	22,4%	0,0	0,0	76,4%	-0,21	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	2,2%	17,2%	0,0	0,0	80,6%	-0,03	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	1,4%	21,6%	0,0	0,0	77,0%	0,23	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	2,3%	22,6%	0,0	0,0	75,1%	-0,19	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	3,6%	20,6%	0,0	0,0	75,8%	0,08	

DATA		Semana 1: 02/05 a 05/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1	Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	7,7%	14,7%	0,0	0,0	77,6%	-0,02
		PMG-16 B	0,0%	0,0%	9,0%	12,6%	0,0	0,0	78,4%	0,04
		PMG-17 A	0,0%	0,0%	4,0%	17,5%	0,0	0,0	78,5%	0,42
		PMG-17 B	0,0%	0,0%	7,0%	12,9%	0,0	0,0	80,1%	0,00
		PMG-18 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,7%	0,0	0,0	77,3%	-0,04
		PMG-18 B	0,0%	0,0%	3,8%	18,1%	0,0	0,0	78,1%	0,04
		PMG-20 A	0,0%	0,0%	2,2%	22,3%	0,0	0,0	75,5%	0,12
		PMG-20 B	0,0%	0,0%	0,6%	21,7%	0,0	0,0	77,7%	0,04
		PMG-22 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,7%	0,0	0,0	77,3%	0,14
		PMG-22 B	0,0%	0,0%	5,8%	15,7%	0,0	0,0	78,5%	0,06
		PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,2%	23,3%	0,0	0,0	75,5%	-0,01
		PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,8%	20,5%	0,0	1,0	77,7%	0,06
		PMG-113 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,4%	0,0	0,0	77,5%	-0,01
		PMG-113 B	0,0%	0,0%	2,2%	19,8%	0,0	0,0	78,0%	0,07
		PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,9%	0,0	0,0	77,3%	-0,01
		PMG-114 B	27,8%	33,5%	1,2%	21,2%	0,0	0,0	49,8%	0,05
		PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,8%	22,1%	0,0	0,0	77,1%	-0,03
		PMG-115 B	0,0%	0,0%	3,2%	18,9%	0,0	0,0	77,9%	-0,15
Edifício I-1	Parte 2	PMG-11 A	0,0%	0,0%	3,5%	18,5%	0,0	0,0	78,0%	-0,02
		PMG-11 B	10,8%	11,6%	14,0%	1,9%	0,0	0,0	73,3%	0,10
		PMG-12 A	0,0%	0,0%	5,7%	16,3%	0,0	0,0	78,0%	0,08
		PMG-12 B	0,0%	0,0%	5,6%	14,9%	0,0	0,0	79,5%	-0,16
		PMG-13 A	0,0%	0,0%	4,5%	17,4%	0,0	0,0	78,1%	0,04
		PMG-13 B	0,0%	0,0%	4,4%	17,0%	0,0	0,0	78,6%	0,13
		PMG-14 A	0,0%	0,0%	4,8%	16,3%	0,0	0,0	78,9%	1,31
		PMG-14 B	0,0%	0,0%	9,3%	10,6%	0,0	0,0	80,1%	0,04
		PMG-15 A	0,0%	0,0%	1,6%	21,4%	0,0	0,0	77,0%	9,94
		PMG-15 B	0,0%	0,0%	1,1%	21,6%	0,0	0,0	77,3%	0,28
		PMG-19 A	0,0%	0,0%	0,9%	21,1%	0,0	0,0	78,0%	0,03
		PMG-19 B	0,0%	0,0%	1,6%	20,0%	0,0	0,0	78,4%	0,13
		PMG-21 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,6%	0,0	0,0	77,3%	-0,02
		PMG-21 B	0,0%	0,0%	1,1%	21,6%	0,0	0,0	77,3%	0,08
I-3 Auditórios		PMG-24 A	0,0%	0,0%	2,3%	18,9%	0,0	0,0	78,8%	0,04
		PMG-24 B	0,0%	0,0%	3,2%	17,5%	0,0	0,0	79,3%	0,04
		PMG-25 A	0,0%	0,0%	2,8%	19,5%	0,0	0,0	77,7%	0,04
		PMG-25 B	0,0%	0,0%	10,0%	11,9%	0,0	1,0	78,1%	0,03
		PMG-26 A	0,0%	0,0%	1,2%	21,1%	0,0	0,0	77,7%	0,08
		PMG-26 B	0,0%	0,0%	2,4%	19,7%	0,0	0,0	77,9%	-0,01
		PMG-27 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,7%	0,0	0,0	78,9%	0,01
		PMG-27 B	0,0%	0,0%	1,6%	19,1%	0,0	0,0	79,3%	-0,04
		PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,4%	19,2%	0,0	0,0	78,4%	0,13
		PMG-28 B	0,0%	0,0%	13,0%	9,5%	0,0	0,0	77,5%	0,04
		PMG-29 A	0,0%	0,0%	2,0%	20,0%	0,0	0,0	78,0%	0,09
		PMG-29 B	0,0%	0,0%	3,2%	18,5%	0,0	0,0	78,3%	0,05
		PMG-44 A	0,0%	0,0%	2,4%	19,8%	0,0	0,0	77,8%	0,12
		PMG-44 B	0,0%	0,0%	3,1%	19,1%	0,0	0,0	77,8%	0,04
		PMG-45 A	0,0%	0,0%	1,4%	21,3%	0,0	0,0	77,3%	0,12
		PMG-45 B	0,0%	0,0%	6,0%	15,7%	0,0	0,0	78,3%	0,11

DATA		Semana 1: 02/05 a 05/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,1%	0,0	0,0	77,9%	0,12	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	7,0%	13,2%	0,0	0,0	79,8%	0,10	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	1,3%	21,3%	0,0	0,0	77,4%	0,08	
	PMG-31 B	0,3%	0,3%	1,4%	18,7%	0,0	0,0	79,6%	3,28	A
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	1,3%	21,2%	0,0	0,0	77,5%	0,04	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	6,3%	15,1%	2,0	0,0	78,6%	0,03	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	1,6%	21,1%	0,0	0,0	77,3%	0,03	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	12,1%	7,6%	0,0	0,0	80,3%	0,05	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	1,7%	21,0%	0,0	0,0	77,3%	0,27	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	4,4%	17,6%	0,0	0,0	78,0%	0,03	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,4%	0,0	0,0	77,5%	0,02	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	8,2%	11,4%	0,0	0,0	80,4%	-0,05	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,3%	0,0	0,0	77,9%	-0,05	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	10,2%	10,3%	0,0	0,0	79,5%	0,05	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,9%	21,0%	0,0	0,0	78,1%	0,11	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	4,7%	18,8%	0,0	0,0	76,5%	0,02	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,0%	0,0	0,0	77,9%	0,09	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,8%	20,7%	0,0	0,0	77,5%	0,08	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	1,5%	21,0%	0,0	0,0	77,5%	0,16	
	PMG-39 B	2,9%	3,5%	8,4%	9,0%	0,0	0,0	79,7%	0,08	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,9%	21,3%	0,0	0,0	77,8%	0,21	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	2,1%	20,3%	0,0	0,0	77,6%	0,05	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	0,0	0,0	78,6%	-0,02	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,9%	21,6%	0,0	0,0	77,5%	0,05	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,1%	0,0	0,0	78,1%	0,03	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	8,7%	12,3%	0,0	0,0	79,0%	0,09	
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	1,2%	21,0%	1,0	0,0	77,8%	0,30	
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	1,5%	21,0%	1,0	0,0	77,5%	0,09	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,1%	1,0	0,0	78,2%	-0,06	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	4,0%	17,8%	0,0	0,0	78,2%	-0,08	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	1,2%	21,7%	0,0	0,0	77,1%	0,16	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	6,6%	1,5%	0,0	0,0	91,6%	7,55	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,7%	0,0	0,0	77,2%	0,30	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	5,0%	15,8%	0,0	0,0	79,2%	0,12	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	2,1%	21,0%	0,0	0,0	76,9%	-0,03	
	PMG-66 B	0,0%	0,1%	1,5%	21,1%	0,0	0,0	77,2%	3,72	A
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,7%	0,0	1,0	77,6%	0,30	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	3,0%	19,6%	0,0	0,0	77,4%	0,19	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,7%	0,0	0,0	77,3%	0,04	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	2,4%	19,6%	0,0	0,0	78,0%	-0,09	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	1,3%	21,0%	0,0	0,0	77,7%	-0,08	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	3,5%	18,8%	0,0	0,0	77,7%	-0,06	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	1,2%	21,5%	0,0	0,0	77,3%	0,08	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	4,5%	17,0%	0,0	0,0	78,5%	0,09	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,5%	0,0	0,0	77,4%	0,09	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	4,0%	19,0%	0,0	0,0	77,0%	0,18	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	1,3%	21,4%	0,0	0,0	77,3%	0,09	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	1,4%	21,2%	0,0	0,0	77,4%	-0,12	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,9%	22,0%	0,0	0,0	77,1%	0,48	
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	1,9%	20,2%	0,0	0,0	77,9%	0,14	
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	1,5%	21,0%	0,0	0,0	77,5%	0,14	
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	3,7%	17,3%	0,0	0,0	79,0%	0,16	

DATA		Semana 1: 02/05 a 05/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5 % e 15 % ; maior que 15 % . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	2,6%	19,6%	0,0	0,0	77,8%	0,13	
	PMG-46 B	3,7 %	4,6 %	13,0%	8,3%	0,0	0,0	75,0%	-0,12	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,0%	0,0	0,0	78,0%	-0,10	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	6,4%	14,0%	0,0	0,0	79,6%	-0,06	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,0%	0,0	0,0	78,8%	0,09	
	PMG-48 B	35,6 %	35,5 %	5,1%	3,0%	0,0	0,0	56,1%	9,54	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,8%	0,0	0,0	78,0%	0,34	
	PMG-49 B	33,1 %	33,2 %	10,9%	2,3%	0,0	0,0	53,7%	6,55	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,2%	0,0	0,0	77,8%	0,15	
	PMG-50 B	1,6 %	2,1 %	14,0%	2,4%	0,0	0,0	82,0%	0,14	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	1,8%	20,4%	0,0	0,0	77,8%	0,08	
	PMG-51 B	17,5 %	18,9 %	7,0%	15,0%	0,0	0,0	60,5%	0,14	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,6%	0,0	0,0	77,3%	-0,11	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	1,3%	21,2%	0,0	0,0	77,5%	-0,05	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,6%	0,0	1,0	77,4%	0,10	
	PMG-53 B	0,0%	0,0%	9,0%	3,1%	0,0	0,0	87,9%	0,16	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,4%	0,0	0,0	77,6%	-0,01	
	PMG-54 B	12,1 %	9,8 %	0,5%	21,9%	0,0	0,0	65,1%	-0,12	A
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	2,6%	20,4%	0,0	0,0	77,0%	0,20	
	PMG-55 B	33,6 %	39,5 %	11,9%	1,3%	0,0	0,0	53,2%	0,28	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	1,5%	21,0%	0,0	0,0	77,5%	0,16	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	5,7%	15,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,13	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,6%	0,0	0,0	77,4%	-0,15	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	13,8%	1,4%	0,0	0,0	84,8%	0,17	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,0%	0,0	0,0	78,2%	0,04	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	4,6%	18,2%	0,0	0,0	77,2%	0,14	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,8%	0,0	0,0	77,4%	-0,14	
	PMG-59 B	6,7 %	7,9 %	10,9%	11,3%	0,0	0,0	71,1%	-0,18	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,8%	0,0	0,0	77,2%	0,11	
	PMG-60 B	6,9 %	7,0 %	4,7%	1,4%	0,0	0,0	86,8%	4,54	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,6%	0,0	0,0	77,4%	0,09	
	PMG-61 B	8,1 %	9,6 %	13,1%	4,3%	0,0	0,0	74,5%	0,15	
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,0%	0,0	0,0	78,0%	0,13	
	PMG-62 B	33,6 %	33,6 %	12,8%	4,6%	0,0	0,0	49,0%	3,66	E

DATA		Semana 1: 02/05 a 05/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,5%	0,0	0,0	77,8%	0,02	
	PMG-01 B	0,2%	0,2%	12,5%	11,1%	0,0	0,0	76,2%	-0,16	A
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,6%	0,0	0,0	77,4%	-0,01	
	PMG-02 B	0,1%	0,1%	0,8%	21,2%	0,0	0,0	77,9%	1,03	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,0%	0,0	0,0	79,0%	0,04	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,1%	0,0	0,0	77,6%	2,21	A
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	1,2%	21,4%	0,0	1,0	77,4%	-0,13	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	0,8%	21,8%	0,0	0,0	77,4%	-0,72	A
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,6%	0,0	0,0	77,6%	0,02	
	PMG-05 B	0,0%	0,0%	0,8%	21,4%	0,0	0,0	77,8%	-0,02	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,8%	0,0	0,0	78,2%	-0,01	
	PMG-06 B	59,4%	59,4%	8,2%	6,3%	0,0	0,0	26,1%	15,62	E
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,9%	21,2%	0,0	0,0	77,9%	-0,01	
	PMG-07 B	0,1%	0,1%	0,6%	21,1%	0,0	0,0	78,1%	-0,19	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	1,8%	21,0%	0,0	0,0	77,2%	0,12	
	PMG-08 B	0,3%	0,7%	11,0%	6,9%	1,0	0,0	81,8%	-0,01	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	7,8%	15,7%	0,0	0,0	76,5%	0,16	
	PMG-09 B	0,2%	0,2%	0,6%	21,0%	0,0	0,0	78,0%	-1,94	A
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	2,1%	20,1%	0,0	0,0	77,8%	0,16	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	1,5%	20,4%	0,0	0,0	77,9%	-0,39	A
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,3%	0,0	0,0	77,6%	0,21	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	7,6%	13,6%	0,0	0,0	78,8%	0,09	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	5,0%	16,7%	0,0	0,0	78,3%	0,10	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	9,0%	10,4%	0,0	0,0	80,6%	0,04	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	3,0%	20,2%	1,0	0,0	76,8%	0,31	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	5,0%	17,0%	0,0	0,0	78,0%	0,13	
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	1,3%	21,2%	0,0	0,0	77,5%	-0,06	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	4,0%	17,3%	0,0	0,0	78,7%	0,08	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,3%	0,0	0,0	77,6%	-0,06	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	1,9%	17,8%	0,0	0,0	80,3%	-0,02	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	1,6%	21,1%	0,0	0,0	77,3%	-0,01	
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	2,8%	1,5%	0,0	0,0	95,7%	-0,04	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,4%	0,0	0,0	77,5%	0,13	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,7%	17,5%	0,0	0,0	80,8%	0,02	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,4%	0,0	0,0	77,6%	0,12	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	1,1%	20,5%	0,0	0,0	78,4%	0,31	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,3%	0,0	0,0	78,4%	0,06	
	PMG-74 B	7,8%	9,4%	1,5%	0,9%	0,0	0,0	89,8%	0,08	
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	1,8%	20,8%	0,0	0,0	77,4%	0,86	
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	5,8%	3,2%	0,0	0,0	91,0%	0,09	
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,3%	0,0	0,0	77,7%	0,93	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	3,0%	15,2%	0,0	0,0	81,8%	0,05	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	13,2%	8,8%	0,0	0,0	78,0%	0,11	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	18,4%	7,0%	0,0	0,0	74,6%	0,05	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	6,3%	14,3%	0,0	0,0	79,4%	0,09	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	7,5%	13,4%	0,0	0,0	79,1%	0,08	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,4%	0,0	0,0	77,5%	0,14	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	16,0%	4,7%	0,0	0,0	79,3%	0,19	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	12,8%	15,1%	0,0	0,0	72,1%	0,05	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	12,7%	8,6%	0,0	0,0	78,5%	0,06	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,5%	0,0	0,0	77,7%	0,06	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	8,1%	8,8%	0,0	0,0	83,1%	0,10	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	1,3%	21,2%	0,0	0,0	77,5%	0,16	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	13,3%	5,5%	0,0	0,0	81,2%	0,09	
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	1,9%	21,6%	0,0	0,0	76,5%	0,08	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	2,5%	19,6%	0,0	0,0	77,9%	0,03	

DATA		Semana 1: 02/05 a 05/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	1,3%	21,1%	0,0	0,0	77,6%	0,09	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	1,5%	20,5%	0,0	0,0	78,0%	0,10	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	1,3%	21,1%	0,0	0,0	77,6%	0,04	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	3,3%	17,7%	0,0	0,0	79,0%	0,09	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,5%	0,0	0,0	77,4%	0,16	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	2,5%	19,1%	0,0	0,0	78,4%	0,10	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,5%	0,0	0,0	77,4%	0,04	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	3,1%	17,5%	0,0	0,0	79,4%	0,05	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,5%	0,0	0,0	77,4%	0,12	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	3,5%	18,3%	0,0	0,0	78,2%	0,10	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	1,3%	21,3%	0,0	0,0	77,4%	0,30	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	2,3%	19,1%	0,0	0,0	78,6%	0,10	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,9%	21,5%	0,0	0,0	77,6%	0,09	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,9%	21,5%	0,0	0,0	77,6%	0,08	
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,9%	21,5%	0,0	0,0	77,6%	0,10	
	PMG-105	0,0%	0,0%	3,7%	16,1%	0,0	0,0	80,2%	0,52	
	PMG-106	0,0%	0,0%	1,1%	21,1%	0,0	0,0	77,8%	0,08	
	PMG-107	0,0%	0,0%	1,3%	21,3%	0,0	0,0	77,4%	0,05	
	PMG-108	0,0%	0,0%	1,1%	21,5%	0,0	0,0	77,4%	0,09	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	0,9%	21,3%	0,0	0,0	77,8%	0,04	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	2,7%	19,1%	0,0	0,0	78,2%	0,04	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,9%	21,3%	0,0	0,0	77,8%	0,04	
	PMG-110 B	6,7%	9,1%	12,3%	9,5%	0,0	0,0	71,5%	0,16	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,6%	18,5%	0,0	0,0	80,9%	-0,34	
Guarda Universitário	PMG-111 B	0,0%	0,0%	1,1%	18,3%	0,0	0,0	80,6%	0,16	
	PMG-112	0,0%	0,0%	1,1%	21,3%	0,0	0,0	77,6%	0,11	
	PMG-116 A	0,0%	0,0%	0,9%	18,5%	0,0	0,0	80,6%	-0,16	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	0,9%	18,4%	0,0	0,0	80,7%	0,13	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	0,6%	18,7%	0,0	0,0	80,7%	0,15	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	0,8%	18,8%	0,0	0,0	80,4%	0,11	
Portaria P3	PMG-118 A	0,0%	0,0%	0,7%	18,7%	0,0	0,0	80,6%	-0,08	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	0,9%	18,3%	0,0	0,0	80,8%	0,04	
	PMG-119 A	0,0%	0,0%	1,1%	18,4%	0,0	0,0	80,5%	0,08	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,8%	18,6%	0,0	0,0	80,6%	0,37	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	1,1%	18,3%	0,0	0,0	80,6%	-0,50	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,7%	18,5%	0,0	0,0	80,8%	0,02	
Transportes	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,8%	18,3%	0,0	0,0	80,9%	0,02	
	PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,8%	18,2%	0,0	0,0	80,8%	-0,57	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	1,4%	16,3%	0,0	0,0	82,3%	-0,01	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	14,0%	1,9%	0,0	0,0	84,1%	0,04	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	1,4%	21,1%	0,0	0,0	77,5%	0,13	
	PMG-122 B	0,2%	0,4%	12,6%	2,9%	0,0	0,0	84,3%	0,09	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,7%	0,0	0,0	77,9%	0,03	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	14,3%	4,3%	0,0	0,0	81,4%	0,09	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,5%	0,0	0,0	77,7%	0,16	
	PMG-124 B	0,1%	0,1%	12,1%	5,5%	0,0	0,0	82,3%	-0,56	

DATA		Semana 2: 08/05 a 12/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	8,1%	13,5%	0,0	0,0	78,4%	-0,02	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	8,5%	13,4%	0,0	0,0	78,1%	-0,06	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	3,8%	16,4%	0,0	0,0	79,8%	0,31	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	6,7%	11,9%	0,0	0,0	81,4%	0,33	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,6%	22,7%	0,0	0,0	76,7%	0,09	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	3,6%	20,1%	0,0	0,0	76,3%	-0,19	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	1,7%	23,3%	0,0	0,0	75,0%	0,02	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	0,2%	23,7%	0,0	0,0	76,1%	0,08	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,7%	24,7%	0,0	0,0	74,6%	-0,45	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	5,3%	17,7%	0,0	0,0	77,0%	0,19	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	2,1%	24,3%	0,0	0,0	73,6%	-0,23	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	2,2%	19,5%	0,0	1,0	78,3%	-0,23	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,8%	22,4%	0,0	0,0	76,8%	-0,36	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,7%	21,8%	0,0	0,0	76,5%	-0,21	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,2%	22,9%	0,0	0,0	76,9%	0,29	
	PMG-114 B	23,6%	23,6%	1,0%	19,2%	0,0	0,0	56,2%	-0,44	
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,5%	22,9%	0,0	0,0	76,6%	0,06	
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	3,7%	19,8%	0,0	0,0	76,5%	0,33	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11 A	0,0%	0,0%	2,7%	20,0%	0,0	0,0	77,3%	0,20	
	PMG-11 B	13,4%	15,1%	13,9%	2,9%	0,0	0,0	69,8%	0,40	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	6,2%	17,3%	0,0	0,0	76,5%	-0,48	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	4,7%	15,9%	0,0	0,0	79,4%	0,30	
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	4,3%	19,4%	0,0	0,0	76,3%	-0,19	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	3,9%	15,0%	0,0	0,0	81,1%	0,34	
	PMG-14 A	0,0%	0,0%	4,4%	19,3%	0,0	0,0	76,3%	-0,43	
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	9,2%	11,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,24	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	1,3%	23,4%	0,0	0,0	75,3%	0,60	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,6%	0,0	0,0	78,8%	-0,19	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	1,7%	23,1%	0,0	0,0	75,2%	0,05	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	1,4%	21,0%	0,0	0,0	77,6%	0,24	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	0,6%	23,6%	0,0	0,0	75,8%	-0,19	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	0,7%	19,6%	0,0	0,0	79,7%	-0,21	
I-3 Auditórios	PMG-24 A	0,0%	0,0%	2,2%	19,9%	0,0	0,0	77,9%	-0,20	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	2,9%	19,5%	0,0	0,0	77,6%	0,12	
	PMG-25 A	0,0%	0,0%	2,3%	18,5%	0,0	0,0	79,2%	0,36	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	9,1%	13,9%	0,0	1,0	77,0%	-0,02	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,2%	0,0	0,0	78,9%	-0,18	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	1,9%	18,5%	0,0	0,0	79,6%	-0,01	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	2,2%	20,9%	0,0	0,0	76,9%	0,09	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	1,4%	20,2%	0,0	0,0	78,4%	0,42	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,6%	22,2%	0,0	0,0	75,2%	0,06	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	13,8%	11,5%	0,0	0,0	74,7%	-0,08	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	1,9%	21,0%	0,0	0,0	77,1%	-0,13	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	2,8%	20,5%	0,0	0,0	76,7%	-0,18	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	1,9%	20,8%	0,0	0,0	77,3%	-0,25	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	2,5%	17,3%	0,0	0,0	80,2%	-0,55	
	PMG-45 A	0,0%	0,0%	1,3%	22,3%	0,0	0,0	76,4%	0,03	
	PMG-45 B	0,0%	0,0%	5,4%	17,7%	0,0	0,0	76,9%	0,12	

DATA		Semana 2: 08/05 a 12/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	0,9%	24,1%	0,0	0,0	75,0%	0,39	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	7,4%	15,2%	0,0	0,0	77,4%	-0,35	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	1,2%	24,3%	0,0	0,0	74,5%	0,03	
	PMG-31 B	0,1%	0,1%	0,9%	16,7%	0,0	0,0	82,1%	-1,49	A
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	0,8%	24,2%	0,0	0,0	75,0%	-0,28	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	5,5%	18,1%	2,0	0,0	76,4%	-0,01	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	2,0%	23,1%	0,0	0,0	74,9%	0,41	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	11,6%	4,6%	0,0	0,0	83,8%	0,01	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	1,1%	22,2%	0,0	0,0	76,7%	0,02	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	4,6%	18,5%	0,0	0,0	76,9%	0,06	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0,0	0,0	78,7%	-0,21	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	7,8%	13,4%	0,0	0,0	78,8%	0,36	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,6%	24,3%	0,0	0,0	75,1%	0,04	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	10,1%	11,3%	0,0	0,0	78,6%	0,14	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,4%	23,0%	0,0	0,0	76,6%	-0,14	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	4,1%	15,8%	0,0	0,0	80,1%	0,09	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	1,2%	23,0%	0,0	0,0	75,8%	0,24	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	2,0%	21,7%	0,0	0,0	76,3%	0,10	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	2,0%	19,0%	0,0	0,0	79,0%	-0,01	
	PMG-39 B	3,7%	4,3%	8,0%	12,0%	0,0	0,0	76,3%	-0,26	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,8%	23,3%	0,0	0,0	75,9%	0,25	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	2,3%	22,3%	0,0	0,0	75,4%	0,25	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	0,6%	22,6%	0,0	0,0	76,8%	0,33	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	0,0	0,0	78,6%	-0,01	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	0,5%	22,1%	0,0	0,0	77,4%	-0,17	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	8,2%	11,3%	0,0	0,0	80,5%	-0,25	
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	0,9%	22,0%	1,0	0,0	77,1%	-0,01	
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	1,0%	19,0%	1,0	0,0	80,0%	0,02	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,2%	24,1%	1,0	0,0	75,7%	0,03	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	3,1%	19,8%	0,0	0,0	77,1%	0,04	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	1,1%	22,7%	0,0	0,0	76,2%	0,02	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	7,1%	0,5%	0,0	0,0	92,2%	-0,57	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	1,7%	23,7%	0,0	0,0	74,6%	-0,06	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	5,1%	16,8%	0,0	0,0	78,1%	-2,14	
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	2,0%	20,0%	0,0	0,0	78,0%	-0,27	
	PMG-66 B	0,2%	0,2%	1,2%	22,5%	0,0	0,0	76,0%	5,12	A
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	1,0	78,8%	0,37	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	2,8%	18,6%	0,0	0,0	78,6%	0,02	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	0,5%	23,7%	0,0	0,0	75,8%	0,13	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	2,8%	21,6%	0,0	0,0	75,6%	0,13	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	1,1%	22,0%	0,0	0,0	76,9%	0,13	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	3,3%	20,8%	0,0	0,0	75,9%	-0,04	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,5%	0,0	0,0	79,5%	0,03	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	4,3%	14,0%	0,0	0,0	81,7%	-0,02	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,9%	23,5%	0,0	0,0	75,6%	0,01	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	3,5%	19,3%	0,0	0,0	77,2%	-0,03	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,9%	0,0	0,0	78,3%	0,01	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,8%	22,0%	0,0	0,0	77,2%	0,04	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,0%	0,0	0,0	78,2%	0,03	
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	1,4%	21,2%	0,0	0,0	77,4%	0,09	
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	2,1%	20,0%	0,0	0,0	77,9%	0,31	
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	3,6%	18,3%	0,0	0,0	78,1%	0,01	

DATA		Semana 2: 08/05 a 12/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	3,1%	21,6%	0,0	0,0	75,3%	-0,27	
	PMG-46 B	3,1%	3,9%	12,4%	9,3%	0,0	0,0	75,2%	-0,09	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,9%	24,0%	0,0	0,0	75,1%	0,09	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	5,9%	12,0%	0,0	0,0	82,1%	0,03	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	0,4%	21,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,01	
	PMG-48 B	32,5%	32,5%	5,6%	1,0%	0,0	0,0	60,9%	0,90	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	0,6%	22,3%	0,0	0,0	77,1%	-0,36	
	PMG-49 B	31,4%	31,5%	10,4%	3,5%	0,0	0,0	54,3%	1,24	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	1,5%	22,5%	0,0	0,0	76,0%	-0,47	
	PMG-50 B	0,2%	0,9%	14,6%	3,6%	0,0	0,0	81,6%	-0,06	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	1,9%	22,5%	0,0	0,0	75,6%	0,04	
	PMG-51 B	14,8%	15,6%	6,6%	12,0%	0,0	0,0	66,6%	-0,01	
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	1,0%	23,6%	0,0	0,0	75,4%	-0,26	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	1,2%	22,2%	0,0	0,0	76,6%	-0,01	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,6%	0,0	1,0	79,7%	0,35	
	PMG-53 B	0,0%	0,0%	8,5%	4,1%	0,0	0,0	87,4%	-0,02	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	0,4%	22,6%	0,0	0,0	77,0%	0,04	
	PMG-54 B	11,7%	12,6%	0,6%	20,9%	0,0	0,0	66,8%	-0,04	
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	2,4%	18,4%	0,0	0,0	79,2%	0,40	
	PMG-55 B	36,8%	37,9%	11,4%	2,4%	0,0	0,0	49,4%	0,02	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	0,6%	22,0%	0,0	0,0	77,4%	0,32	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	5,5%	17,6%	0,0	0,0	76,9%	-0,13	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,8%	22,6%	0,0	0,0	76,6%	0,01	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	13,3%	2,6%	0,0	0,0	84,1%	0,40	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,0%	22,3%	0,0	0,0	77,7%	-0,03	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	4,4%	17,0%	0,0	0,0	78,6%	0,25	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,6%	23,1%	0,0	0,0	76,3%	0,16	
	PMG-59 B	8,9%	10,5%	11,3%	13,3%	0,0	0,0	66,5%	0,02	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,1%	18,8%	0,0	0,0	80,1%	0,01	
	PMG-60 B	7,9%	8,1%	4,5%	3,4%	0,0	0,0	83,8%	0,77	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,3%	18,6%	0,0	0,0	80,1%	0,40	
	PMG-61 B	7,3%	10,4%	13,2%	2,3%	0,0	0,0	77,2%	0,29	
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	0,5%	20,0%	0,0	0,0	79,5%	0,27	
	PMG-62 B	37,8%	37,8%	12,5%	6,6%	0,0	0,0	42,9%	5,61	E

DATA		Semana 2: 08/05 a 12/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,5%	0,0	0,0	78,0%	-0,14	
	PMG-01 B	0,1%	0,2%	12,1%	12,1%	0,0	0,0	75,7%	0,60	A
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,9%	22,6%	0,0	0,0	76,5%	0,36	
	PMG-02 B	0,1%	0,1%	1,1%	19,2%	0,0	0,0	79,6%	0,57	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	1,5%	23,0%	0,0	0,0	75,5%	0,55	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,88	A
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	0,7%	23,4%	0,0	1,0	75,9%	0,01	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	0,2%	18,8%	0,0	0,0	81,0%	0,62	A
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	1,0%	23,6%	0,0	0,0	75,4%	-0,14	
	PMG-05 B	0,1%	0,1%	1,1%	20,4%	0,0	0,0	78,4%	0,58	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	1,4%	22,8%	0,0	0,0	75,8%	0,03	
	PMG-06 B	61,5%	61,5%	8,4%	7,8%	0,0	0,0	22,3%	17,40	E
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	1,4%	22,5%	0,0	0,0	76,1%	0,46	
	PMG-07 B	0,1%	0,1%	0,2%	23,1%	0,0	0,0	76,6%	2,24	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	1,9%	22,0%	0,0	0,0	76,1%	-0,16	
	PMG-08 B	0,5%	0,9%	11,3%	7,9%	1,0	0,0	80,3%	0,09	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	7,3%	17,7%	0,0	0,0	75,0%	0,01	
	PMG-09 B	0,3%	0,3%	0,2%	22,0%	0,0	0,0	76,5%	0,35	A
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	1,7%	21,1%	0,0	0,0	77,2%	0,06	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	1,1%	21,4%	0,0	0,0	77,5%	-0,29	A
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	1,0%	22,3%	0,0	0,0	76,7%	3,56	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	7,3%	14,6%	0,0	0,0	78,1%	0,33	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	5,5%	14,7%	0,0	0,0	79,8%	-0,15	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	9,9%	12,4%	0,0	0,0	77,7%	0,01	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	2,6%	17,2%	1,0	0,0	80,2%	0,14	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	5,2%	18,2%	0,0	0,0	76,6%	-0,01	
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	0,8%	23,2%	0,0	0,0	76,0%	-0,21	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	3,5%	17,9%	0,0	0,0	78,6%	0,01	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	1,7%	21,5%	0,0	0,0	76,8%	-0,16	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	1,8%	18,8%	0,0	0,0	79,4%	0,01	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	1,1%	22,1%	0,0	0,0	76,8%	0,05	
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	2,4%	1,5%	0,0	0,0	96,1%	0,06	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	1,0%	22,4%	0,0	0,0	76,6%	0,09	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,2%	19,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,11	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,5%	24,4%	0,0	0,0	75,1%	0,42	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	1,9%	22,5%	0,0	0,0	75,6%	0,04	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,3%	0,0	0,0	77,9%	-0,21	
	PMG-74 B	11,4%	11,5%	1,9%	2,9%	0,0	0,0	83,8%	0,91	
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,3%	0,0	0,0	78,8%	0,23	
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	5,4%	5,6%	0,0	0,0	89,0%	0,57	
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,7%	23,3%	0,0	0,0	76,0%	-0,27	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	2,5%	13,1%	0,0	0,0	84,4%	0,01	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	12,4%	10,0%	0,0	0,0	77,6%	-0,06	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	18,3%	5,6%	0,0	0,0	76,1%	0,46	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	6,1%	15,5%	0,0	0,0	78,4%	0,38	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	7,4%	15,4%	0,0	0,0	77,2%	0,12	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,5%	22,6%	0,0	0,0	76,9%	0,01	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	15,9%	2,6%	0,0	0,0	81,5%	0,12	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	13,2%	12,7%	0,0	0,0	74,1%	0,02	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	12,2%	10,6%	0,0	0,0	77,2%	-0,15	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	0,2%	18,5%	0,0	0,0	81,3%	-0,28	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	7,6%	10,0%	0,0	0,0	82,4%	0,20	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,1%	0,0	0,0	80,4%	0,15	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	12,9%	8,5%	0,0	0,0	78,6%	0,15	
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	1,7%	20,6%	0,0	0,0	77,7%	0,38	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	2,0%	20,6%	0,0	0,0	77,4%	0,04	

DATA		Semana 2: 08/05 a 12/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,1%	0,0	0,0	80,0%	0,39	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	1,6%	18,5%	0,0	0,0	79,9%	0,03	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	0,0	0,0	79,0%	0,47	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	3,2%	16,7%	0,0	0,0	80,1%	0,06	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	0,8%	23,5%	0,0	0,0	75,7%	0,20	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	3,0%	18,7%	0,0	0,0	78,3%	0,13	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,3%	0,0	0,0	79,4%	0,43	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	3,0%	16,1%	0,0	0,0	80,9%	-0,14	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	1,4%	22,7%	0,0	0,0	75,9%	0,29	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	3,1%	19,3%	0,0	0,0	77,6%	0,25	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,3%	0,0	0,0	80,2%	0,18	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	2,9%	20,1%	0,0	0,0	77,0%	0,40	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	1,0%	19,5%	0,0	0,0	79,5%	0,15	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,3%	22,5%	0,0	0,0	77,2%	0,27	
	PMG-104	0,0%	0,0%	1,1%	21,6%	0,0	0,0	77,3%	0,41	
	PMG-105	0,0%	0,0%	3,4%	16,4%	0,0	0,0	80,2%	0,04	
	PMG-106	0,0%	0,0%	0,7%	21,6%	0,0	0,0	77,7%	0,16	
	PMG-107	0,0%	0,0%	1,8%	20,5%	0,0	0,0	77,7%	0,01	
	PMG-108	0,0%	0,0%	0,7%	22,5%	0,0	0,0	76,8%	-0,15	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,8%	0,0	0,0	78,2%	0,06	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	3,0%	21,1%	0,0	0,0	75,9%	0,08	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0,0	0,0	79,0%	0,37	
	PMG-110 B	2,1%	3,2%	11,8%	10,5%	0,0	0,0	75,6%	0,06	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,5%	0,0	0,0	79,3%	-0,28	
	PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,3%	0,0	0,0	79,0%	-0,38	
	PMG-112	0,0%	0,0%	0,6%	23,3%	0,0	0,0	76,1%	-0,08	
Guarda Universitário	PMG-116 A	0,0%	0,0%	0,7%	17,5%	0,0	0,0	81,8%	0,11	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	0,8%	17,9%	0,0	0,0	81,3%	-0,32	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	0,1%	17,7%	0,0	0,0	82,2%	-0,32	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	0,2%	19,2%	0,0	0,0	80,6%	0,28	
	PMG-118 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,2%	0,0	0,0	79,8%	0,09	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	0,8%	16,3%	0,0	0,0	82,9%	-0,09	
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0,0	0,0	78,8%	-0,08	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	1,3%	16,5%	0,0	0,0	82,2%	0,24	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	0,1%	20,7%	0,0	0,0	77,4%	2,36	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	0,9%	16,2%	0,0	0,0	82,9%	-0,01	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,6%	21,0%	0,0	0,0	78,4%	0,09	
Transportes	PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,9%	21,0%	0,0	0,0	78,1%	-0,87	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	0,9%	17,3%	0,0	0,0	81,8%	0,43	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	13,4%	2,9%	0,0	0,0	83,7%	-0,11	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	1,5%	23,1%	0,0	0,0	75,4%	0,40	
	PMG-122 B	0,7%	1,1%	12,1%	3,9%	0,0	0,0	83,3%	0,56	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,9%	0,0	0,0	77,6%	0,31	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	13,8%	5,2%	0,0	0,0	81,0%	-0,04	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	1,1%	22,5%	0,0	0,0	76,4%	0,42	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	11,6%	7,5%	0,0	0,0	80,9%	0,07	

DATA		Semana 3: 15/05 a 19/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	7,7%	12,3%	0,0	0,0	80,0%	-0,07	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	9,0%	14,2%	0,0	0,0	76,8%	-0,12	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	4,0%	15,3%	0,0	0,0	80,7%	0,41	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	7,0%	10,9%	0,0	0,0	82,1%	0,63	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	1,0%	23,7%	0,0	0,0	75,3%	0,19	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	3,8%	22,1%	0,0	0,0	74,1%	-0,25	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	2,2%	24,3%	0,0	0,0	73,5%	-0,12	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	0,6%	25,7%	0,0	0,0	73,7%	-0,01	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	1,0%	27,7%	0,0	0,0	71,3%	-0,27	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	5,8%	19,7%	0,0	0,0	74,5%	0,30	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,2%	25,3%	0,0	0,0	73,5%	-0,17	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,8%	18,5%	0,0	0,0	79,7%	-0,18	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	1,1%	23,4%	0,0	0,0	75,5%	-0,32	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	2,2%	23,8%	0,0	0,0	74,0%	-0,29	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,8%	23,9%	1,0	0,0	75,3%	0,22	
	PMG-114 B	21,5%	22,1%	1,0%	17,2%	0,0	0,0	60,1%	-0,41	
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,8%	23,7%	0,0	0,0	75,5%	0,07	
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	3,2%	20,7%	0,0	0,0	76,1%	0,35	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11 A	0,0%	0,0%	3,5%	21,5%	0,0	0,0	75,0%	0,22	
	PMG-11 B	12,8%	14,7%	14,0%	3,9%	0,0	0,0	69,3%	0,38	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	5,7%	18,3%	0,0	0,0	76,0%	-0,63	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	5,6%	16,9%	0,0	0,0	77,5%	0,28	
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	4,5%	21,4%	0,0	0,0	74,1%	-0,24	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	4,4%	13,0%	0,0	0,0	82,6%	0,30	
	PMG-14 A	0,0%	0,0%	4,8%	22,3%	0,0	0,0	72,9%	-0,37	
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	9,3%	12,6%	0,0	0,0	78,1%	-0,29	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	1,6%	25,4%	0,0	0,0	73,0%	0,52	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	1,1%	19,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,13	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	0,9%	25,1%	0,0	0,0	74,0%	0,12	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	1,6%	22,0%	1,0	0,0	76,4%	0,16	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	1,1%	25,6%	0,0	0,0	73,3%	-0,10	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	1,1%	17,6%	0,0	0,0	81,3%	-0,35	
I-3 Auditórios	PMG-24 A	0,0%	0,0%	2,3%	20,9%	0,0	0,0	76,8%	-0,42	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	3,2%	21,5%	0,0	0,0	75,3%	0,14	
	PMG-25 A	0,0%	0,0%	2,8%	17,5%	0,0	0,0	79,7%	0,42	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	10,0%	15,9%	0,0	0,0	74,1%	-0,07	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,3%	0,0	0,0	79,5%	-0,23	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	2,4%	17,3%	0,0	0,0	80,3%	-0,07	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	1,4%	22,1%	0,0	0,0	76,5%	0,19	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	1,6%	21,3%	0,0	0,0	77,1%	0,72	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,4%	25,2%	0,0	0,0	72,4%	0,16	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	13,0%	13,5%	0,0	0,0	73,5%	-0,14	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	2,0%	22,0%	0,0	0,0	76,0%	-0,27	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	3,2%	22,5%	0,0	0,0	74,3%	-0,27	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	2,4%	21,8%	0,0	0,0	75,8%	-0,07	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	3,1%	15,5%	0,0	0,0	81,4%	-0,44	
	PMG-45 A	0,0%	0,0%	1,4%	23,3%	0,0	0,0	75,3%	0,09	
	PMG-45 B	0,0%	0,0%	6,0%	19,7%	0,0	0,0	74,3%	0,17	

DATA		Semana 3: 15/05 a 19/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	1,0%	27,1%	0,0	0,0	71,9%	0,43	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	7,0%	17,2%	0,0	0,0	75,8%	-0,43	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	1,3%	27,3%	0,0	0,0	71,4%	-0,04	
	PMG-31 B	0,1%	0,1%	1,1%	14,7%	0,0	0,0	84,0%	-1,46	A
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	1,3%	27,2%	0,0	0,0	71,5%	-0,27	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	6,3%	21,1%	0,0	0,0	72,6%	0,01	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	1,6%	25,1%	1,0	0,0	73,3%	0,43	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	12,1%	1,6%	0,0	0,0	86,3%	-0,01	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	1,7%	23,4%	0,0	0,0	74,9%	-0,13	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	4,4%	19,4%	0,0	0,0	76,2%	0,04	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,26	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	8,2%	15,4%	0,0	0,0	76,4%	0,32	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,8%	27,3%	0,0	0,0	71,9%	0,10	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	10,2%	12,3%	0,0	0,0	77,5%	0,09	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	0,9%	25,0%	0,0	0,0	74,1%	-0,22	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	4,7%	12,8%	0,0	0,0	82,5%	0,15	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	1,1%	25,0%	0,0	0,0	73,9%	0,31	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,8%	22,7%	0,0	0,0	75,5%	0,02	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	1,5%	17,0%	0,0	0,0	81,5%	0,08	
	PMG-39 B	3,1%	3,7%	8,4%	15,0%	0,0	0,0	73,5%	-0,40	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	0,9%	25,3%	0,0	0,0	73,8%	0,03	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	2,1%	24,3%	0,0	0,0	73,6%	0,27	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	0,8%	24,6%	0,0	0,0	74,6%	0,39	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	0,9%	19,6%	0,0	0,0	79,5%	-0,06	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	0,8%	23,1%	0,0	0,0	76,1%	-0,22	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	8,7%	10,3%	0,0	0,0	81,0%	-0,31	
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	1,2%	23,0%	0,0	0,0	75,8%	0,09	
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	1,5%	17,0%	0,0	0,0	81,5%	0,32	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	0,7%	27,1%	0,0	0,0	72,2%	0,13	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	4,0%	21,8%	0,0	0,0	74,2%	-0,02	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	1,2%	23,7%	0,0	0,0	75,1%	-0,12	
	PMG-64 B	0,0%	0,0%	6,4%	0,9%	0,0	0,0	92,5%	-0,66	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	1,1%	25,7%	0,0	0,0	73,2%	0,12	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	4,7%	17,8%	0,0	0,0	77,2%	-2,03	A
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	2,1%	19,0%	0,0	0,0	78,9%	-0,21	
	PMG-66 B	0,1%	0,2%	1,5%	23,9%	0,0	0,0	74,5%	5,17	A
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,1%	0,0	0,0	79,2%	0,41	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	3,0%	17,6%	0,0	0,0	79,4%	-0,06	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	1,0%	25,7%	0,0	0,0	73,3%	0,06	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	2,4%	23,6%	1,0	0,0	74,0%	0,16	
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	1,3%	23,0%	0,0	0,0	75,7%	0,14	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	3,5%	22,8%	0,0	0,0	73,7%	-0,02	
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	1,2%	17,5%	0,0	0,0	81,3%	0,05	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	4,5%	11,0%	0,0	0,0	84,5%	-0,04	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	1,1%	25,5%	0,0	0,0	73,4%	-0,14	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	4,0%	19,6%	0,0	0,0	76,4%	-0,05	A
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,4%	0,0	0,0	78,3%	-0,04	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	1,4%	22,8%	0,0	0,0	75,8%	0,00	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	0,0	0,0	79,1%	0,09	
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	1,9%	22,2%	0,0	0,0	75,9%	0,04	
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,0%	0,0	0,0	79,5%	0,23	
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	3,7%	19,3%	0,0	0,0	77,0%	1,60	A

DATA		Semana 3: 15/05 a 19/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	2,6%	23,6%	0,0	0,0	73,8%	-0,20	
	PMG-46 B	2,8%	3,5%	13,0%	10,3%	0,0	0,0	73,9%	-0,17	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	1,0%	27,0%	0,0	0,0	72,0%	0,18	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	6,4%	10,0%	0,0	0,0	83,6%	-0,11	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	1,2%	22,0%	0,0	0,0	76,8%	-0,23	
	PMG-48 B	31,4%	31,4%	4,9%	0,7%	0,0	1,0	62,8%	0,92	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	1,2%	23,8%	0,0	0,0	75,0%	-0,30	
	PMG-49 B	30,5%	30,6%	9,6%	4,7%	0,0	0,0	54,3%	1,19	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	1,0%	23,8%	0,0	0,0	75,2%	-0,52	
	PMG-50 B	0,2%	0,9%	14,0%	4,8%	0,0	0,0	81,0%	-0,12	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	1,8%	24,6%	0,0	0,0	73,6%	0,14	
	PMG-51 B	2,4%	2,4%	7,0%	9,0%	0,0	0,0	81,6%	3,17	A
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	1,1%	25,6%	0,0	0,0	73,3%	-0,16	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	1,3%	23,2%	0,0	0,0	75,5%	-0,07	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	1,0%	17,6%	0,0	0,0	81,4%	0,21	
	PMG-53 B	0,0%	0,0%	9,0%	5,1%	0,0	0,0	85,9%	-0,11	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	1,0%	23,8%	0,0	0,0	75,2%	0,22	
	PMG-54 B	0,9%	0,9%	0,5%	19,7%	0,0	0,0	78,7%	-1,32	A
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	2,6%	16,4%	0,0	0,0	81,0%	0,46	
	PMG-55 B	3,7%	3,7%	11,9%	0,9%	0,0	0,0	83,5%	0,07	A
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	1,5%	23,0%	0,0	0,0	75,5%	0,36	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	5,7%	19,6%	0,0	0,0	74,7%	-0,21	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	1,0%	23,6%	0,0	0,0	75,4%	-0,06	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	13,8%	3,8%	0,0	0,0	82,4%	0,43	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,8%	23,6%	0,0	1,0	75,6%	-0,02	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	4,6%	15,8%	0,0	0,0	79,6%	0,27	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,8%	24,4%	0,0	0,0	74,8%	0,18	
	PMG-59 B	7,4%	9,8%	10,9%	15,3%	0,0	0,0	66,4%	0,00	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,0%	15,8%	0,0	0,0	83,2%	-0,14	
	PMG-60 B	6,7%	6,7%	4,3%	5,4%	0,0	0,0	83,6%	0,75	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,0%	15,6%	0,0	0,0	83,4%	0,35	
	PMG-61 B	8,9%	11,1%	13,1%	0,3%	0,0	0,0	77,7%	0,25	
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	1,0%	19,0%	0,0	0,0	80,0%	0,33	
	PMG-62 B	34,6%	34,7%	12,6%	8,6%	0,0	0,0	44,2%	5,56	E

DATA		Semana 3: 15/05 a 19/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	1,0%	22,5%	0,0	0,0	76,5%	-0,22	
	PMG-01 B	0,1%	0,2%	12,5%	13,1%	0,0	0,0	74,3%	0,32	A
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	1,0%	23,6%	0,0	0,0	75,4%	0,43	
	PMG-02 B	0,1%	0,1%	0,6%	17,2%	0,0	0,0	81,9%	0,49	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	1,0%	26,0%	0,0	0,0	73,0%	0,64	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	0,6%	20,3%	0,0	0,0	78,9%	-1,02	A
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	1,2%	25,4%	0,0	0,0	73,4%	-0,21	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	0,8%	15,8%	0,0	0,0	83,4%	0,64	A
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	0,8%	25,6%	0,0	0,0	73,6%	-0,08	
	PMG-05 B	0,1%	0,1%	0,8%	19,4%	0,0	0,0	79,7%	0,53	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	1,0%	24,8%	0,0	0,0	74,2%	-0,02	
	PMG-06 B	68,7 %	68,7 %	8,2%	9,3%	0,0	0,0	13,8%	22,72	E
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,9%	23,8%	0,0	0,0	75,3%	0,56	
	PMG-07 B	0,1%	0,1%	0,6%	25,1%	0,0	0,0	74,2%	2,54	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	1,8%	23,0%	0,0	0,0	75,2%	-0,06	
	PMG-08 B	0,3%	0,3%	11,0%	8,9%	0,0	0,0	79,8%	0,03	
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	7,8%	19,7%	0,0	0,0	72,5%	-0,13	
	PMG-09 B	0,3%	0,3%	1,1%	24,0%	0,0	0,0	74,6%	0,26	A
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	2,1%	22,1%	0,0	0,0	75,8%	0,24	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	1,5%	22,4%	0,0	0,0	76,1%	-0,18	A
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	1,1%	23,3%	0,0	0,0	75,6%	3,62	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	7,6%	15,6%	0,0	1,0	76,8%	0,38	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	5,0%	12,7%	0,0	0,0	82,3%	-0,11	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	9,0%	14,4%	0,0	0,0	76,6%	-0,07	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	3,0%	14,2%	0,0	0,0	82,8%	0,07	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	5,0%	19,4%	0,0	0,0	75,6%	1,01	A
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	1,3%	25,2%	1,0	0,0	73,5%	-0,20	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	4,0%	18,5%	0,0	0,0	77,5%	0,03	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,7%	0,0	0,0	77,2%	-0,14	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	1,9%	19,8%	1,0	0,0	78,3%	-0,01	A
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	1,6%	23,1%	0,0	0,0	75,3%	-0,10	A
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	2,8%	0,3%	0,0	0,0	96,9%	0,04	A
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	1,1%	23,4%	0,0	0,0	75,5%	0,04	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,7%	21,5%	0,0	0,0	76,8%	-0,15	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	1,0%	27,4%	0,0	0,0	71,6%	0,48	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	1,1%	24,5%	0,0	0,0	74,4%	-0,01	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	1,3%	22,3%	0,0	0,0	76,4%	-0,29	
	PMG-74 B	2,4 %	2,6 %	1,4%	4,9%	0,0	0,0	91,2%	0,97	A
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	1,8%	17,8%	0,0	0,0	80,4%	0,30	
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	5,8%	8,0%	0,0	0,0	86,2%	0,49	
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	1,0%	25,3%	0,0	0,0	73,7%	-0,18	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	3,0%	11,0%	0,0	0,0	86,0%	-0,13	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	13,2%	11,2%	0,0	0,0	75,6%	-0,28	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	18,4%	4,2%	0,0	0,0	77,4%	0,48	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	6,3%	16,7%	0,0	0,0	77,0%	0,44	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	7,5%	17,4%	0,0	0,0	75,1%	0,07	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	1,1%	23,8%	0,0	0,0	75,1%	-0,04	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	16,0%	0,5%	0,0	0,0	83,5%	0,06	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	12,8%	10,3%	0,0	0,0	76,9%	0,12	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	12,7%	12,6%	0,0	0,0	74,7%	0,15	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	0,8%	15,5%	0,0	0,0	83,7%	-0,18	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	8,1%	11,2%	0,0	0,0	80,7%	0,14	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	1,3%	17,0%	0,0	0,0	81,7%	0,01	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	13,3%	11,5%	1,0	0,0	75,2%	0,06	
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,6%	0,0	0,0	78,5%	0,56	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	2,5%	21,6%	0,0	0,0	75,9%	0,15	

DATA		Semana 3: 15/05 a 19/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	1,3%	17,1%	0,0	0,0	81,6%	0,45	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	1,5%	16,5%	0,0	0,0	82,0%	0,08	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	1,3%	19,1%	0,0	0,0	79,6%	0,51	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	3,3%	15,7%	0,0	0,0	81,0%	-0,02	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	1,1%	25,5%	0,0	0,0	73,4%	0,13	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	2,5%	18,3%	0,0	0,0	79,2%	0,16	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,1%	0,0	0,0	79,8%	0,44	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	3,1%	14,7%	0,0	0,0	82,2%	-0,12	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	1,1%	23,9%	0,0	0,0	75,0%	0,31	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	3,5%	20,3%	0,0	0,0	76,2%	0,23	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	1,3%	17,3%	0,0	0,0	81,4%	0,03	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	2,3%	21,1%	0,0	0,0	76,6%	0,38	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	0,9%	17,5%	0,0	0,0	81,6%	0,10	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,9%	23,5%	0,0	0,0	75,6%	0,23	
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,9%	21,7%	0,0	0,0	77,4%	0,47	
	PMG-105	0,0%	0,0%	3,7%	16,7%	0,0	0,0	79,6%	-0,01	
	PMG-106	0,0%	0,0%	1,1%	22,1%	0,0	0,0	76,8%	0,08	
	PMG-107	0,0%	0,0%	1,3%	19,7%	0,0	0,0	79,0%	0,07	
	PMG-108	0,0%	0,0%	1,1%	23,5%	0,0	0,0	75,4%	-0,08	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	0,0	0,0	78,8%	-0,02	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	2,7%	23,1%	0,0	0,0	74,2%	0,17	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,3%	0,0	0,0	79,8%	0,23	
	PMG-110 B	8,7%	8,7%	12,3%	11,5%	0,0	0,0	67,5%	-0,16	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,6%	22,5%	0,0	0,0	76,9%	-0,26	
	PMG-111 B	0,0%	0,0%	1,1%	22,3%	0,0	0,0	76,6%	-0,32	
	PMG-112	0,0%	0,0%	1,1%	25,3%	0,0	0,0	73,6%	-0,13	
Guarda Universitário	PMG-116 A	0,0%	0,0%	0,9%	16,5%	0,0	0,0	82,6%	0,06	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	0,9%	17,4%	0,0	0,0	81,7%	-0,38	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	0,6%	16,7%	0,0	0,0	82,7%	-0,22	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,6%	0,0	0,0	79,6%	0,58	
	PMG-118 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,7%	0,0	0,0	79,6%	0,19	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	0,9%	14,3%	0,0	0,0	84,8%	-0,15	
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	1,1%	22,4%	0,0	0,0	76,5%	-0,22	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,8%	14,4%	0,0	0,0	84,8%	0,15	
	PMG-119 C	0,0%	0,0%	0,1%	23,1%	0,0	0,0	76,7%	2,32	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	1,0%	13,9%	0,0	0,0	85,1%	0,10	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,8%	23,7%	0,0	0,0	75,5%	0,15	
Transportes	PMG-120 C	0,0%	0,0%	0,8%	23,8%	0,0	0,0	75,4%	3,50	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	1,4%	18,3%	0,0	0,0	80,3%	0,47	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	14,0%	3,9%	0,0	0,0	82,1%	-0,19	A
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	1,4%	25,1%	0,0	0,0	73,5%	0,33	
	PMG-122 B	0,4%	0,8%	12,6%	4,9%	0,0	0,0	82,1%	0,59	A
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	1,4%	21,1%	0,0	0,0	77,5%	0,32	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	14,3%	6,1%	0,0	0,0	79,6%	-0,02	A
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,8%	23,5%	0,0	0,0	75,7%	0,44	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	12,1%	9,5%	0,0	0,0	78,4%	0,05	A

DATA		Semana 4: 22/05 a 26/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	4,8%	17,0%	0,0	0,0	77,4%	-0,04	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	8,2%	12,8%	0,0	0,0	0,8%	-0,06	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	4,2%	16,2%	0,0	0,0	78,8%	-0,11	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	5,9%	15,3%	0,0	0,0	78,0%	0,08	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	1,7%	22,2%	0,0	0,0	75,3%	0,07	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	4,9%	16,0%	0,0	0,0	78,3%	-0,06	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	2,2%	19,8%	0,0	0,0	77,2%	-0,01	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	2,0%	19,3%	0,0	0,0	77,9%	0,04	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,9%	21,0%	0,0	0,0	77,3%	0,21	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	6,8%	13,7%	0,0	0,0	78,7%	0,15	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,8%	21,2%	0,0	0,0	76,2%	0,08	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	3,5%	19,1%	0,0	0,0	76,6%	0,15	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	4,7%	16,5%	0,0	0,0	78,0%	0,11	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	2,7%	19,6%	0,0	0,0	76,9%	0,18	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	1,9%	21,1%	0,0	0,0	76,2%	-0,05	
	PMG-114 B	31,5%	31,5%	1,2%	21,8%	0,0	0,0	72,8%	3,77	A
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,9%	0,0	0,0	76,9%	0,09	
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	2,5%	19,8%	0,0	0,0	76,9%	0,00	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11 A	0,0%	0,0%	3,7%	19,2%	0,0	0,0	76,3%	-0,07	
	PMG-11 B	11,4%	11,8%	16,2%	2,1%	0,0	0,0	79,0%	-0,30	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	5,1%	14,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,02	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	6,6%	13,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,14	
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	4,8%	17,8%	0,0	0,0	76,6%	-0,02	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	6,1%	15,5%	0,0	0,0	77,6%	0,02	
	PMG-14 A	0,0%	0,0%	5,3%	16,3%	0,0	0,0	77,6%	0,05	
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	8,6%	9,9%	0,0	0,0	80,7%	-0,02	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	1,4%	22,1%	0,0	0,0	75,7%	-0,02	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	0,9%	21,2%	0,0	0,0	77,1%	0,01	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,9%	0,0	0,0	76,9%	-0,02	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	1,9%	19,9%	0,0	0,0	77,4%	0,01	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	2,3%	20,4%	0,0	0,0	76,5%	0,04	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	5,3%	16,5%	0,0	0,0	77,4%	0,06	
I-3 Auditórios	PMG-24 A	0,0%	0,0%	1,9%	20,2%	0,0	0,0	77,1%	0,00	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	3,4%	18,7%	0,0	0,0	77,1%	-0,06	
	PMG-25 A	0,0%	0,0%	1,9%	22,4%	0,0	0,0	74,9%	-0,04	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	5,1%	18,4%	0,0	0,0	75,7%	0,06	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	2,0%	21,9%	0,0	0,0	75,3%	-0,01	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	5,6%	15,4%	0,0	0,0	78,2%	0,18	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	3,4%	20,2%	0,0	0,0	75,6%	0,25	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	8,7%	14,1%	0,0	0,0	76,4%	-0,02	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	3,5%	18,4%	0,0	0,0	77,3%	0,01	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	11,1%	9,3%	0,0	0,0	78,8%	-0,01	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	3,1%	21,4%	0,0	0,0	74,7%	0,05	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	4,0%	18,1%	1,0	0,0	77,1%	-0,01	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	2,1%	17,3%	1,0	0,0	79,8%	0,01	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	3,0%	18,3%	0,0	0,0	77,9%	-0,01	
	PMG-45 A	0,0%	0,0%	1,8%	20,4%	0,0	0,0	77,0%	-0,02	
	PMG-45 B	0,0%	0,0%	3,3%	19,1%	0,0	0,0	76,8%	0,05	

DATA		Semana 4: 22/05 a 26/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	2,1%	21,0%	0,0	0,0	76,1%	0,87	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	6,8%	13,3%	0,0	0,0	79,1%	0,01	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	1,8%	20,6%	0,0	0,0	76,8%	0,01	
	PMG-31 B	0,3%	0,3%	12,2%	7,8%	0,0	0,0	78,9%	1,15	A
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,4%	0,0	0,0	76,8%	0,21	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	4,6%	16,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,10	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	2,3%	20,4%	0,0	0,0	76,5%	0,00	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	12,8%	9,0%	0,0	1,0	77,4%	0,25	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,9%	0,0	0,0	76,2%	-0,01	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	3,2%	19,9%	0,0	0,0	76,1%	-0,01	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,3%	0,0	0,0	77,6%	-0,08	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	5,5%	15,5%	0,0	0,0	78,2%	0,04	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	2,1%	20,0%	0,0	0,0	77,1%	0,29	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	12,1%	7,3%	0,0	0,0	79,8%	0,09	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	1,6%	20,4%	0,0	0,0	77,2%	0,04	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	3,5%	19,0%	0,0	0,0	76,7%	0,21	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	1,5%	21,3%	0,0	0,0	76,4%	0,20	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,7%	19,2%	0,0	0,0	78,3%	0,06	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,6%	0,0	0,0	78,5%	0,00	
	PMG-39 B	0,6%	1,1%	12,5%	1,4%	0,0	0,0	84,6%	0,08	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	1,6%	21,8%	0,0	0,0	75,8%	0,63	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	2,1%	20,4%	0,0	0,0	76,7%	0,04	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	1,7%	22,2%	0,0	1,0	75,3%	0,00	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	2,2%	22,1%	0,0	0,0	74,9%	0,01	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	3,3%	20,3%	0,0	0,0	75,6%	0,07	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	13,0%	9,4%	0,0	0,0	76,8%	0,05	
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	2,3%	20,8%	0,0	0,0	76,1%	0,08	
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	1,6%	21,6%	0,0	0,0	76,0%	0,08	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	1,1%	22,3%	0,0	0,0	75,8%	0,00	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	3,4%	19,6%	0,0	0,0	76,2%	0,00	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	1,3%	21,1%	0,0	0,0	76,8%	0,12	
	PMG-64 B	0,1%	0,1%	9,9%	1,9%	0,0	0,0	78,7%	-4,58	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	1,4%	22,0%	0,0	0,0	75,8%	0,11	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	5,0%	15,8%	0,0	0,0	78,4%	0,25	A
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	2,1%	18,9%	0,0	0,0	78,2%	-0,10	
	PMG-66 B	0,2%	0,2%	19,9%	1,2%	0,0	0,0	72,9%	2,45	A
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,9%	0,0	0,0	76,2%	-0,09	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	2,2%	21,5%	0,0	0,0	75,5%	0,08	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	1,8%	21,0%	0,0	0,0	76,4%	-0,09	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	1,6%	20,0%	0,0	0,0	77,6%	0,40	A
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,9%	1,0	1,0	76,9%	0,92	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	7,3%	13,5%	0,0	0,0	78,4%	0,32	A
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	1,3%	21,7%	0,0	0,0	76,2%	0,05	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	1,0%	22,0%	0,0	0,0	76,2%	0,06	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	1,6%	20,7%	0,0	0,0	76,9%	0,06	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	1,5%	20,4%	0,0	0,0	77,3%	-0,10	A
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	1,3%	22,2%	0,0	0,0	75,7%	0,06	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	1,5%	22,1%	0,0	0,0	75,6%	0,04	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,2%	0,0	0,0	76,9%	0,05	
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	2,2%	20,9%	0,0	0,0	76,1%	0,01	
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	1,7%	20,9%	0,0	0,0	76,6%	0,04	
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	1,7%	21,2%	0,0	0,0	76,3%	0,20	

DATA		Semana 4: 22/05 a 26/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	3,1%	18,9%	0,0	0,0	77,2%	0,01	
	PMG-46 B	1,5%	2,4%	13,8%	1,9%	0,0	0,0	83,1%	0,08	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	1,8%	21,2%	0,0	0,0	76,2%	-0,34	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	5,3%	17,0%	0,0	0,0	76,9%	-0,31	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,1%	0,0	0,0	78,2%	0,21	
	PMG-48 B	32,4%	32,4%	6,2%	3,6%	0,0	0,0	57,9%	0,51	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	1,9%	21,1%	0,0	0,0	76,2%	0,01	
	PMG-49 B	30,2%	30,2%	9,1%	3,3%	0,0	0,0	53,6%	-0,29	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	1,8%	21,3%	0,0	0,0	76,1%	0,14	
	PMG-50 B	0,4%	0,9%	13,8%	2,3%	0,0	0,0	81,4%	0,00	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	1,1%	22,2%	0,0	0,0	75,9%	0,22	
	PMG-51 B	0,1%	0,1%	6,4%	8,9%	0,0	0,0	69,4%	0,44	A
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	1,6%	22,0%	0,0	0,0	75,6%	0,06	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	1,6%	22,5%	0,0	0,0	75,1%	0,01	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	1,4%	22,5%	0,0	0,0	75,3%	0,09	
	PMG-53 B	0,0%	0,0%	13,0%	4,4%	0,0	0,0	81,8%	-0,02	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	2,0%	21,3%	0,0	0,0	75,9%	-0,34	
	PMG-54 B	1,4%	2,4%	8,9%	8,2%	0,0	0,0	68,0%	0,23	A
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	1,8%	21,8%	0,0	0,0	75,6%	-0,31	
	PMG-55 B	26,8%	31,4%	7,2%	10,0%	0,0	0,0	43,3%	-0,31	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	1,6%	20,7%	0,0	0,0	76,9%	0,18	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	6,3%	17,4%	0,0	0,0	75,5%	-0,31	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	0,9%	21,3%	0,0	0,0	77,0%	-0,06	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	6,4%	13,1%	0,0	0,0	79,7%	-0,06	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	1,9%	21,2%	0,0	0,0	76,1%	-0,31	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	5,8%	17,5%	0,0	0,0	75,9%	-0,02	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,1%	1,0	0,0	77,0%	0,08	
	PMG-59 B	7,9%	8,4%	9,7%	20,3%	0,0	0,0	63,4%	-0,30	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,3%	21,4%	0,0	0,0	76,5%	-0,30	
	PMG-60 B	6,4%	6,5%	7,4%	6,5%	0,0	0,0	76,2%	1,29	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,9%	0,0	0,0	76,8%	0,06	
	PMG-61 B	9,7%	11,6%	13,0%	3,3%	0,0	0,0	75,0%	0,01	
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	1,4%	22,5%	0,0	0,0	75,3%	0,05	
	PMG-62 B	34,8%	34,9%	16,0%	3,4%	0,0	0,0	49,9%	2,59	E

DATA		Semana 4: 22/05 a 26/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,0%	0,0	0,0	77,7%	0,04	
	PMG-01 B	0,1%	0,2%	14,0%	3,8%	0,0	0,0	81,0%	0,05	A
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	1,8%	22,1%	0,0	0,0	75,3%	0,11	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	2,8%	21,2%	0,0	0,0	75,2%	-2,68	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	2,0%	20,8%	0,0	0,0	76,4%	0,09	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	13,4%	6,9%	0,0	0,0	78,9%	-1,78	A
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	2,8%	21,7%	0,0	0,0	74,7%	0,06	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	4,8%	17,6%	0,0	0,0	76,8%	0,66	A
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,4%	0,0	0,0	77,7%	0,14	
	PMG-05 B	0,1%	0,1%	1,0%	19,9%	0,0	0,0	78,2%	-0,35	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	1,6%	20,9%	0,0	0,0	76,7%	0,03	
	PMG-06 B	73,4%	73,4%	7,7%	7,8%	0,0	0,0	23,9%	34,78	E
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	1,2%	21,7%	0,0	0,0	76,3%	0,25	
	PMG-07 B	0,1%	0,1%	1,6%	21,7%	0,0	0,0	75,8%	0,29	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	1,3%	21,9%	0,0	0,0	76,0%	-0,02	
	PMG-08 B	0,2%	0,3%	15,4%	2,0%	0,0	0,0	81,6%	-0,11	A
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	9,4%	14,3%	1,0	0,0	75,5%	0,01	
	PMG-09 B	0,2%	0,2%	20,3%	2,3%	0,0	0,0	76,3%	0,11	A
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	2,8%	19,8%	0,0	0,0	76,6%	0,06	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	7,0%	14,3%	0,0	0,0	77,9%	1,70	A
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,8%	0,0	0,0	77,4%	-0,02	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	10,9%	8,4%	0,0	0,0	79,9%	0,14	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	5,4%	15,9%	0,0	0,0	77,9%	0,00	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	10,3%	7,9%	0,0	0,0	81,0%	0,00	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	2,9%	20,6%	0,0	1,0	75,7%	0,46	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	5,4%	17,5%	0,0	0,0	76,3%	0,01	
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	5,3%	11,0%	0,0	0,0	82,9%	-0,08	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	9,3%	12,1%	0,0	0,0	77,8%	-0,01	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	1,6%	20,9%	0,0	0,0	76,7%	0,00	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	2,1%	17,6%	0,0	0,0	79,5%	-0,01	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,9%	0,0	0,0	77,0%	0,00	
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	2,9%	1,8%	0,0	0,0	94,5%	0,07	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,1%	1,0	0,0	77,0%	0,05	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,7%	18,4%	0,0	0,0	79,1%	0,11	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,4%	0,0	0,0	77,4%	-0,27	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,31	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,9%	0,0	0,0	77,0%	0,01	
	PMG-74 B	0,4%	0,6%	2,0%	2,1%	0,0	0,0	94,7%	0,77	A
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	1,2%	22,2%	0,0	0,0	75,8%	0,26	
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	6,3%	8,5%	0,0	0,0	83,5%	-0,02	
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	2,2%	21,8%	0,0	0,0	75,2%	0,17	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	5,8%	12,7%	0,0	0,0	80,7%	0,28	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	17,5%	7,3%	0,0	1,0	74,4%	0,36	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	16,4%	5,2%	0,0	0,0	77,6%	-0,02	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	8,1%	18,2%	0,0	0,0	72,9%	0,04	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	15,9%	7,6%	0,0	0,0	75,7%	0,29	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	1,5%	20,9%	0,0	0,0	76,8%	0,01	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	17,4%	1,9%	0,0	0,0	79,9%	0,04	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	2,9%	18,4%	0,0	0,0	77,9%	0,21	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	11,7%	8,3%	0,0	0,0	79,2%	0,19	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	1,8%	22,7%	0,0	0,0	74,7%	0,04	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	13,5%	8,3%	1,0	0,0	77,4%	-0,06	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	1,3%	23,3%	0,0	0,0	74,6%	-0,16	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	14,5%	6,1%	0,0	0,0	78,6%	0,00	
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	1,8%	22,4%	0,0	0,0	75,0%	0,00	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	2,1%	21,6%	0,0	0,0	75,5%	-0,06	

DATA		Semana 4: 22/05 a 26/05								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	1,3%	21,8%	0,0	0,0	76,1%	-0,05	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	1,6%	20,3%	0,0	1,0	77,3%	0,01	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	1,2%	21,1%	0,0	0,0	76,9%	0,04	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	2,5%	19,6%	1,0	0,0	77,1%	-0,02	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	1,5%	21,8%	0,0	0,0	75,9%	-0,04	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	2,7%	18,8%	0,0	0,0	77,7%	0,01	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,6%	0,0	0,0	77,4%	-0,02	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	3,6%	17,6%	0,0	0,0	78,0%	-0,01	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,0%	0,0	0,0	77,2%	-0,02	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	3,4%	18,1%	0,0	0,0	77,7%	0,01	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	2,0%	20,6%	0,0	0,0	76,6%	-0,27	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	2,7%	18,5%	0,0	0,0	78,0%	0,51	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	1,6%	21,0%	0,0	0,0	76,6%	0,18	
	PMG-103	0,0%	0,0%	1,0%	21,6%	0,0	0,0	76,6%	-0,17	
	PMG-104	0,0%	0,0%	1,2%	21,3%	0,0	0,0	76,7%	-0,27	
	PMG-105	0,0%	0,0%	4,5%	17,9%	0,0	0,0	76,8%	-0,02	
	PMG-106	0,0%	0,0%	3,2%	19,7%	0,0	0,0	76,3%	-0,02	
	PMG-107	0,0%	0,0%	1,5%	21,0%	0,0	0,0	76,7%	-0,04	
	PMG-108	0,0%	0,0%	1,2%	22,7%	0,0	0,0	75,3%	0,04	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	4,4%	20,0%	0,0	0,0	74,8%	0,07	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	1,7%	21,8%	0,0	0,0	75,7%	-0,01	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	7,3%	5,3%	0,0	0,0	86,6%	-0,07	
	PMG-110 B	0,0%	0,1%	2,2%	21,0%	0,0	0,0	75,2%	0,57	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	1,8%	21,2%	0,0	0,0	76,2%	0,07	
	PMG-111 B	0,0%	0,0%	1,8%	20,8%	0,0	0,0	76,6%	0,25	
	PMG-112	0,0%	0,0%	1,6%	20,6%	0,0	1,0	77,0%	0,01	
Guarda Universitário	PMG-116 A	0,0%	0,0%	1,5%	22,1%	0,0	0,0	75,6%	0,01	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	1,6%	20,0%	0,0	0,0	77,6%	-0,01	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,9%	0,0	0,0	78,1%	-0,02	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	3,6%	20,8%	0,0	0,0	74,8%	-0,01	
	PMG-118 A	0,0%	0,0%	1,8%	22,5%	0,0	0,0	74,9%	0,01	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	1,4%	21,2%	0,0	0,0	76,6%	-0,02	
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	1,3%	22,0%	0,0	0,0	75,9%	0,01	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	1,7%	22,3%	0,0	0,0	75,2%	0,07	
	PMG-119 C	0,1%	0,2%	1,3%	22,0%	0,0	0,0	75,8%	-0,01	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	1,9%	21,1%	0,0	0,0	76,2%	0,15	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	2,1%	21,3%	1,0	0,0	75,8%	0,24	
Transportes	PMG-120 C	0,1%	0,1%	1,6%	21,5%	0,0	0,0	76,1%	0,19	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	1,6%	21,2%	0,0	0,0	76,4%	0,17	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	1,7%	10,0%	0,0	0,0	87,5%	0,47	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	0,9%	21,1%	0,0	0,0	77,2%	0,29	
	PMG-122 B	0,2%	0,3%	5,8%	16,2%	0,0	0,0	77,1%	-0,02	A
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	1,7%	21,0%	0,0	0,0	76,5%	-0,01	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	6,2%	15,7%	0,0	0,0	77,3%	0,26	A
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	1,7%	20,9%	0,0	0,0	76,6%	0,01	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	10,3%	15,0%	0,0	0,0	73,9%	0,58	

DATA		Semana 5: 29/05 a 02/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	9,8%	13,8%	0,0	0,0	76,4%	0,10	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	11,6%	10,9%	0,0	0,0	77,5%	-0,21	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	5,8%	16,8%	0,0	0,0	77,4%	-0,25	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	7,1%	12,3%	0,0	0,0	80,6%	0,06	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	2,2%	18,8%	0,0	0,0	79,0%	0,04	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	6,6%	14,9%	0,0	0,0	78,5%	-0,16	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	2,6%	17,4%	0,0	0,0	80,0%	-0,18	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	0,8%	22,0%	0,0	0,0	77,2%	0,22	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,9%	17,7%	0,0	0,0	81,4%	0,01	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	7,6%	11,2%	0,0	1,0	81,2%	0,23	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	2,3%	21,0%	1,0	0,0	76,7%	0,01	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	3,8%	19,2%	0,0	0,0	77,0%	0,22	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	0,7%	17,8%	0,0	0,0	81,5%	-0,08	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	6,0%	18,8%	0,0	0,0	75,2%	0,03	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	3,6%	19,0%	0,0	0,0	77,4%	0,06	
	PMG-114 B	2,6%	2,6%	10,3%	0,0%	0,0	0,0	86,9%	5,47	A
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	1,8%	21,0%	0,0	0,0	77,2%	0,02	
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	5,9%	17,5%	0,0	0,0	76,6%	0,02	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11 A	0,0%	0,0%	6,1%	19,1%	0,0	0,0	74,8%	0,04	
	PMG-11 B	9,8%	12,6%	14,7%	3,2%	0,0	0,0	72,3%	0,14	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	6,9%	15,1%	0,0	0,0	78,0%	0,14	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	4,3%	22,9%	0,0	0,0	72,7%	1,58	A
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	5,8%	18,2%	0,0	0,0	76,0%	0,25	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	8,5%	15,5%	0,0	0,0	76,0%	0,01	
	PMG-14 A	0,0%	0,0%	6,6%	16,6%	0,0	0,0	76,8%	0,00	
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	11,0%	11,7%	0,0	0,0	77,3%	0,32	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	2,3%	23,6%	0,0	0,0	74,1%	0,05	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	1,5%	19,5%	0,0	0,0	79,0%	-0,20	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,1%	0,0	0,0	79,0%	-0,27	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	2,8%	20,3%	0,0	0,0	76,9%	-0,01	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	3,1%	20,6%	0,0	0,0	76,3%	0,42	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	4,9%	16,2%	0,0	0,0	78,9%	0,04	
I-3 Auditórios	PMG-24 A	0,0%	0,0%	3,7%	19,4%	0,0	0,0	76,9%	0,11	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	3,4%	19,8%	0,0	0,0	76,8%	-0,04	
	PMG-25 A	0,0%	0,0%	4,0%	18,2%	0,0	0,0	77,8%	0,22	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	5,8%	15,3%	0,0	0,0	78,9%	0,01	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	4,2%	20,5%	0,0	0,0	75,3%	0,13	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	6,8%	16,0%	0,0	0,0	77,2%	0,17	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	5,5%	20,0%	0,0	0,0	74,5%	0,21	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	11,7%	8,0%	1,0	0,0	80,3%	0,14	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	5,0%	19,0%	0,0	0,0	76,0%	-0,14	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	14,4%	12,2%	0,0	0,0	73,4%	-0,01	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	2,5%	19,4%	0,0	0,0	78,1%	0,01	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	3,7%	18,2%	0,0	0,0	78,1%	0,06	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	1,4%	12,9%	0,0	0,0	85,7%	-0,14	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	4,2%	20,1%	0,0	0,0	75,7%	-0,58	
	PMG-45 A	0,0%	0,0%	3,0%	19,4%	0,0	0,0	77,6%	0,06	
	PMG-45 B	0,0%	0,0%	5,7%	13,9%	0,0	0,0	80,4%	-0,05	

DATA		Semana 5: 29/05 a 02/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	3,0%	20,9%	0,0	0,0	76,1%	0,38	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	11,2%	13,3%	0,0	0,0	75,5%	0,04	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	2,9%	20,7%	0,0	0,0	76,4%	0,31	
	PMG-31 B	0,1%	0,1%	4,1%	21,7%	0,0	0,0	73,8%	-1,78	A
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	4,4%	22,1%	0,0	0,0	73,5%	0,01	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	9,0%	13,6%	0,0	0,0	77,4%	0,02	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	3,7%	21,2%	0,0	0,0	75,1%	0,06	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	14,4%	7,7%	0,0	0,0	77,9%	0,02	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	2,4%	13,9%	0,0	0,0	83,7%	-0,04	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	5,1%	16,1%	0,0	0,0	78,8%	0,01	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	1,1%	17,7%	0,0	0,0	81,2%	0,01	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	8,2%	13,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,09	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	1,7%	20,1%	0,0	0,0	78,2%	0,26	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	15,4%	6,1%	0,0	0,0	78,5%	0,04	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	1,6%	17,8%	0,0	0,0	80,6%	0,04	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	5,3%	20,6%	0,0	0,0	74,1%	0,30	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	0,6%	22,6%	0,0	0,0	76,8%	-0,08	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	2,5%	21,5%	0,0	0,0	76,0%	0,05	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	2,5%	13,3%	0,0	0,0	84,2%	-0,04	
	PMG-39 B	0,4%	0,9%	13,2%	1,4%	0,0	0,0	85,0%	0,48	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	4,6%	22,9%	0,0	0,0	72,5%	0,01	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	3,6%	17,8%	0,0	0,0	78,6%	-0,17	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	3,8%	20,1%	0,0	0,0	76,1%	0,21	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	3,9%	18,6%	0,0	0,0	77,5%	0,09	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	11,0%	10,2%	0,0	0,0	78,8%	0,29	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	14,2%	8,7%	1,0	0,0	77,1%	0,06	
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	4,4%	21,4%	0,0	0,0	74,2%	-0,38	
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	3,8%	19,8%	0,0	0,0	76,4%	0,23	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	1,4%	22,5%	0,0	0,0	76,1%	0,14	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	5,1%	17,4%	0,0	0,0	77,5%	0,20	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,9%	18,4%	0,0	0,0	80,7%	-0,04	
	PMG-64 B	0,1%	0,1%	8,3%	6,1%	1,0	0,0	85,4%	-2,58	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,9%	0,0	0,0	78,4%	-0,14	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	1,1%	18,3%	0,0	0,0	80,6%	4,92	A
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	3,1%	21,0%	0,0	0,0	75,9%	0,04	
	PMG-66 B	0,1%	0,1%	2,6%	6,8%	0,0	0,0	90,5%	-0,16	
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	2,4%	18,9%	0,0	0,0	78,7%	0,29	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	6,1%	18,4%	0,0	0,0	75,5%	0,05	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	1,8%	21,4%	0,0	0,0	76,8%	-0,30	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	2,8%	17,9%	0,0	0,0	79,3%	0,29	A
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	3,7%	20,6%	0,0	0,0	75,7%	0,04	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	9,2%	11,2%	0,0	0,0	79,5%	0,70	A
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	2,5%	22,4%	0,0	1,0	75,1%	0,06	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	1,4%	18,5%	0,0	0,0	80,1%	0,37	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,8%	23,6%	0,0	0,0	75,6%	0,04	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	0,6%	23,3%	0,0	0,0	76,1%	2,20	A
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,7%	0,0	0,0	79,2%	0,08	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,2%	18,6%	0,0	0,0	81,2%	0,31	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	0,4%	19,8%	0,0	0,0	79,8%	0,29	
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	0,6%	21,7%	0,0	0,0	77,7%	-0,06	
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	1,9%	18,7%	0,0	0,0	79,4%	0,04	
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	1,2%	15,1%	0,0	0,0	83,7%	-1,23	A

DATA		Semana 5: 29/05 a 02/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	3,9%	15,9%	0,0	0,0	80,2%	-0,26	
	PMG-46 B	1,2%	1,9%	14,8%	1,9%	0,0	0,0	82,1%	-0,14	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	4,7%	19,8%	0,0	0,0	75,5%	0,06	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	9,6%	15,3%	0,0	0,0	75,1%	0,09	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	5,7%	20,4%	0,0	0,0	73,9%	0,02	
	PMG-48 B	31,6%	31,6%	3,9%	3,5%	0,0	0,0	60,4%	1,70	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	3,0%	19,6%	0,0	1,0	77,4%	0,04	
	PMG-49 B	30,8%	30,8%	8,5%	0,0%	0,0	0,0	60,4%	1,06	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	2,6%	19,4%	0,0	0,0	78,0%	0,05	
	PMG-50 B	0,6%	0,7%	13,4%	2,9%	0,0	0,0	83,1%	0,02	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	1,3%	12,6%	0,0	0,0	86,1%	-0,04	
	PMG-51 B	0,1%	0,2%	7,2%	9,1%	0,0	0,0	83,6%	-0,20	A
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,8%	0,0	1,0	77,6%	0,33	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,7%	19,4%	0,0	0,0	79,9%	0,06	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,5%	22,9%	0,0	0,0	76,6%	0,03	
	PMG-53 B	0,0%	0,0%	10,4%	1,7%	0,0	0,0	87,9%	-0,53	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	3,2%	22,2%	0,0	0,0	74,6%	0,10	
	PMG-54 B	0,6%	0,6%	12,9%	1,4%	0,0	0,0	85,1%	0,58	A
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	4,2%	20,9%	0,0	0,0	74,9%	0,06	
	PMG-55 B	31,6%	36,7%	0,2%	3,9%	0,0	0,0	64,3%	0,16	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	3,3%	20,5%	0,0	0,0	76,2%	-0,37	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	8,3%	16,9%	0,0	0,0	74,8%	0,02	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	4,1%	22,2%	0,0	0,0	73,7%	-0,26	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	9,9%	3,3%	0,0	0,0	86,8%	0,03	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,9%	21,7%	0,0	0,0	77,4%	0,06	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	7,0%	12,5%	0,0	0,0	80,5%	-0,10	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	2,1%	18,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,17	
	PMG-59 B	6,8%	7,8%	13,6%	1,9%	1,0	0,0	77,7%	0,04	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,3%	17,7%	0,0	0,0	81,0%	0,06	
	PMG-60 B	7,1%	7,2%	5,0%	3,1%	0,0	0,0	84,8%	1,69	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,6%	22,4%	0,0	0,0	76,0%	0,07	
	PMG-61 B	10,8%	13,6%	7,5%	1,9%	0,0	0,0	79,8%	0,05	
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,4%	0,0	0,0	77,6%	0,06	
	PMG-62 B	31,5%	31,5%	16,5%	3,0%	0,0	0,0	48,8%	2,78	E

DATA		Semana 5: 29/05 a 02/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	1,9%	19,5%	0,0	0,0	78,6%	0,06	
	PMG-01 B	0,1%	0,2%	17,7%	0,6%	0,0	0,0	81,6%	1,02	A
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	4,8%	19,3%	0,0	0,0	75,9%	0,05	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	2,7%	16,8%	0,0	0,0	80,5%	0,03	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	4,4%	17,5%	0,0	0,0	78,1%	0,01	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	4,5%	19,5%	0,0	0,0	75,9%	-1,81	A
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	3,7%	16,4%	0,0	0,0	79,9%	0,01	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	7,4%	17,1%	0,0	0,0	75,5%	1,26	A
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	3,9%	20,4%	0,0	0,0	75,7%	0,36	
	PMG-05 B	0,1%	0,0%	1,1%	21,3%	0,0	0,0	77,5%	1,34	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	1,4%	20,1%	0,0	0,0	78,5%	0,26	
	PMG-06 B	65,1%	65,1%	10,3%	2,9%	0,0	0,0	21,7%	18,92	E
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,8%	14,6%	0,0	0,0	84,6%	0,05	
	PMG-07 B	0,1%	0,1%	0,5%	17,6%	0,0	0,0	81,8%	-0,05	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	1,5%	19,3%	0,0	0,0	79,2%	0,01	
	PMG-08 B	0,1%	0,2%	1,2%	16,4%	0,0	0,0	82,3%	-0,20	A
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	7,6%	14,6%	0,0	0,0	77,8%	0,11	
	PMG-09 B	0,2%	0,4%	3,5%	20,6%	0,0	0,0	75,7%	-1,56	A
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	3,7%	19,1%	0,0	0,0	77,2%	0,13	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	4,1%	17,3%	1,0	0,0	78,6%	0,92	A
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	2,7%	24,3%	0,0	0,0	73,0%	0,25	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	10,4%	11,9%	0,0	0,0	77,7%	0,13	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	9,4%	18,2%	0,0	0,0	72,4%	0,37	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	11,8%	8,8%	0,0	0,0	79,4%	-0,26	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	3,0%	20,8%	0,0	0,0	76,2%	-0,33	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	6,6%	16,0%	0,0	0,0	77,4%	-0,16	
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	7,1%	14,4%	0,0	0,0	78,5%	0,74	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	7,9%	18,4%	0,0	0,0	73,7%	-0,17	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,7%	0,0	0,0	78,4%	0,03	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	1,4%	21,0%	0,0	0,0	77,6%	0,09	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	2,2%	19,3%	0,0	0,0	78,5%	0,08	
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	2,9%	1,9%	0,0	0,0	95,2%	0,09	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	3,4%	16,4%	0,0	0,0	80,2%	0,22	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	2,4%	17,0%	0,0	0,0	80,6%	0,04	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	1,8%	17,0%	0,0	0,0	81,2%	0,12	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	2,1%	15,8%	0,0	0,0	82,1%	0,26	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	5,4%	17,3%	0,0	0,0	77,3%	-0,23	
	PMG-74 B	0,2%	0,2%	2,8%	13,0%	0,0	0,0	83,8%	2,56	A
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	3,1%	18,9%	0,0	0,0	78,0%	0,88	
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	2,7%	0,3%	0,0	0,0	97,0%	0,05	
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	2,7%	18,6%	0,0	0,0	78,7%	-0,03	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	7,0%	12,4%	0,0	0,0	80,6%	-0,03	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	8,4%	12,1%	0,0	0,0	79,5%	-0,11	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	16,6%	7,7%	0,0	0,0	75,7%	0,38	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	4,8%	19,1%	0,0	0,0	76,1%	0,14	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	14,4%	7,8%	0,0	0,0	77,8%	0,06	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,6%	16,9%	0,0	0,0	82,5%	0,01	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	17,2%	4,5%	0,0	0,0	78,3%	0,08	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	5,5%	16,2%	1,0	0,0	78,3%	0,23	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	9,7%	14,1%	0,0	0,0	76,0%	-0,43	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	4,9%	18,0%	0,0	0,0	77,1%	-0,20	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	16,7%	0,6%	0,0	0,0	82,7%	-0,43	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	2,6%	18,4%	0,0	1,0	79,0%	0,22	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	8,6%	10,6%	0,0	0,0	80,8%	0,09	
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	2,6%	24,4%	0,0	0,0	73,0%	0,39	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	3,9%	19,4%	0,0	0,0	76,7%	-0,09	

DATA		Semana 5: 29/05 a 02/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	3,6%	19,2%	0,0	0,0	77,2%	-0,09	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	2,7%	21,1%	0,0	0,0	76,2%	0,17	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	0,2%	20,0%	0,0	0,0	79,8%	0,58	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	3,4%	20,7%	0,0	0,0	75,9%	-0,06	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	1,3%	21,9%	0,0	0,0	76,8%	0,04	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	2,9%	20,4%	0,0	0,0	76,7%	-5,84	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	2,8%	20,3%	0,0	0,0	76,9%	0,40	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	4,8%	16,4%	0,0	0,0	78,8%	-0,32	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	2,2%	19,3%	0,0	0,0	78,5%	0,09	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	3,8%	18,2%	0,0	0,0	78,0%	0,21	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	1,7%	18,4%	0,0	0,0	79,9%	0,06	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	4,5%	16,0%	0,0	0,0	79,5%	-0,08	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	1,5%	23,0%	0,0	0,0	75,5%	0,04	
	PMG-103	0,0%	0,0%	1,5%	18,7%	0,0	0,0	79,8%	-0,06	
	PMG-104	0,0%	0,0%	5,1%	23,4%	0,0	0,0	71,5%	-0,06	
	PMG-105	0,0%	0,0%	7,2%	15,9%	0,0	0,0	76,9%	-0,25	
	PMG-106	0,0%	0,0%	4,2%	23,7%	0,0	0,0	72,1%	-0,77	
	PMG-107	0,0%	0,0%	3,8%	23,6%	0,0	0,0	72,6%	0,06	
	PMG-108	0,0%	0,0%	2,0%	21,0%	0,0	0,0	77,0%	0,67	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	3,5%	18,7%	0,0	1,0	77,8%	-0,04	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	4,6%	15,5%	0,0	0,0	79,9%	-0,03	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,6%	0,0	0,0	79,5%	-0,62	
	PMG-110 B	0,0%	0,1%	7,3%	10,7%	0,0	0,0	82,0%	1,56	A
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	1,1%	13,9%	0,0	0,0	85,0%	-0,59	
Guarda Universitário	PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,9%	21,4%	0,0	0,0	77,7%	0,06	
	PMG-112	0,0%	0,0%	0,6%	19,2%	0,0	0,0	80,2%	0,03	
	PMG-116 A	0,0%	0,0%	1,4%	22,1%	0,0	0,0	76,5%	0,06	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	2,4%	19,2%	0,0	0,0	78,4%	0,07	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	2,4%	22,0%	0,0	0,0	75,6%	0,04	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	6,6%	16,9%	0,0	0,0	76,5%	-0,06	
Portaria P3	PMG-118 A	0,0%	0,0%	2,4%	16,8%	0,0	0,0	80,8%	0,23	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	4,9%	19,4%	0,0	0,0	75,7%	-0,02	
	PMG-119 A	0,0%	0,0%	2,0%	17,5%	0,0	0,0	80,5%	0,06	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	3,0%	17,9%	0,0	1,0	79,1%	-0,02	
	PMG-119 C	0,1%	0,1%	5,2%	17,3%	0,0	0,0	77,4%	2,51	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	3,5%	22,0%	0,0	0,0	74,5%	-0,32	
Transportes	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,4%	22,6%	0,0	0,0	77,0%	-0,17	
	PMG-120 C	0,1%	0,1%	1,0%	21,2%	0,0	0,0	77,7%	-1,28	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	1,3%	22,6%	0,0	0,0	76,1%	0,57	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	0,8%	17,4%	0,0	0,0	81,8%	-2,09	A
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	0,7%	22,9%	0,0	0,0	76,4%	0,06	
	PMG-122 B	0,1%	0,1%	0,1%	20,9%	0,0	0,0	78,9%	1,22	A
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	1,6%	16,5%	0,0	0,0	81,9%	0,19	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	1,4%	20,2%	0,0	0,0	78,4%	-0,59	A
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	1,5%	21,1%	0,0	0,0	77,4%	0,15	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	3,6%	18,1%	0,0	0,0	78,3%	-2,66	A

DATA		Semana 1: 05/06 a 09/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5 % e 15 % ; maior que 15 % . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1	Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	4,4%	17,5%	0,0	0,0	78,1%	-0,08
		PMG-16 B	0,0%	0,0%	9,5%	9,9%	0,0	0,0	80,6%	0,03
		PMG-17 A	0,0%	0,0%	3,6%	11,3%	0,0	0,0	85,1%	0,06
		PMG-17 B	0,0%	0,0%	7,4%	17,9%	0,0	0,0	74,7%	-0,09
		PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,4%	22,9%	0,0	0,0	76,7%	0,02
		PMG-18 B	0,0%	0,0%	4,3%	12,4%	0,0	0,0	83,3%	0,02
		PMG-20 A	0,0%	0,0%	4,6%	22,4%	0,0	0,0	73,0%	-0,06
		PMG-20 B	0,0%	0,0%	0,4%	21,7%	0,0	0,0	77,9%	0,14
		PMG-22 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,0%	0,0	0,0	79,1%	0,14
		PMG-22 B	0,0%	0,0%	5,2%	12,0%	0,0	0,0	82,8%	-0,03
		PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,3%	23,8%	0,0	1,0	74,9%	0,25
		PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,4%	18,5%	0,0	0,0	80,1%	0,01
		PMG-113 A	0,0%	0,0%	3,1%	20,4%	0,0	0,0	76,5%	0,00
		PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,4%	19,0%	0,0	0,0	79,6%	0,32
		PMG-114 A	0,0%	0,0%	1,6%	18,5%	0,0	0,0	79,9%	0,05
		PMG-114 B	0,7%	0,7%	0,8%	20,2%	0,0	0,0	78,2%	-0,20
		PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,4%	22,6%	0,0	0,0	77,0%	-0,27
		PMG-115 B	0,0%	0,0%	1,7%	18,9%	0,0	0,0	79,4%	-0,01
Edifício I-1	Parte 2	PMG-11 A	0,0%	0,0%	1,8%	16,4%	0,0	0,0	81,8%	0,42
		PMG-11 B	12,4 %	13,6 %	13,6%	0,4%	0,0	0,0	73,6%	0,04
		PMG-12 A	0,0%	0,0%	3,5%	16,1%	0,0	0,0	80,4%	0,11
		PMG-12 B	0,0%	0,0%	2,6%	21,5%	0,0	0,0	75,9%	0,10
		PMG-13 A	0,0%	0,0%	6,1%	15,1%	0,0	0,0	78,8%	-0,21
		PMG-13 B	0,0%	0,0%	6,8%	15,9%	0,0	0,0	77,3%	-0,25
		PMG-14 A	0,0%	0,0%	6,0%	10,1%	0,0	0,0	83,9%	0,06
		PMG-14 B	0,0%	0,0%	13,4%	4,6%	0,0	0,0	82,0%	0,04
		PMG-15 A	0,0%	0,0%	0,8%	22,6%	0,0	0,0	76,6%	-0,16
		PMG-15 B	0,0%	0,0%	1,4%	18,9%	0,0	1,0	79,7%	-0,18
		PMG-19 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,8%	0,0	0,0	77,7%	0,22
		PMG-19 B	0,0%	0,0%	0,6%	17,5%	0,0	0,0	81,9%	0,01
		PMG-21 A	0,0%	0,0%	2,4%	16,2%	0,0	0,0	81,4%	0,23
		PMG-21 B	0,0%	0,0%	4,4%	17,1%	1,0	0,0	78,5%	0,01
I-3 Auditórios		PMG-24 A	0,0%	0,0%	1,9%	18,5%	0,0	0,0	79,6%	0,22
		PMG-24 B	0,0%	0,0%	1,8%	17,7%	0,0	0,0	80,5%	-0,58
		PMG-25 A	0,0%	0,0%	2,8%	25,2%	0,0	0,0	72,0%	0,06
		PMG-25 B	0,0%	0,0%	2,4%	20,4%	0,0	0,0	77,2%	-0,05
		PMG-26 A	0,0%	0,0%	2,2%	18,0%	0,0	0,0	79,8%	0,38
		PMG-26 B	0,0%	0,0%	5,8%	14,8%	0,0	0,0	79,4%	0,04
		PMG-27 A	0,0%	0,0%	2,6%	16,9%	0,0	0,0	80,5%	0,31
		PMG-27 B	0,0%	0,0%	10,3%	8,4%	0,0	0,0	81,3%	-0,06
		PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,4%	15,3%	0,0	0,0	82,3%	0,01
		PMG-28 B	0,0%	0,0%	12,1%	8,0%	0,0	0,0	79,9%	0,02
		PMG-29 A	0,0%	0,0%	4,0%	24,0%	0,0	0,0	72,0%	0,06
		PMG-29 B	0,0%	0,0%	3,4%	13,2%	0,0	0,0	83,4%	0,02
		PMG-44 A	0,0%	0,0%	3,1%	17,5%	0,0	0,0	79,4%	-0,04
		PMG-44 B	0,0%	0,0%	1,3%	16,1%	0,0	0,0	82,6%	0,01
		PMG-45 A	0,0%	0,0%	1,8%	21,0%	0,0	0,0	77,2%	0,01
		PMG-45 B	0,0%	0,0%	4,4%	17,1%	0,0	0,0	78,5%	-0,09

DATA		Semana 1: 05/06 a 09/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	1,9%	17,6%	0,0	0,0	80,5%	0,26	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	6,9%	13,4%	0,0	0,0	79,7%	0,04	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,7%	24,6%	0,0	1,0	74,7%	-0,04	
	PMG-31 B	0,1%	0,1%	13,0%	1,2%	1,0	0,0	85,5%	0,22	A
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	2,6%	18,0%	0,0	0,0	79,4%	0,01	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	8,7%	14,4%	0,0	0,0	76,9%	0,13	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	1,5%	16,3%	0,0	0,0	82,2%	0,17	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	11,2%	14,9%	0,0	0,0	73,9%	0,21	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	1,3%	17,1%	0,0	0,0	81,6%	0,14	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	2,6%	16,9%	0,0	0,0	80,5%	-0,14	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	0,9%	22,1%	0,0	1,0	77,0%	-0,01	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	4,3%	14,4%	0,0	0,0	81,3%	0,01	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,6%	20,0%	0,0	0,0	79,4%	0,06	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	13,5%	8,4%	0,0	0,0	78,1%	-0,14	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	1,9%	17,9%	0,0	0,0	80,2%	0,04	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	2,3%	17,0%	0,0	0,0	80,7%	-0,16	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	1,9%	22,7%	0,0	0,0	75,4%	0,29	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	2,3%	14,5%	0,0	0,0	83,2%	0,05	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,5%	0,0	0,0	78,9%	-0,30	
	PMG-39 B	0,6%	1,1%	7,0%	8,9%	0,0	0,0	83,5%	0,29	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	1,2%	23,2%	1,0	0,0	75,6%	0,04	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	1,3%	19,7%	0,0	1,0	79,0%	0,70	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	1,4%	21,7%	0,0	0,0	76,9%	0,06	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	1,4%	15,8%	0,0	0,0	82,8%	0,37	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	3,3%	20,2%	0,0	0,0	76,5%	0,04	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	12,1%	8,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,11	
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	3,1%	16,7%	0,0	0,0	80,2%	0,08	
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	2,2%	22,4%	0,0	0,0	75,4%	0,31	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	2,2%	15,2%	0,0	0,0	82,6%	0,29	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	4,0%	18,1%	0,0	0,0	77,9%	-0,06	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,5%	23,2%	0,0	0,0	76,3%	0,04	
	PMG-64 B	0,2%	0,2%	1,4%	13,7%	0,0	0,0	84,7%	0,04	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	1,7%	25,8%	0,0	0,0	72,5%	0,30	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	0,9%	20,7%	0,0	0,0	78,4%	-0,08	A
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,9%	0,0	0,0	79,5%	0,05	
	PMG-66 B	0,1%	0,1%	17,9%	0,4%	0,0	0,0	82,2%	-0,04	A
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,0%	0,0	0,0	80,4%	0,48	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	2,3%	17,7%	0,0	0,0	80,0%	0,01	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	2,0%	19,5%	0,0	0,0	78,5%	-0,17	
	PMG-68 B	0,0%	0,0%	0,5%	21,3%	0,0	0,0	77,8%	-0,49	A
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,0%	0,0	0,0	78,0%	0,09	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	0,7%	15,5%	0,0	0,0	83,6%	0,29	A
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,6%	18,9%	0,0	0,0	80,5%	0,06	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,38	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,3%	22,7%	0,0	0,0	77,0%	0,23	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	0,5%	19,4%	0,0	0,0	80,1%	0,14	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	1,0	0,0	78,7%	0,20	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,7%	22,5%	0,0	0,0	76,8%	-0,04	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	1,9%	18,9%	0,0	0,0	79,2%	-2,58	
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	1,7%	20,0%	0,0	0,0	78,3%	-0,14	
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	2,1%	23,6%	0,0	0,0	74,3%	0,10	
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	0,5%	21,2%	0,0	0,0	78,3%	0,58	A

DATA		Semana 1: 05/06 a 09/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5 % e 15 % ; maior que 15 % . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	2,6%	19,6%	0,0	1,0	77,8%	0,06	
	PMG-46 B	0,9%	1,4 %	12,5%	3,4%	0,0	0,0	83,2%	0,16	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,4%	23,7%	0,0	0,0	75,9%	-0,37	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	3,3%	14,1%	0,0	0,0	82,6%	0,02	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	2,6%	25,0%	0,0	0,0	72,4%	-0,26	
	PMG-48 B	32,4 %	32,4 %	5,3%	4,0%	0,0	0,0	58,3%	0,38	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	1,1%	18,1%	0,0	0,0	79,7%	0,06	
	PMG-49 B	30,1 %	30,2 %	7,4%	9,8%	0,0	0,0	52,4%	0,95	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	2,0%	22,3%	0,0	0,0	75,7%	-0,17	
	PMG-50 B	0,8%	0,9%	12,1%	12,9%	0,0	0,0	74,2%	0,04	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	2,7%	17,7%	0,0	0,0	79,6%	0,06	
	PMG-51 B	0,2%	0,2%	6,6%	10,3%	1,0	0,0	82,9%	0,05	A
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	1,0%	25,2%	0,0	0,0	73,8%	-0,26	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	1,3%	17,7%	0,0	0,0	81,0%	-0,14	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	1,6%	21,5%	0,0	0,0	76,9%	0,06	
	PMG-53 B	0,0%	0,0%	7,5%	0,4%	0,0	0,0	92,1%	0,09	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	2,6%	18,3%	0,0	0,0	79,1%	0,02	
	PMG-54 B	0,2%	0,2%	10,7%	7,9%	0,0	0,0	81,2%	-1,19	A
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,9%	14,5%	0,0	0,0	84,6%	0,04	
	PMG-55 B	38,7 %	39,3 %	9,0%	4,1%	0,0	0,0	48,2%	0,49	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	1,1%	17,5%	0,0	0,0	81,4%	0,05	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	4,9%	15,4%	0,0	0,0	79,7%	0,02	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	2,1%	17,7%	0,0	0,0	80,2%	-0,04	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	6,8%	9,6%	0,0	0,0	83,6%	-0,20	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,6%	22,3%	0,0	0,0	77,1%	0,33	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	3,4%	14,8%	0,0	0,0	81,8%	0,06	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	1,0%	24,4%	0,0	0,0	74,6%	0,03	
	PMG-59 B	7,1 %	7,5 %	9,1%	11,1%	0,0	0,0	72,7%	-0,53	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,4%	0,0	0,0	78,4%	0,26	
	PMG-60 B	6,5 %	6,6 %	7,3%	3,7%	1,0	0,0	82,5%	3,12	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,6%	20,2%	0,0	0,0	78,2%	0,05	
	PMG-61 B	8,6 %	9,5 %	13,6%	4,0%	0,0	0,0	73,8%	-0,05	
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	4,4%	19,8%	0,0	0,0	75,8%	0,01	
	PMG-62 B	27,6 %	27,8 %	2,2%	0,5%	0,0	0,0	69,5%	-2,47	E

DATA		Semana 1: 05/06 a 09/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	1,7%	16,8%	0,0	0,0	81,5%	0,11	
	PMG-01 B	0,2%	0,2%	16,3%	0,6%	0,0	0,0	83,8%	0,45	A
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,4%	22,5%	0,0	1,0	77,1%	0,13	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	0,5%	22,2%	0,0	0,0	77,3%	0,92	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	1,3%	23,9%	0,0	0,0	74,8%	0,25	
	PMG-03 B	0,0%	0,0%	11,3%	10,8%	0,0	0,0	77,9%	-1,56	A
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	4,0%	26,0%	0,0	0,0	70,0%	0,37	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	4,9%	20,0%	0,0	0,0	75,1%	-0,26	A
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	2,4%	18,8%	0,0	0,0	78,8%	-0,33	
	PMG-05 B	0,1%	0,1%	1,1%	25,0%	0,0	0,0	73,8%	-36,00	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,4%	0,0	0,0	79,7%	-0,01	
	PMG-06 B	62,1%	62,2%	4,5%	1,5%	0,0	0,0	31,2%	-15,89	E
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,8%	24,1%	0,0	0,0	75,1%	0,05	
	PMG-07 B	0,1%	0,1%	0,6%	23,6%	1,0	0,0	75,7%	-0,79	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	0,7%	24,6%	1,0	0,0	74,7%	-0,06	
	PMG-08 B	0,1%	0,1%	9,5%	12,9%	0,0	0,0	77,5%	1,26	A
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	9,3%	14,7%	0,0	0,0	76,0%	1,02	
	PMG-09 B	0,1%	0,1%	1,0%	2,6%	0,0	0,0	96,3%	-3,14	A
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	4,3%	16,7%	0,0	0,0	79,0%	0,03	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	8,9%	16,4%	0,0	0,0	74,7%	0,01	A
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	2,1%	19,3%	0,0	0,0	78,6%	-0,03	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	11,3%	11,5%	0,0	1,0	77,2%	0,01	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	3,7%	13,9%	0,0	0,0	82,4%	0,01	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	12,9%	12,3%	0,0	0,0	74,8%	0,36	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	3,5%	15,3%	0,0	0,0	81,2%	0,88	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	3,9%	14,3%	0,0	0,0	81,8%	0,05	
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	3,8%	7,0%	0,0	0,0	89,2%	-0,03	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	9,9%	11,6%	0,0	0,0	78,5%	-0,03	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,4%	0,0	0,0	78,8%	-0,11	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,7%	22,9%	0,0	0,0	76,4%	0,38	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,4%	22,4%	0,0	0,0	77,2%	0,14	
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	4,1%	2,4%	0,0	0,0	93,5%	0,06	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	1,4%	22,4%	0,0	0,0	76,2%	0,01	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	2,0%	15,7%	0,0	0,0	82,3%	0,08	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,5%	25,6%	0,0	0,0	73,9%	0,23	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,4%	15,1%	0,0	0,0	84,5%	-0,04	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,5%	16,6%	0,0	0,0	82,9%	-0,20	
	PMG-74 B	0,1%	0,2%	0,5%	0,8%	1,0	0,0	98,6%	-0,43	A
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,5%	22,2%	0,0	0,0	77,3%	0,22	
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	5,9%	9,5%	0,0	0,0	84,6%	-0,17	
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	1,4%	23,7%	0,0	0,0	74,9%	0,03	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	5,6%	15,6%	0,0	0,0	78,8%	0,09	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	17,3%	5,1%	0,0	0,0	77,6%	0,08	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	19,0%	11,3%	0,0	1,0	69,7%	0,09	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	5,9%	22,1%	0,0	0,0	72,0%	0,22	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	14,4%	5,3%	0,0	0,0	80,3%	0,04	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,5%	24,0%	0,0	0,0	75,5%	0,12	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	14,7%	0,1%	0,0	0,0	85,2%	0,26	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	1,7%	18,8%	0,0	0,0	79,5%	-0,23	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	13,6%	4,1%	0,0	0,0	82,0%	-0,77	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	1,4%	17,1%	0,0	0,0	81,5%	0,06	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	11,0%	9,4%	0,0	0,0	79,6%	0,67	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	1,2%	25,8%	0,0	1,0	73,0%	-0,04	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	14,7%	4,9%	0,0	0,0	80,4%	-0,03	
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	2,3%	25,6%	0,0	0,0	72,1%	-0,62	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	2,0%	26,8%	0,0	0,0	71,2%	1,56	

DATA		Semana 1: 05/06 a 09/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	2,0%	16,6%	0,0	0,0	81,4%	-0,59	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	2,6%	23,1%	0,0	0,0	74,3%	0,06	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	1,6%	17,2%	0,0	0,0	81,2%	0,03	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	3,7%	16,9%	0,0	0,0	79,4%	0,06	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	1,3%	22,7%	0,0	0,0	76,0%	0,07	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	2,0%	13,9%	0,0	0,0	84,1%	0,04	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	3,4%	17,2%	0,0	0,0	79,4%	-0,06	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	3,9%	22,5%	0,0	0,0	73,6%	0,23	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	2,1%	16,9%	0,0	0,0	81,0%	-0,02	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	3,0%	15,5%	0,0	0,0	81,5%	0,09	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	3,6%	19,2%	0,0	0,0	77,2%	0,39	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	2,0%	18,0%	0,0	0,0	80,0%	-0,09	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	2,1%	19,8%	0,0	0,0	78,1%	-0,09	
	PMG-103	0,0%	0,0%	1,7%	19,1%	0,0	0,0	79,2%	0,17	
	PMG-104	0,0%	0,0%	1,7%	19,9%	0,0	0,0	78,4%	0,58	
	PMG-105	0,0%	0,0%	3,4%	15,5%	0,0	0,0	81,1%	-0,06	
	PMG-106	0,0%	0,0%	5,2%	18,0%	0,0	0,0	76,8%	0,04	
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,5%	22,1%	0,0	0,0	77,4%	-0,01	
	PMG-108	0,0%	0,0%	0,4%	24,5%	0,0	0,0	75,1%	0,40	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	4,1%	15,7%	0,0	0,0	80,2%	-0,32	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	0,5%	19,6%	0,0	0,0	79,9%	0,09	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	5,7%	2,3%	0,0	0,0	92,0%	0,21	
	PMG-110 B	0,0%	0,1%	0,7%	19,9%	0,0	1,0	79,4%	0,06	A
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,7%	18,2%	0,0	0,0	81,1%	-0,08	
Guarda Universitário	PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,8%	19,9%	0,0	0,0	79,3%	0,04	
	PMG-112	0,0%	0,0%	1,8%	20,3%	0,0	0,0	77,9%	-0,06	
	PMG-116 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,9%	0,0	0,0	78,7%	-0,06	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	3,0%	18,5%	0,0	0,0	78,5%	-0,25	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	0,9%	24,1%	0,0	0,0	75,0%	0,09	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	2,9%	16,8%	0,0	0,0	80,3%	0,57	
Portaria P3	PMG-118 A	0,0%	0,0%	2,3%	22,9%	0,0	0,0	74,8%	0,04	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	0,6%	17,4%	0,0	0,0	82,0%	0,06	
	PMG-119 A	0,0%	0,0%	1,7%	15,1%	0,0	0,0	83,2%	-0,02	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	1,0%	20,1%	0,0	0,0	78,9%	0,19	
	PMG-119 C	0,1%	0,1%	0,9%	17,1%	0,0	0,0	81,9%	-2,14	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	3,4%	21,8%	0,0	0,0	74,8%	0,15	
Transportes	PMG-120 B	0,0%	0,0%	2,0%	19,1%	0,0	0,0	78,9%	0,06	
	PMG-120 C	0,1%	0,1%	1,0%	20,9%	0,0	0,0	78,0%	-0,02	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	0,8%	23,7%	0,0	0,0	75,5%	0,06	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	8,1%	7,8%	0,0	0,0	84,1%	-0,32	A
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	1,6%	22,9%	0,0	1,0	75,5%	-0,17	
	PMG-122 B	0,1%	0,1%	5,6%	14,5%	0,0	0,0	79,8%	-0,09	A
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,3%	0,0	0,0	78,8%	0,04	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	5,9%	11,8%	0,0	0,0	82,3%	0,01	A
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,6%	22,0%	0,0	0,0	77,4%	-0,05	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	7,9%	14,0%	0,0	0,0	78,1%	-0,49	A

DATA		Semana 2: 12/06 a 16/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	5,0%	18,8%	0,0	0,0	76,2%	0,03	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	10,2%	13,2%	0,0	0,0	76,6%	0,06	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	4,5%	15,5%	0,0	0,0	80,0%	-0,10	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	5,9%	19,8%	0,0	0,0	74,3%	0,18	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	1,4%	29,2%	0,0	0,0	69,4%	0,06	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	4,4%	9,6%	0,0	0,0	86,0%	0,04	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	3,2%	25,3%	0,0	0,0	71,5%	0,07	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	1,5%	23,0%	0,0	0,0	75,5%	0,02	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	1,1%	24,2%	0,0	0,0	74,7%	0,18	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	5,9%	12,2%	0,0	0,0	81,9%	0,25	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	2,0%	24,3%	0,0	0,0	73,7%	-0,19	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,7%	21,0%	0,0	0,0	77,3%	-0,17	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	2,8%	18,3%	0,0	0,0	78,9%	-0,23	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	2,6%	27,0%	0,0	0,0	70,4%	-0,25	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,7%	0,0	0,0	78,7%	-0,22	
	PMG-114 B	1,2%	1,2%	1,6%	24,8%	0,0	0,0	72,4%	3,64	A
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,6%	30,2%	0,0	0,0	69,2%	-0,31	
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	2,6%	20,8%	0,0	0,0	76,6%	-0,30	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11 A	0,0%	0,0%	2,3%	17,7%	0,0	0,0	80,0%	-0,26	
	PMG-11 B	11,9%	12,6%	14,2%	12,1%	0,0	0,0	61,8%	-0,37	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	2,8%	22,7%	0,0	0,0	74,5%	-0,27	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	3,4%	29,0%	0,0	0,0	67,4%	-0,15	A
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	6,8%	16,5%	0,0	0,0	76,7%	-0,14	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	7,5%	18,5%	0,0	0,0	74,0%	-0,14	
	PMG-14 A	0,0%	0,0%	5,6%	8,4%	0,0	0,0	86,0%	-0,14	
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	11,4%	6,8%	0,0	0,0	81,8%	0,06	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	1,8%	19,3%	0,0	1,0	78,9%	-0,09	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	1,5%	22,4%	1,0	0,0	76,1%	-0,17	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	0,5%	24,9%	0,0	0,0	74,6%	0,08	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	1,4%	17,1%	0,0	0,0	81,5%	-0,17	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	2,4%	15,9%	0,0	1,0	81,7%	0,18	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	4,2%	14,3%	0,0	0,0	81,5%	-0,25	
I-3 Auditórios	PMG-24 A	0,0%	0,0%	3,3%	20,4%	0,0	0,0	76,3%	-0,30	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	1,9%	19,8%	0,0	0,0	78,3%	-0,28	
	PMG-25 A	0,0%	0,0%	1,5%	30,5%	0,0	0,0	68,0%	-0,26	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	3,6%	19,3%	0,0	0,0	77,1%	-3,27	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	2,2%	19,0%	0,0	0,0	78,8%	-0,18	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	6,5%	18,4%	0,0	0,0	75,1%	0,10	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	3,5%	19,5%	0,0	0,0	77,0%	0,08	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	10,7%	7,7%	0,0	0,0	81,6%	0,27	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,8%	17,9%	0,0	0,0	79,3%	0,25	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	12,9%	11,0%	0,0	0,0	76,1%	0,22	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	3,0%	26,3%	0,0	0,0	70,7%	-0,06	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	4,1%	15,1%	0,0	0,0	80,8%	-0,12	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	3,6%	15,9%	0,0	0,0	80,5%	-0,14	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	2,2%	22,2%	0,0	0,0	75,6%	-0,11	
	PMG-45 A	0,0%	0,0%	2,2%	24,8%	0,0	0,0	73,0%	-0,13	
	PMG-45 B	0,0%	0,0%	4,3%	17,3%	0,0	0,0	78,4%	-0,13	

DATA		Semana 2: 12/06 a 16/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	2,1%	26,1%	0,0	0,0	71,8%	-0,15	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	7,0%	12,7%	0,0	0,0	80,3%	-0,20	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	1,2%	28,6%	2,0	0,0	70,2%	-0,17	
	PMG-31 B	0,2%	0,2%	13,6%	4,8%	0,0	0,0	81,3%	-1,78	A
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	1,6%	25,8%	0,0	0,0	72,6%	-0,04	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	6,7%	20,6%	0,0	0,0	72,7%	-0,09	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	0,9%	18,7%	0,0	0,0	80,4%	0,25	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	11,3%	13,0%	0,0	0,0	75,7%	0,22	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	1,3%	24,0%	0,0	0,0	74,7%	0,26	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	3,0%	14,9%	0,0	0,0	82,1%	-0,08	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	1,1%	24,1%	0,0	0,0	74,8%	-0,14	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	4,1%	16,8%	0,0	0,0	79,1%	-0,08	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	1,1%	26,1%	0,0	1,0	72,8%	-0,23	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	13,8%	8,8%	0,0	0,0	77,4%	0,08	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	2,7%	18,8%	0,0	0,0	78,5%	-0,05	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	3,0%	21,5%	0,0	0,0	75,5%	-0,28	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	1,8%	28,6%	0,0	0,0	69,6%	-0,03	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	2,9%	18,2%	0,0	0,0	78,9%	-0,27	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	1,7%	25,1%	0,0	0,0	73,2%	-0,15	
	PMG-39 B	0,9%	1,2%	6,7%	12,5%	0,0	0,0	79,9%	-0,38	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	1,4%	27,0%	0,0	0,0	71,6%	0,12	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	1,2%	22,6%	0,0	0,0	76,2%	0,11	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	2,7%	23,4%	0,0	0,0	73,9%	0,10	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	1,4%	18,5%	0,0	0,0	80,1%	-0,09	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	3,4%	24,0%	0,0	0,0	72,6%	0,22	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	11,9%	10,6%	0,0	0,0	77,5%	0,29	
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	3,2%	19,3%	0,0	0,0	77,5%	-0,05	
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	2,9%	24,6%	0,0	0,0	72,5%	0,06	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	2,8%	19,5%	0,0	0,0	77,7%	0,03	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	4,9%	24,0%	1,0	0,0	71,1%	-0,13	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	1,3%	24,8%	0,0	0,0	73,9%	0,19	
	PMG-64 B	0,1%	0,2%	2,3%	16,9%	0,0	0,0	80,7%	0,17	
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	1,7%	29,6%	0,0	0,0	68,7%	-0,09	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	0,4%	23,7%	0,0	0,0	75,9%	-1,15	A
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,8%	26,3%	0,0	1,0	72,9%	-0,11	
	PMG-66 B	0,1%	0,1%	18,6%	3,2%	0,0	0,0	78,1%	1,26	A
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	1,6%	20,4%	0,0	0,0	78,0%	0,32	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	3,1%	16,1%	0,0	0,0	80,8%	0,09	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	1,3%	21,6%	0,0	0,0	77,1%	0,06	
	PMG-68 B	0,0%	0,1%	1,1%	23,8%	0,0	0,0	74,9%	0,54	A
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	1,3%	22,2%	0,0	0,0	76,4%	0,18	
	PMG-69 B	0,0%	0,0%	1,9%	14,6%	1,0	0,0	83,5%	-0,65	A
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,3%	0,0	0,0	78,7%	-0,18	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,4%	0,0	0,0	78,4%	-0,15	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,8%	21,0%	0,0	0,0	78,2%	0,11	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	1,0%	24,2%	0,0	0,0	74,8%	0,06	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,5%	21,8%	0,0	0,0	77,7%	-0,05	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,3%	24,9%	0,0	1,0	74,8%	0,29	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	1,0%	22,2%	0,0	0,0	76,8%	-0,10	
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	1,2%	22,0%	0,0	0,0	76,8%	-0,20	
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	2,3%	25,1%	0,0	0,0	72,6%	0,09	
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	1,3%	24,0%	0,0	0,0	74,7%	-0,05	A

DATA		Semana 2: 12/06 a 16/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5 % e 15 % ; maior que 15 % . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	2,8%	19,2%	0,0	0,0	78,0%	-0,13	
	PMG-46 B	1,1 %	1,9 %	12,5%	4,4%	0,0	0,0	82,0%	0,04	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	1,0%	22,6%	0,0	0,0	76,4%	-0,36	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	4,0%	19,2%	0,0	0,0	76,8%	-0,03	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	2,3%	23,1%	0,0	0,0	74,6%	-0,12	
	PMG-48 B	31,6 %	31,6 %	6,4%	5,3%	0,0	0,0	56,7%	1,62	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	1,7%	22,6%	1,0	0,0	75,7%	-0,46	
	PMG-49 B	30,7 %	30,8 %	6,5%	12,3%	0,0	0,0	50,5%	0,89	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	1,8%	23,6%	0,0	0,0	74,6%	-0,14	
	PMG-50 B	0,4%	0,7%	11,8%	15,5%	0,0	1,0	72,3%	0,06	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	3,6%	19,8%	0,0	0,0	76,6%	-0,22	
	PMG-51 B	0,1%	0,2%	7,3%	14,0%	0,0	0,0	78,6%	-0,13	A
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,3%	29,3%	0,0	0,0	70,4%	-0,06	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,9%	23,2%	0,0	0,0	75,9%	0,01	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,8%	23,0%	0,0	0,0	76,2%	-0,33	
	PMG-53 B	0,0%	0,0%	8,1%	2,6%	0,0	0,0	89,3%	0,18	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	2,3%	20,8%	0,0	0,0	76,9%	-0,14	
	PMG-54 B	0,1%	0,1%	10,9%	8,9%	0,0	0,0	80,1%	-1,47	A
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	1,5%	16,4%	0,0	0,0	82,1%	-0,64	
	PMG-55 B	34,1 %	39,7 %	9,2%	8,8%	0,0	0,0	47,9%	-2,17	A
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,1%	0,0	0,0	79,7%	-0,06	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	6,1%	21,2%	0,0	1,0	72,7%	-0,04	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	3,1%	21,6%	0,0	0,0	75,3%	-0,08	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	7,4%	11,0%	0,0	0,0	81,6%	-0,11	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,8%	26,0%	0,0	0,0	73,2%	-0,14	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	3,4%	16,5%	0,0	0,0	80,1%	-0,26	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	1,2%	27,6%	0,0	0,0	71,2%	0,04	
	PMG-59 B	6,4 %	8,1 %	7,2%	11,9%	0,0	0,0	74,5%	0,09	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,3%	25,8%	0,0	0,0	72,9%	0,08	
	PMG-60 B	6,9 %	7,0 %	6,1%	3,8%	0,0	0,0	82,6%	0,95	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,9%	23,1%	0,0	0,0	75,0%	-0,25	
	PMG-61 B	9,2 %	9,7 %	13,3%	1,9%	0,0	0,0	75,6%	-0,24	
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	3,3%	22,6%	0,0	0,0	74,1%	-0,05	
	PMG-62 B	34,4 %	34,4 %	9,1%	0,7%	0,0	0,0	55,5%	5,68	E

DATA		Semana 2: 12/06 a 16/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	2,5%	17,7%	0,0	1,0	79,8%	-0,13	
	PMG-01 B	0,1%	0,2%	16,6%	3,1%	0,0	0,0	80,2%	-0,06	A
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,9%	0,0	0,0	77,5%	0,22	
	PMG-02 B	0,0%	0,0%	0,1%	25,3%	0,0	0,0	74,6%	0,19	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,4%	0,0	0,0	79,0%	0,16	
	PMG-03 B	0,0%	0,1%	11,8%	18,0%	0,0	0,0	70,2%	-0,15	A
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	3,8%	24,9%	0,0	0,0	71,3%	0,21	
	PMG-04 B	0,0%	0,0%	4,8%	22,3%	0,0	0,0	72,9%	0,22	A
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	1,8%	21,1%	0,0	0,0	77,1%	-0,13	
	PMG-05 B	0,0%	0,1%	1,6%	24,6%	0,0	0,0	73,8%	0,04	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	1,8%	17,6%	1,0	0,0	80,6%	0,09	
	PMG-06 B	59,7 %	59,7 %	4,4%	4,4%	0,0	0,0	31,1%	15,78	E
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	1,7%	20,1%	0,0	0,0	78,2%	0,23	
	PMG-07 B	0,0%	0,1%	1,1%	26,9%	0,0	0,0	71,8%	1,63	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	1,7%	22,8%	0,0	0,0	75,5%	0,18	
	PMG-08 B	0,1%	0,1%	10,3%	12,8%	0,0	0,0	76,8%	-0,96	A
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	9,9%	18,8%	0,0	0,0	71,3%	-0,27	
	PMG-09 B	0,1%	0,2%	21,7%	2,9%	0,0	2,0	75,3%	-1,05	A
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	3,1%	21,7%	0,0	0,0	75,2%	-0,23	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	7,1%	16,4%	0,0	0,0	76,5%	0,06	A
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	1,7%	25,6%	0,0	0,0	72,7%	-0,06	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	9,9%	12,8%	0,0	0,0	77,3%	0,14	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	4,9%	15,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,03	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	12,7%	7,4%	0,0	0,0	79,9%	0,02	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	2,9%	20,6%	0,0	0,0	76,5%	0,01	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	4,1%	13,1%	0,0	0,0	82,8%	0,05	
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	4,4%	9,4%	0,0	0,0	86,2%	-0,13	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	10,0%	10,4%	0,0	0,0	79,6%	-0,16	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	1,5%	22,7%	0,0	1,0	75,8%	-0,16	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	1,2%	27,2%	0,0	0,0	71,6%	-0,12	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,3%	29,7%	0,0	0,0	70,0%	-0,12	
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	4,6%	3,5%	0,0	0,0	91,9%	-0,02	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	1,2%	25,7%	0,0	0,0	73,1%	-0,01	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	2,2%	18,6%	0,0	0,0	79,2%	-0,03	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,5%	25,5%	0,0	0,0	74,0%	-0,33	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,2%	19,1%	1,0	0,0	80,7%	-0,01	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	1,3%	22,5%	0,0	0,0	76,2%	-0,15	
	PMG-74 B	0,3%	0,4%	0,5%	4,3%	1,0	0,0	94,8%	-1,54	A
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,9%	26,2%	0,0	0,0	72,9%	-0,22	
	PMG-75 B	0,0%	0,0%	6,6%	10,8%	0,0	0,0	82,6%	0,64	A
	PMG-76 A	0,0%	0,0%	1,9%	28,4%	0,0	0,0	69,7%	-0,26	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	6,7%	13,5%	0,0	0,0	79,8%	-0,19	
CAT	PMG-82 A	0,0%	0,0%	17,2%	5,4%	0,0	0,0	77,4%	0,07	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	17,7%	10,5%	0,0	0,0	71,8%	0,19	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	6,4%	28,8%	0,0	0,0	64,8%	-0,03	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	14,5%	6,2%	0,0	0,0	79,3%	-0,17	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,2%	26,4%	0,0	0,0	73,4%	0,06	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	17,0%	3,6%	0,0	0,0	79,4%	-0,10	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	2,2%	18,8%	0,0	0,0	79,0%	0,20	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	13,2%	8,5%	0,0	0,0	78,0%	-0,33	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	2,3%	16,2%	0,0	0,0	81,5%	0,06	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	11,9%	11,4%	0,0	0,0	76,7%	-0,05	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	1,6%	32,8%	0,0	1,0	65,6%	-0,11	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	15,3%	6,9%	2,0	0,0	77,8%	-0,25	
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	3,2%	26,5%	0,0	0,0	70,3%	0,28	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	1,7%	33,8%	0,0	0,0	64,5%	0,08	

DATA		Semana 2: 12/06 a 16/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	2,3%	18,7%	0,0	0,0	79,0%	0,08	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	2,6%	28,6%	0,0	0,0	68,8%	0,16	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,4%	0,0	0,0	79,2%	-0,20	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	3,7%	19,5%	0,0	0,0	76,8%	-0,18	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	1,7%	28,8%	0,0	0,0	69,5%	-0,19	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	3,1%	17,6%	0,0	0,0	79,3%	-0,46	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	1,6%	18,4%	0,0	0,0	80,0%	0,40	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	3,9%	20,8%	0,0	0,0	75,3%	-0,19	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	3,1%	15,8%	0,0	0,0	81,1%	-0,16	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	3,7%	17,0%	0,0	0,0	79,3%	-0,25	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	2,0%	17,0%	0,0	0,0	81,0%	-0,21	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	1,8%	20,5%	1,0	0,0	77,7%	-0,27	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	2,4%	18,7%	0,0	0,0	78,9%	-0,14	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,8%	23,7%	0,0	0,0	75,5%	-0,17	
	PMG-104	0,0%	0,0%	1,2%	23,6%	0,0	0,0	75,2%	-0,06	
	PMG-105	0,0%	0,0%	4,7%	16,1%	0,0	0,0	79,2%	-0,30	
	PMG-106	0,0%	0,0%	3,8%	24,7%	0,0	0,0	71,5%	-0,01	
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,3%	23,1%	0,0	0,0	76,6%	-0,18	
	PMG-108	0,0%	0,0%	0,5%	30,1%	0,0	0,0	69,4%	-0,23	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	4,0%	17,0%	0,0	0,0	79,0%	-0,19	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	0,6%	26,5%	0,0	0,0	72,9%	-0,21	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	5,8%	6,4%	0,0	0,0	87,8%	-0,27	
	PMG-110 B	1,9%	3,4%	0,6%	19,2%	0,0	0,0	78,3%	0,08	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,3%	0,0	0,0	77,6%	-0,11	
	PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,3%	21,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,24	
	PMG-112	0,0%	0,0%	2,5%	25,5%	0,0	0,0	72,0%	0,13	
Guarda Universitário	PMG-116 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,5%	0,0	0,0	78,3%	0,14	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	2,1%	21,0%	0,0	0,0	76,9%	-0,11	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	1,5%	24,6%	0,0	0,0	73,9%	-0,16	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	3,2%	18,2%	0,0	0,0	78,6%	-0,05	
	PMG-118 A	0,0%	0,0%	1,7%	20,7%	0,0	0,0	77,6%	-0,07	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	0,4%	15,7%	0,0	0,0	83,9%	-0,04	
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	2,0%	18,2%	0,0	0,0	79,8%	-0,04	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,0%	24,8%	0,0	0,0	75,2%	0,19	
	PMG-119 C	0,1%	0,1%	2,2%	18,8%	0,0	0,0	78,9%	0,69	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	3,0%	22,6%	0,0	0,0	74,4%	0,02	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	0,8%	22,6%	0,0	0,0	76,6%	0,01	
Transportes	PMG-120 C	0,0%	0,1%	1,1%	25,1%	0,0	0,0	73,8%	-0,47	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	1,7%	28,0%	0,0	0,0	70,3%	0,20	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	8,7%	8,8%	0,0	0,0	82,5%	-0,07	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	2,3%	26,1%	0,0	0,0	71,6%	0,04	
	PMG-122 B	0,1%	0,3%	6,8%	16,6%	0,0	0,0	76,5%	-0,58	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	0,6%	19,4%	0,0	0,0	80,0%	-0,09	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	6,7%	13,3%	0,0	0,0	80,0%	0,13	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	1,3%	22,8%	0,0	0,0	75,9%	-0,13	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	8,6%	15,8%	0,0	0,0	75,6%	-0,26	

DATA		Semana 3: 19/06 a 23/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0%	0,0%	4,2%	16,1%	0,0	0,0	79,7%	0,04	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	9,6%	9,5%	0,0	0,0	80,9%	0,14	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	3,6%	9,9%	0,0	0,0	86,5%	-0,08	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	7,1%	20,5%	0,0	0,0	72,4%	0,13	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,3%	22,5%	0,0	0,0	77,2%	0,14	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	4,4%	11,0%	0,0	0,0	84,6%	0,01	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	3,4%	24,0%	0,0	0,0	72,6%	0,01	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	0,2%	20,3%	0,0	0,0	79,5%	-0,06	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,5%	0,0	0,0	77,5%	0,19	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	5,2%	13,8%	0,0	0,0	81,0%	0,29	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	1,0%	23,2%	0,0	0,0	75,8%	-0,21	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,3%	18,0%	0,0	0,0	80,7%	-0,12	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	3,2%	22,2%	0,0	0,0	74,6%	-0,22	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	1,9%	18,8%	0,0	0,0	79,3%	-0,27	
	PMG-114 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,2%	0,0	0,0	79,0%	-0,19	
	PMG-114 B	0,6%	0,6%	1,0%	21,7%	0,0	0,0	76,6%	-1,95	A
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,2%	22,2%	0,0	0,0	77,6%	-0,36	
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	1,6%	17,5%	0,0	0,0	80,9%	-0,32	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11 A	0,0%	0,0%	1,8%	16,0%	0,0	0,0	82,2%	-0,27	
	PMG-11 B	9,7%	10,6%	13,4%	0,2%	0,0	0,0	76,7%	-0,34	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	3,6%	13,7%	0,0	0,0	82,7%	-0,21	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	2,6%	19,9%	0,0	0,0	77,3%	0,79	A
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	6,0%	14,7%	0,0	0,0	79,3%	-0,19	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	6,9%	17,5%	0,0	0,0	75,6%	-0,06	
	PMG-14 A	0,0%	0,0%	4,7%	9,7%	0,0	0,0	85,6%	-0,18	
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	12,6%	3,2%	0,0	0,0	84,2%	0,00	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	0,7%	22,2%	0,0	1,0	77,1%	-0,17	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	1,5%	21,5%	1,0	0,0	77,0%	-0,16	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,6%	0,0	0,0	77,7%	0,12	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	0,4%	17,2%	0,0	0,0	82,4%	-0,19	
	PMG-21 A	0,0%	0,0%	2,3%	15,3%	0,0	1,0	82,4%	0,23	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	3,5%	16,7%	0,0	0,0	79,8%	-0,24	
I-3 Auditórios	PMG-24 A	0,0%	0,0%	2,3%	18,1%	0,0	0,0	79,6%	-0,32	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	1,5%	17,3%	0,0	0,0	81,2%	-0,25	
	PMG-25 A	0,0%	0,0%	1,9%	23,8%	0,0	0,0	74,3%	-0,25	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	2,9%	23,0%	0,0	0,0	74,1%	-3,32	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	1,4%	15,6%	0,0	0,0	83,0%	-0,20	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	5,9%	14,4%	0,0	0,0	79,7%	0,09	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	2,8%	15,5%	0,0	0,0	81,7%	0,11	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	9,7%	10,0%	0,0	0,0	80,3%	0,33	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,3%	13,9%	0,0	0,0	83,8%	0,27	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	12,1%	5,6%	0,0	0,0	82,3%	0,17	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	3,8%	23,6%	0,0	0,0	72,6%	0,02	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	3,1%	11,8%	0,0	0,0	85,1%	-0,16	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	3,2%	21,1%	0,0	0,0	75,7%	-0,20	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	1,5%	14,7%	0,0	0,0	83,8%	-0,19	
	PMG-45 A	0,0%	0,0%	1,3%	20,6%	0,0	0,0	78,1%	-0,12	
	PMG-45 B	0,0%	0,0%	3,8%	19,7%	0,0	0,0	76,5%	-0,09	

DATA		Semana 3: 19/06 a 23/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	1,0%	15,2%	0,0	0,0	83,8%	-0,17	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	6,9%	12,0%	0,0	0,0	81,1%	-0,15	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,4%	23,2%	2,0	0,0	76,4%	-0,16	
	PMG-31 B	0,1%	0,2%	12,9%	0,3%	0,0	0,0	86,6%	0,88	A
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	2,7%	16,6%	0,0	0,0	80,7%	-0,01	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	7,5%	14,0%	0,0	0,0	78,5%	-0,08	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	1,3%	14,9%	0,0	0,0	83,8%	0,20	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	10,6%	14,5%	0,0	0,0	74,9%	0,20	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	0,1%	19,5%	0,0	0,0	80,4%	0,25	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	2,3%	16,5%	0,0	0,0	81,2%	-0,05	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	0,9%	20,7%	0,0	0,0	78,4%	-0,08	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	4,4%	12,0%	0,0	0,0	83,6%	-0,06	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	0,8%	18,6%	0,0	1,0	80,6%	-0,28	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	13,2%	6,0%	0,0	0,0	80,8%	0,16	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	2,1%	20,5%	0,0	0,0	77,4%	-0,09	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	2,0%	14,6%	0,0	0,0	83,4%	-0,34	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,3%	0,0	0,0	78,6%	-0,11	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	2,0%	13,1%	0,0	0,0	84,9%	-0,26	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	1,5%	23,1%	0,0	0,0	75,4%	-0,11	
	PMG-39 B	0,7%	0,9%	7,1%	8,3%	0,0	0,0	83,9%	-0,40	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	1,6%	22,9%	0,0	0,0	75,5%	0,17	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	1,1%	21,2%	0,0	0,0	77,7%	0,12	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,9%	0,0	0,0	77,9%	0,08	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	1,2%	17,2%	0,0	0,0	81,6%	-0,06	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	3,1%	21,8%	0,0	0,0	75,1%	0,23	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	11,9%	7,4%	0,0	0,0	80,7%	0,24	
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	3,2%	15,3%	0,0	0,0	81,5%	-0,07	
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	2,3%	22,0%	0,0	0,0	75,7%	0,05	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	2,4%	13,8%	0,0	0,0	83,8%	-0,05	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	3,7%	20,7%	1,0	0,0	75,6%	-0,12	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,6%	26,8%	0,0	0,0	72,6%	0,23	
	PMG-64 B	0,2%	0,2%	0,4%	12,3%	0,0	0,0	87,1%	2,16	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	1,4%	26,1%	0,0	0,0	72,5%	-0,04	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	0,0%	21,7%	0,0	0,0	78,2%	-0,37	A
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,7%	0,0	1,0	79,5%	-0,13	
	PMG-66 B	0,1%	0,1%	17,6%	1,3%	0,0	0,0	80,9%	-1,26	A
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	0,7%	18,6%	0,0	0,0	80,7%	0,33	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	2,7%	19,3%	0,0	0,0	78,0%	0,04	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	1,4%	18,1%	0,0	0,0	80,5%	0,04	
	PMG-68 B	0,1%	0,1%	0,7%	22,9%	0,0	0,0	76,3%	-0,58	A
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	0,7%	20,6%	0,0	0,0	78,7%	0,21	
	PMG-69 B	0,1%	0,1%	0,8%	17,1%	1,0	0,0	82,0%	-0,14	A
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,7%	18,5%	0,0	0,0	80,8%	-0,16	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	0,3%	23,3%	0,0	0,0	76,4%	-0,20	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,4%	20,3%	0,0	0,0	79,3%	0,19	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	0,6%	18,0%	0,0	0,0	81,4%	0,02	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,6%	0,0	0,0	78,6%	-0,11	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	0,4%	24,1%	0,0	1,0	75,5%	0,21	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	1,0%	17,5%	0,0	0,0	81,5%	-0,09	
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	0,7%	19,6%	0,0	0,0	79,7%	-0,16	
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	1,6%	25,2%	0,0	0,0	73,2%	0,07	
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	0,2%	22,8%	0,0	0,0	77,0%	0,36	A

DATA		Semana 3: 19/06 a 23/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	2,5%	22,2%	0,0	0,0	75,3%	-0,21	
	PMG-46 B	1,3%	1,8%	12,5%	7,0%	0,0	0,0	79,2%	0,05	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,2%	23,3%	0,0	0,0	76,5%	-0,32	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	3,4%	12,7%	0,0	0,0	83,9%	-0,05	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	1,8%	24,6%	0,0	0,0	73,6%	-0,07	
	PMG-48 B	31,9%	32,0%	5,3%	3,2%	0,0	0,0	59,4%	1,31	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	0,8%	18,5%	1,0	0,0	80,7%	0,02	
	PMG-49 B	31,1%	31,1%	6,7%	10,8%	0,0	0,0	50,3%	0,69	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	1,1%	21,6%	0,0	0,0	77,3%	-0,13	
	PMG-50 B	0,8%	1,2%	11,8%	11,5%	0,0	1,0	75,9%	0,01	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	2,8%	21,3%	0,0	0,0	75,9%	-0,24	
	PMG-51 B	0,2%	0,3%	6,8%	9,9%	0,0	0,0	83,1%	-0,29	A
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,4%	23,8%	0,0	0,0	75,8%	-0,03	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,6%	17,3%	0,0	0,0	82,1%	0,07	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	0,8%	19,1%	0,0	0,0	80,1%	-0,31	
	PMG-53 B	0,0%	0,0%	8,1%	1,8%	0,0	0,0	90,1%	0,13	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	1,7%	17,9%	0,0	0,0	80,4%	-0,06	
	PMG-54 B	0,2%	0,2%	10,7%	10,4%	0,0	0,0	78,6%	-0,46	A
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,4%	13,6%	0,0	0,0	86,0%	-0,08	
	PMG-55 B	37,9%	42,6%	8,3%	3,5%	0,0	0,0	50,3%	0,65	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	1,2%	16,8%	0,0	0,0	82,0%	-0,05	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	5,4%	14,8%	0,0	1,0	79,8%	0,00	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	2,1%	16,2%	0,0	0,0	81,7%	-0,10	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	6,8%	13,2%	0,0	0,0	80,0%	-0,06	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	0,3%	20,9%	0,0	0,0	78,8%	-0,22	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	3,3%	14,4%	0,0	0,0	82,3%	-0,25	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,1%	27,0%	0,0	0,0	72,9%	0,08	
	PMG-59 B	5,9%	7,8%	7,8%	10,7%	0,0	0,0	75,6%	0,07	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,8%	0,0	0,0	79,0%	0,13	
	PMG-60 B	6,1%	6,2%	6,4%	2,0%	0,0	0,0	85,2%	-1,56	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,8%	19,8%	0,0	0,0	78,4%	-0,27	
	PMG-61 B	10,6%	11,8%	13,3%	3,6%	0,0	0,0	72,5%	-0,21	
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	3,5%	18,4%	0,0	0,0	78,1%	-0,04	
	PMG-62 B	33,1%	33,1%	1,4%	0,5%	0,0	0,0	65,0%	-3,15	E

DATA		Semana 3: 19/06 a 23/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	1,2%	16,4%	0,0	1,0	82,4%	-0,15	
	PMG-01 B	0,1%	0,2%	16,3%	0,3%	0,0	0,0	83,3%	-1,79	A
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,1%	22,1%	0,0	0,0	77,8%	0,25	
	PMG-02 B	0,0%	0,1%	0,2%	21,8%	0,0	0,0	78,0%	-1,26	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	1,2%	26,5%	0,0	0,0	72,3%	0,18	
	PMG-03 B	0,1%	0,1%	11,4%	9,4%	0,0	0,0	79,1%	-0,69	A
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	4,2%	29,6%	0,0	0,0	66,2%	0,29	
	PMG-04 B	0,0%	0,1%	4,4%	19,4%	0,0	0,0	76,2%	-0,26	A
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	2,2%	17,4%	0,0	0,0	80,4%	-0,19	
	PMG-05 B	0,0%	0,1%	1,2%	25,0%	0,0	0,0	73,8%	0,64	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	1,4%	19,8%	1,0	0,0	78,8%	0,10	
	PMG-06 B	61,4 %	61,5 %	4,7%	0,2%	0,0	0,0	33,5%	-16,44	E
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,6%	27,7%	0,0	0,0	71,7%	0,21	
	PMG-07 B	0,0%	0,1%	0,7%	26,2%	0,0	0,0	73,1%	-0,89	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	1,1%	26,2%	0,0	0,0	72,7%	0,17	
	PMG-08 B	0,1%	0,2%	9,3%	11,5%	0,0	0,0	79,1%	-0,97	A
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	9,1%	14,3%	0,0	0,0	76,6%	-0,21	
	PMG-09 B	0,2%	0,2%	0,2%	2,2%	0,0	2,0	97,4%	-2,54	A
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	3,8%	16,3%	0,0	0,0	79,9%	-0,28	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	8,3%	19,0%	0,0	0,0	72,7%	0,06	A
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	1,4%	16,9%	0,0	0,0	81,7%	-0,10	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	10,8%	12,0%	0,0	0,0	77,2%	0,08	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	3,8%	12,5%	0,0	0,0	83,7%	-0,11	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	12,6%	15,9%	0,0	0,0	71,5%	0,03	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	3,6%	13,9%	0,0	0,0	82,5%	0,05	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	4,1%	15,9%	0,0	0,0	80,0%	0,03	
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	3,5%	5,6%	0,0	0,0	90,9%	-0,08	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	9,1%	10,7%	0,0	0,0	80,2%	-0,24	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,9%	19,7%	0,0	1,0	79,4%	-0,15	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	0,9%	22,3%	0,0	0,0	76,8%	-0,08	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,5%	25,1%	0,0	0,0	74,4%	-0,14	
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	4,5%	5,4%	0,0	0,0	90,1%	0,03	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	1,4%	21,0%	0,0	0,0	77,6%	0,00	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	1,8%	19,3%	0,0	0,0	78,9%	-0,05	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,6%	25,0%	0,0	0,0	74,4%	-0,30	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,4%	17,8%	1,0	0,0	81,8%	0,00	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,0%	14,2%	0,0	0,0	85,8%	-0,20	
	PMG-74 B	1,6 %	1,6 %	0,5%	2,4%	1,0	0,0	95,5%	-0,16	A
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,2%	21,8%	0,0	0,0	78,0%	-0,23	
	PMG-75 B	0,0%	0,1%	5,8%	11,8%	0,0	0,0	82,1%	-0,49	A
	PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,5%	26,3%	0,0	0,0	73,2%	-0,20	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	6,0%	17,2%	0,0	0,0	76,8%	-0,17	
CAT	PMG-82 A	0,0%	0,0%	17,0%	6,7%	0,0	0,0	76,3%	0,02	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	18,3%	9,9%	0,0	0,0	71,8%	0,27	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	5,9%	21,7%	0,0	0,0	72,4%	-0,07	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	13,8%	4,9%	0,0	0,0	81,3%	-0,23	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,6%	26,6%	0,0	0,0	72,8%	-0,02	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	15,5%	0,6%	0,0	0,0	83,9%	-0,09	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	0,7%	17,4%	0,0	0,0	81,9%	0,24	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	13,0%	2,0%	0,0	0,0	84,7%	0,29	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	1,5%	15,7%	0,0	0,0	82,8%	0,11	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	11,0%	9,0%	0,0	0,0	80,0%	-0,13	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	0,9%	24,4%	0,0	1,0	74,7%	-0,10	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	14,8%	7,0%	2,0	0,0	78,2%	-0,21	
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	2,4%	23,8%	0,0	0,0	73,8%	0,26	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	0,8%	25,4%	0,0	0,0	73,8%	0,13	

DATA		Semana 3: 19/06 a 23/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	2,1%	19,3%	0,0	0,0	78,6%	0,09	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	1,8%	22,5%	0,0	0,0	75,7%	0,14	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	1,1%	19,2%	0,0	0,0	79,7%	-0,17	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	3,7%	16,3%	0,0	0,0	80,0%	-0,17	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	1,2%	21,3%	0,0	0,0	77,5%	-0,24	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	2,1%	12,5%	0,0	0,0	85,4%	-0,02	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	3,8%	18,8%	0,0	0,0	77,4%	0,02	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	3,6%	23,6%	0,0	0,0	72,8%	-0,16	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	1,9%	18,5%	0,0	0,0	79,6%	-0,10	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	2,7%	15,7%	0,0	0,0	81,6%	-0,23	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	2,9%	19,3%	0,0	0,0	77,8%	-0,03	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	1,7%	20,6%	1,0	0,0	77,7%	-0,19	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	2,0%	18,4%	0,0	0,0	79,6%	-0,18	
	PMG-103	0,0%	0,0%	0,8%	21,8%	0,0	0,0	77,4%	0,02	
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,5%	18,1%	0,0	0,0	81,4%	-0,14	
	PMG-105	0,0%	0,0%	2,8%	18,4%	0,0	0,0	78,8%	0,03	
	PMG-106	0,0%	0,0%	5,0%	15,9%	0,0	0,0	79,1%	0,03	
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,0%	19,9%	0,0	0,0	80,1%	-0,20	
	PMG-108	0,0%	0,0%	0,5%	25,5%	0,0	0,0	74,0%	-0,18	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	4,3%	17,5%	0,0	0,0	78,2%	-0,27	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	0,0%	21,6%	0,0	0,0	78,4%	-0,04	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	5,8%	1,7%	0,0	0,0	92,5%	-0,08	
	PMG-110 B	2,1%	2,6%	0,2%	19,5%	0,0	0,0	78,2%	0,06	
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,8%	0,0	0,0	78,4%	-0,06	
	PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,1%	19,5%	0,0	0,0	80,4%	-0,01	
	PMG-112	0,0%	0,0%	1,9%	22,9%	0,0	0,0	75,2%	0,11	
Guarda Universitário	PMG-116 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0,0	0,0	78,7%	0,17	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	2,0%	19,0%	0,0	0,0	79,0%	-0,10	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	0,4%	24,4%	0,0	0,0	75,2%	-0,21	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	3,1%	16,9%	0,0	0,0	80,0%	-0,07	
	PMG-118 A	0,0%	0,0%	1,7%	24,3%	0,0	0,0	74,0%	-0,08	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	0,5%	17,0%	0,0	0,0	82,5%	-0,01	
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	1,7%	16,2%	0,0	0,0	82,1%	0,02	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,1%	18,7%	0,0	0,0	81,2%	0,21	
	PMG-119 C	0,1%	0,2%	0,9%	18,5%	0,0	0,0	80,3%	0,59	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	2,9%	21,4%	0,0	0,0	75,7%	0,10	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	1,3%	17,7%	0,0	0,0	81,0%	-0,03	
Transportes	PMG-120 C	0,1%	0,1%	0,8%	19,5%	0,0	0,0	79,6%	-1,32	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	0,9%	23,4%	0,0	0,0	75,7%	0,12	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	8,1%	7,4%	0,0	0,0	84,5%	-0,06	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	1,6%	21,5%	0,0	0,0	76,9%	0,08	
	PMG-122 B	0,3%	0,6%	5,7%	14,1%	0,0	0,0	79,9%	-0,60	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	0,7%	19,9%	0,0	0,0	79,4%	-0,04	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	5,6%	10,4%	0,0	0,0	84,0%	0,05	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,7%	21,6%	0,0	0,0	77,7%	-0,12	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	8,1%	14,4%	0,0	0,0	77,5%	-0,22	

DATA		Semana 4: 26/06 a 30/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
	PMG-16 A	0,0%	0,0%	3,9%	19,1%	0,0	0,0	77,0%	-0,07	
	PMG-16 B	0,0%	0,0%	10,2%	12,5%	0,0	0,0	77,3%	0,05	
	PMG-17 A	0,0%	0,0%	3,9%	13,0%	0,0	0,0	83,1%	-0,05	
	PMG-17 B	0,0%	0,0%	7,5%	19,7%	0,0	0,0	72,8%	-0,12	
	PMG-18 A	0,0%	0,0%	0,8%	25,7%	0,0	0,0	73,5%	0,23	
	PMG-18 B	0,0%	0,0%	4,7%	17,2%	0,0	0,0	78,1%	0,05	
	PMG-20 A	0,0%	0,0%	4,0%	25,2%	0,0	0,0	70,8%	-0,04	
	PMG-20 B	0,0%	0,0%	0,5%	25,5%	0,0	0,0	74,0%	-0,37	
	PMG-22 A	0,0%	0,0%	1,4%	24,7%	0,0	0,0	73,9%	-0,13	
	PMG-22 B	0,0%	0,0%	5,8%	16,0%	0,0	0,0	78,2%	0,01	
	PMG-23 A	0,0%	0,0%	0,2%	26,8%	0,0	0,0	73,0%	0,33	
	PMG-23 B	0,0%	0,0%	1,0%	19,4%	0,0	0,0	79,6%	0,04	
	PMG-113 A	0,0%	0,0%	3,6%	23,4%	0,0	0,0	73,0%	0,04	
	PMG-113 B	0,0%	0,0%	2,5%	22,6%	0,0	0,0	74,9%	-0,58	
Edifício I-1 Parte 2	PMG-114 A	0,0%	0,0%	1,5%	21,4%	0,0	0,0	77,1%	0,21	
	PMG-114 B	1,9%	1,9%	1,1%	20,0%	0,0	0,0	76,8%	-0,14	A
	PMG-115 A	0,0%	0,0%	0,4%	25,2%	0,0	0,0	74,4%	-0,16	
	PMG-115 B	0,0%	0,0%	1,2%	22,6%	0,0	0,0	76,2%	-0,20	
	PMG-11 A	0,0%	0,0%	2,7%	19,7%	0,0	0,0	77,6%	0,19	
	PMG-11 B	10,8%	11,6%	13,6%	4,2%	0,0	0,0	71,4%	0,02	
	PMG-12 A	0,0%	0,0%	3,2%	20,9%	0,0	0,0	75,9%	-0,11	
	PMG-12 B	0,0%	0,0%	3,6%	25,3%	0,0	0,0	71,1%	0,21	A
	PMG-13 A	0,0%	0,0%	6,3%	18,9%	0,0	0,0	74,8%	-0,09	
	PMG-13 B	0,0%	0,0%	7,5%	16,7%	0,0	0,0	75,8%	-0,16	
	PMG-14 A	0,0%	0,0%	5,2%	14,9%	0,0	0,0	79,9%	0,07	
	PMG-14 B	0,0%	0,0%	12,8%	8,4%	0,0	0,0	78,8%	0,36	
	PMG-15 A	0,0%	0,0%	1,1%	26,4%	0,0	0,0	72,5%	-0,21	
	PMG-15 B	0,0%	0,0%	2,1%	20,7%	0,0	0,0	77,2%	0,05	
	PMG-19 A	0,0%	0,0%	0,0%	25,4%	0,0	0,0	74,6%	-0,32	
	PMG-19 B	0,0%	0,0%	0,7%	20,2%	0,0	0,0	79,1%	-0,05	
I-3 Auditórios	PMG-21 A	0,0%	0,0%	2,9%	20,5%	0,0	0,0	76,6%	-0,07	
	PMG-21 B	0,0%	0,0%	4,0%	16,9%	0,0	0,0	79,1%	-0,04	
	PMG-24 A	0,0%	0,0%	2,5%	21,3%	0,0	0,0	76,2%	0,02	
	PMG-24 B	0,0%	0,0%	1,9%	21,5%	0,0	0,0	76,6%	0,69	
	PMG-25 A	0,0%	0,0%	2,5%	27,0%	0,0	0,0	70,5%	-0,13	
	PMG-25 B	0,0%	0,0%	3,9%	21,2%	0,0	0,0	74,9%	0,01	
	PMG-26 A	0,0%	0,0%	1,8%	20,9%	0,0	0,0	77,3%	-0,24	
	PMG-26 B	0,0%	0,0%	6,5%	15,4%	0,0	0,0	78,1%	-0,29	
	PMG-27 A	0,0%	0,0%	2,1%	20,9%	0,0	0,0	77,0%	-0,03	
	PMG-27 B	0,0%	0,0%	10,0%	12,0%	0,0	0,0	78,0%	0,07	
	PMG-28 A	0,0%	0,0%	2,2%	21,1%	0,0	0,0	76,7%	-0,31	
	PMG-28 B	0,0%	0,0%	11,4%	13,8%	0,0	0,0	74,8%	0,13	
	PMG-29 A	0,0%	0,0%	4,0%	26,8%	0,0	0,0	69,2%	-0,06	
	PMG-29 B	0,0%	0,0%	3,6%	17,5%	0,0	0,0	78,9%	-0,46	
	PMG-44 A	0,0%	0,0%	3,8%	21,3%	0,0	0,0	74,9%	-0,08	
	PMG-44 B	0,0%	0,0%	2,2%	17,1%	0,0	0,0	80,7%	0,65	
	PMG-45 A	0,0%	0,0%	1,5%	23,8%	0,0	0,0	74,7%	-0,05	
	PMG-45 B	0,0%	0,0%	4,5%	22,0%	0,0	0,0	73,5%	-0,06	

DATA		Semana 4: 26/06 a 30/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	0,0%	0,0%	1,2%	24,4%	0,0	0,0	74,4%	-0,10	
	PMG-30 B	0,0%	0,0%	6,6%	18,2%	1,0	0,0	75,2%	-0,06	
	PMG-31 A	0,0%	0,0%	0,6%	30,4%	0,0	0,0	69,0%	-0,22	
	PMG-31 B	5,8%	5,8%	13,3%	3,2%	0,0	0,0	77,7%	-0,79	
	PMG-32 A	0,0%	0,0%	3,3%	23,8%	0,0	0,0	72,9%	0,08	
	PMG-32 B	0,0%	0,0%	8,4%	19,2%	0,0	0,0	72,4%	0,07	
	PMG-33 A	0,0%	0,0%	1,0%	21,1%	0,0	0,0	77,9%	0,13	
	PMG-33 B	0,0%	0,0%	11,2%	13,7%	0,0	0,0	75,1%	-0,04	
	PMG-34 A	0,0%	0,0%	0,8%	20,9%	0,0	0,0	78,3%	-0,27	
	PMG-34 B	0,0%	0,0%	2,2%	19,6%	0,0	0,0	78,2%	-0,21	
	PMG-35 A	0,0%	0,0%	1,3%	24,0%	0,0	0,0	74,7%	-0,04	
	PMG-35 B	0,0%	0,0%	4,9%	20,2%	0,0	0,0	74,9%	0,02	
	PMG-36 A	0,0%	0,0%	1,1%	25,2%	0,0	0,0	73,7%	-0,15	
	PMG-36 B	0,0%	0,0%	13,4%	13,2%	0,0	0,0	73,4%	0,01	
	PMG-37 A	0,0%	0,0%	2,7%	22,2%	0,0	0,0	75,1%	0,25	
	PMG-37 B	0,0%	0,0%	2,7%	17,8%	0,0	1,0	79,5%	0,09	
	PMG-38 A	0,0%	0,0%	1,1%	28,5%	0,0	0,0	70,4%	0,18	
	PMG-38 B	0,0%	0,0%	1,9%	18,3%	0,0	0,0	79,8%	-0,01	
	PMG-39 A	0,0%	0,0%	1,1%	20,6%	0,0	0,0	78,3%	0,29	
	PMG-39 B	1,2%	1,6%	7,6%	13,9%	0,0	0,0	77,3%	-0,26	
	PMG-40 A	0,0%	0,0%	1,8%	26,9%	0,0	0,0	71,3%	-0,19	
	PMG-40 B	0,0%	0,0%	1,0%	24,0%	0,0	0,0	75,0%	0,64	
	PMG-41 A	0,0%	0,0%	2,9%	25,9%	1,0	0,0	71,2%	0,10	
	PMG-41 B	0,0%	0,0%	1,4%	16,7%	0,0	0,0	81,9%	0,01	
	PMG-42 A	0,0%	0,0%	3,5%	24,4%	0,0	0,0	72,1%	0,21	
	PMG-42 B	0,0%	0,0%	12,5%	10,6%	0,0	0,0	76,9%	0,08	
	PMG-43 A	0,0%	0,0%	3,6%	20,5%	0,0	0,0	75,9%	0,17	
	PMG-43 B	0,0%	0,0%	2,9%	22,2%	0,0	0,0	74,9%	-0,97	
Edifício I-4	PMG-63 A	0,0%	0,0%	3,0%	21,0%	0,0	0,0	76,0%	-0,21	
	PMG-63 B	0,0%	0,0%	4,7%	22,1%	0,0	0,0	73,2%	0,06	
	PMG-64 A	0,0%	0,0%	0,8%	26,1%	0,0	0,0	73,1%	-0,28	
	PMG-64 B	0,1%	0,2%	1,5%	15,5%	0,0	0,0	82,8%	-0,56	A
	PMG-65 A	0,0%	0,0%	0,9%	28,9%	0,0	0,0	70,2%	-0,10	
	PMG-65 B	0,0%	0,0%	0,0%	24,0%	0,0	0,0	76,0%	-0,49	A
	PMG-66 A	0,0%	0,0%	1,0%	20,5%	0,0	0,0	78,5%	-0,11	
	PMG-66 B	0,1%	0,1%	17,9%	3,7%	0,0	0,0	78,2%	0,03	A
	PMG-67 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,0%	0,0	0,0	78,8%	0,05	
	PMG-67 B	0,0%	0,0%	3,0%	19,3%	0,0	0,0	77,7%	0,03	
	PMG-68 A	0,0%	0,0%	2,0%	24,3%	0,0	0,0	73,7%	-0,08	
	PMG-68 B	0,1%	0,1%	0,4%	24,6%	0,0	0,0	74,9%	-0,24	A
	PMG-69 A	0,0%	0,0%	1,0%	23,8%	0,0	0,0	75,2%	-0,15	
	PMG-69 B	0,0%	0,1%	1,1%	18,7%	0,0	0,0	80,2%	-0,08	A
	PMG-77 A	0,0%	0,0%	0,5%	19,2%	0,0	0,0	80,3%	-0,14	
	PMG-77 B	0,0%	0,0%	0,6%	19,4%	0,0	0,0	80,0%	0,03	
	PMG-78 A	0,0%	0,0%	0,7%	26,0%	0,0	0,0	73,3%	-0,08	
	PMG-78 B	0,0%	0,0%	0,8%	22,9%	0,0	0,0	76,3%	-0,05	
	PMG-79 A	0,0%	0,0%	1,4%	22,3%	0,0	0,0	76,3%	0,04	
	PMG-79 B	0,0%	0,0%	1,1%	25,3%	0,0	0,0	73,6%	0,02	
	PMG-80 A	0,0%	0,0%	1,2%	20,7%	0,0	0,0	78,1%	-0,20	
	PMG-80 B	0,0%	0,0%	1,3%	22,8%	0,0	0,0	75,9%	-0,16	
	PMG-81 A	0,0%	0,0%	1,1%	24,0%	0,0	0,0	74,9%	-0,23	
	PMG-81 B	0,0%	0,0%	0,4%	23,5%	0,0	0,0	76,1%	0,09	A

DATA		Semana 4: 26/06 a 30/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	0,0%	0,0%	2,1%	22,6%	0,0	0,0	75,3%	-0,20	
	PMG-46 B	1,1%	1,5%	13,2%	6,1%	0,0	0,0	79,6%	-0,17	
	PMG-47 A	0,0%	0,0%	0,4%	28,5%	0,0	0,0	71,1%	0,02	
	PMG-47 B	0,0%	0,0%	4,0%	14,9%	0,0	0,0	81,1%	0,27	
	PMG-48 A	0,0%	0,0%	2,7%	27,8%	0,0	0,0	69,5%	-0,07	
	PMG-48 B	32,6%	32,6%	4,5%	4,0%	0,0	0,0	58,5%	-1,18	E
	PMG-49 A	0,0%	0,0%	1,5%	22,8%	1,0	0,0	75,7%	-0,02	
	PMG-49 B	31,7%	31,8%	6,7%	13,0%	0,0	0,0	48,4%	-0,69	E
	PMG-50 A	0,0%	0,0%	0,7%	25,7%	0,0	0,0	73,6%	0,24	
	PMG-50 B	0,4%	0,6%	11,3%	16,9%	0,0	0,0	71,4%	0,29	
	PMG-51 A	0,0%	0,0%	2,8%	22,7%	0,0	0,0	74,5%	0,11	
	PMG-51 B	0,1%	0,1%	7,3%	9,1%	0,0	1,0	83,5%	-1,63	A
	PMG-52 A	0,0%	0,0%	0,6%	30,0%	0,0	0,0	69,4%	-0,10	
	PMG-52 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,5%	0,0	0,0	78,7%	-0,21	
	PMG-53 A	0,0%	0,0%	1,2%	23,3%	0,0	0,0	75,5%	0,26	
	PMG-53 B	0,0%	0,0%	8,7%	1,3%	0,0	0,0	90,0%	0,13	
	PMG-54 A	0,0%	0,0%	2,4%	21,3%	0,0	0,0	76,3%	0,09	
	PMG-54 B	0,3%	0,4%	10,7%	8,4%	0,0	0,0	80,6%	1,27	A
	PMG-55 A	0,0%	0,0%	0,7%	14,8%	0,0	0,0	84,5%	-0,17	
	PMG-55 B	31,5%	34,5%	8,9%	3,1%	0,0	0,0	56,5%	-0,17	
	PMG-56 A	0,0%	0,0%	2,2%	20,6%	0,0	0,0	77,2%	-0,24	
	PMG-56 B	0,0%	0,0%	5,7%	19,4%	0,0	0,0	74,9%	-0,02	
	PMG-57 A	0,0%	0,0%	2,4%	21,6%	0,0	0,0	76,0%	0,02	
	PMG-57 B	0,0%	0,0%	7,4%	12,0%	0,0	0,0	80,6%	-0,16	
	PMG-58 A	0,0%	0,0%	1,2%	26,4%	0,0	0,0	72,4%	-0,10	
	PMG-58 B	0,0%	0,0%	3,6%	15,4%	0,0	0,0	81,0%	-0,23	
	PMG-59 A	0,0%	0,0%	0,4%	27,0%	0,0	0,0	72,6%	-0,03	
	PMG-59 B	4,8%	6,2%	7,5%	14,9%	0,0	0,0	72,8%	-0,19	
	PMG-60 A	0,0%	0,0%	1,2%	19,4%	0,0	0,0	79,4%	-0,18	
	PMG-60 B	7,8%	7,8%	6,3%	8,5%	0,0	0,0	77,4%	-2,58	E
	PMG-61 A	0,0%	0,0%	1,6%	19,0%	0,0	0,0	79,4%	-0,14	
	PMG-61 B	11,5%	15,9%	13,3%	3,8%	0,0	0,0	71,4%	0,03	
	PMG-62 A	0,0%	0,0%	4,1%	21,6%	0,0	0,0	74,3%	0,03	
	PMG-62 B	31,4%	31,4%	9,0%	2,7%	0,0	0,0	56,8%	-3,48	E

DATA		Semana 4: 26/06 a 30/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% . / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	0,0%	0,0%	1,8%	19,6%	0,0	0,0	78,6%	-0,18	
	PMG-01 B	0,2%	0,2%	16,8%	2,5%	0,0	0,0	80,5%	-0,27	A
	PMG-02 A	0,0%	0,0%	0,3%	25,3%	0,0	0,0	74,4%	-0,04	
	PMG-02 B	0,1%	0,1%	0,0%	22,0%	0,0	0,0	77,9%	-0,08	A
	PMG-03 A	0,0%	0,0%	0,8%	25,7%	0,0	0,0	73,5%	0,06	
	PMG-03 B	0,1%	0,1%	11,6%	13,7%	0,0	0,0	74,6%	-0,06	A
	PMG-04 A	0,0%	0,0%	4,8%	25,8%	1,0	0,0	69,4%	-0,01	
	PMG-04 B	0,0%	0,1%	5,1%	19,0%	0,0	0,0	75,9%	0,11	A
	PMG-05 A	0,0%	0,0%	2,5%	23,6%	0,0	0,0	73,9%	0,17	
	PMG-05 B	0,1%	0,1%	1,0%	25,4%	0,0	0,0	73,5%	-0,10	A
	PMG-06 A	0,0%	0,0%	1,1%	22,4%	0,0	0,0	76,5%	-0,21	
	PMG-06 B	64,8%	64,8%	4,6%	5,9%	0,0	0,0	24,5%	-14,98	E
	PMG-07 A	0,0%	0,0%	0,2%	23,2%	0,0	0,0	76,6%	-0,08	
	PMG-07 B	0,0%	0,1%	1,2%	24,2%	0,0	0,0	74,4%	-0,01	A
	PMG-08 A	0,0%	0,0%	1,1%	25,4%	0,0	0,0	73,5%	0,02	
	PMG-08 B	0,1%	0,1%	9,1%	16,7%	0,0	0,0	74,1%	0,21	A
	PMG-09 A	0,0%	0,0%	9,7%	18,5%	0,0	0,0	71,8%	0,59	
	PMG-09 B	0,1%	0,2%	1,2%	6,4%	0,0	0,0	92,3%	0,10	A
	PMG-10 A	0,0%	0,0%	4,3%	19,5%	0,0	0,0	76,2%	-0,03	
	PMG-10 B	0,0%	0,0%	8,8%	16,2%	0,0	0,0	75,0%	0,08	A
	PMG-84 A	0,0%	0,0%	1,6%	24,1%	0,0	0,0	74,3%	0,12	
	PMG-84 B	0,0%	0,0%	11,2%	13,4%	0,0	1,0	75,4%	-0,06	
	PMG-85 A	0,0%	0,0%	3,4%	14,7%	0,0	0,0	81,9%	0,08	
	PMG-85 B	0,0%	0,0%	11,8%	12,1%	0,0	0,0	76,1%	-0,01	
	PMG-86 A	0,0%	0,0%	4,1%	15,1%	0,0	0,0	80,8%	-0,04	
	PMG-86 B	0,0%	0,0%	4,0%	15,3%	0,0	0,0	80,7%	0,05	
	PMG-87 A	0,0%	0,0%	4,1%	11,8%	0,0	0,0	84,1%	-0,12	
	PMG-87 B	0,0%	0,0%	9,7%	14,5%	0,0	0,0	75,8%	-0,22	
Enfermaria	PMG-70 A	0,0%	0,0%	0,4%	22,7%	0,0	0,0	76,9%	0,04	
	PMG-70 B	0,0%	0,0%	1,1%	25,9%	0,0	0,0	73,0%	0,14	
	PMG-71 A	0,0%	0,0%	0,8%	26,3%	0,0	0,0	72,9%	-0,08	
	PMG-71 B	0,0%	0,0%	5,0%	3,3%	0,0	0,0	91,7%	0,13	
	PMG-72 A	0,0%	0,0%	1,6%	26,2%	0,0	0,0	72,2%	0,14	
	PMG-72 B	0,0%	0,0%	2,4%	20,2%	0,0	1,0	77,4%	0,01	
	PMG-73 A	0,0%	0,0%	0,8%	31,2%	0,0	0,0	68,0%	0,01	
	PMG-73 B	0,0%	0,0%	0,4%	20,6%	0,0	0,0	79,0%	-0,06	
	PMG-74 A	0,0%	0,0%	0,6%	21,4%	0,0	0,0	78,0%	0,19	
	PMG-74 B	2,6%	2,8%	0,1%	3,1%	0,0	0,0	94,2%	0,09	A
	PMG-75 A	0,0%	0,0%	0,2%	22,5%	0,0	0,0	77,3%	-0,01	
	PMG-75 B	0,0%	0,1%	6,3%	13,7%	0,0	0,0	80,0%	-0,02	A
CAT	PMG-76 A	0,0%	0,0%	0,9%	24,5%	0,0	0,0	74,6%	-0,06	
	PMG-76 B	0,0%	0,0%	6,6%	16,3%	0,0	0,0	77,1%	-0,27	
	PMG-82 A	0,0%	0,0%	17,9%	8,1%	0,0	0,0	74,0%	0,05	
	PMG-82 B	0,0%	0,0%	18,5%	12,7%	0,0	0,0	68,8%	0,09	
	PMG-83 A	0,0%	0,0%	6,2%	25,1%	0,0	0,0	68,7%	0,08	
	PMG-83 B	0,0%	0,0%	14,0%	9,1%	0,0	0,0	76,9%	0,09	
	PMG-94 A	0,0%	0,0%	0,9%	27,3%	0,0	0,0	71,8%	-0,01	
	PMG-94 B	0,0%	0,0%	16,7%	1,5%	0,0	0,0	81,8%	-0,08	
	PMG-95 A	0,0%	0,0%	0,4%	19,2%	0,0	0,0	80,4%	-0,21	
	PMG-95 B	0,0%	0,0%	13,8%	10,2%	0,0	0,0	75,9%	-0,06	E
	PMG-96 A	0,0%	0,0%	2,2%	16,9%	0,0	0,0	80,9%	0,08	
	PMG-96 B	0,0%	0,0%	11,6%	12,4%	0,0	0,0	76,0%	-0,06	
	PMG-97 A	0,0%	0,0%	1,8%	26,5%	0,0	0,0	71,7%	-0,18	
	PMG-97 B	0,0%	0,0%	15,3%	7,2%	0,0	0,0	77,5%	0,00	
	PMG-98 A	0,0%	0,0%	2,7%	27,8%	0,0	0,0	69,5%	-0,17	
	PMG-98 B	0,0%	0,0%	1,4%	30,6%	0,0	0,0	68,0%	-0,16	

DATA		Semana 4: 26/06 a 30/06								
POÇOS		CH ₄ (%Vol.)	Pico CH ₄ (%Vol.)	CO ₂ (%Vol.)	O ₂ (%Vol.)	H ₂ S (ppm)	CO (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS.
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% / E = Restrição de Fluxo, A = Presença de Água										
Incubadora	PMG-88 A	0,0%	0,0%	2,6%	16,8%	0,0	1,0	80,6%	0,12	
	PMG-88 B	0,0%	0,0%	1,8%	23,1%	0,0	0,0	75,1%	-0,19	
	PMG-89 A	0,0%	0,0%	1,6%	18,9%	0,0	0,0	79,5%	0,23	
	PMG-89 B	0,0%	0,0%	3,9%	17,9%	0,0	0,0	78,2%	-0,24	
	PMG-90 A	0,0%	0,0%	1,6%	27,5%	0,0	0,0	70,9%	-0,32	
	PMG-90 B	0,0%	0,0%	1,7%	16,3%	0,0	0,0	82,0%	-0,25	
	PMG-91 A	0,0%	0,0%	2,4%	17,9%	0,0	0,0	79,7%	-0,25	
	PMG-91 B	0,0%	0,0%	3,8%	22,5%	0,0	0,0	73,7%	-0,02	
	PMG-92 A	0,0%	0,0%	1,7%	19,5%	0,0	0,0	78,8%	-0,20	
	PMG-92 B	0,0%	0,0%	3,2%	17,7%	0,0	0,0	79,1%	0,09	
	PMG-93 A	0,0%	0,0%	3,8%	18,5%	0,0	0,0	77,7%	0,11	
	PMG-93 B	0,0%	0,0%	1,2%	20,5%	0,0	0,0	78,3%	0,33	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102	0,0%	0,0%	2,0%	20,6%	0,0	0,0	77,4%	0,27	
	PMG-103	0,0%	0,0%	1,5%	22,5%	0,0	0,0	76,0%	0,17	
	PMG-104	0,0%	0,0%	0,4%	23,2%	0,0	0,0	76,4%	0,02	
	PMG-105	0,0%	0,0%	5,1%	17,7%	0,0	0,0	77,2%	-0,16	
	PMG-106	0,0%	0,0%	5,5%	22,0%	0,0	0,0	72,5%	-0,20	
	PMG-107	0,0%	0,0%	0,6%	24,9%	0,0	0,0	74,5%	-0,19	
	PMG-108	0,0%	0,0%	0,8%	26,2%	0,0	0,0	73,0%	-0,12	
	PMG-109 A	0,0%	0,0%	4,3%	17,0%	0,0	0,0	78,7%	-0,09	
	PMG-109 B	0,0%	0,0%	0,8%	24,3%	0,0	0,0	74,9%	-0,17	
	PMG-110 A	0,0%	0,0%	6,1%	3,3%	0,0	0,0	90,6%	-0,15	
	PMG-110 B	0,4%	0,4%	0,8%	22,5%	0,0	0,0	76,1%	-0,16	A
	PMG-111 A	0,0%	0,0%	0,5%	23,5%	0,0	0,0	76,0%	0,04	
	PMG-111 B	0,0%	0,0%	0,6%	23,7%	0,0	0,0	75,7%	-0,01	
	PMG-112	0,0%	0,0%	2,5%	24,7%	0,0	0,0	72,8%	-0,08	
Guarda Universitário	PMG-116 A	0,0%	0,0%	0,9%	21,9%	0,0	0,0	77,2%	0,20	
	PMG-116 B	0,0%	0,0%	2,2%	18,9%	0,0	0,0	78,9%	0,20	
	PMG-117 A	0,0%	0,0%	1,0%	24,2%	0,0	0,0	74,8%	0,25	
	PMG-117 B	0,0%	0,0%	3,8%	18,5%	0,0	0,0	77,7%	-0,05	
	PMG-118 A	0,0%	0,0%	1,5%	24,9%	0,0	0,0	73,6%	-0,08	
	PMG-118 B	0,0%	0,0%	0,2%	17,8%	0,0	0,0	82,0%	-0,06	
Portaria P3	PMG-119 A	0,0%	0,0%	2,1%	18,3%	0,0	1,0	79,6%	-0,28	
	PMG-119 B	0,0%	0,0%	0,8%	20,8%	0,0	0,0	78,4%	0,16	
	PMG-119 C	0,1%	0,1%	0,7%	20,8%	0,0	0,0	78,4%	-0,09	A
	PMG-120 A	0,0%	0,0%	2,8%	21,3%	0,0	0,0	75,9%	-0,34	
	PMG-120 B	0,0%	0,0%	1,6%	23,0%	0,0	0,0	75,4%	-0,11	
Transportes	PMG-120 C	0,1%	0,1%	1,1%	26,5%	0,0	0,0	72,3%	-0,26	A
	PMG-121 A	0,0%	0,0%	1,5%	26,4%	0,0	0,0	72,1%	-0,11	
	PMG-121 B	0,0%	0,0%	8,8%	10,6%	0,0	0,0	80,6%	-0,40	
	PMG-122 A	0,0%	0,0%	1,6%	26,6%	0,0	0,0	71,8%	0,17	
	PMG-122 B	0,2%	0,4%	6,5%	17,3%	0,0	0,0	76,0%	0,12	
	PMG-123 A	0,0%	0,0%	0,7%	22,3%	0,0	0,0	77,0%	0,08	
	PMG-123 B	0,0%	0,0%	6,2%	15,5%	0,0	0,0	78,3%	-0,06	
	PMG-124 A	0,0%	0,0%	0,5%	24,8%	0,0	0,0	74,7%	0,23	
	PMG-124 B	0,0%	0,0%	8,7%	17,0%	0,0	0,0	74,3%	0,24	

**ANEXO IV – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM PMG COM MX6
(ABR A JUN / 17)**

SEMANA		Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
		03/04 a 07/04		10/04 a 13/04		17/04 a 20/04		24/04 a 28/04	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada									
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-16 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-17 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-17 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-18 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-18 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-20 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-20 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-22 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-22 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-23 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-23 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-113 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-113 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-114 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-114 B	0,2	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-115 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-115 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-11 B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-12 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-12 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-13 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-13 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-14 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-14 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-15 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-15 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-19 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-19 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-21 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-21 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-24 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-24 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-25 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-25 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-26 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-26 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-27 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-27 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-28 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-28 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-29 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-29 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-44 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-44 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-45 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-45 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA			Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
			03/04 a 07/04		10/04 a 13/04		17/04 a 20/04		24/04 a 28/04	
POÇOS			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada										
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-30	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-31	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-31	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	2,0 %
	PMG-32	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-32	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-33	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-33	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-34	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-34	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-35	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-35	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-36	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-36	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-37	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-37	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-38	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-38	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-39	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-39	B	0,0	22,0 %	0,0	36,0 %	0,0	68,0 %	0,0	54,0 %
	PMG-40	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-40	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-41	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-41	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-42	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-42	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-43	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-43	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-63	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-63	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-64	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-64	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-65	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-65	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-66	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-66	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-67	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-67	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-68	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-68	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-69	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-69	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-77	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-77	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-78	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-78	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-79	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-79	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-80	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-80	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-81	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-81	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA			Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
			03/04 a 07/04		10/04 a 13/04		17/04 a 20/04		24/04 a 28/04	
POÇOS			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada										
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-46	B	0,0	0,0%	0,0	68,0%	0,0	90,0%	0,0	74,0%
	PMG-47	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-47	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-48	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-48	B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-49	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-49	B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-50	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-50	B	0,0	51,0%	0,0	34,0%	0,0	42,0%	0,0	56,0%
	PMG-51	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-51	B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-52	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-52	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-53	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-53	B	0,0	0,0%	0,0	28,0%	0,0	18,0%	0,0	2,0%
	PMG-54	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-54	B	0,0	0,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-55	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-55	B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-56	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-56	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-57	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-57	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-58	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-58	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-59	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-59	B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-60	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-60	B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-61	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-61	B	0,0	100,0%	0,0	94,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-62	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-62	B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
al (conjunto didático)	PMG-01	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-01	B	0,0	12,0%	0,0	12,0%	0,0	10,0%	0,0	2,0%
	PMG-02	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-02	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-03	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-03	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	4,0%
	PMG-04	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-04	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-05	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-05	B	0,0	0,0%	0,0	4,0%	0,0	2,0%	0,0	2,0%
	PMG-06	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-06	B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-07	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-07	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-08	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-08	B	0,0	15,0%	0,0	32,0%	0,0	52,0%	0,0	6,0%

SEMANA		Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
		03/04 a 07/04		10/04 a 13/04		17/04 a 20/04		24/04 a 28/04	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada									
Bloco Inicial	PMG-09 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-09 B	0,0	2,0 %	0,0	4,0 %	0,0	4,0 %	0,0	4,0 %
	PMG-10 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-10 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-84 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-84 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-85 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-85 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-86 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-86 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-87 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-87 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-70 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-71 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-71 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-72 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-72 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-73 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-73 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-74 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-74 B	0,0	100,0 %	0,0	72,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-75 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-75 B	0,0	4,0 %	0,0	2,0 %	0,0	0,0%	0,0	0,0%
CAT	PMG-76 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-76 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-82 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-82 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-83 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-83 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-94 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-94 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-95 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-95 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-96 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-96 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-97 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-97 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-98 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-98 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA			Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
			03/04 a 07/04		10/04 a 13/04		17/04 a 20/04		24/04 a 28/04	
POÇOS			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada										
Incubadora	PMG-88	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-88	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-89	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-89	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-90	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-90	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-91	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-91	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-92	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-92	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-93	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-93	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-103		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-104		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-105		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-106		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-107		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-108		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-109	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-109	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-110	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-110	B	0,0	7,0 %	0,0	8,0 %	0,0	2,0 %	0,0	42,0 %
	PMG-111	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-111	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-112		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-116	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-117	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-117	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-118	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-118	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-119	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-119	C	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-120	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-120	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-120	C	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Transportes	PMG-121	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-121	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-122	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-122	B	0,0	16,0 %	0,0	18,0 %	0,0	14,0 %	0,0	22,0 %
	PMG-123	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-123	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-124	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-124	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA			Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	
			02/05 a 05/05		08/05 a 12/05		15/05 a 19/05		22/05 a 26/05		29/05 a 02/06	
POÇOS			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada												
Edifício I-1	Parte 1	PMG-16 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-16 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-17 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-17 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-18 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-18 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-20 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-20 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-22 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-22 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-23 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-23 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-113 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-113 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-114 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-114 B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	52,0%
		PMG-115 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-115 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Edifício I-1	Parte 2	PMG-11 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-11 B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
		PMG-12 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-12 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-13 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-13 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-14 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-14 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%
		PMG-15 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-15 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-19 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-19 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-21 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-21 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-24 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%
		PMG-24 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
I-3 Auditórios		PMG-25 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-25 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%
		PMG-26 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-26 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-27 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%
		PMG-27 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-28 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-28 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-29 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-29 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-44 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-44 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-45 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		PMG-45 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA			Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	
			02/05 a 05/05		08/05 a 12/05		15/05 a 19/05		22/05 a 26/05		29/05 a 02/06	
POÇOS			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada												
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-30	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-31	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	1,1	0,0%
	PMG-31	B	0,0	0,1 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %	0,0	6,0 %	0,0	2,0 %
	PMG-32	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-32	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-33	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-33	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-34	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-34	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-35	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-35	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-36	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-36	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-37	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-37	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-38	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-38	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-39	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-39	B	0,0	0,6 %	0,0	74,0 %	0,0	62,0 %	0,0	12,0 %	0,0	8,0 %
	PMG-40	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-40	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-41	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-41	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-42	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-42	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-43	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-43	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-63	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-63	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-64	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-64	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %
	PMG-65	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-65	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-66	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,5	0,0%
	PMG-66	B	0,0	0,0%	0,0	4,0 %	0,0	2,0 %	0,0	4,0 %	0,0	2,0 %
	PMG-67	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-67	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-68	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-68	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-69	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-69	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-77	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-77	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-78	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-78	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-79	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-79	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-80	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-80	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-81	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-81	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA			Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	
			02/05 a 05/05		08/05 a 12/05		15/05 a 19/05		22/05 a 26/05		29/05 a 02/06	
POÇOS			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada												
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-46	B	0,0	0,7 %	0,0	62,0 %	0,0	56,0 %	0,0	30,0 %	0,0	24,0 %
	PMG-47	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-47	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-48	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-48	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-49	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-49	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-50	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-50	B	0,0	0,3 %	0,0	4,0 %	0,0	4,0 %	0,0	8,0 %	0,0	12,0 %
	PMG-51	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-51	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	48,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %
	PMG-52	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-52	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-53	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-53	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,6	0,0%
	PMG-54	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-54	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	18,0 %	0,0	28,0 %	0,0	12,0 %
	PMG-55	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-55	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	74,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-56	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-56	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-57	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-57	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-58	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-58	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-59	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-59	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-60	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-60	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-61	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-61	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-62	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-62	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
al (conjunto didático)	PMG-01	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-01	B	0,0	0,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %
	PMG-02	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-02	B	0,0	0,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-03	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-03	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-04	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-04	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-05	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-05	B	0,0	0,0%	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %
	PMG-06	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	1,2	0,0%
	PMG-06	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-07	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-07	B	0,0	0,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %
	PMG-08	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-08	B	0,0	0,1 %	0,0	10,0 %	0,0	6,0 %	0,0	4,0 %	0,0	2,0 %

SEMANA		Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	
		02/05 a 05/05		08/05 a 12/05		15/05 a 19/05		22/05 a 26/05		29/05 a 02/06	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada											
Bloco Inicial	PMG-09 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-09 B	0,0	0,0 %	0,0	6,0 %	0,0	6,0 %	0,0	4,0 %	0,0	4,0 %
	PMG-10 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-10 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-84 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-84 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-85 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-85 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-86 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-86 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-87 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-87 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-70 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,5	0,0%
	PMG-71 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-71 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-72 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-72 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-73 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-73 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-74 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-74 B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	48,0 %	0,0	8,0 %	0,0	4,0 %
	PMG-75 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-75 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
CAT	PMG-76 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%
	PMG-76 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-82 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-82 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-83 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-83 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-94 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-94 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-95 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-95 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-96 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-96 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-97 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-97 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-98 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,4	0,0%
	PMG-98 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA			Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5	
			02/05 a 05/05		08/05 a 12/05		15/05 a 19/05		22/05 a 26/05		29/05 a 02/06	
POÇOS			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada												
Incubadora	PMG-88	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-88	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-89	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-89	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-90	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-90	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-91	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-91	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-92	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-92	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-93	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-93	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-103		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-104		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-105		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-106		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-107		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-108		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-109	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-109	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-110	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-110	B	0,0	100,0%	0,0	42,0%	0,0	100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-111	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-111	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,3	0,0%
	PMG-112		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-116	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-117	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-117	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-118	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-118	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-119	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-119	C	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	2,0%	0,0	2,0%
	PMG-120	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-120	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%
	PMG-120	C	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	2,0%	0,0	2,0%
Transportes	PMG-121	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-121	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-122	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-122	B	0,0	0,0%	0,0	14,0%	0,0	8,0%	0,0	4,0%	0,0	2,0%
	PMG-123	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-123	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-124	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-124	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA			Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
			05/06 a 09/06		12/06 a 16/06		19/06 a 23/06		26/06 a 30/06	
POÇOS			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada										
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-16	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-17	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-17	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-18	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-18	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-20	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-20	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-22	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-22	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-23	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-23	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-113	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-113	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-114	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-114	B	0,0	14,0%	0,0	24,0%	0,2	12,0%	0,0	38,0%
	PMG-115	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-115	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	PMG-11	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-11	B	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
	PMG-12	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-12	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-13	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-13	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-14	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-14	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-15	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-15	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-19	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-19	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-21	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-21	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-24	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-24	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	PMG-25	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-25	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-26	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-26	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-27	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-27	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-28	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-28	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-29	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-29	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-44	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-44	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-45	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-45	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA			Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
			05/06 a 09/06		12/06 a 16/06		19/06 a 23/06		26/06 a 30/06	
POÇOS			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada										
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-30	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-31	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,8	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-31	B	0,0	2,0 %	0,0	4,0 %	0,0	2,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-32	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-32	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-33	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-33	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-34	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-34	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-35	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-35	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-36	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-36	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-37	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-37	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-38	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-38	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-39	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-39	B	0,0	12,0 %	0,0	18,0 %	0,0	14,0 %	0,0	24,0 %
	PMG-40	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-40	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-41	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-41	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-42	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-42	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-43	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-43	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Edifício I-4	PMG-63	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-63	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-64	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-64	B	0,0	4,0 %	0,0	2,0 %	0,0	4,0 %	0,0	2,0 %
	PMG-65	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-65	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-66	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-66	B	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %
	PMG-67	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-67	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-68	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-68	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %
	PMG-69	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-69	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	2,0 %	0,0	0,0%
	PMG-77	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-77	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-78	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-78	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-79	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-79	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-80	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-80	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-81	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,6	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-81	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA			Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
			05/06 a 09/06		12/06 a 16/06		19/06 a 23/06		26/06 a 30/06	
POÇOS			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada										
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-46	B	0,0	18,0 %	0,0	22,0 %	0,0	26,0 %	0,0	22,0 %
	PMG-47	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-47	B	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-48	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-48	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-49	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-49	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-50	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-50	B	0,0	16,0 %	0,0	8,0 %	0,0	16,0 %	0,0	8,0 %
	PMG-51	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-51	B	0,0	4,0 %	0,0	2,0 %	0,0	4,0 %	0,0	2,0 %
	PMG-52	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-52	B	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-53	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-53	B	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-54	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-54	B	0,0	4,0 %	0,0	2,0 %	0,0	4,0 %	0,0	6,0 %
	PMG-55	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-55	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-56	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-56	B	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-57	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-57	B	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-58	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-58	B	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-59	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-59	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	96,0 %
	PMG-60	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-60	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-61	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-61	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-62	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-62	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
al (conjunto didático)	PMG-01	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-01	B	0,0	4,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %	0,0	4,0 %
	PMG-02	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-02	B	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	2,0 %
	PMG-03	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-03	B	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %
	PMG-04	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-04	B	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-05	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-05	B	0,0	2,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	2,0 %
	PMG-06	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-06	B	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %	0,0	100,0 %
	PMG-07	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-07	B	0,0	2,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-08	A	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %
	PMG-08	B	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %

SEMANA		Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
		05/06 a 09/06		12/06 a 16/06		19/06 a 23/06		26/06 a 30/06	
POÇOS		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada									
Bloco Inicial	PMG-09 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-09 B	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %	0,0	4,0 %	0,0	2,0 %
	PMG-10 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-10 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-84 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-84 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-85 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-85 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-86 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-86 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-87 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-87 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Enfermaria	PMG-70 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-70 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-71 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-71 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-72 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-72 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-73 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-73 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-74 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-74 B	0,0	2,0 %	0,0	6,0 %	0,0	32,0 %	0,0	52,0 %
	PMG-75 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-75 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
CAT	PMG-82 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-82 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-83 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-83 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-94 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-94 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-95 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-95 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-96 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-96 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-97 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-97 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-98 A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-98 B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

SEMANA			Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
			05/06 a 09/06		12/06 a 16/06		19/06 a 23/06		26/06 a 30/06	
POÇOS			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Legenda: (-) Medição não realizada										
Incubadora	PMG-88	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-88	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-89	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-89	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-90	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-90	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,5	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-91	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-91	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-92	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-92	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-93	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-93	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-103		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-104		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-105		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-106		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-107		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-108		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-109	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-109	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-110	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-110	B	0,0	0,0%	0,0	38,0 %	0,0	42,0 %	0,0	8,0 %
	PMG-111	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-111	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-112		0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Guarda Universitário	PMG-116	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-116	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-117	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-117	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-118	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-118	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Portaria P3	PMG-119	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-119	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-119	C	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %
	PMG-120	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-120	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-120	C	0,0	2,0 %	0,0	0,0%	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %
Transportes	PMG-121	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-121	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-122	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-122	B	0,0	2,0 %	0,0	2,0 %	0,0	6,0 %	0,0	4,0 %
	PMG-123	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-123	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-124	A	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	PMG-124	B	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%

**ANEXO V – TABELAS DE MEDIÇÕES QUINZENAIS NA
INFRAESTRUTURA COM MX6 (ABR A JUN / 17)**

SEMANA		Quinzena 1 17/04/2017		Quinzena 2 15/03/2017	
Chuva?		não		não	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	0,0	0,0	0,0%
		17	0,0	0,0	0,0%
		16	0,0	0,0	0,0%
		14	0,0	0,0	0,0%
		15	0,0	0,0	0,0%
		18	0,0	0,0	0,0%
		19	0,0	0,0	0,0%
		20	0,0	0,0	0,0%
		13	0,0	0,0	0,0%
		25	0,0	0,0	0,0%
		22	0,0	0,0	0,0%
		21	0,0	0,0	0,0%
		32	0,0	0,0	0,0%
		30	0,0	0,0	0,0%
		31	0,0	0,0	0,0%
		28	0,0	0,0	0,0%
		26	0,0	0,0	0,0%
		24	0,0	0,0	0,0%
		27	0,0	0,0	0,0%
		23	0,0	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01	0,0	0,0	0,0%
		05	0,0	0,0	0,0%
		04	0,0	0,0	0,0%
		03	0,0	0,0	0,0%
		09	0,0	0,0	0,0%
		08	0,0	0,0	0,0%
		07	0,0	0,0	0,0%
		06	0,0	0,0	0,0%
		02	0,0	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralos	160	0,0	0,0	0,0%
		159	0,0	0,0	0,0%
		162	0,0	0,0	0,0%
		165	0,0	0,0	0,0%
		164	0,0	0,0	0,0%
		176	0,0	0,0	0,0%
		177	0,0	0,2	0,0%
		174	0,0	0,0	0,0%
		171	0,0	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	Ralos	148	0,0	0,0	0,0%
		149	0,0	0,0	0,0%
		150	0,0	0,0	0,0%
		147	0,0	0,0	0,0%
		139	0,0	0,0	0,0%
		140	0,0	0,0	0,0%
		141	0,0	0,0	0,0%
		151	0,0	0,0	0,0%
		145	0,0	0,0	0,0%
		144	0,0	0,0	0,0%
		143	0,0	0,0	0,0%
		142	0,0	0,0	0,0%
		146	0,0	0,0	0,0%

Chuva?		não		não	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	Ralos	95	0,0	0,0	0,0%
		97	0,0	0,0	0,0%
		99	0,0	0,0	0,0%
		106	0,0	0,0	0,0%
		96	0,0	0,0	0,0%
		104	0,0	0,0	0,0%
		307	0,0	0,0	0,0%
		122	0,0	0,0	0,0%
		111	0,0	0,0	0,0%
		117	0,0	0,0	0,0%
		100	0,0	0,0	0,0%
		101	0,0	0,0	0,0%
		105	0,0	0,0	0,0%
		91	0,0	0,0	0,0%
		102	0,0	0,0	0,0%
		88	0,0	0,0	0,0%
		108	0,0	0,0	0,0%
		107	0,0	0,0	0,0%
		94	0,0	0,0	0,0%
		92	0,0	0,0	0,0%
		90	0,0	0,0	0,0%
		89	0,0	0,0	0,0%
		87	0,0	0,0	0,0%
		123	0,0	0,0	0,0%
		121	0,0	0,0	0,0%
		120	0,0	0,0	0,0%
		119	0,0	0,0	0,0%
		114	0,0	0,0	0,0%
		113	0,0	0,0	0,0%
		112	0,0	0,0	0,0%
		109	0,0	0,0	0,0%
		110	0,0	0,0	0,0%

Chuva?		não		não	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Conjunto Laboratorial	Ralos	34	0,0	0,0	0,0%
		36	0,0	0,0	0,0%
		53	0,0	0,0	0,0%
		69	0,0	0,0	0,0%
		70	0,0	0,0	0,0%
		71	0,0	0,0	0,0%
		67	0,0	0,0	0,0%
		66	0,0	0,0	0,0%
		64	0,0	0,0	0,0%
		65	0,0	0,0	0,0%
		63	0,0	0,0	0,0%
		62	0,0	0,0	0,0%
		56	0,0	0,0	0,0%
		60	0,0	0,0	0,0%
		58	0,0	0,0	0,0%
		55	0,0	0,0	0,0%
		54	0,0	0,0	0,0%
		57	0,0	0,0	0,0%
		42	0,0	0,0	0,0%
		44	0,0	0,0	0,0%
		43	0,0	0,0	0,0%
		41	0,0	0,0	0,0%
		38	0,0	0,0	0,0%
		32	0,0	0,0	0,0%
		61	0,0	0,0	0,0%
		37	0,0	0,0	0,0%
		45	0,0	0,0	0,0%
		46	0,0	0,0	0,0%
		40	0,0	0,0	0,0%
		47	0,0	0,0	0,0%
		48	0,0	0,0	0,0%
		49	0,0	0,0	0,0%
		50	0,0	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralos	74	0,0	0,0	0,0%
		75	0,0	0,0	0,0%
		76	0,0	0,0	0,0%
		77	0,0	0,0	0,0%
		78	0,0	0,0	0,0%
		79	0,0	0,0	0,0%
		80	0,0	0,0	0,0%
		81	0,0	0,0	0,0%
		82	0,0	0,0	0,0%
		83	0,0	0,0	0,0%
		84	0,0	0,0	0,0%
		85	0,0	0,0	0,0%
		86	0,0	0,0	0,0%

Chuva?			não		não	
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Enfermaria	Ralos	124	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		125	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		126	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		127	0,0	0,0%	0,0	0,0%
CAT	Ralos	136	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		137	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		138	0,0	0,0%	0,0	0,0%
P3	Ralos	187	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		186	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Incubadora	Ralos	132	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		133	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		134	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		135	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Caixas	Enf	53	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Enf	55	0,0	0,0%	0,7	0,0%
	Lab	40	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	38	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	24	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	15	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	13	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	28	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	33	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	37	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	16	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	18	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	21	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	39	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	59	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	57	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	60	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	67	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	58	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Aud	72	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Aud	73	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Aud	74	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Espaços com pouca circulação de ar		1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		9	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Legenda dos Espaços com pouca circulação de ar:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1- Depósito Auditório Vermelho | 6- Câmara de visita da Caixa d'água |
| 2- Depósito Auditório Verde | 7- Depósito dentro do Almocharifado |
| 3- Depósito I3 | 8- Depósito fora do Almocharifado |
| 4- Arquivo Enfermaria | 9- Casa de Máquinas (Hidrante) |
| 5- Depósito Enfermaria | |

SEMANA		Quinzena 1 02/05/2017		Quinzena 2 15/05/2017	
Chuva?		não		não	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	0,0	0,0	0,0%
		17	0,0	0,0	0,0%
		16	0,0	0,0	0,0%
		14	0,0	0,0	0,0%
		15	0,0	0,0	0,0%
		18	0,0	0,0	0,0%
		19	0,0	0,0	0,0%
		20	0,0	0,0	0,0%
		13	0,0	0,0	0,0%
		25	0,0	0,0	0,0%
		22	0,0	0,0	0,0%
		21	0,0	0,0	0,0%
		32	0,0	0,0	0,0%
		30	0,0	0,0	0,0%
		31	0,0	0,0	0,0%
		28	0,0	0,0	0,0%
		26	0,0	0,0	0,0%
		24	0,0	0,0	0,0%
		27	0,0	0,0	0,0%
		23	0,0	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01	0,0	0,0	0,0%
		05	0,0	0,0	0,0%
		04	0,0	0,0	0,0%
		03	0,0	0,0	0,0%
		09	0,0	0,0	0,0%
		08	0,0	0,0	0,0%
		07	0,0	0,0	0,0%
		06	0,0	0,0	0,0%
		02	0,0	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralos	160	0,0	0,0	0,0%
		159	0,0	0,0	0,0%
		162	0,0	0,0	0,0%
		165	0,0	0,0	0,0%
		164	0,0	0,0	0,0%
		176	0,0	0,0	0,0%
		177	0,0	0,0	0,0%
		174	0,0	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	Ralos	171	0,0	0,0	0,0%
		148	0,0	0,0	0,0%
		149	0,0	0,0	0,0%
		150	0,0	0,0	0,0%
		147	0,0	0,0	0,0%
		139	0,0	0,0	0,0%
		140	0,0	0,0	0,0%
		141	0,0	0,0	0,0%
		151	0,0	0,0	0,0%
		145	0,0	0,0	0,0%
		144	0,0	0,0	0,0%
		143	0,0	0,0	0,0%
		142	0,0	0,0	0,0%
		146	0,0	0,0	0,0%

Chuva?		não		não	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	Ralos	95	0,0	0,0	0,0%
		97	0,0	0,0	0,0%
		99	0,0	0,0	0,0%
		106	0,0	0,0	0,0%
		96	0,0	0,0	0,0%
		104	0,0	0,0	0,0%
		307	0,0	0,0	0,0%
		122	0,0	0,0	0,0%
		111	0,0	0,0	0,0%
		117	0,0	0,0	0,0%
		100	0,0	0,0	0,0%
		101	0,0	0,0	0,0%
		105	0,0	0,0	0,0%
		91	0,0	0,0	0,0%
		102	0,0	0,0	0,0%
		88	0,0	0,0	0,0%
		108	0,0	0,0	0,0%
		107	0,0	0,0	0,0%
		94	0,0	0,0	0,0%
		92	0,0	0,0	0,0%
		90	0,0	0,0	0,0%
		89	0,0	0,0	0,0%
		87	0,0	0,0	0,0%
		123	0,0	0,0	0,0%
		121	0,0	0,0	0,0%
		120	0,0	0,0	0,0%
		119	0,0	0,0	0,0%
		114	0,0	0,0	0,0%
		113	0,0	0,0	0,0%
		112	0,0	0,0	0,0%
		109	0,0	0,0	0,0%
		110	0,0	0,0	0,0%

Chuva?		não		não	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Conjunto Laboratorial	Ralos	34	0,0	0,0	0,0%
		36	0,0	0,0	0,0%
		53	0,0	0,0	0,0%
		69	0,0	0,0	0,0%
		70	0,0	0,0	0,0%
		71	0,0	0,0	0,0%
		67	0,0	0,0	0,0%
		66	0,0	0,0	0,0%
		64	0,0	0,0	0,0%
		65	0,0	0,0	0,0%
		63	0,0	0,0	0,0%
		62	0,0	0,0	0,0%
		56	0,0	0,0	0,0%
		60	0,0	0,0	0,0%
		58	0,0	0,0	0,0%
		55	0,0	0,0	0,0%
		54	0,0	0,0	0,0%
		57	0,0	0,0	0,0%
		42	0,0	0,0	0,0%
		44	0,0	0,0	0,0%
		43	0,0	0,0	0,0%
		41	0,0	0,0	0,0%
		38	0,0	0,0	0,0%
		32	0,0	0,0	0,0%
		61	0,0	0,0	0,0%
		37	0,0	0,0	0,0%
		45	0,0	0,0	0,0%
		46	0,0	0,0	0,0%
		40	0,0	0,0	0,0%
		47	0,0	0,0	0,0%
		48	0,0	0,0	0,0%
		49	0,0	0,0	0,0%
		50	0,0	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralos	74	0,0	0,0	0,0%
		75	0,0	0,0	0,0%
		76	0,0	0,0	0,0%
		77	0,0	0,0	0,0%
		78	0,0	0,0	0,0%
		79	0,0	0,0	0,0%
		80	0,0	0,0	0,0%
		81	0,0	0,0	0,0%
		82	0,0	0,0	0,0%
		83	0,0	0,0	0,0%
		84	0,0	0,0	0,0%
		85	0,0	0,0	0,0%
		86	0,0	0,0	0,0%

Chuva?			não		não	
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Enfermaria	Ralos	124	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		125	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		126	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		127	0,0	0,0%	0,0	0,0%
CAT	Ralos	136	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		137	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		138	0,0	0,0%	0,0	0,0%
P3	Ralos	187	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		186	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Incubadora	Ralos	132	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		133	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		134	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		135	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Caixas	Enf	53	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Enf	55	1,1	7,0%	0,0	0,0%
	Lab	40	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	38	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	24	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	15	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	13	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	28	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	33	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	37	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	16	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	18	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	21	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	39	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	59	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	57	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	60	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	67	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	58	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Aud	72	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Aud	73	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Aud	74	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Espaços com pouca circulação de ar		1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		9	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Legenda dos Espaços com pouca circulação de ar:

1- Depósito Auditório Vermelho

2- Depósito Auditório Verde

3- Depósito I3

4- Arquivo Enfermaria

5- Depósito Enfermaria

6- Câmara de visita da Caixa d'água

7- Depósito dentro do Almojarifado

8- Depósito fora do Almojarifado

9- Casa de Máquinas (Hidrante)

SEMANA		Quinzena 1 01/06/2017		Quinzena 2 14/06/2017	
Chuva?		não		não	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	0,0	0,0	0,0%
		17	0,0	0,0	0,0%
		16	0,0	0,0	0,0%
		14	0,0	0,0	0,0%
		15	0,0	0,0	0,0%
		18	0,0	0,0	0,0%
		19	0,0	0,0	0,0%
		20	0,0	0,0	0,0%
		13	0,0	0,0	0,0%
		25	0,0	0,0	0,0%
		22	0,0	0,0	0,0%
		21	0,0	0,0	0,0%
		32	0,0	0,0	0,0%
		30	0,0	0,0	0,0%
		31	0,0	0,0	0,0%
		28	0,0	0,0	0,0%
		26	0,0	0,0	0,0%
		24	0,0	0,0	0,0%
		27	0,0	0,0	0,0%
		23	0,0	0,0	0,0%
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01	0,0	0,0	0,0%
		05	0,0	0,0	0,0%
		04	0,0	0,0	0,0%
		03	0,0	0,0	0,0%
		09	0,0	0,0	0,0%
		08	0,0	0,0	0,0%
		07	0,0	0,0	0,0%
		06	0,0	0,0	0,0%
		02	0,0	0,0	0,0%
I-3 Auditórios	Ralos	160	0,0	0,0	0,0%
		159	0,0	0,0	0,0%
		162	0,0	0,0	0,0%
		165	0,0	0,0	0,0%
		164	0,0	0,0	0,0%
		176	0,0	0,0	0,0%
		177	0,0	0,0	0,0%
		174	0,0	0,0	0,0%
I-3 Biblioteca	Ralos	171	0,0	0,0	0,0%
		148	0,0	0,0	0,0%
		149	0,0	0,0	0,0%
		150	0,0	0,0	0,0%
		147	0,0	0,0	0,0%
		139	0,0	0,0	0,0%
		140	0,0	0,0	0,0%
		141	0,0	0,0	0,0%
		151	0,0	0,0	0,0%
		145	0,0	0,0	0,0%
		144	0,0	0,0	0,0%
		143	0,0	0,0	0,0%
		142	0,0	0,0	0,0%
		146	0,0	0,0	0,0%

Chuva?		não		não	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Edifício I-4	Ralos	95	0,0	0,0	0,0%
		97	0,0	0,0	0,0%
		99	0,0	0,0	0,0%
		106	0,0	0,0	0,0%
		96	0,0	0,0	0,0%
		104	0,0	0,0	0,0%
		307	0,0	0,0	0,0%
		122	0,0	0,0	0,0%
		111	0,0	0,0	0,0%
		117	0,0	0,0	0,0%
		100	0,0	0,0	0,0%
		101	0,0	0,0	0,0%
		105	0,0	0,0	0,0%
		91	0,0	0,0	0,0%
		102	0,0	0,0	0,0%
		88	0,0	0,0	0,0%
		108	0,0	0,0	0,0%
		107	0,0	0,0	0,0%
		94	0,0	0,0	0,0%
		92	0,0	0,0	0,0%
		90	0,0	0,0	0,0%
		89	0,0	0,0	0,0%
		87	0,0	0,0	0,0%
		123	0,0	0,0	0,0%
		121	0,0	0,0	0,0%
		120	0,0	0,0	0,0%
		119	0,0	0,0	0,0%
		114	0,0	0,0	0,0%
		113	0,0	0,0	0,0%
		112	0,0	0,0	0,0%
		109	0,0	0,0	0,0%
		110	0,0	0,0	0,0%

Chuva?		não		não	
INFRA		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Conjunto Laboratorial	Ralos	34	0,0	0,0	0,0%
		36	0,0	0,0	0,0%
		53	0,0	0,0	0,0%
		69	0,0	0,0	0,0%
		70	0,0	0,0	0,0%
		71	0,0	0,0	0,0%
		67	0,0	0,0	0,0%
		66	0,0	0,0	0,0%
		64	1,3	0,0	0,0%
		65	0,0	0,0	0,0%
		63	0,0	0,0	0,0%
		62	0,0	0,0	0,0%
		56	0,0	0,0	0,0%
		60	0,0	0,0	0,0%
		58	0,0	0,0	0,0%
		55	0,0	0,0	0,0%
		54	0,0	0,0	0,0%
		57	0,0	0,0	0,0%
		42	0,0	0,0	0,0%
		44	0,0	0,0	0,0%
		43	0,0	0,0	0,0%
		41	0,0	0,0	0,0%
		38	0,0	0,0	0,0%
		32	0,0	0,0	0,0%
		61	0,0	0,0	0,0%
		37	0,0	0,0	0,0%
		45	0,0	0,0	0,0%
		46	0,0	0,0	0,0%
		40	0,0	0,0	0,0%
		47	0,0	0,0	0,0%
		48	0,0	0,0	0,0%
		49	0,0	0,0	0,0%
		50	0,0	0,0	0,0%
Bloco inicial	Ralos	74	0,0	0,0	0,0%
		75	0,0	0,0	0,0%
		76	0,0	0,0	0,0%
		77	0,0	0,0	0,0%
		78	0,0	0,0	0,0%
		79	0,0	0,0	0,0%
		80	0,0	0,0	0,0%
		81	0,0	0,0	0,0%
		82	0,0	0,0	0,0%
		83	0,0	0,0	0,0%
		84	0,0	0,0	0,0%
		85	0,0	0,0	0,0%
		86	0,0	0,0	0,0%

Chuva?			não		não	
INFRA			PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)
Enfermaria	Ralos	124	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		125	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		126	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		127	0,0	0,0%	0,0	0,0%
CAT	Ralos	136	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		137	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		138	0,0	0,0%	0,0	0,0%
P3	Ralos	187	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		186	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Incubadora	Ralos	132	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		133	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		134	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		135	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Caixas	Enf	53	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Enf	55	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	40	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	38	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	24	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	15	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	13	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	28	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	33	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	37	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	16	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	18	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	21	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Lab	39	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	59	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	57	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	60	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	67	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Bib.	58	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Aud	72	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Aud	73	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	Aud	74	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Espaços com pouca circulação de ar		1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
		9	0,0	0,0%	0,0	0,0%

Legenda dos Espaços com pouca circulação de ar:

1- Depósito Auditório Vermelho

2- Depósito Auditório Verde

3- Depósito I3

4- Arquivo Enfermaria

5- Depósito Enfermaria

6- Câmara de visita da Caixa d'água

7- Depósito dentro do Almoxarifado

8- Depósito fora do Almoxarifado

9- Casa de Máquinas (Hidrante)

**ANEXO VI – TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM EXAUSTORES (ABR
A JUN / 17)**

DATA		Semana 1: 03/04 a 07/04/2017				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (% Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,17
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,16
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,75
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,01
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,15
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,28
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,71
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,19
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,89
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,21
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,82
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,61
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,29
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,34
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,70
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,52
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,52
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,11
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,97
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,72
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,77
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,58
Exaustor Reserva 1						
Exaustor Reserva 2						

DATA		Semana 2: 10/04 a 13/04/2017				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (% Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,44
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,17
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,64
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,17
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,47
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,55
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,77
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,54
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,21
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,01
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,87
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,25
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,89
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,13
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,73
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,98
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,28
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,87
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,05
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,52
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,70
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,07
Exaustor Reserva 1						
Exaustor Reserva 2						

DATA		Semana 3: 17/04 a 20/04/2017				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (% Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,52
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,97
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,53
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,04
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,02
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,93
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,09
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,86
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,51
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,41
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,72
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,60
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,36
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,59
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,80
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,29
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,59
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,26
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,43
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,32
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,89
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,25
Exaustor Reserva 1						
Exaustor Reserva 2						

DATA		Semana 3: 24/04 a 28/04/2017				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (% Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,38
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,72
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,87
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,50
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,40
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,69
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,92
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,48
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,66
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,09
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,68
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,24
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,62
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,34
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,56
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,52
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,33
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,36
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,64
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,07
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,39
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,95
Exaustor Reserva 1						
Exaustor Reserva 2						

DATA		Semana 1: 01/05 a 05/05/2017				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (% Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,10
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,50
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,07
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,42
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,71
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,56
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,36
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,22
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,23
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,56
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,46
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,18
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,21
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,11
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,17
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,13
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,04
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,36
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,36
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,91
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,11
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,16
Exaustor Reserva 1						
Exaustor Reserva 2						

DATA		Semana 2: 08/05 a 12/05/2017				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (% Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,85
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,66
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,30
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,15
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,48
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,41
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,62
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,77
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,01
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,07
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,00
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,44
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,79
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,55
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,49
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,55
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,43
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,23
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,14
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,94
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,65
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,03
Exaustor Reserva 1						
Exaustor Reserva 2						

DATA		Semana 3: 15/05 a 19/05/2017				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (% Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,21
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,55
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,41
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,55
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,03
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,15
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,47
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,42
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,85
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,63
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,15
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,70
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,47
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,13
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,97
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,36
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,39
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,37
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,40
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,26
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,54
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,77
Exaustor Reserva 1						
Exaustor Reserva 2						

DATA		Semana 3: 22/05 a 26/05/2017				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (% Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,42
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,16
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,13
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,45
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,22
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-7,02
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,20
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,06
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,70
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,13
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,98
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,13
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,69
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,93
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,02
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,13
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,52
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,93
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,33
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,53
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,31
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,20
Exaustor Reserva 1						
Exaustor Reserva 2						

DATA		Semana 3: 22/05 a 26/05/2017				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (% Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,70
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,15
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,71
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,22
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,20
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,11
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,27
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-6,04
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,69
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,59
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,90
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,78
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,54
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,77
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,98
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,47
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,77
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,44
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,61
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,50
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,07
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,43
Exaustor Reserva 1						
Exaustor Reserva 2						

DATA		Semana 1: 05/06 a 09/06/2017				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (% Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,68
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,32
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,82
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,45
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,53
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,47
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,15
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,38
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,81
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,00
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,78
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,63
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,55
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,09
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,62
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,55
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,20
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,61
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-0,40
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,39
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,72
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,52
Exaustor Reserva 1						
Exaustor Reserva 2						

DATA		Semana 2: 12/06 a 16/06/2017				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (% Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,21
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,56
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,87
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,45
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,99
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,16
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,74
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,89
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,52
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,12
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,48
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,20
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,43
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,67
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,34
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,77
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,34
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,91
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,70
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,61
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,49
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,16
Exaustor Reserva 1						
Exaustor Reserva 2						

DATA		Semana 3: 19/06 a 23/06/2017				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (% Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,15
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,94
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,27
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,82
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,14
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,75
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,58
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,27
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,74
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,79
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,99
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,39
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,30
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,61
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,72
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,17
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,51
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,74
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,37
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,93
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,64
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,60
Exaustor Reserva 1						
Exaustor Reserva 2						

DATA		Semana 3: 26/06 a 30/06/2017				
Identificação do Exaustor	Operação	Vácuo na célula		Entrada do Exaustor		
		(mmHg)	(Conversão mBar)	VOC (ppm)	Metano (% Vol)	Pressão (mBar)
Exaustor I1 (1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,73
Exaustor I1 (2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,39
Exaustor I5 Auditórios	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,52
Exaustor Biblioteca	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,94
Exaustor Portaria 3	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,49
Exaustor Ginásio	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,96
Exaustor Enfermaria	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,01
Exaustor CAT1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,37
Exaustor CAT2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,16
Exaustor Transportes	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,83
Exaustor MI (B1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,80
Exaustor MI (B2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,82
Exaustor MI (B3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,86
Exaustor Auditório 1	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,15
Exaustor Auditório 2	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,49
Exaustor Cantina	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,59
Exaustor Corredor	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,96
Exaustor Conj. Lab. (A1)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,97
Exaustor Conj. Lab. (A2)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,21
Exaustor Conj. Lab. (A3)	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,61
Exaustor I4	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,36
Exaustor Guarda	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,04
Exaustor Reserva 1						
Exaustor Reserva 2						

**ANEXO VII – EVOLUÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES X PRESSÃO (ABR / 14 A
JUN / 17)**

EDIFÍCIO I-1

Quantidade total de Poços:

17 Pares

sendo 9 na Parte 1 e 8 na Parte 2

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:



2 Pares

PMG-114 Parte 1

PMG-11 Parte 2

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

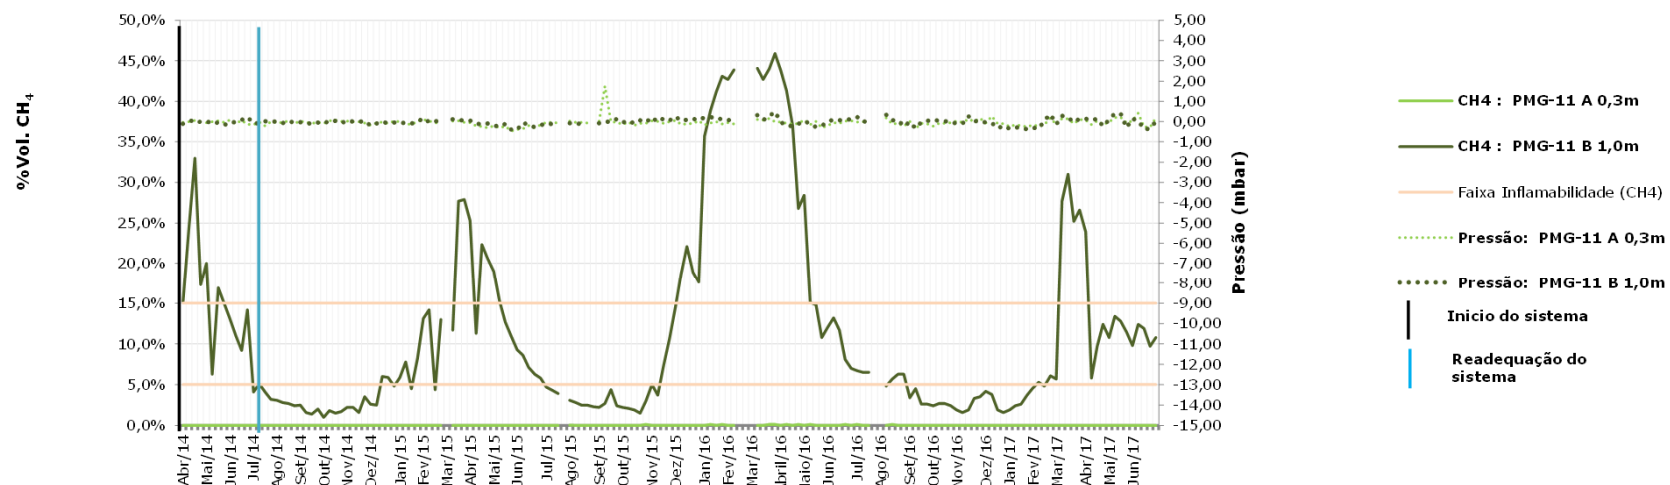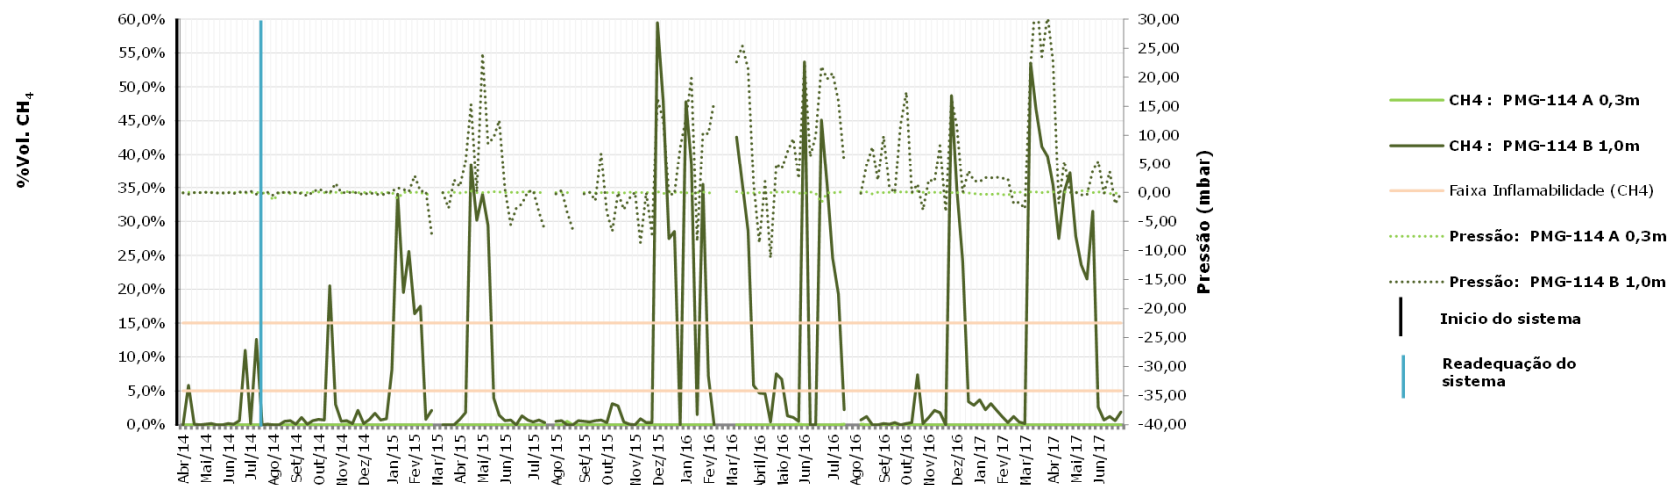

EDIFÍCIO I-3

Quantidade total de Poços:

21 Pares

sendo 7 nos Auditórios e 14 na Biblioteca

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:



2 Pares

PMG-31 Biblioteca

PMG-39 Biblioteca

Observações:

As concentrações apresentam-se no Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

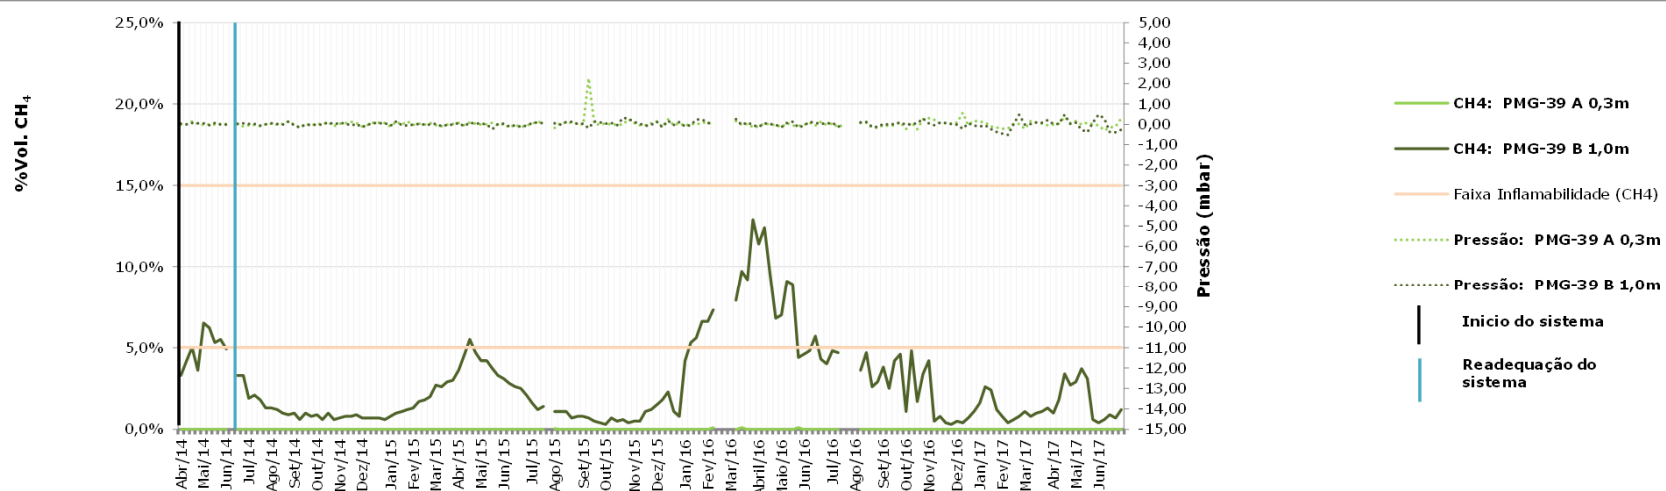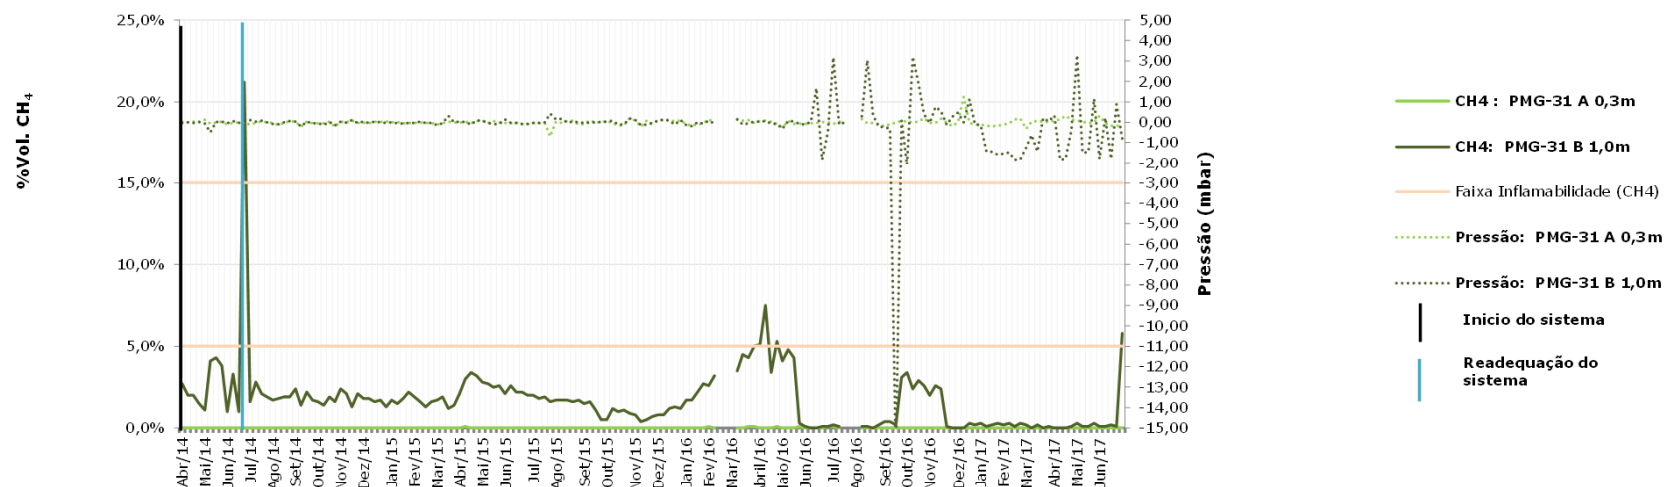

EDIFÍCIO I-4

Quantidade total de Poços:

12 Pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

3Pares



PMG-64

PMG-69

PMG-66

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

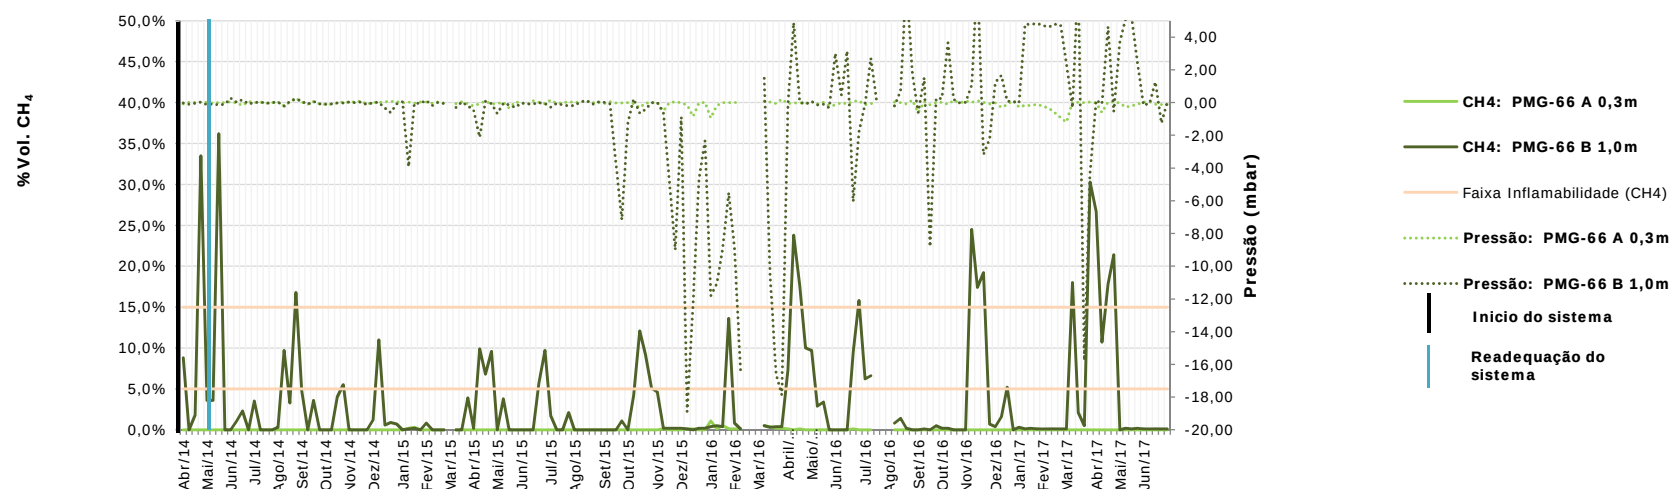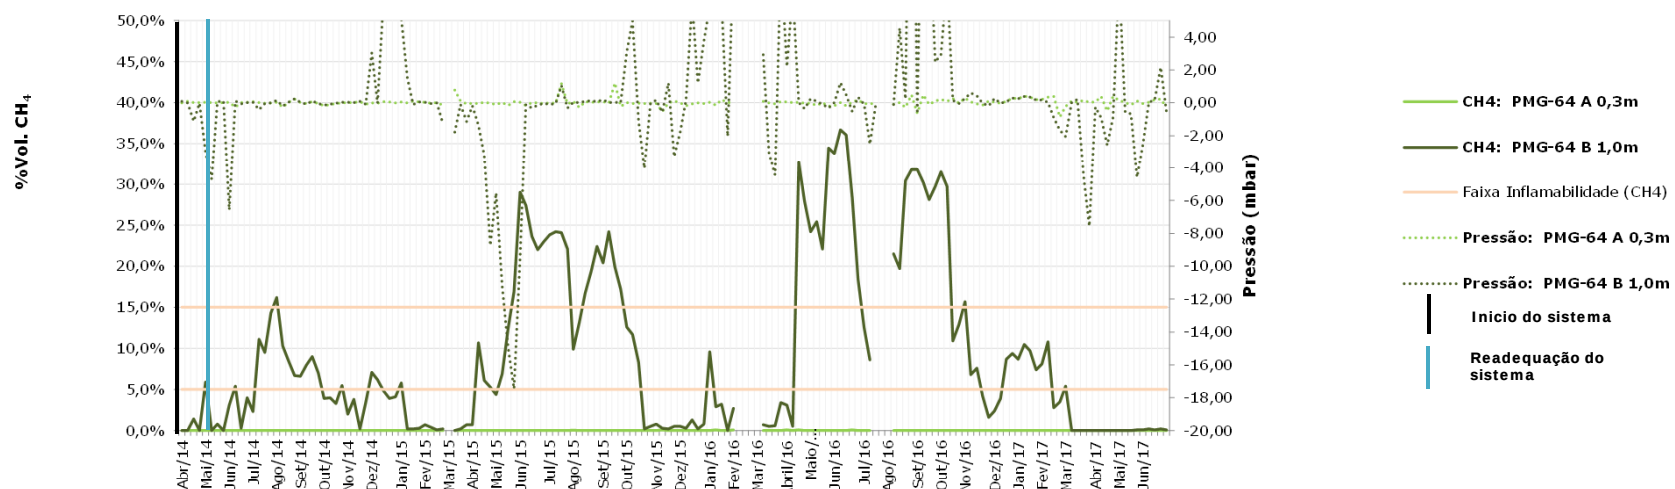

EDIFÍCIO I-4

Quantidade total de Poços:

12 Pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

3Pares


PMG-64

PMG-69

PMG-66

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

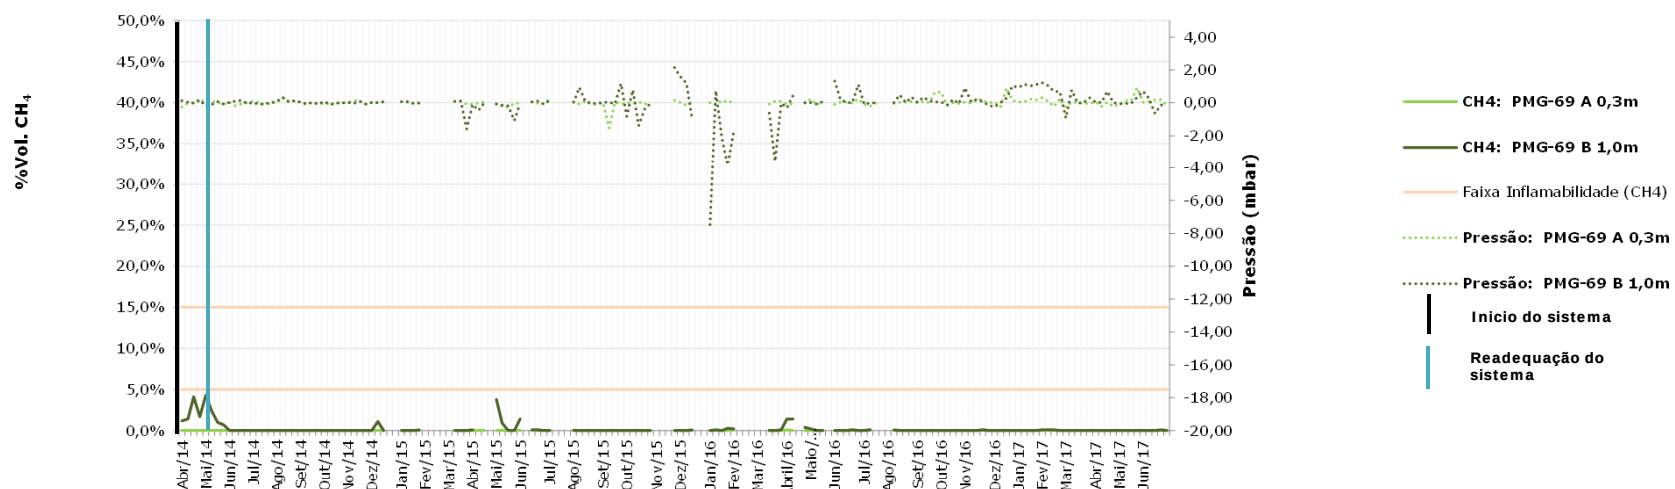

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços:

17 Pares

Período de Medição:



08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

13 Pares PMG-46 PMG-49 PMG-51 PMG-54 PMG-57 PMG-60 PMG-62
PMG-48 PMG-50 PMG-53 PMG-55 PMG-59 PMG-61

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

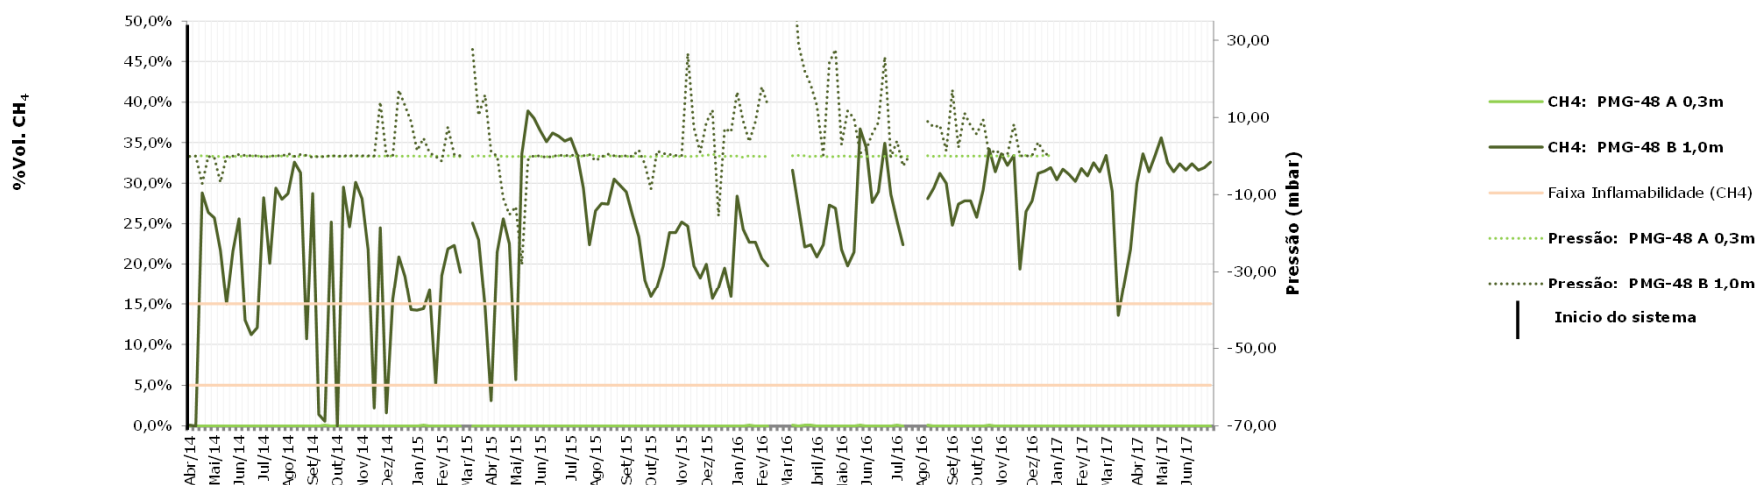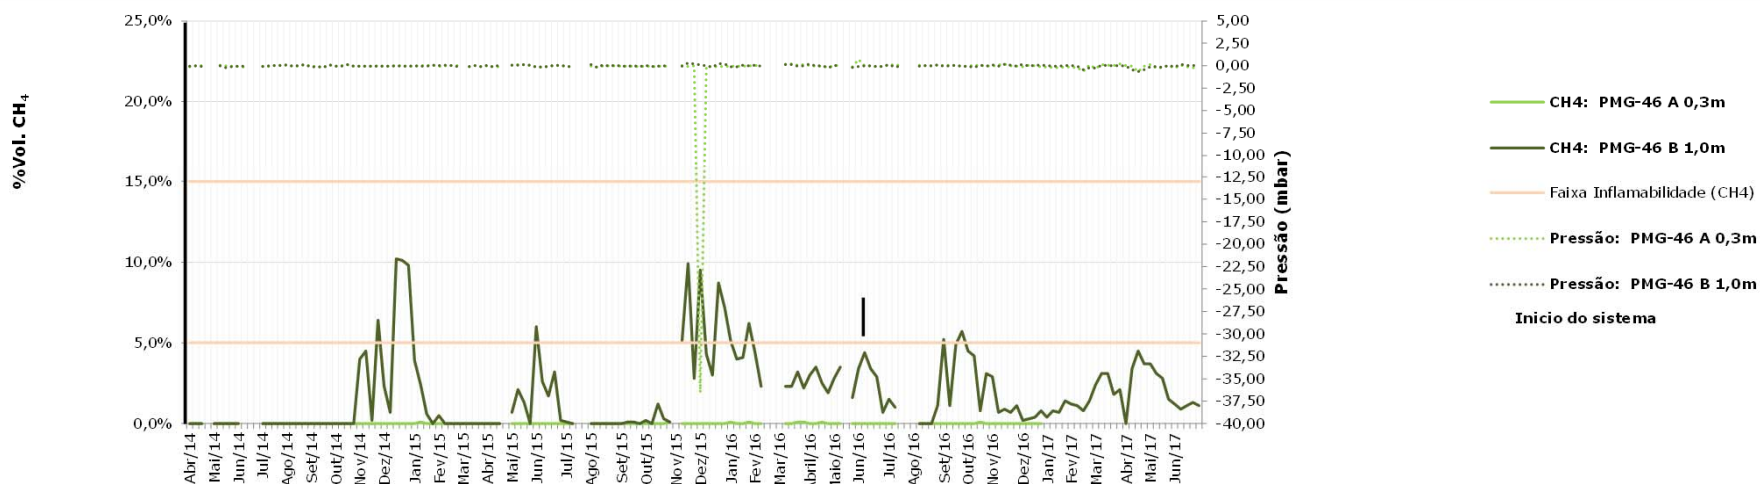

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços:

17 Pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017


Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

13 Pares

PMG-46	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-60	PMG-62
PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-61	

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

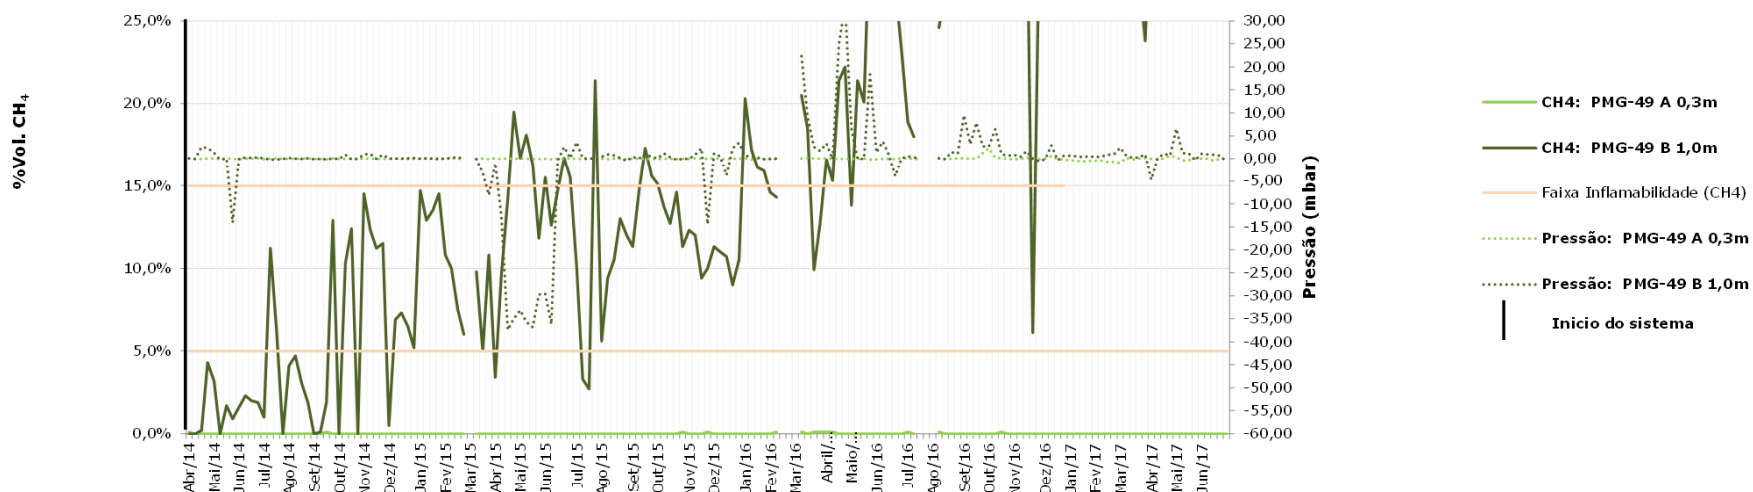

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços:

17 Pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017



Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

13 Pares

PMG-46	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-60	PMG-62
PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-61	

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

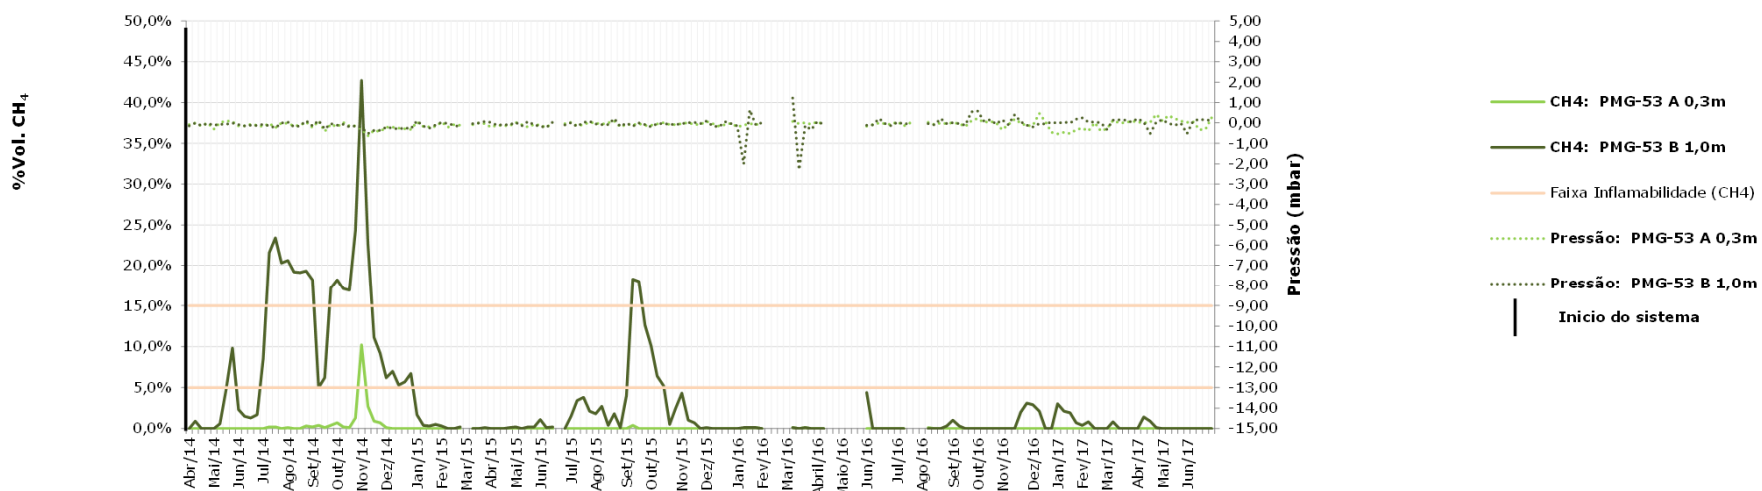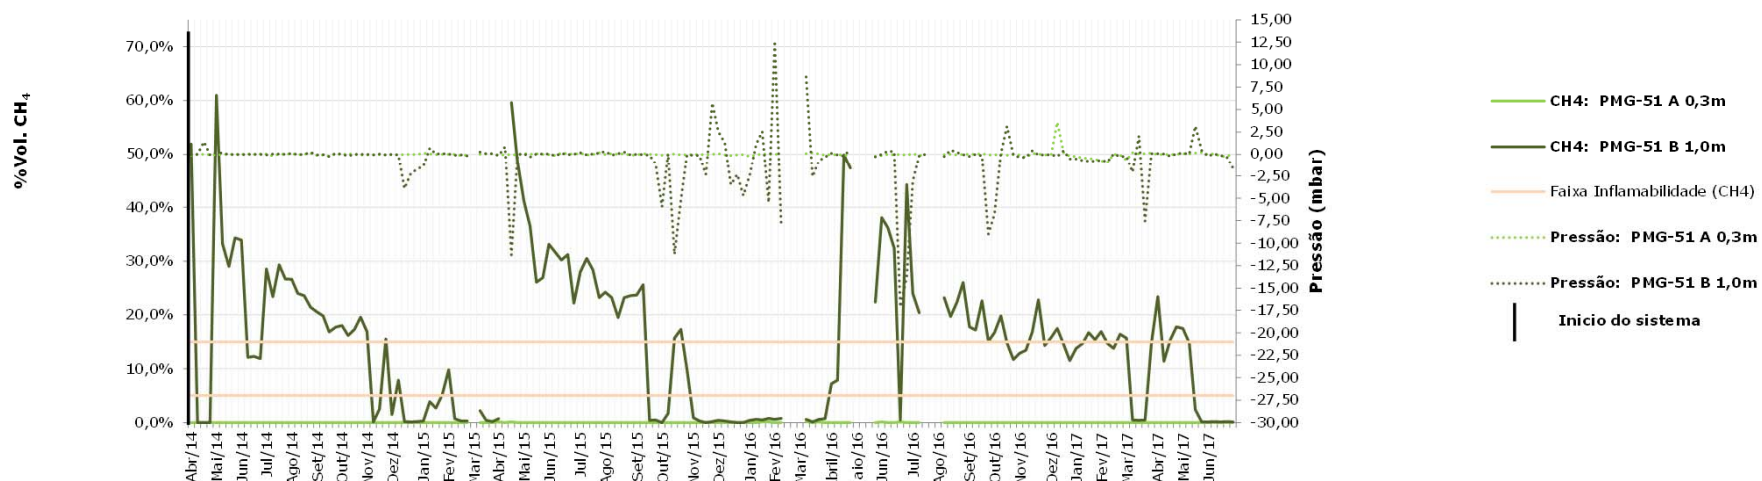

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços:

17 Pares

Período de Medição:



08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

13 Pares PMG-46 PMG-49 PMG-51 PMG-54 PMG-57 PMG-60 PMG-62
PMG-48 PMG-50 PMG-53 PMG-55 PMG-59 PMG-61

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

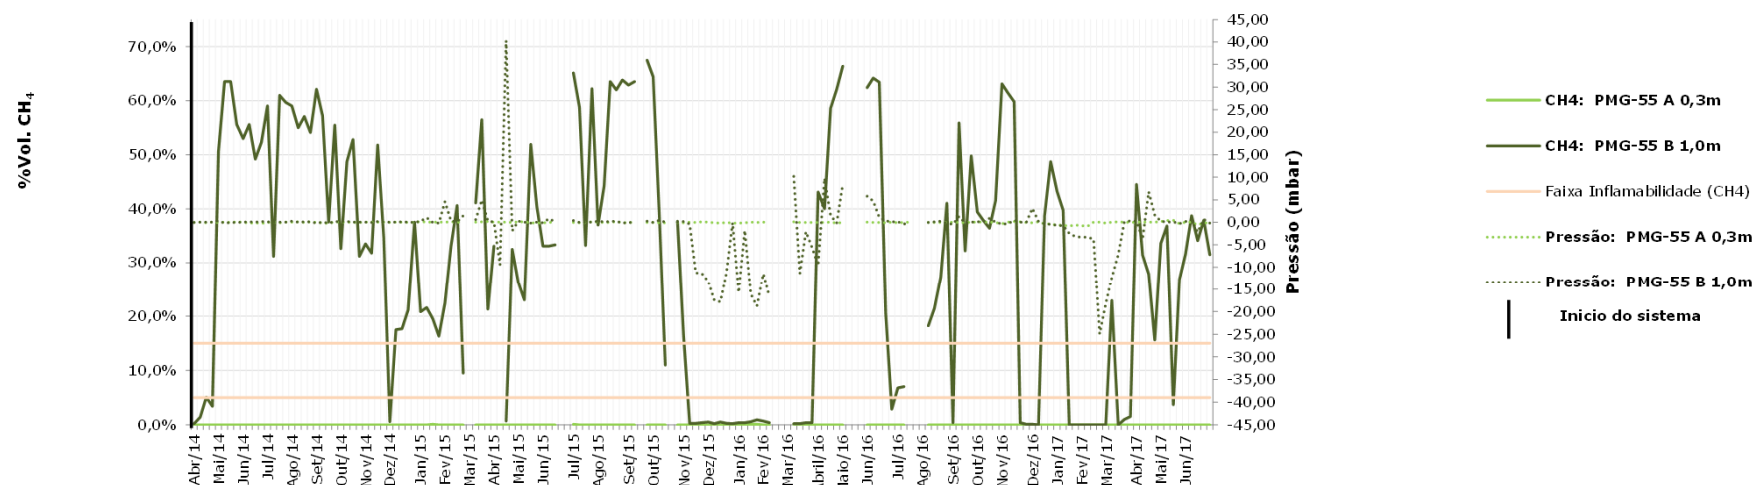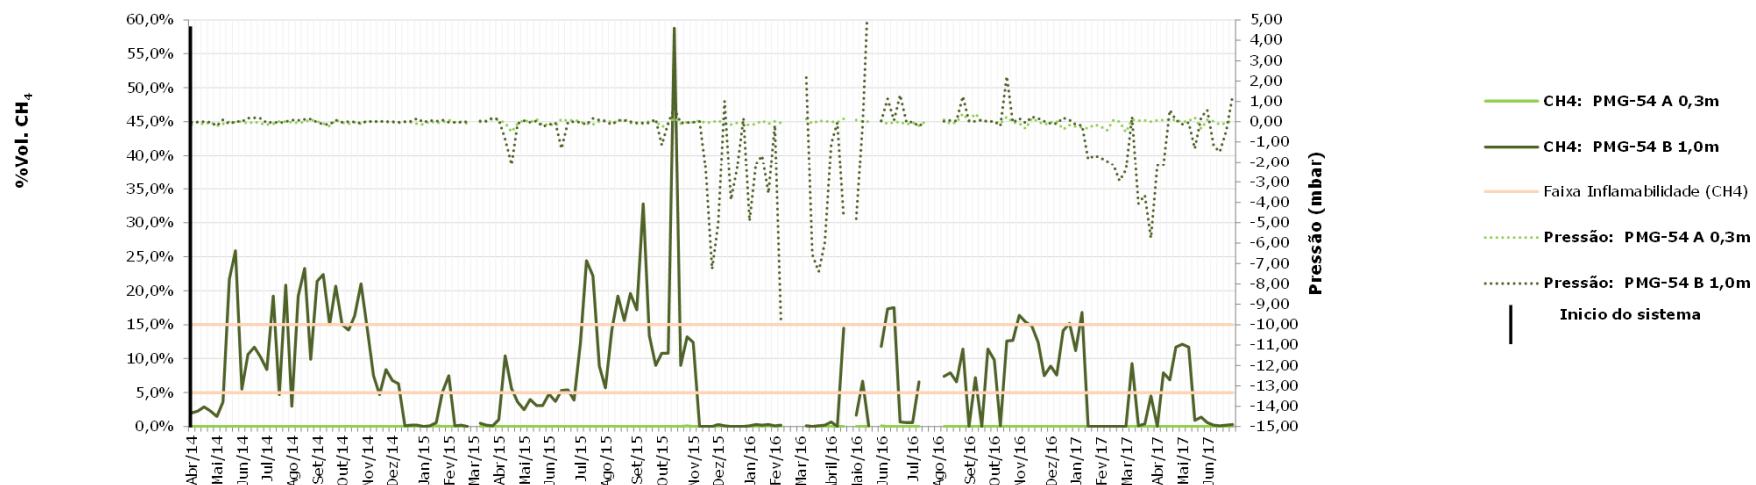

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços:

17 Pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

13 Pares

PMG-46
PMG-48

PMG-49
PMG-50

PMG-51
PMG-53

PMG-54
PMG-55



PMG-57
PMG-59

PMG-60
PMG-61

PMG-62

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

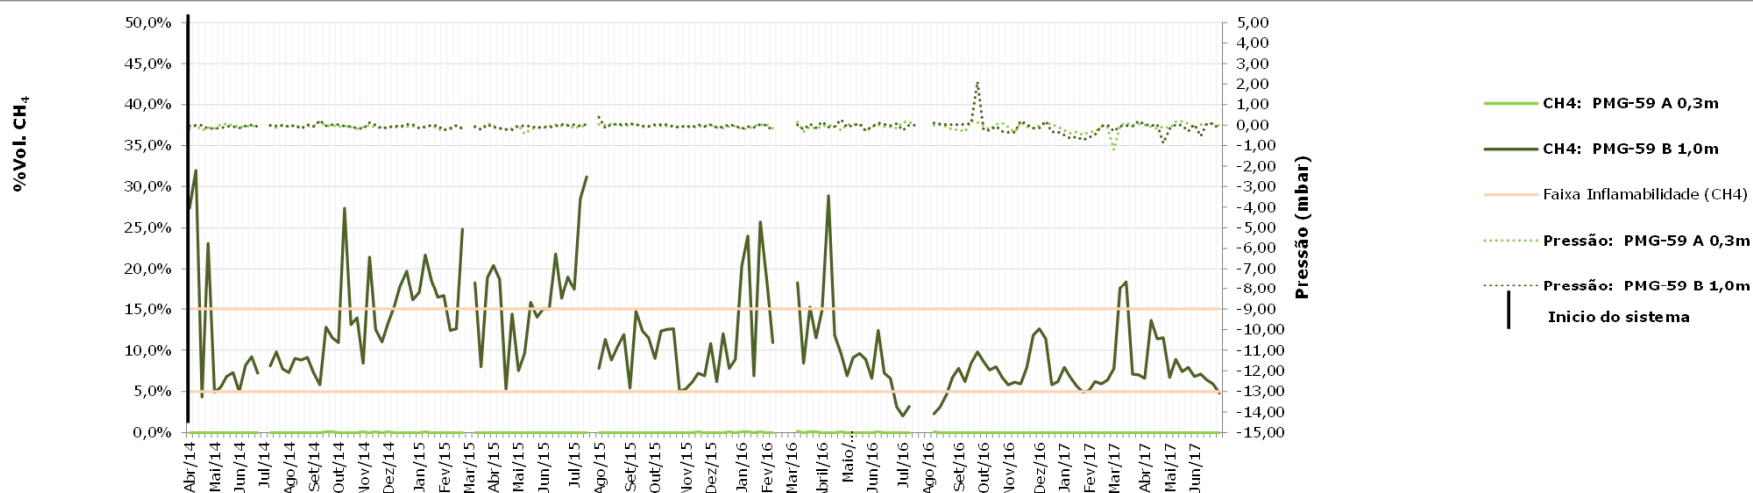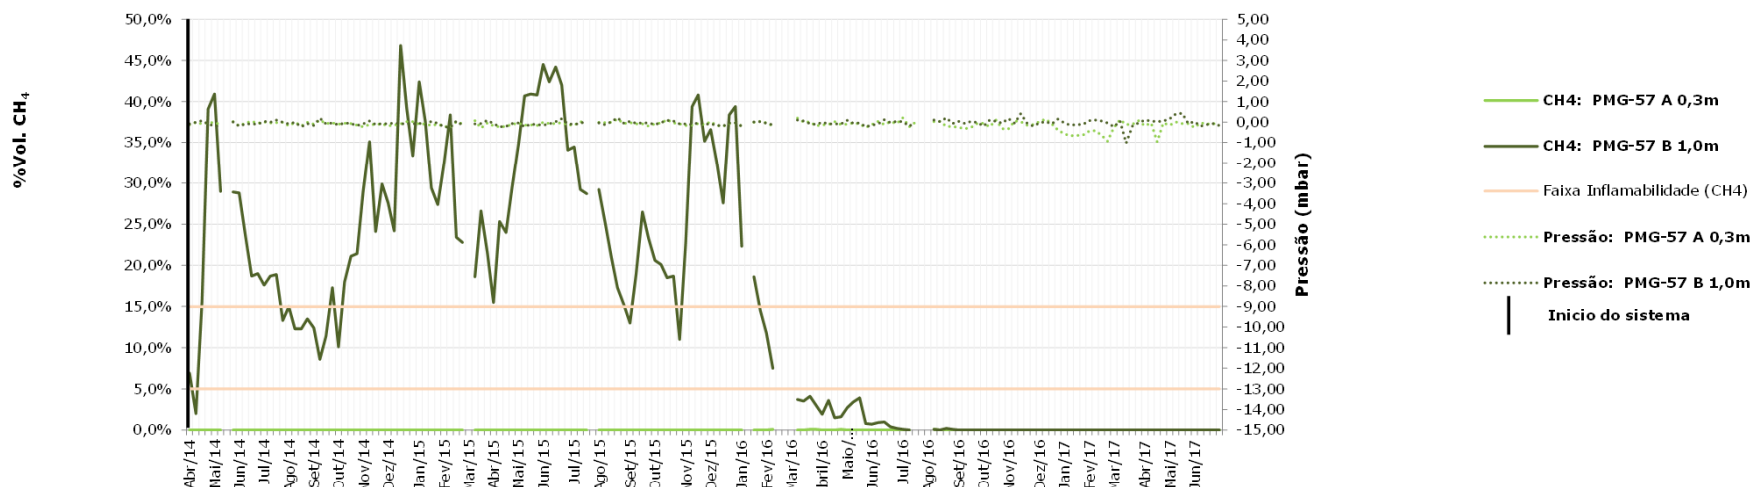

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços:

17 Pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017



Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

13 Pares

PMG-46	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-60	PMG-62
PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-61	

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

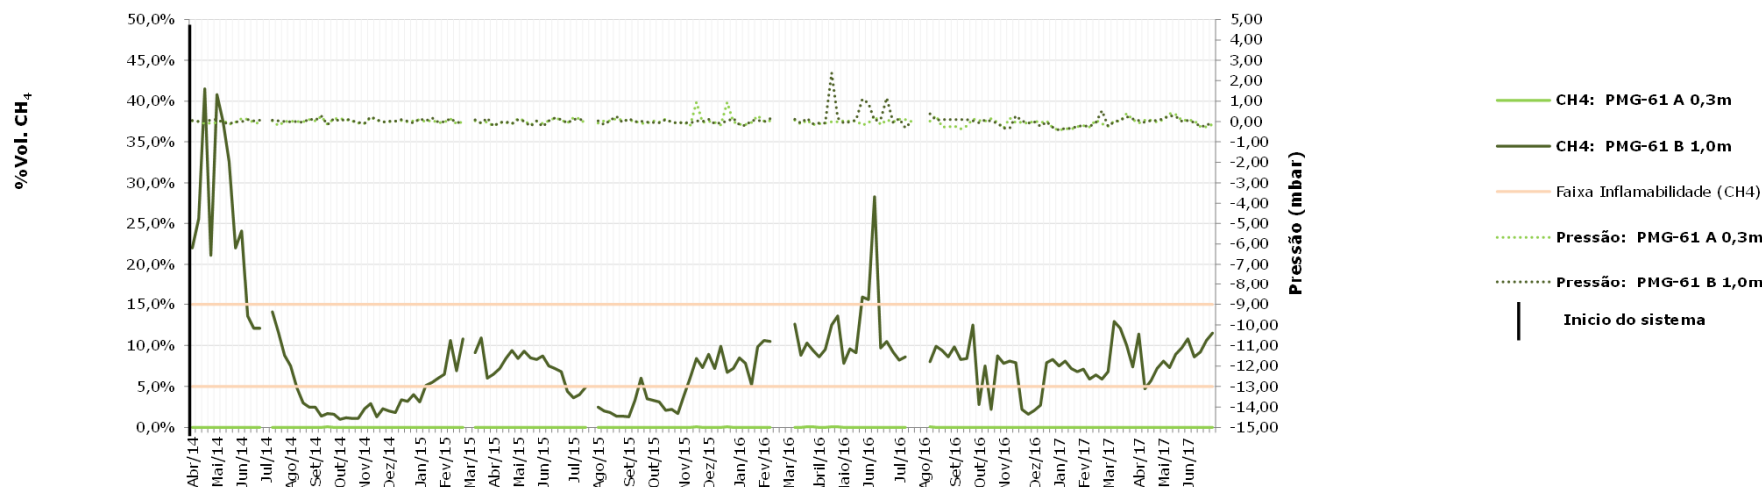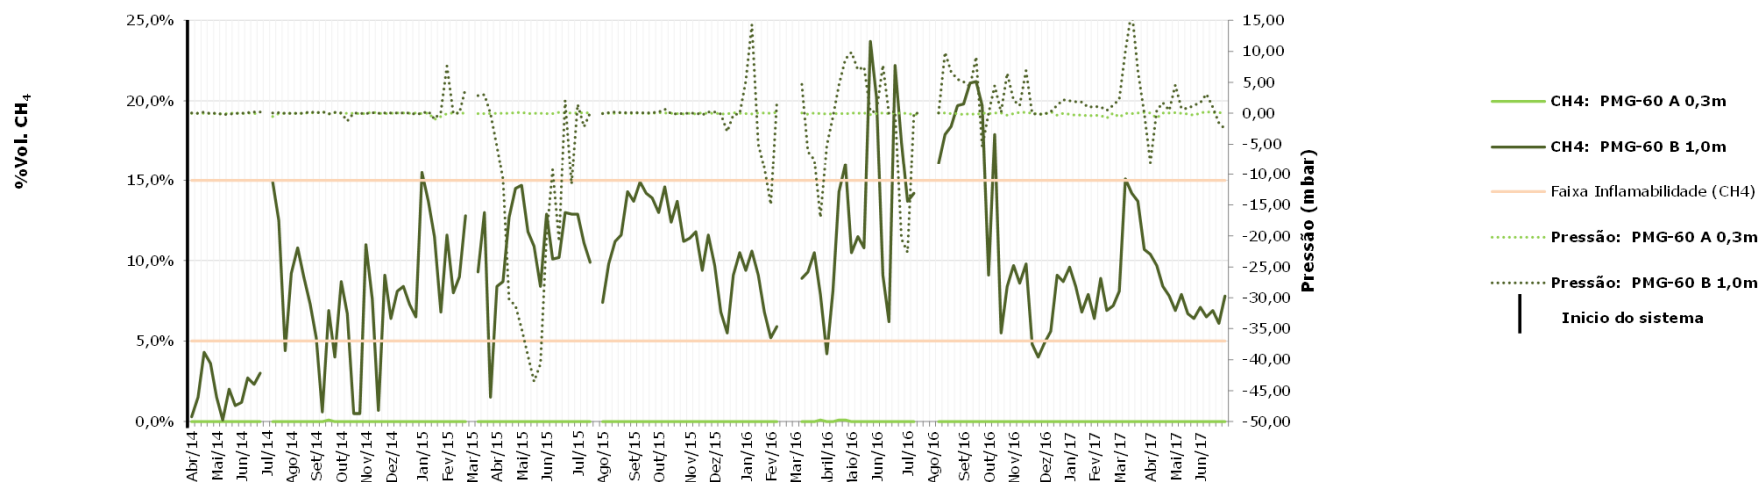

CONJUNTO LABORATORIAL

Quantidade total de Poços:

17 Pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017


Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

13 Pares

PMG-46	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-60	PMG-62
PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-59	PMG-61	

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

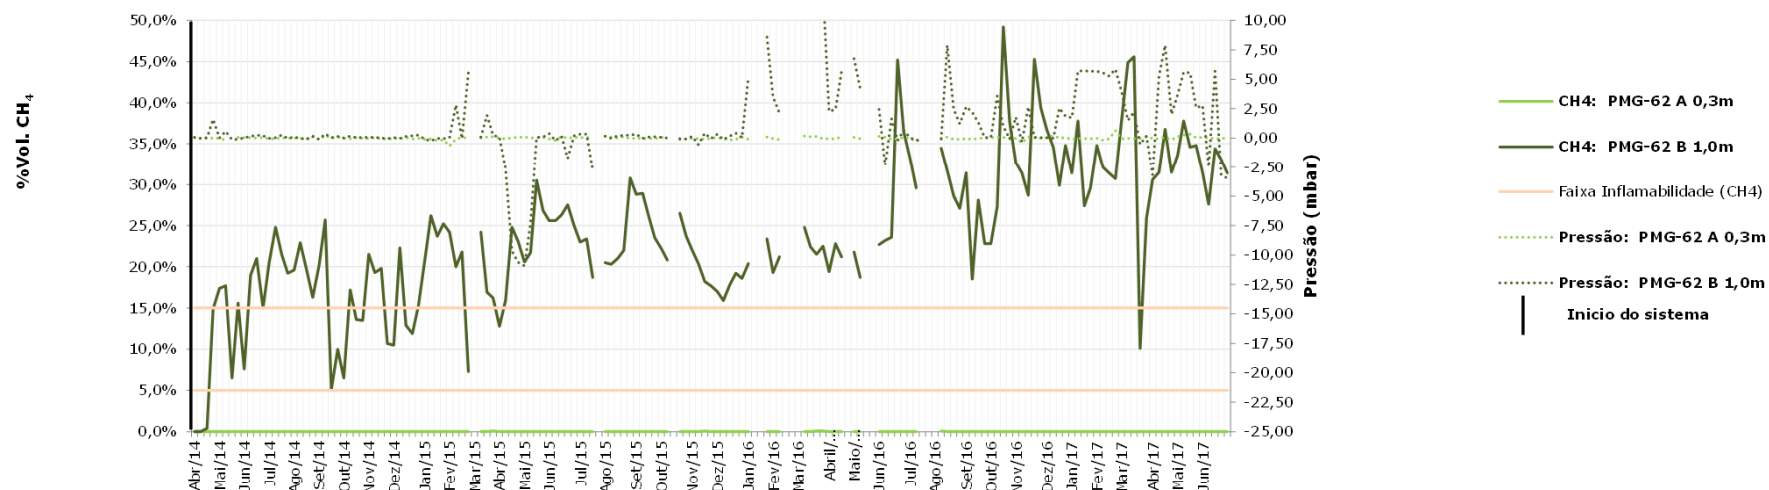

BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços:

14 Pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

6 Pares

PMG-01

PMG-03

PMG-08



PMG-02

PMG-06

PMG-09

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

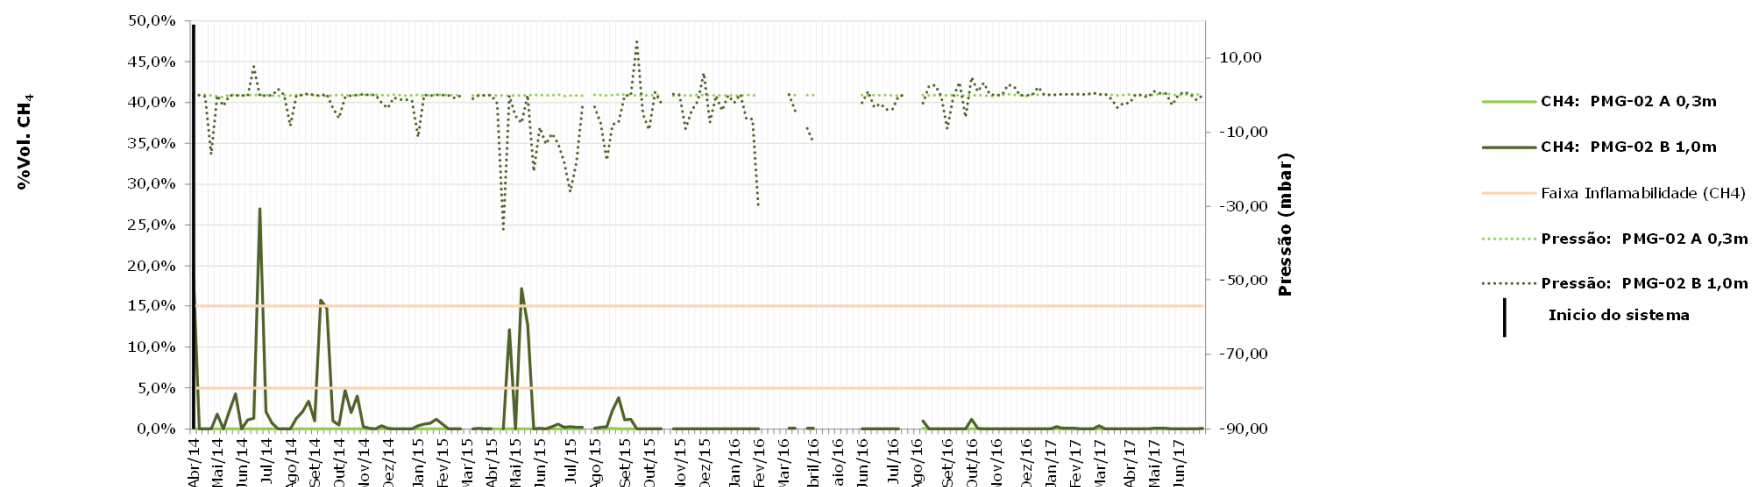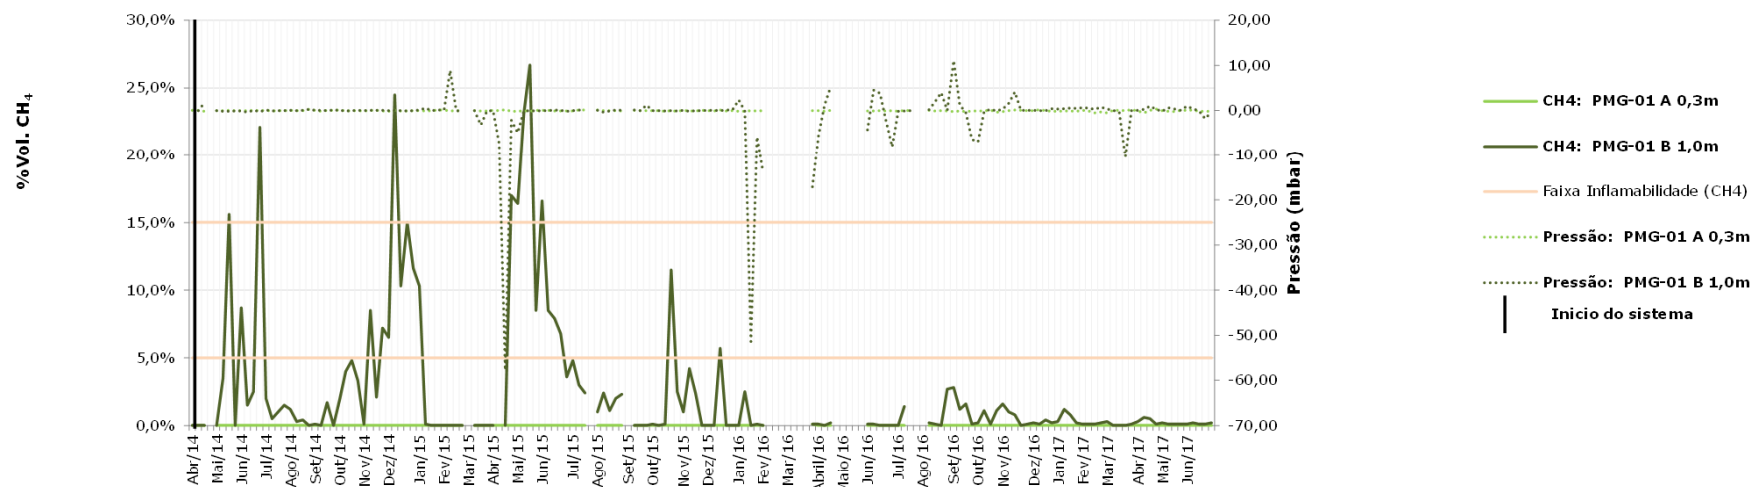

BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços:

14 Pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

6 Pares

PMG-01

PMG-03

PMG-08



PMG-02

PMG-06

PMG-09

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

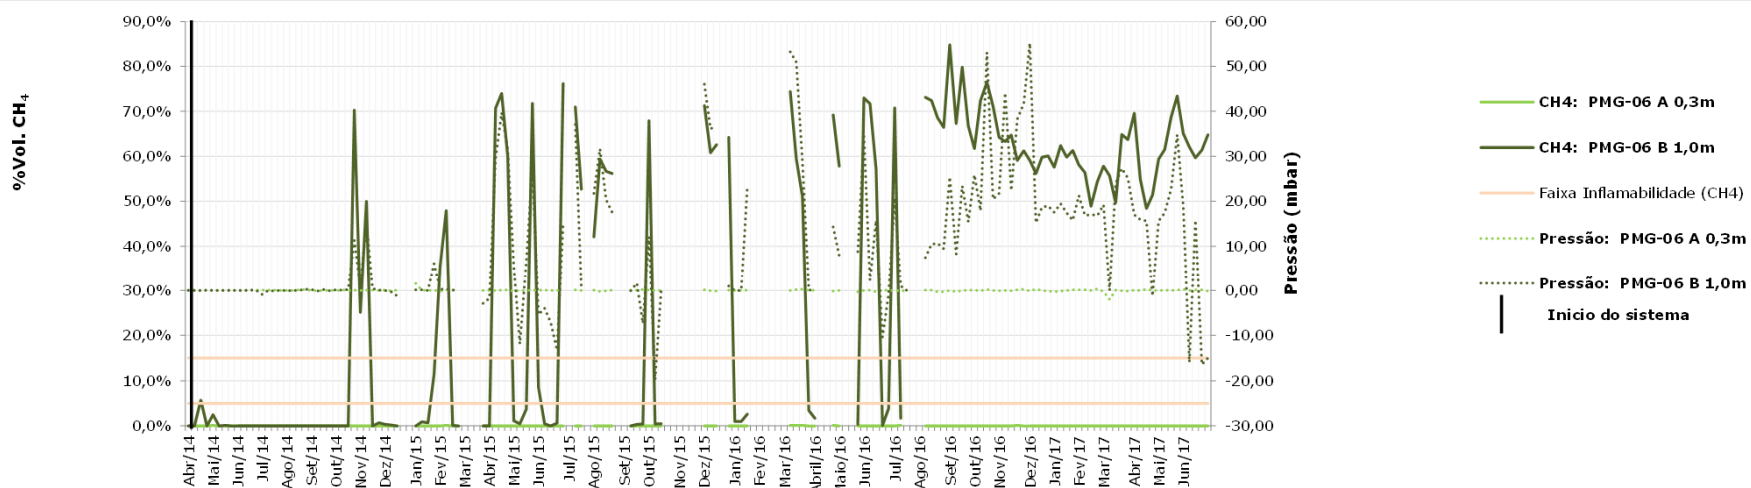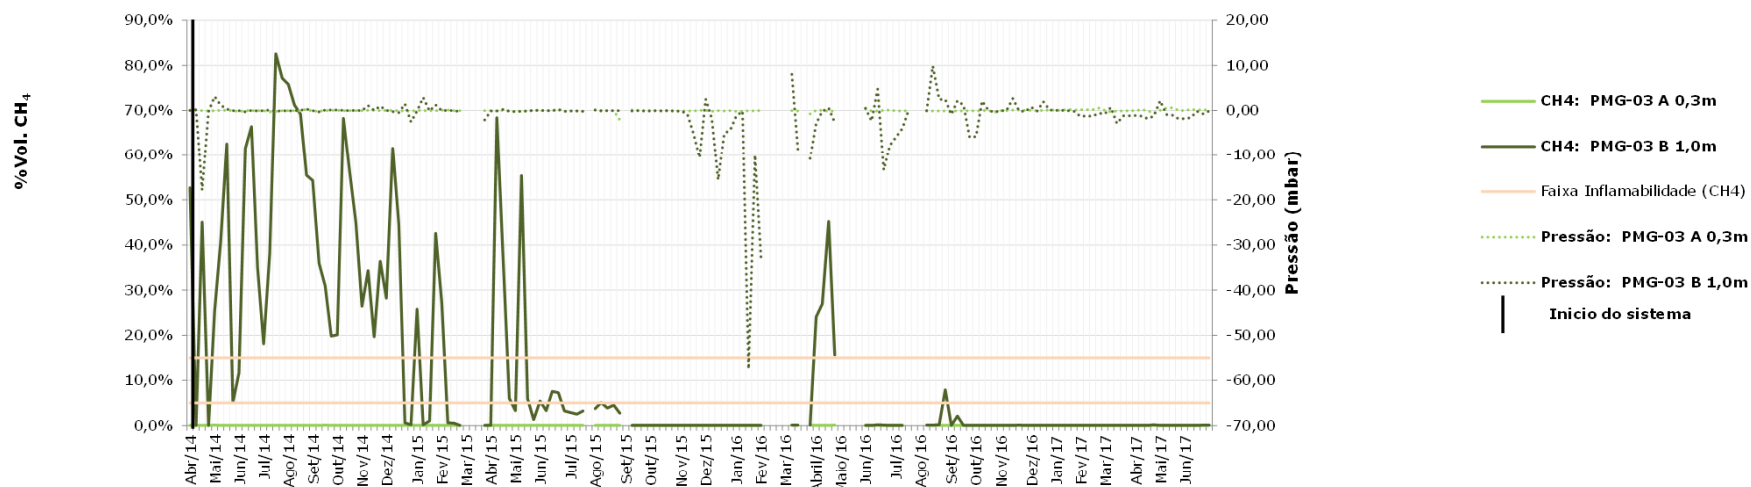

BLOCO INICIAL (CONJ. DIDÁTICO)

Quantidade total de Poços:

14 Pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

6 Pares

PMG-01

PMG-03

PMG-08



PMG-02

PMG-06

PMG-09

Observações:

As concentrações apresentam-se acima do Limite inferior de explosividade, somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

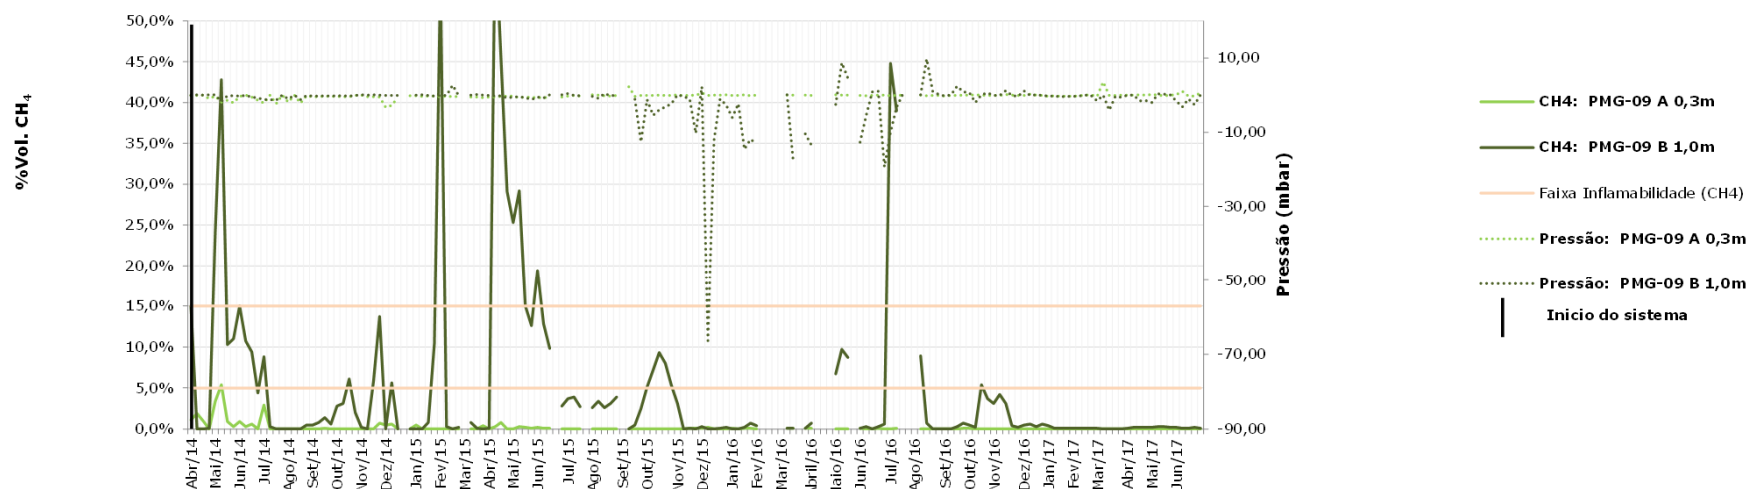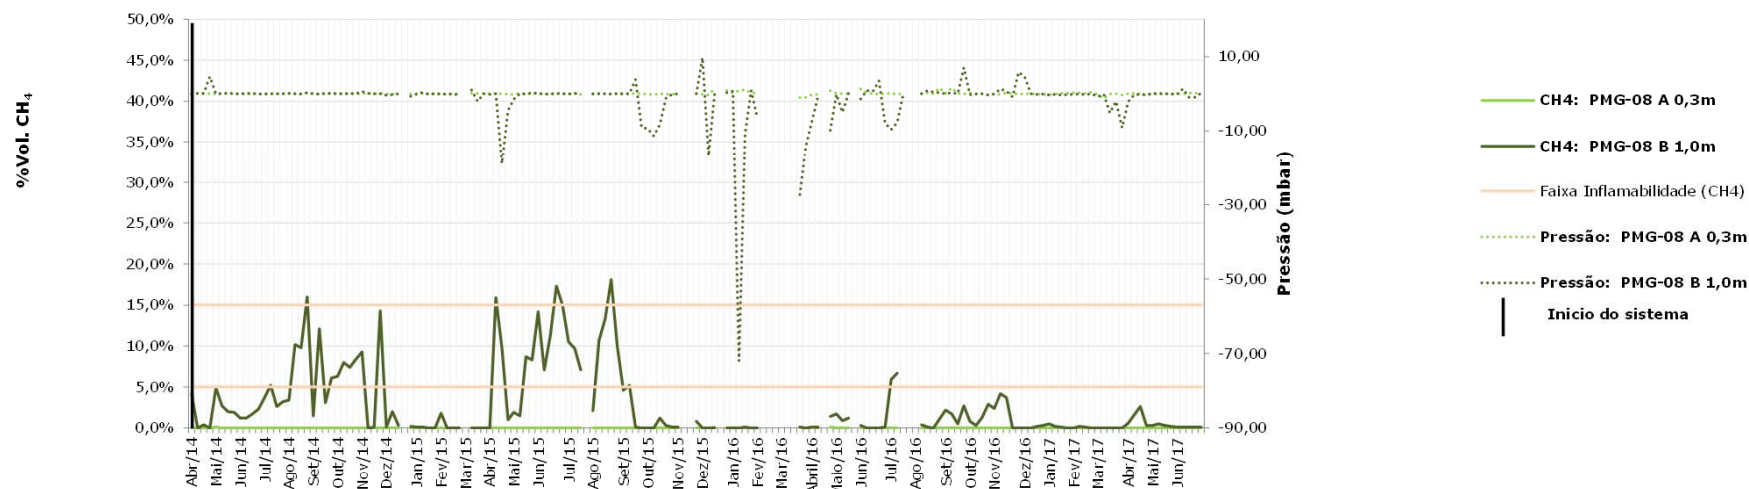

ENFERMARIA

Quantidade total de Poços:

7 Pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

3 Par



PMG-71

PMG-75

PMG-74

Observações:

As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

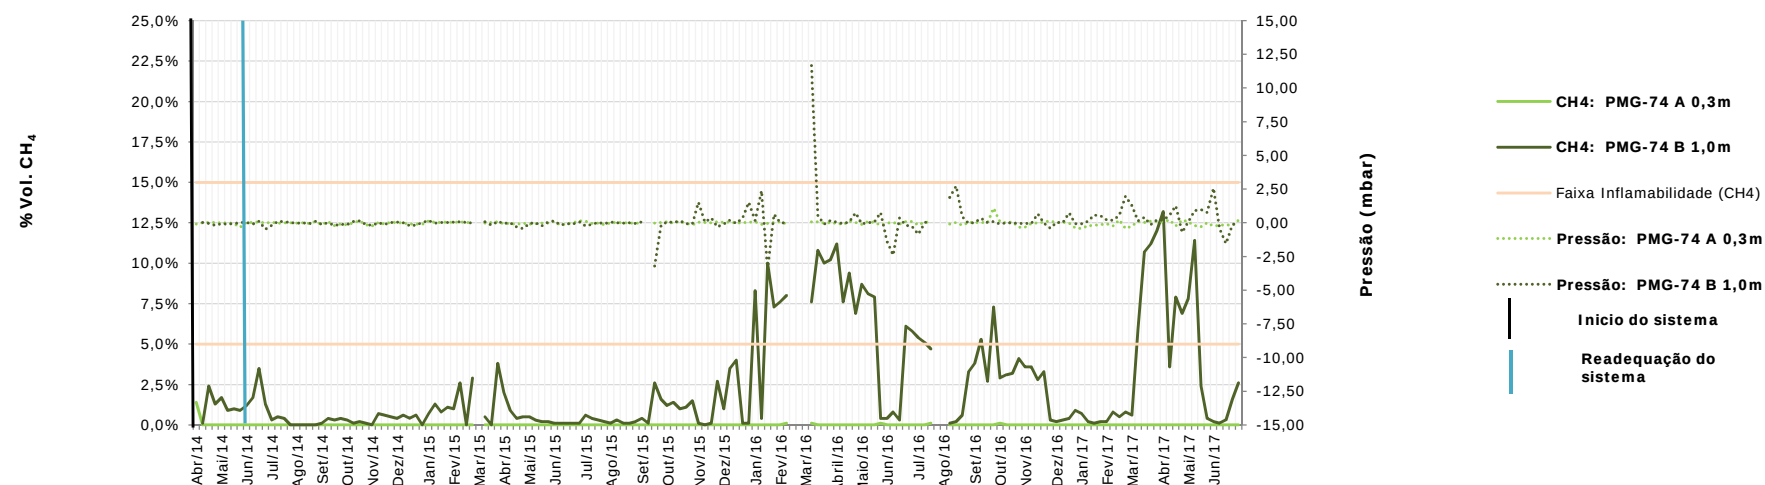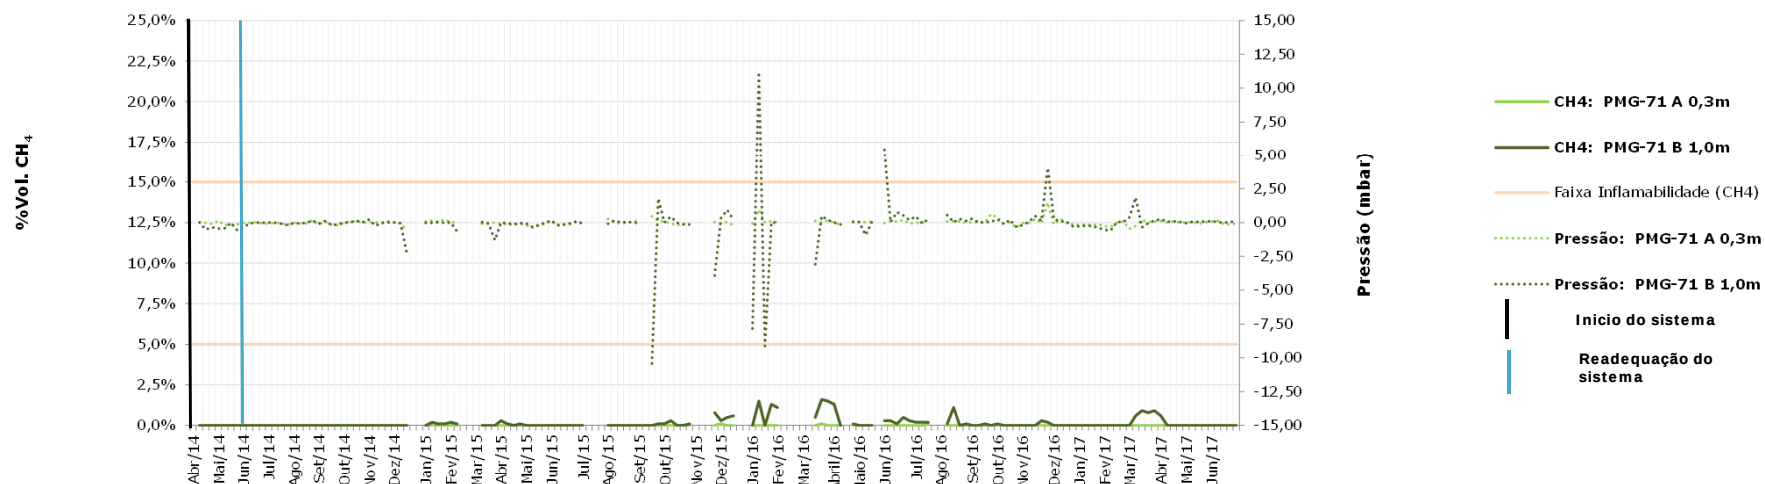

ENFERMARIA

Quantidade total de Poços:

7 Pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

3 Par


PMG-71

PMG-75

PMG-74

Observações:

As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

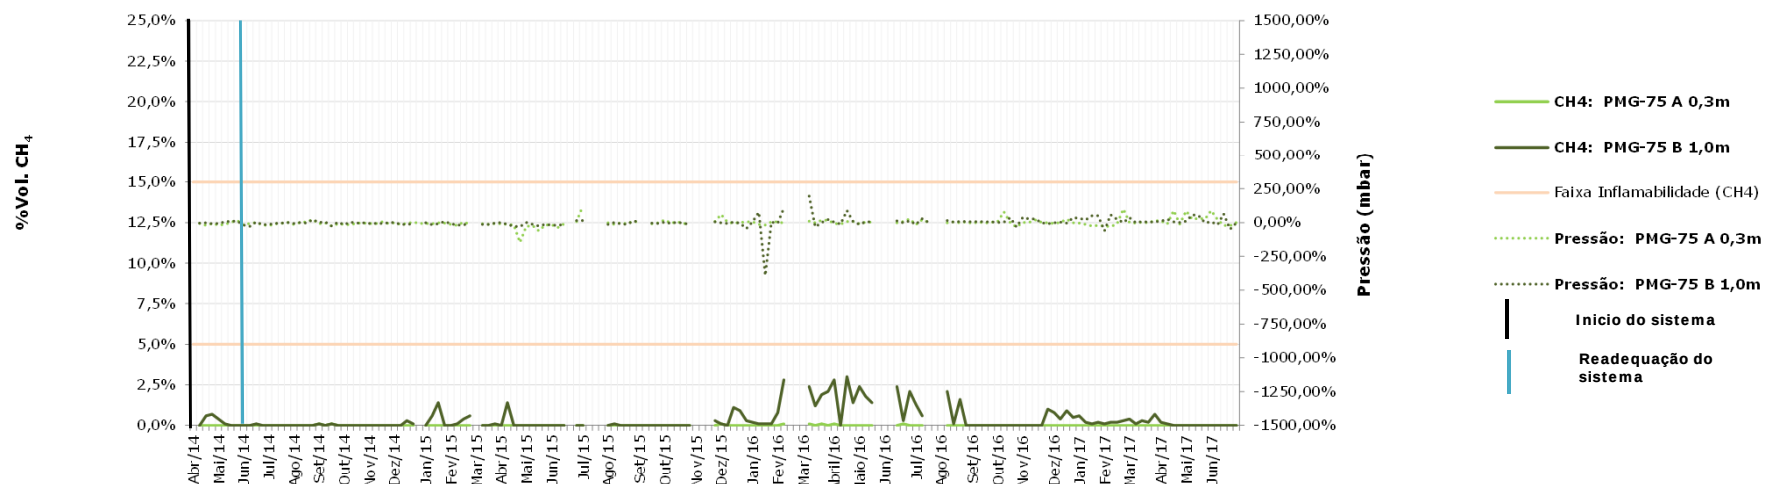

GINÁSIO POLIESPORTIVO

Quantidade total de Poços:

11 Pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017


Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

1 Pares

PMG-110

Observações:

As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

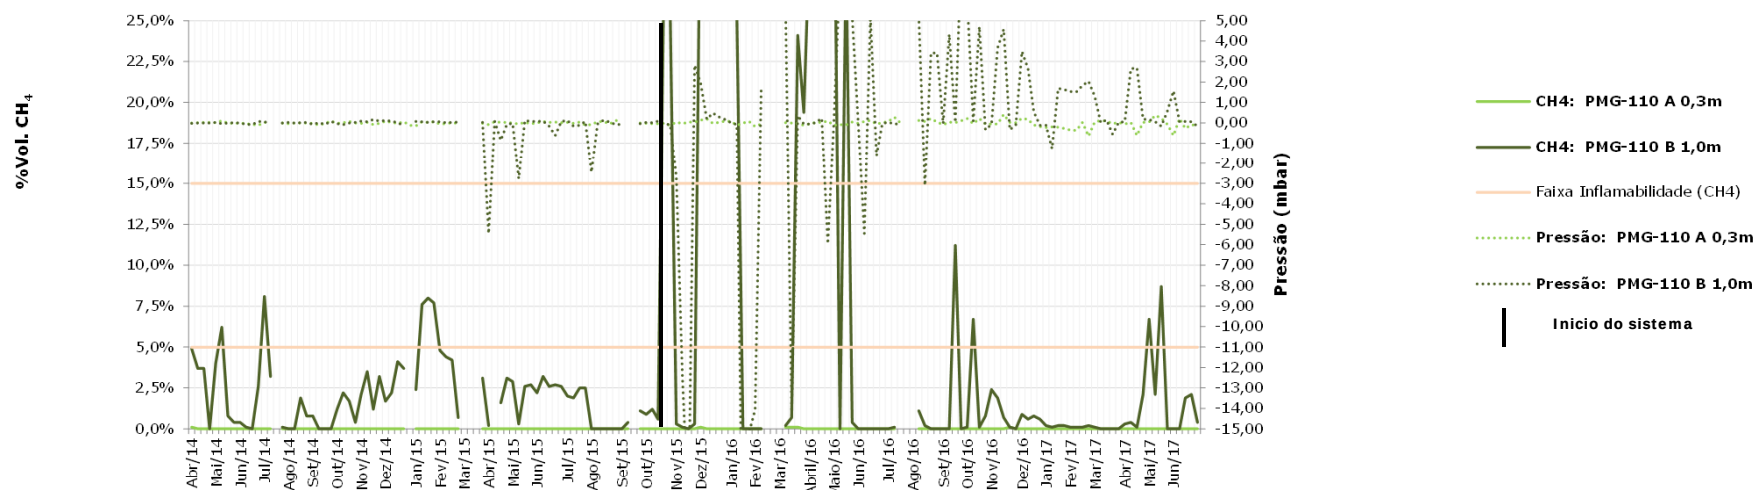

Transportes

Quantidade total de Poços:

4 pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017


Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:

1 Par

PMG-122

Observações:

As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

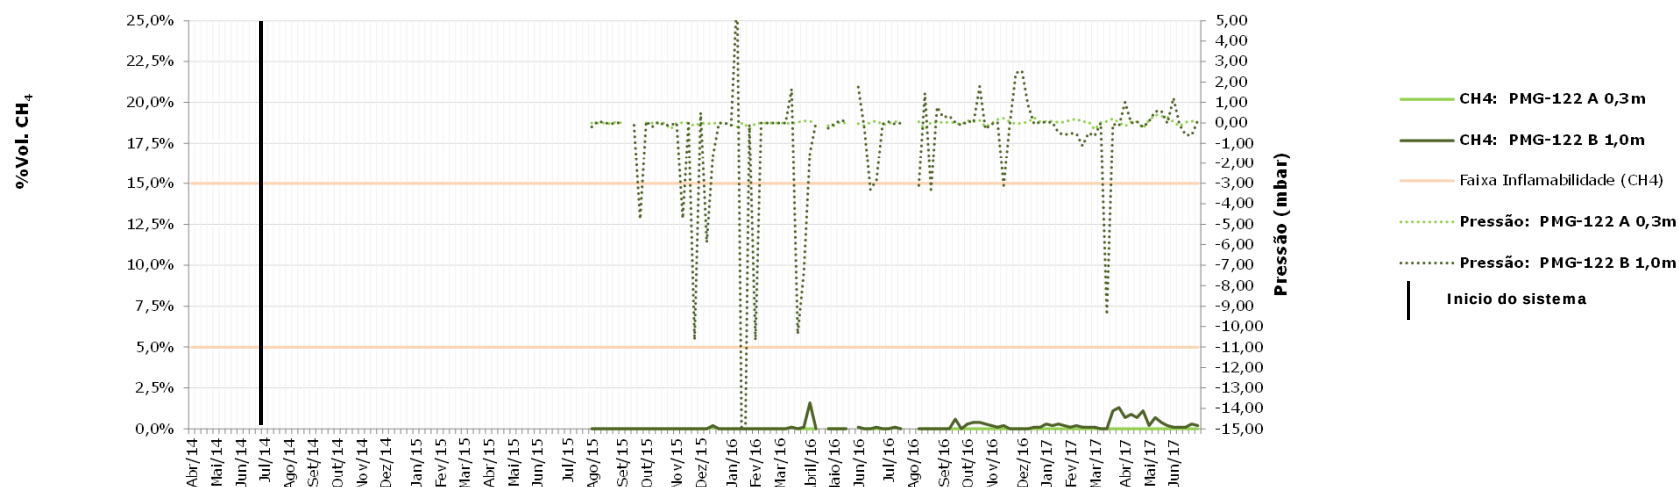

CAT

Quantidade total de Poços:

7 pares

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 30 de Junho de 2017

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:



2 Par

PMG-95

PMG-96

Observações:

As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

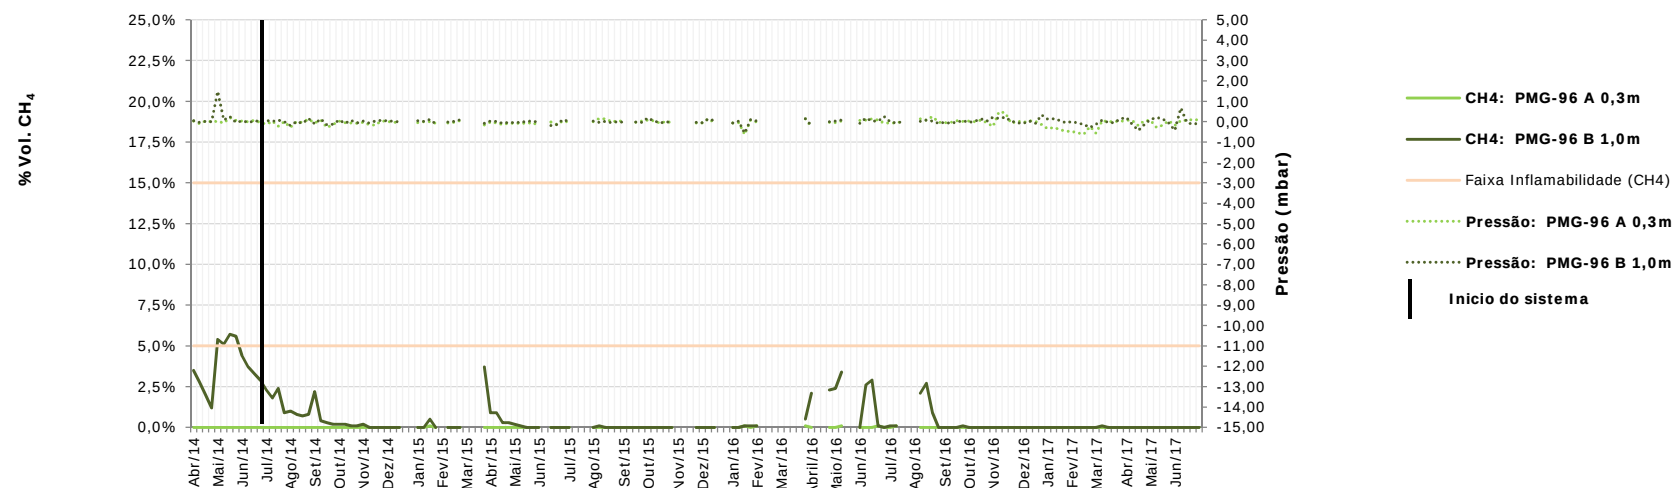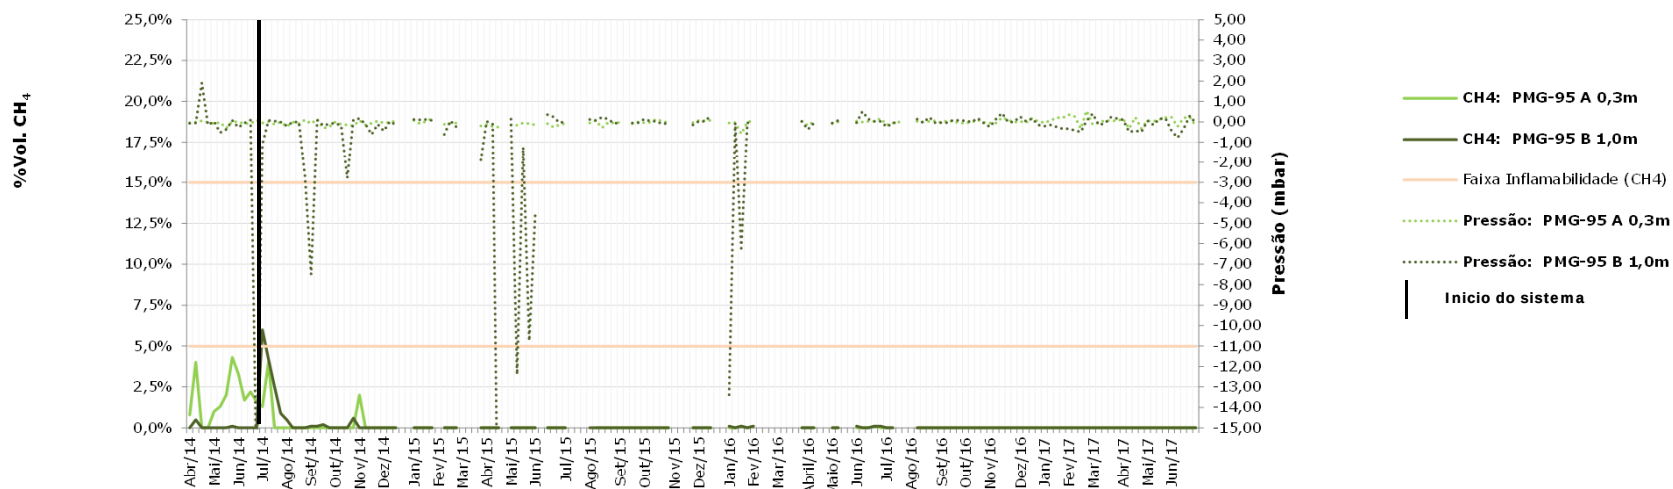

Portaria P3

Quantidade total de Poços:

2 Trios

Período de Medição:

08 de Abril de 2014 a 31 de Março de 2017

Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:


2Trios

PMG-119

PMG-120

Observações:

As concentrações apresentam-se no abaixo do Limite inferior de explosividade e somente nas porções profundas, não alcançando o subslab (poços imediatamente abaixo das construções)

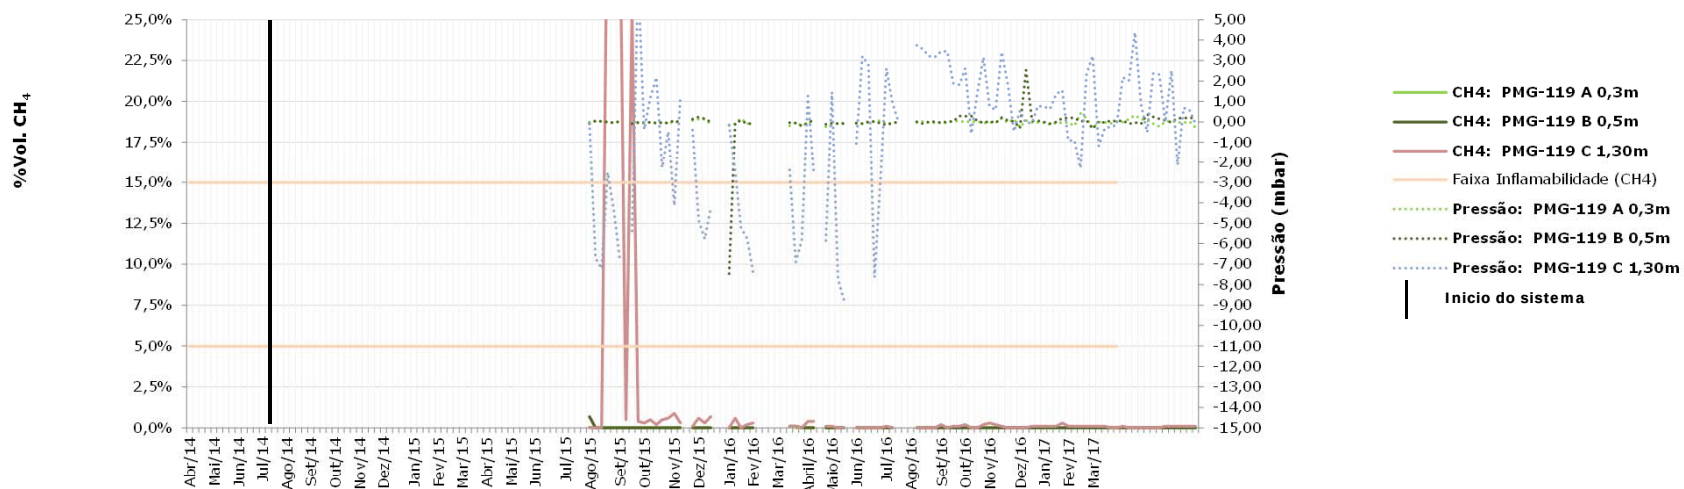


Incubadora	
Quantidade total de Poços:	6 Pares
Período de Medição:	03 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	Nenhum poço apresentou concentrações CH ₄
GUARDA UNIVERSITÁRIA	
Quantidade total de Poços:	3 Pares
Período de Medição:	03 de Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	Nenhum poço apresentou concentrações CH ₄

**ANEXO VIII – EVOLUÇÃO DA PRESENÇA DE ÁGUA / RESTRIÇÃO FLUXO
X PRESSÃO (ABR / 14 A JUN / 17)**


Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-1


PMG-114A




PMG-114B



PMG-11A




PMG-11B




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-1

PMG-12A




PMG-12B




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-3


PMG-27A




PMG-27B



PMG-31A




PMG-31B




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-3

PMG-42A




PMG-42B




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-4


PMG-63A




PMG-63B



PMG-64A




PMG-64B




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-4


PMG-65A




PMG-65B



PMG-66A




PMG-66B




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-4


PMG-68A




PMG-68B



PMG-69A




PMG-69B




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-4


PMG-77A




PMG-77B



PMG-78A




PMG-78B




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-4


PMG-79A




PMG-79B



PMG-80A




PMG-80B




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

EDIFÍCIO I-4

PMG-81A




PMG-81B



Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão


Conjunto Laboratorial

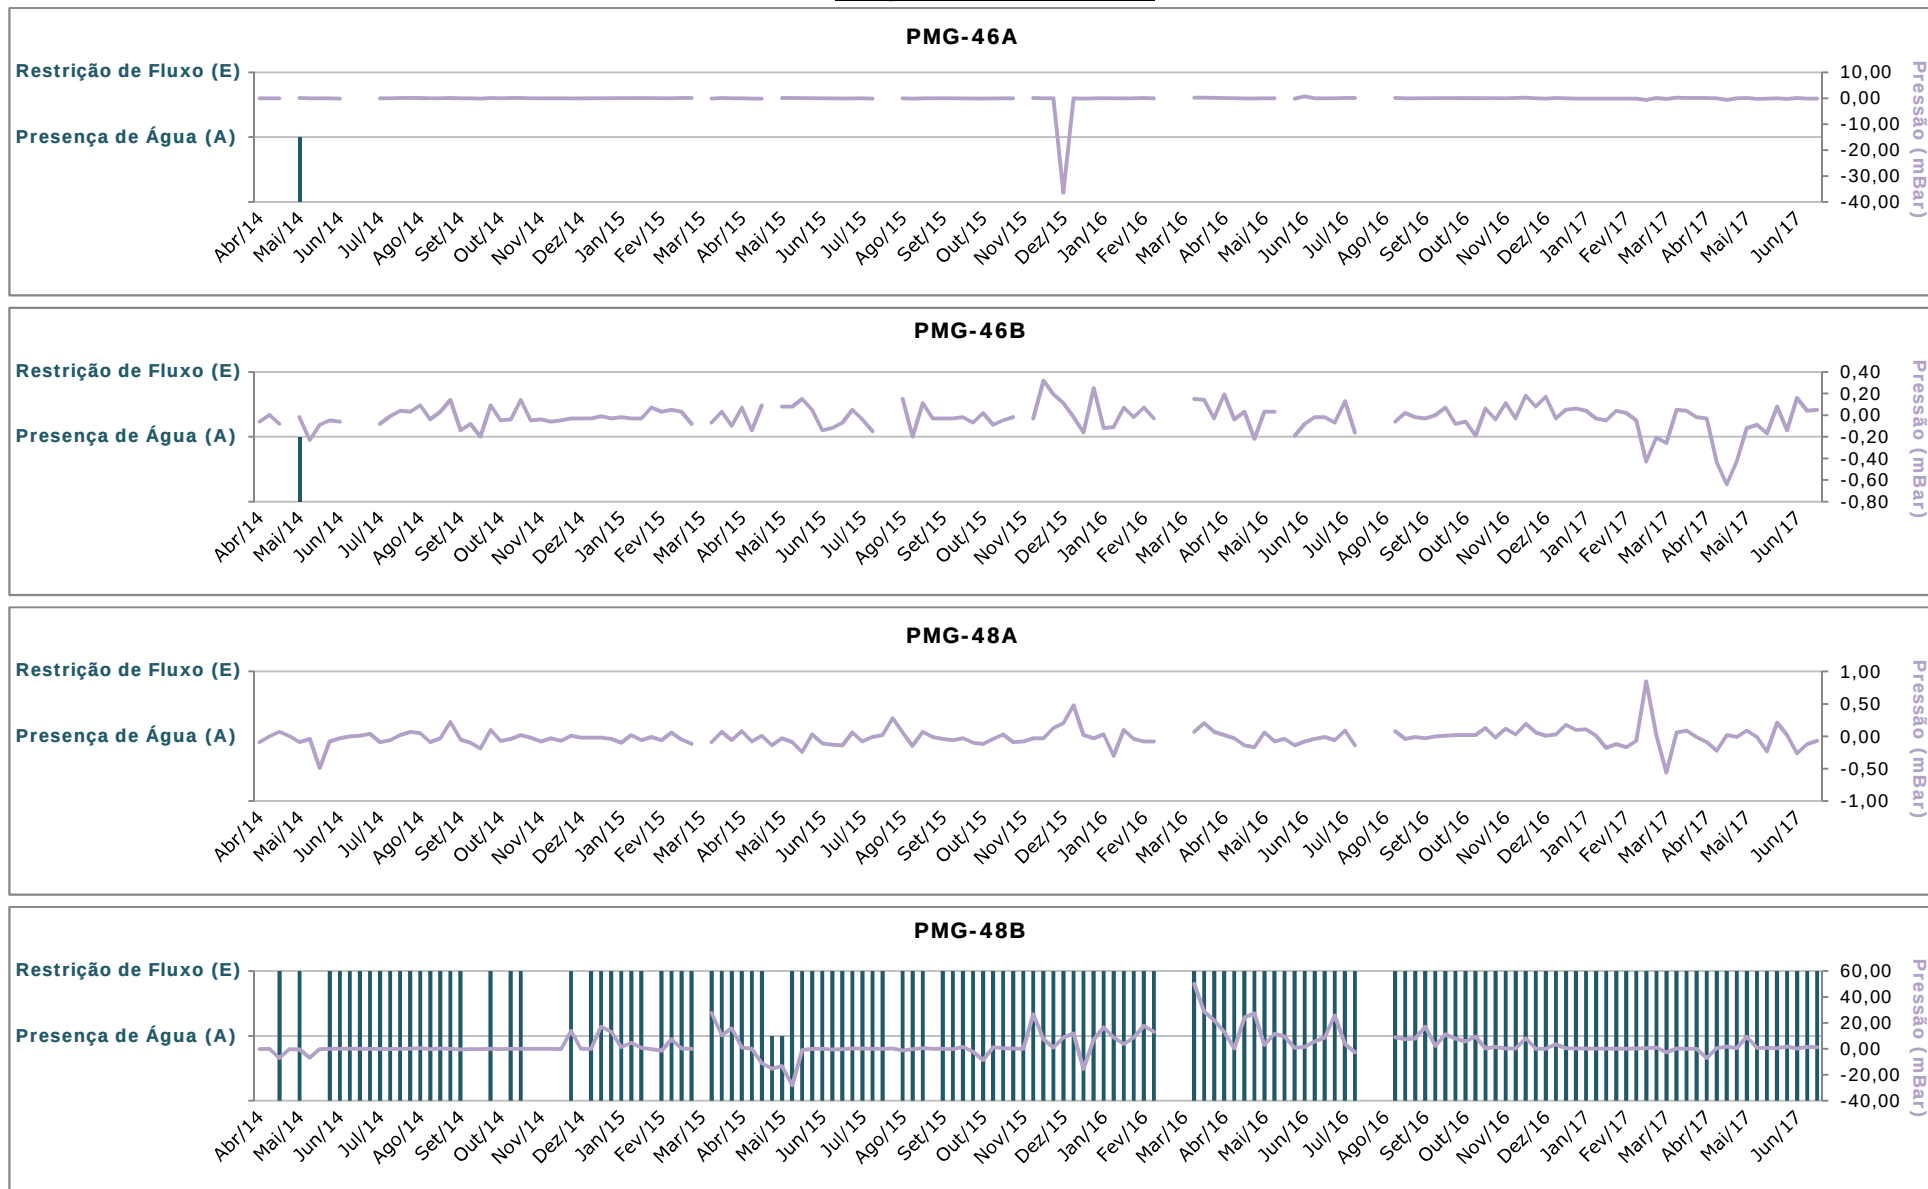


Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Conjunto Laboratorial


PMG-49A




PMG-49B



PMG-51A




PMG-51B




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Conjunto Laboratorial


PMG-53A




PMG-53B



PMG-54A




PMG-54B



Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão


Conjunto Laboratorial

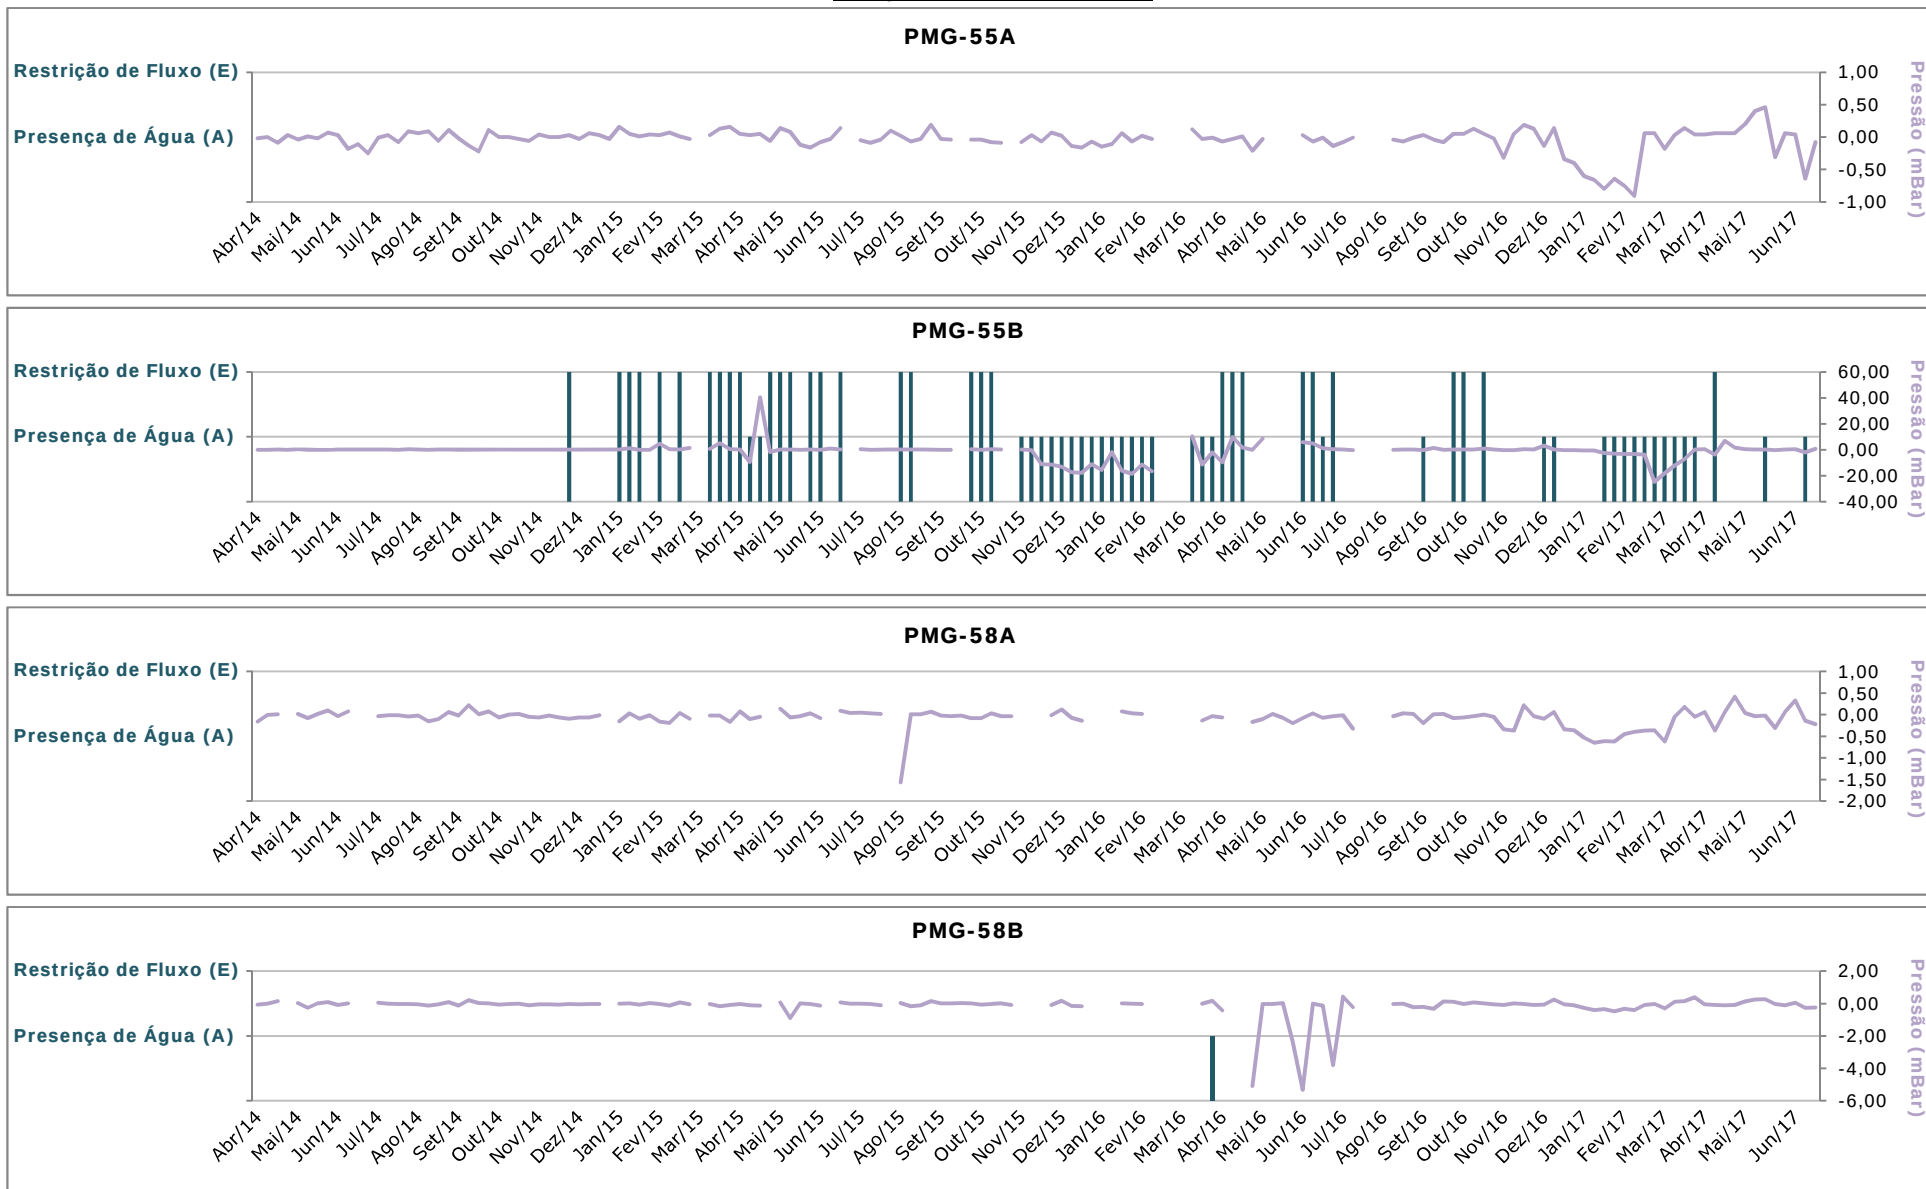


Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Conjunto Laboratorial


PMG-60A




PMG-60B



PMG-62A




PMG-62B



Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Bloco Inicial (Conjunto Didático)

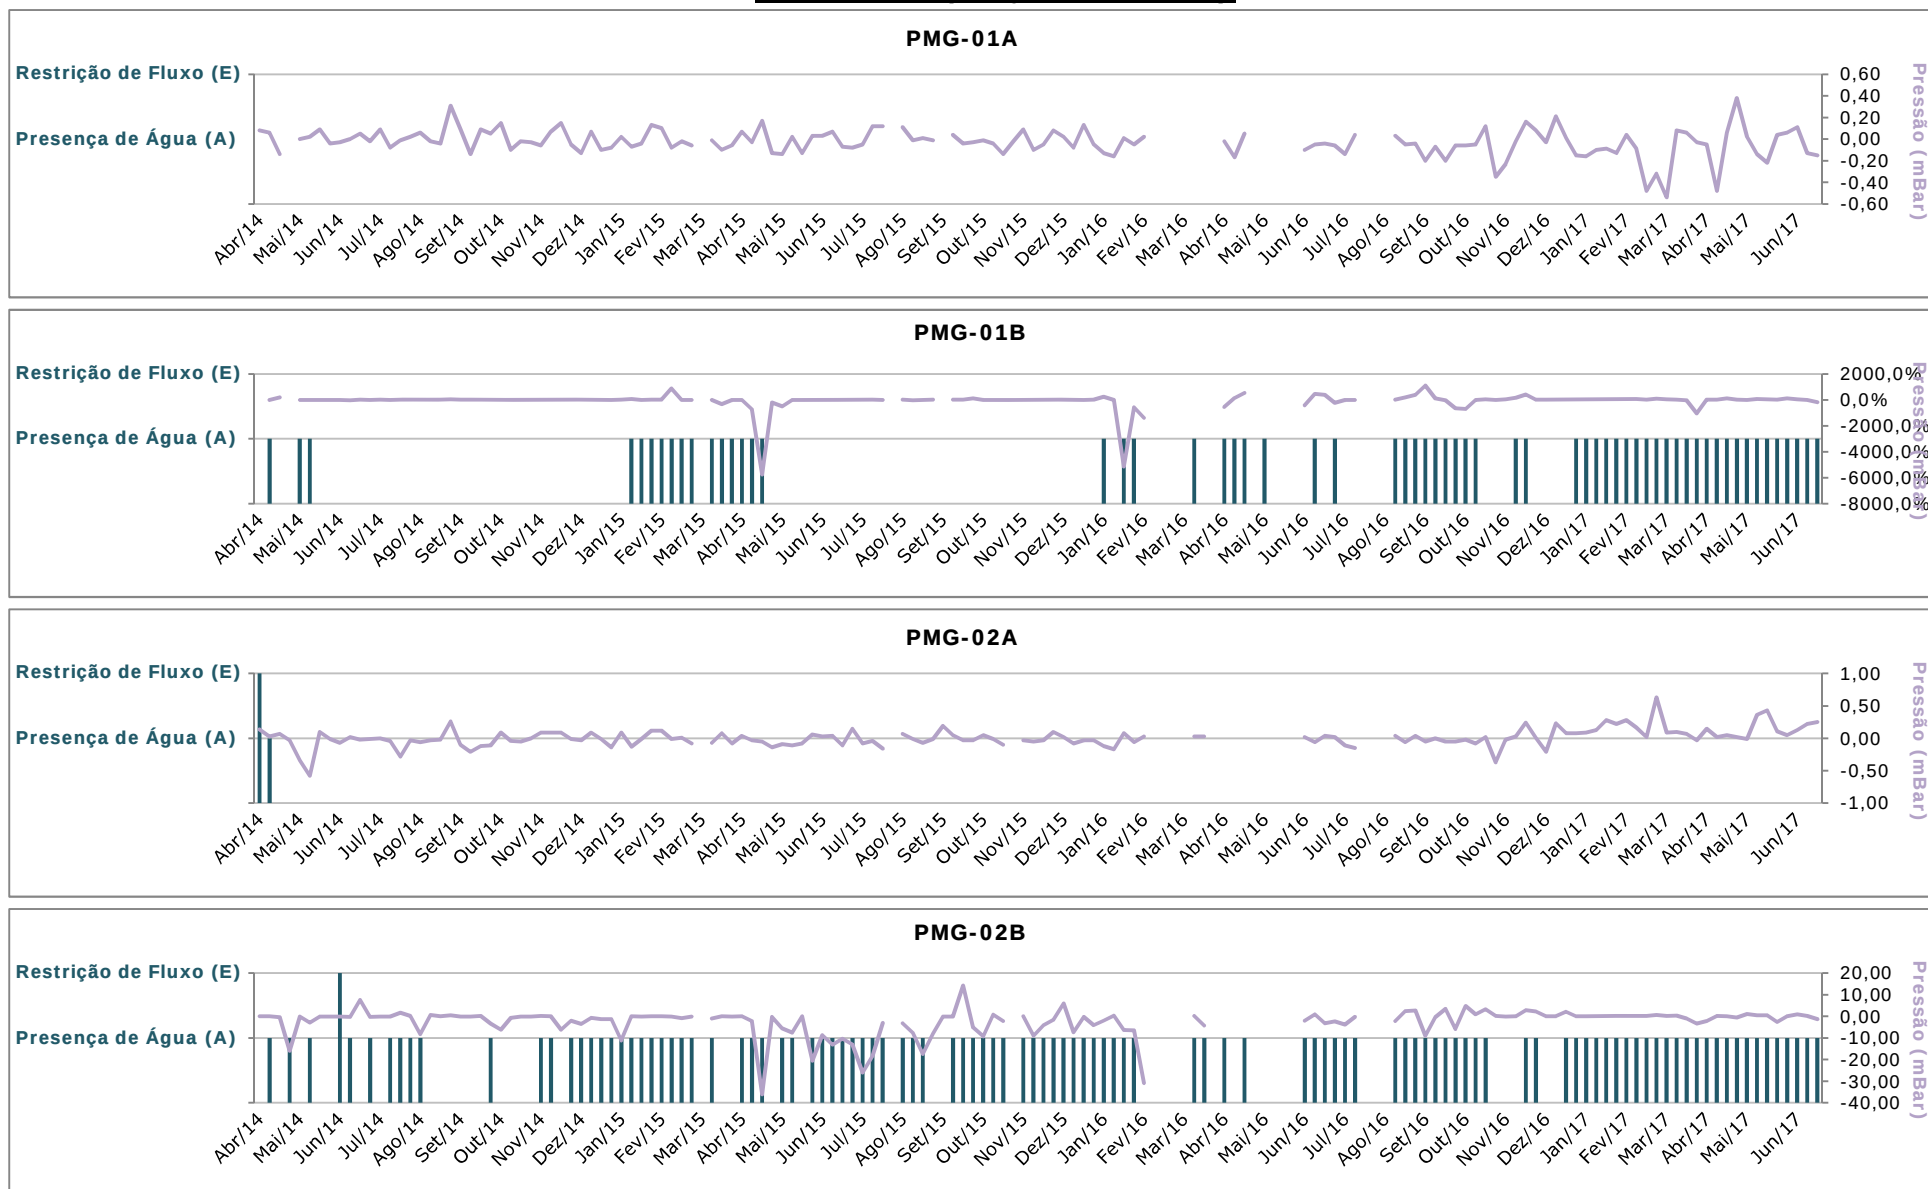


Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Bloco Inicial (Conjunto Didático)




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Bloco Inicial (Conjunto Didático)

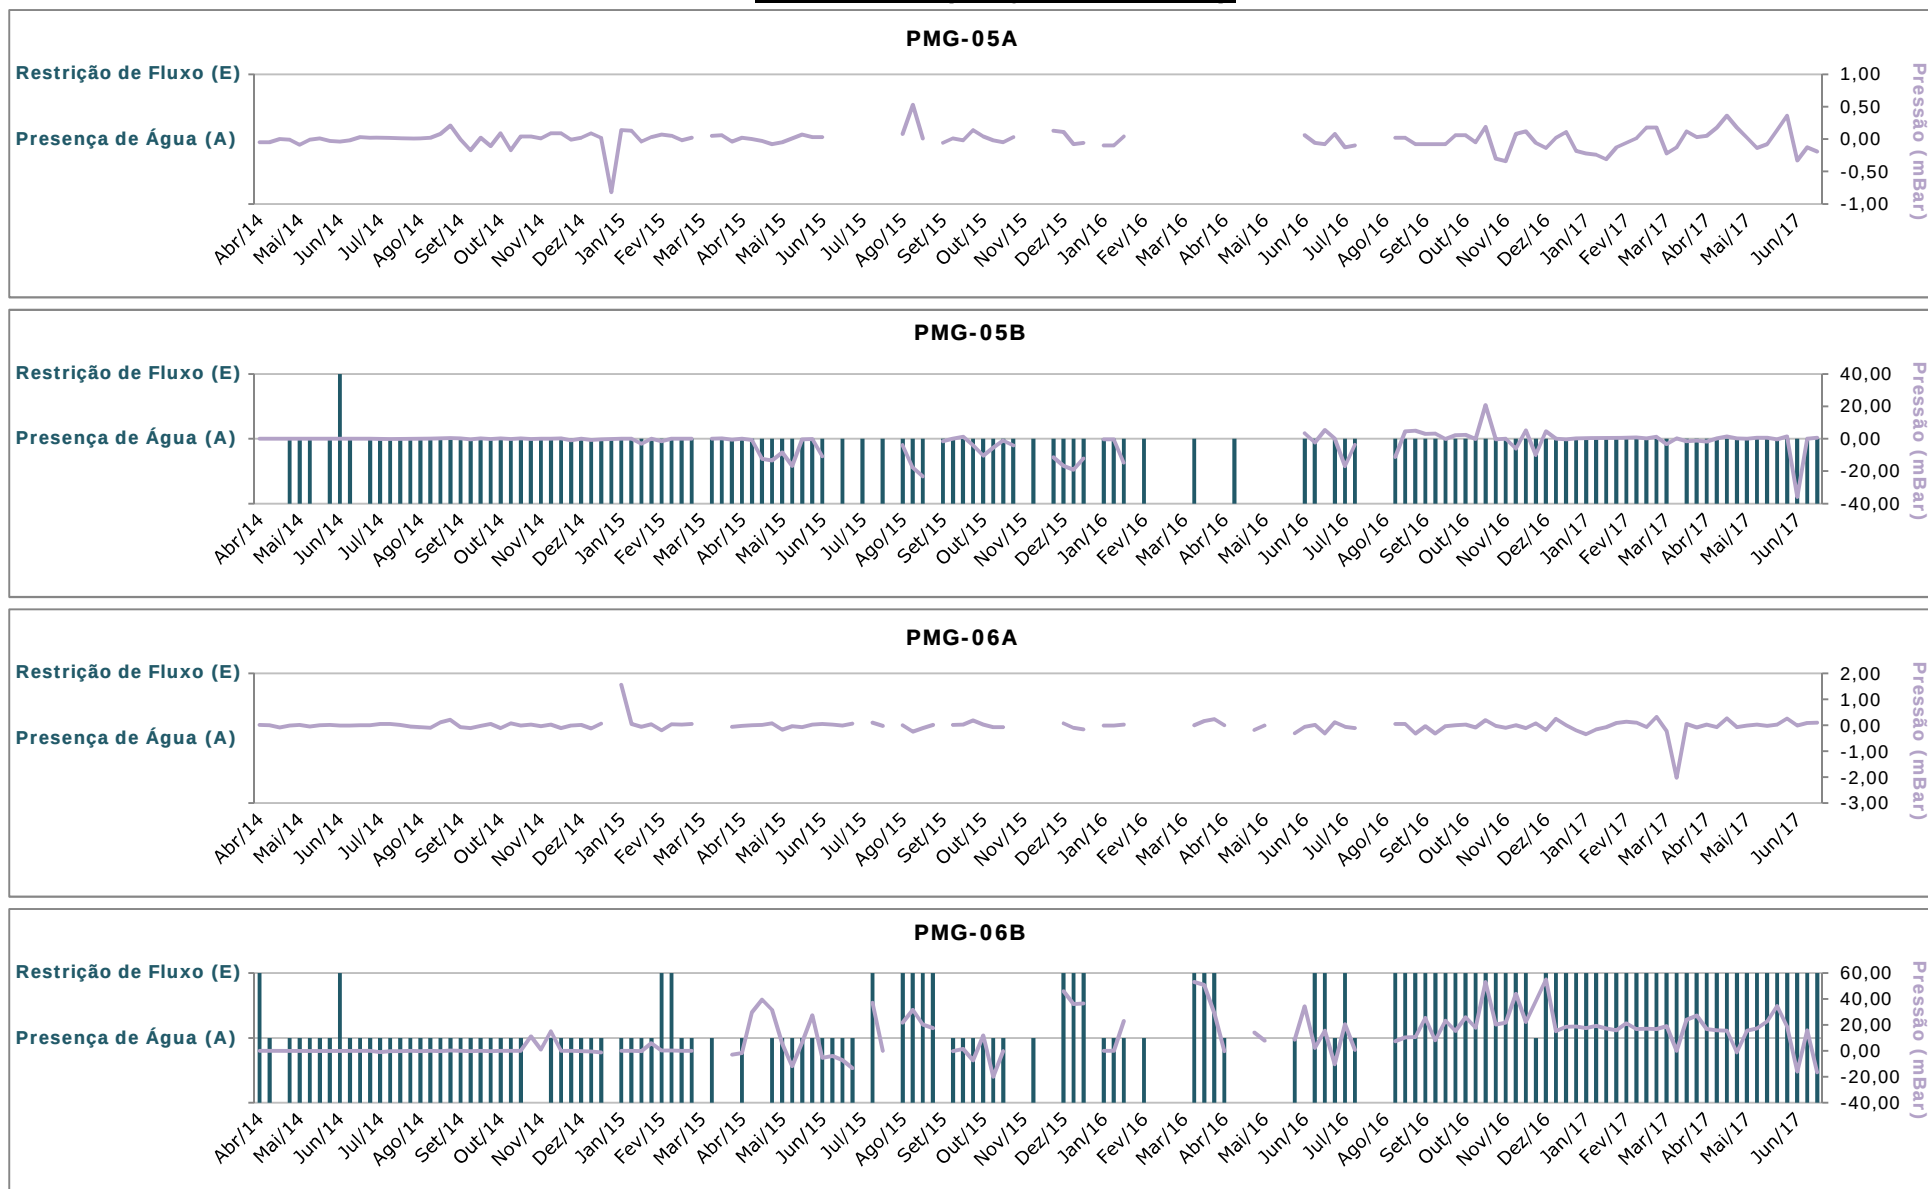

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Bloco Inicial (Conjunto Didático)

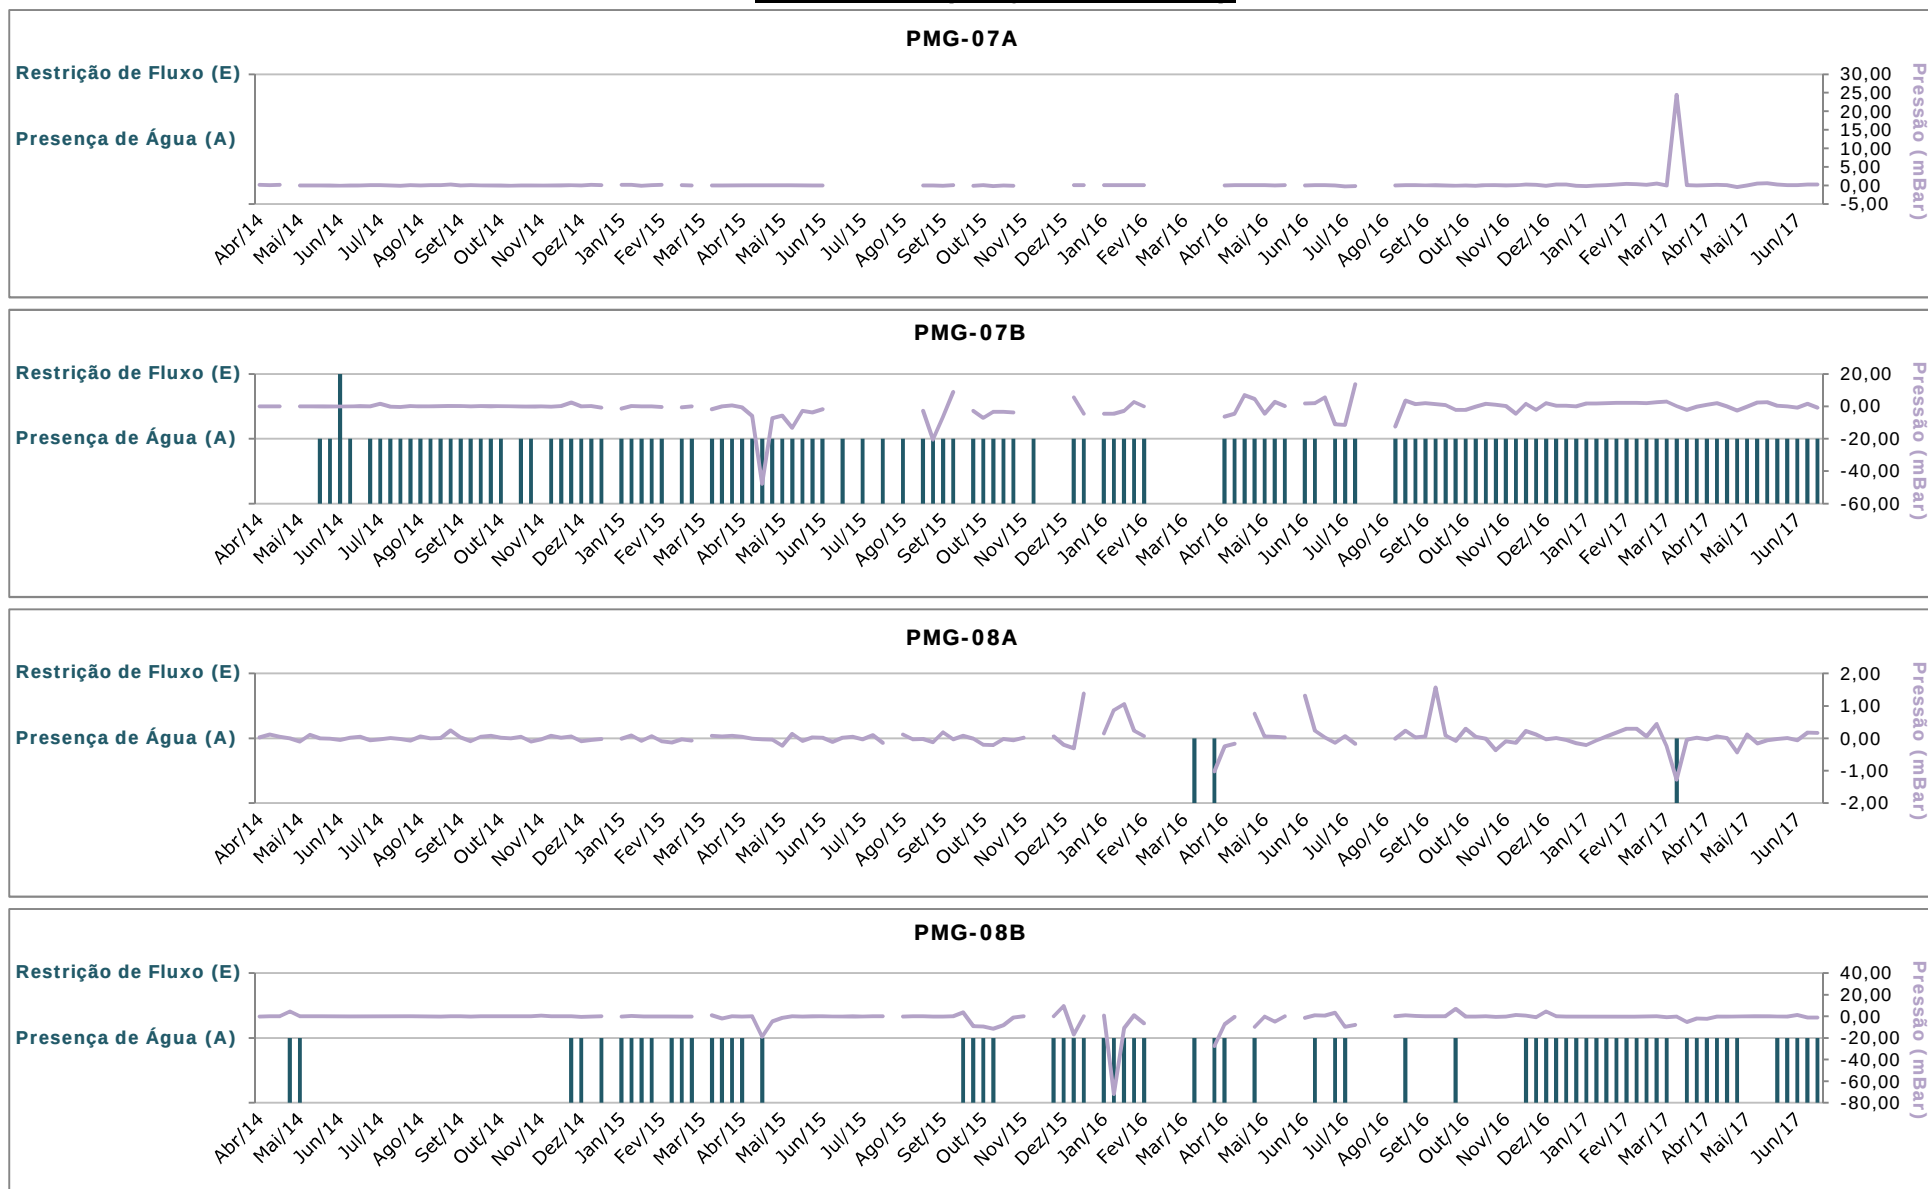


Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Bloco Inicial (Conjunto Didático)



Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão


Bloco Inicial (Conjunto Didático)

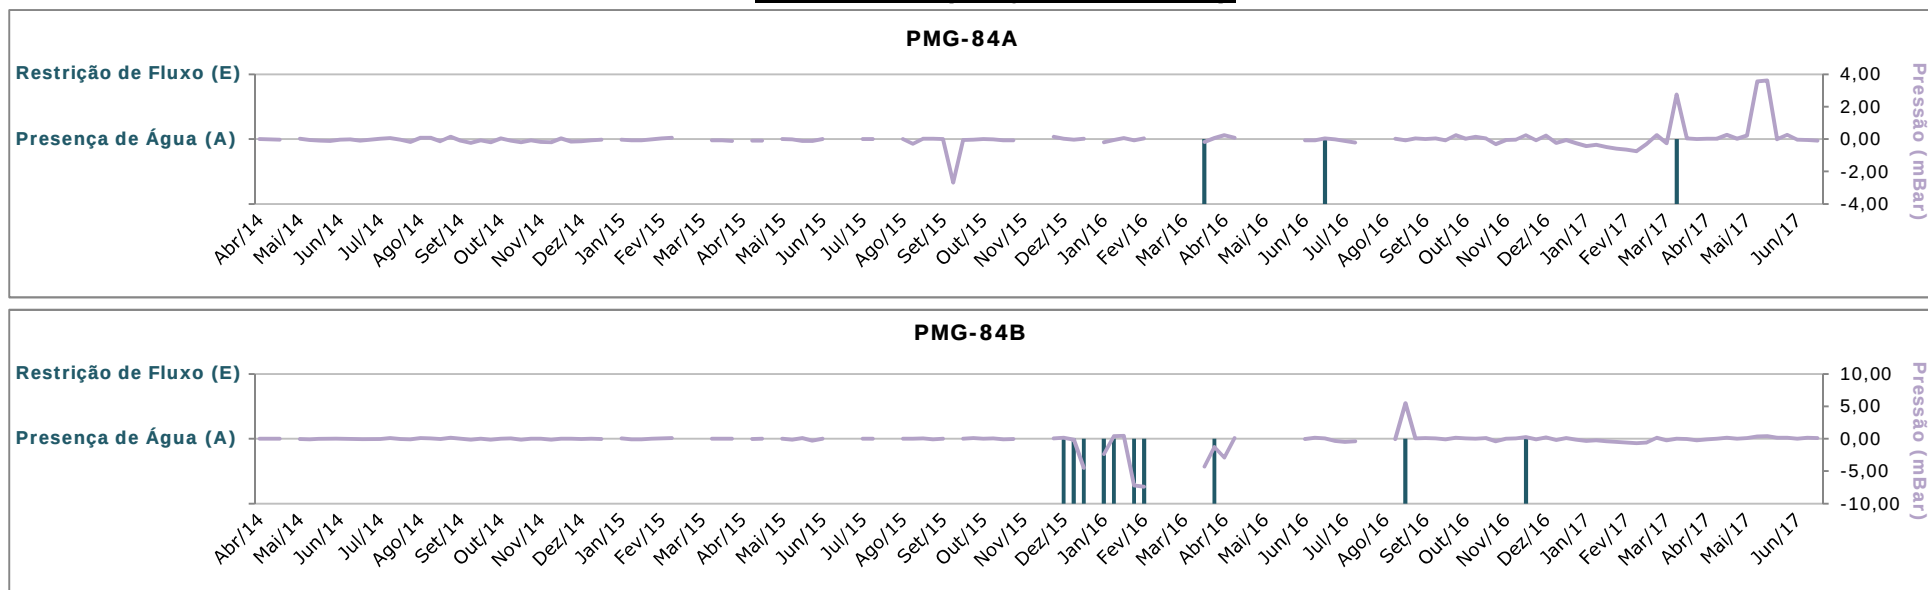


Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Enfermaria


PMG-70A




PMG-70B



PMG-71A




PMG-71B




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Enfermaria


PMG-72A




PMG-72B



PMG-73A




PMG-73B




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Enfermaria


PMG-74A




PMG-74B



PMG-75A




PMG-75B




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Enfermaria

PMG-76A

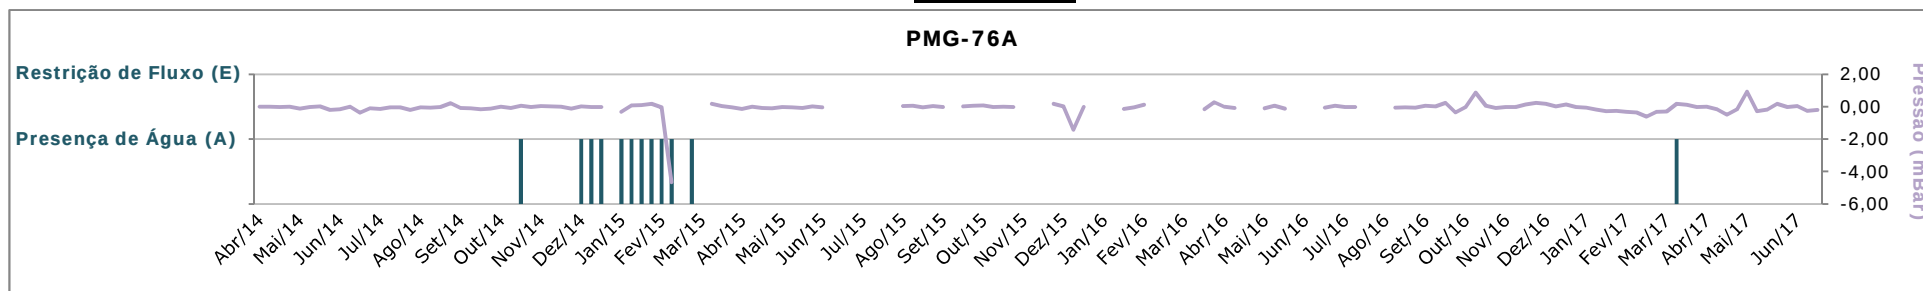


PMG-76B

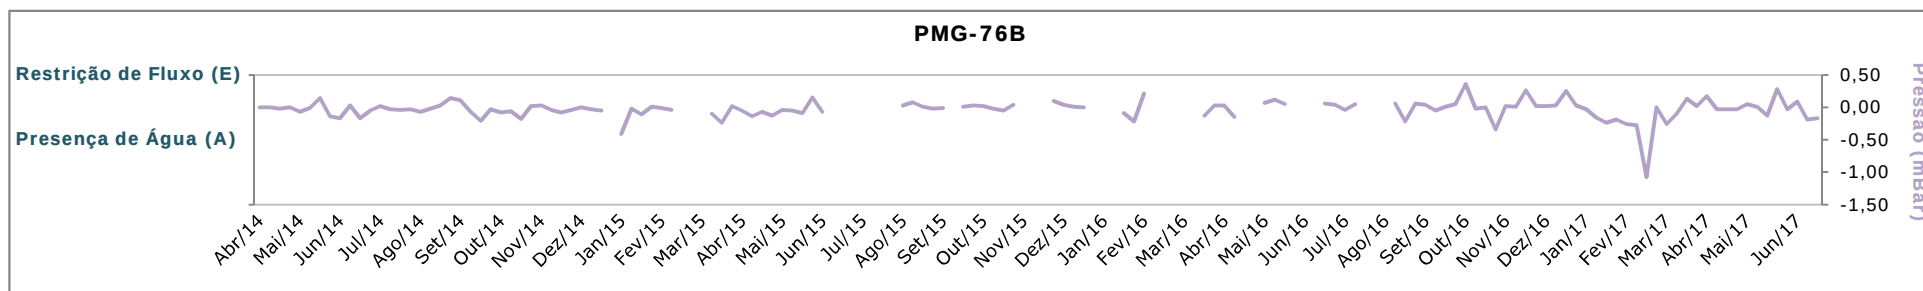


Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

CAT

PMG-95A




PMG-95B




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Ginásio

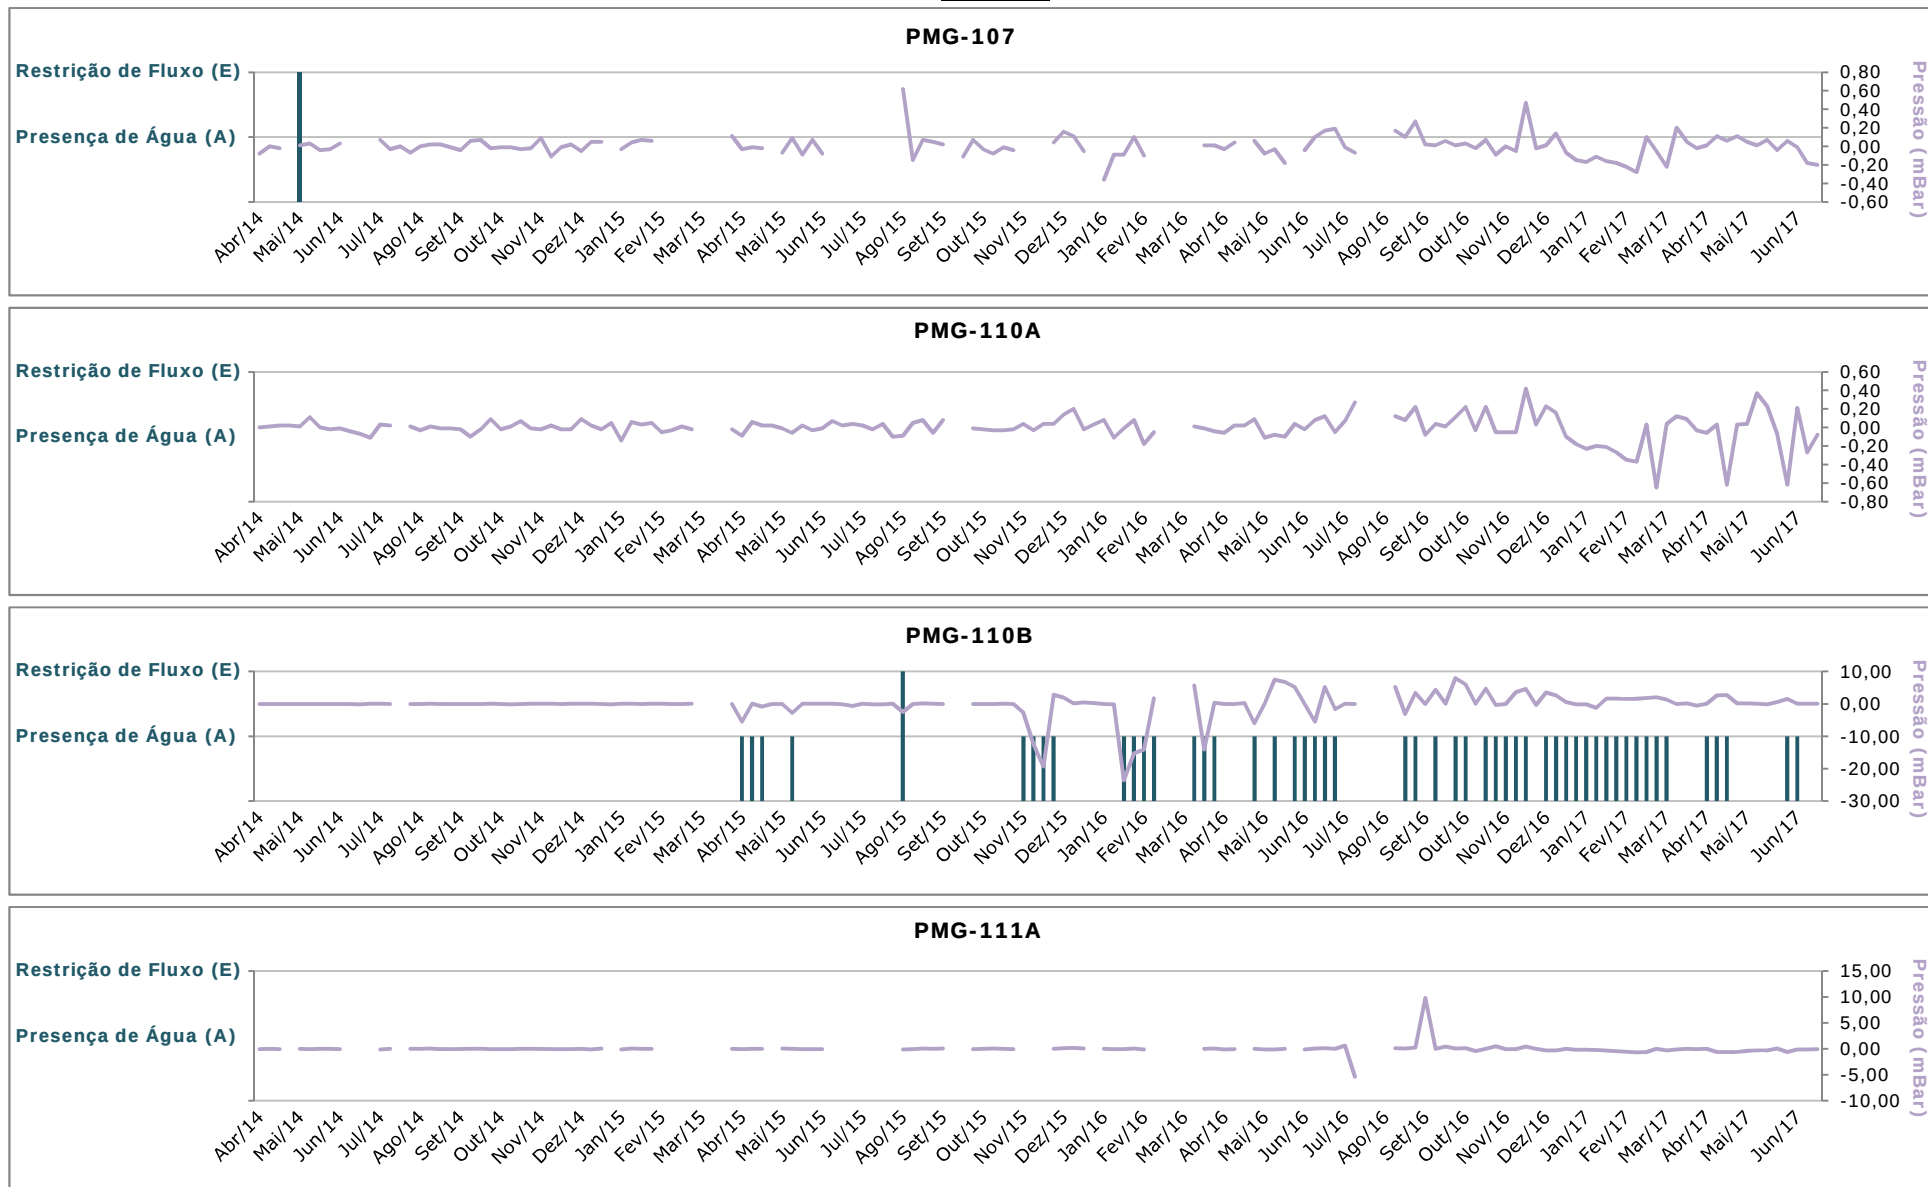


Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Ginásio

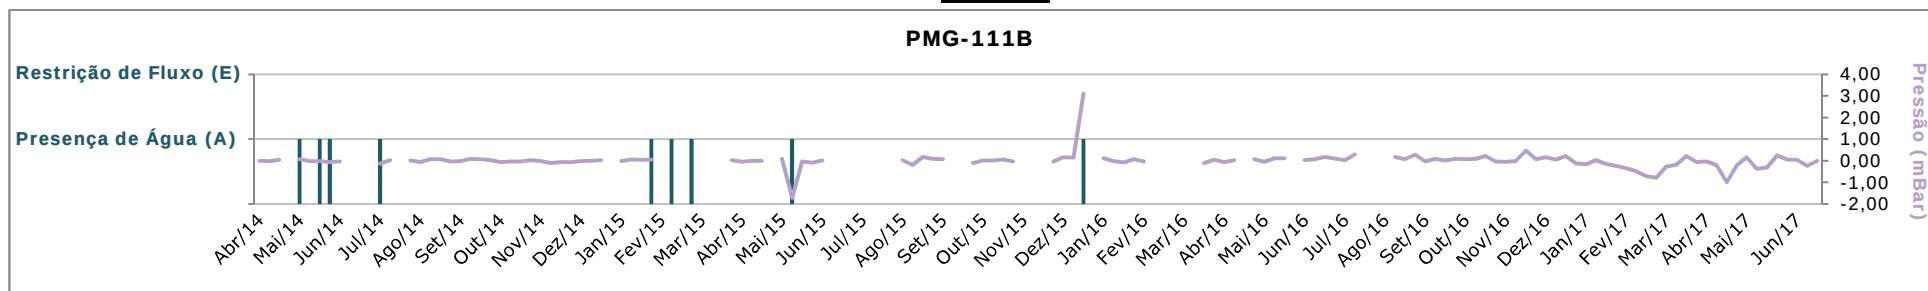


Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Guarda Universitária

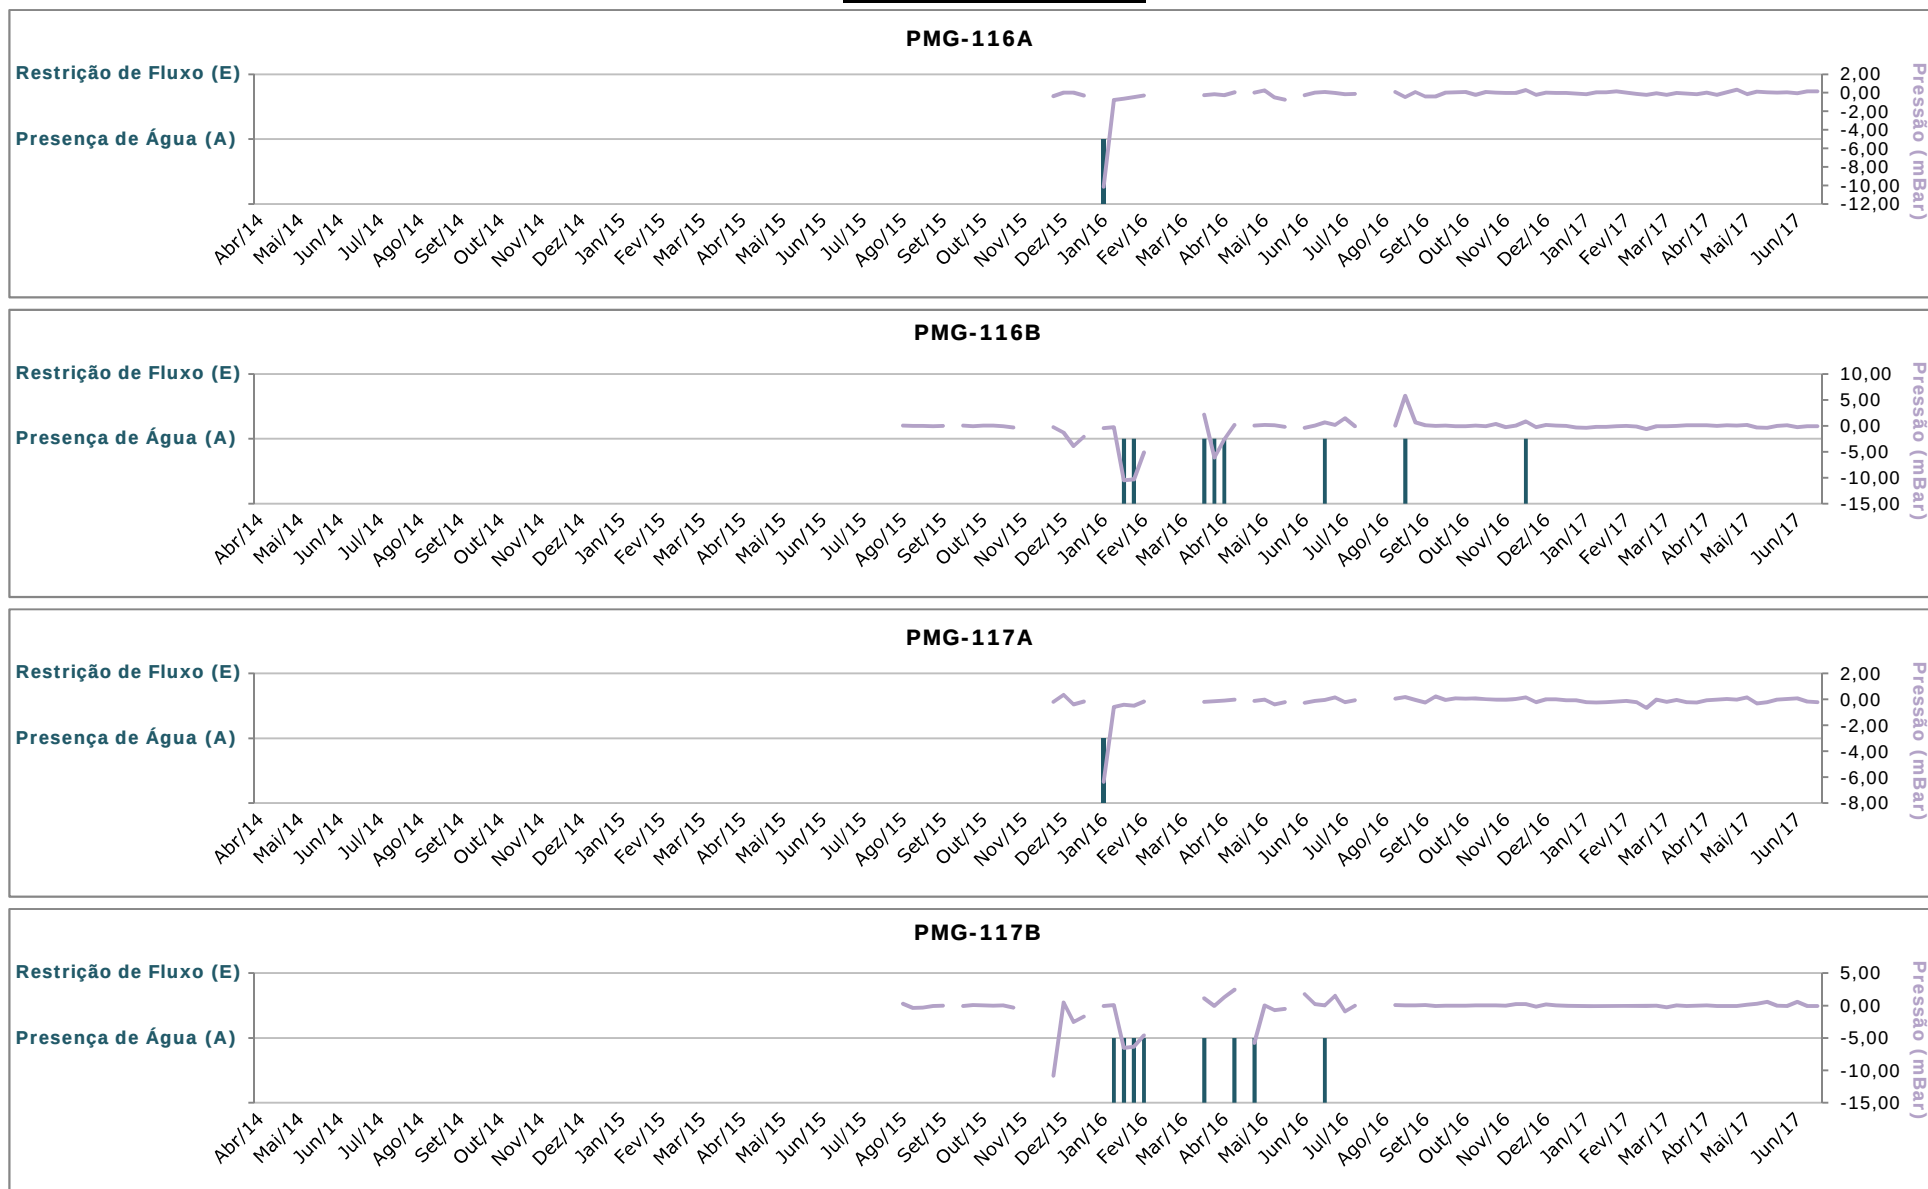

Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão


Guarda Universitária

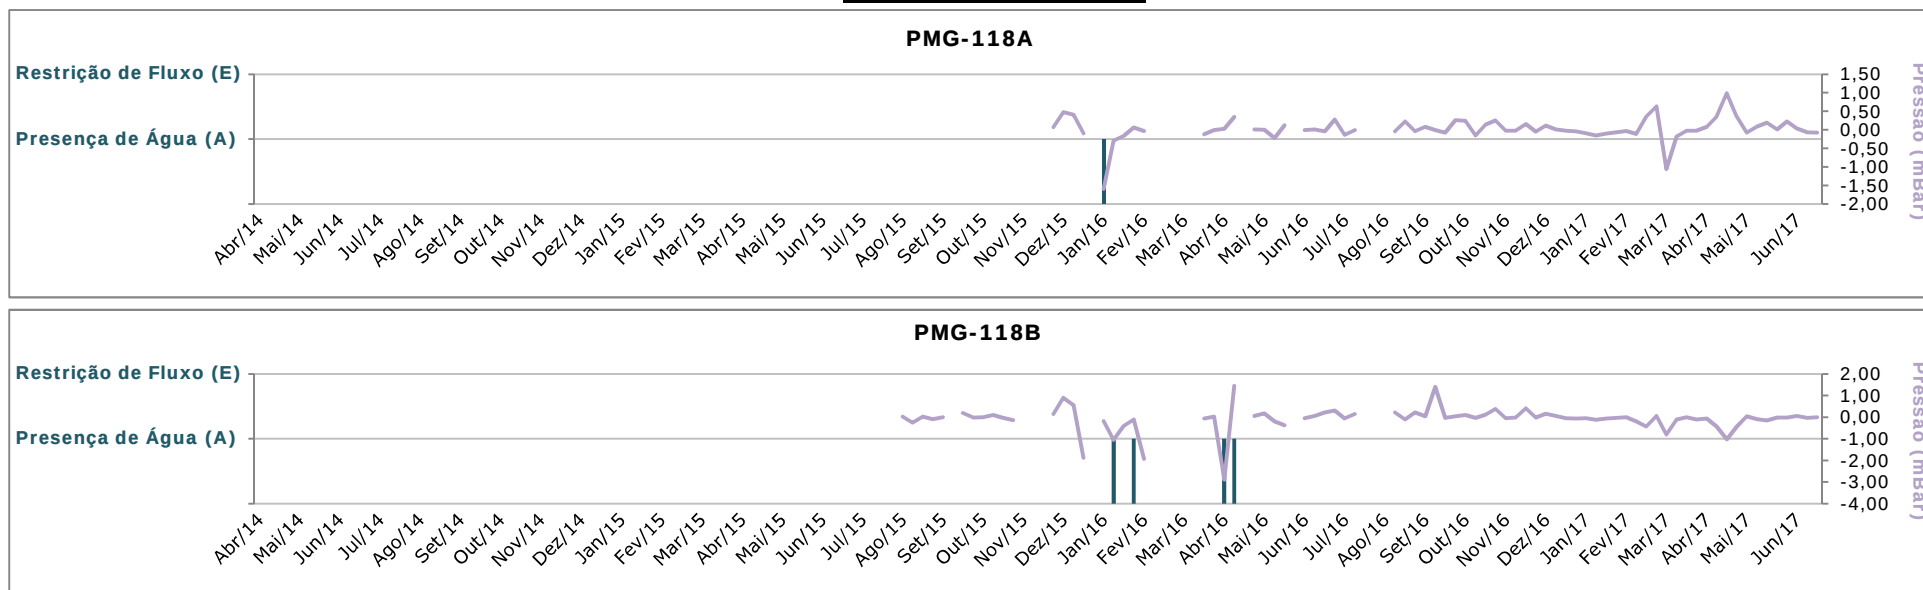


Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Portaria P3


PMG-119A




PMG-119B



PMG-119C




PMG-120A




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Portaria P3

PMG-120B




PMG-120C




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Transporte


PMG-121A




PMG-121B



PMG-122A




PMG-122B




Gráficos da relação entre a Presença de Água/Restrição de Fluxo e a Variação da Pressão

Transporte


PMG-123A




PMG-123B



PMG-124A



PMG-124B



ANEXO IX – LISTA DE PRESENÇA DO TREINAMENTO

LISTA DE PRESENÇA



TREINAMENTO

Descrição do Treinamento:	Responsável / Entidade:		
Treinamento da operação e manutenção dos sistemas de ventilação instalados na USP Leste. Parte Prática: - Visita a um abrigo e demonstração detalhada da operação do exaustor e prática; - Operação dos equipamentos de medição (GEM 5000 e MX6); - Realização de demonstração e prática de medição em poços de monitoramento e pontos de infraestrutura; - Demonstração de manobras no sistema (conforme plano de contingência); - Vistoria em todos os prédios para localização dos poços, pontos e exaustores.	Paula Ramos Raiza CREA: 5063314530 - CRQ: 04263483 / Renan Albuquerque Feres		
Local da Reunião: USP	Período/Duração: 1h30min.		
Data de realização: 28/06/2017	Necessita de Verificação da Eficácia?	Sim	X
		Não	

Nome do Colaborador	Assinatura	EFICAZ	
		Sim	Não
Luciano Piccoli		X	
Renato Camargo Cabec		X	
Roberto de Oliveira		X	
ERVIN SRIUBASSI		X	
Charlesson C. Santos		X	
EDSON VEREIRA SOUSA		X	
IZABELA CRUZ		X	
Victor Azevedo		X	
EVANDIO FIORAVANTE		X	
Fabiana Alves Cagnon		X	
THIAGO SILVA			

MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA

☐	Avaliação de procedimento ou registro - Listar:
☒	Acompanhamento do trabalho sendo realizado, ou seja, teste prático:
☐	Entrevista com o colaborador.
Prazo de Avaliação _____ dias.	
Responsável pela Avaliação: Paula Ramos	Data: 28 / 06 / 17.
Observação:	

LISTA DE PRESENÇA



TREINAMENTO

Descrição do Treinamento:	Responsável / Entidade:		
Treinamento da operação e manutenção dos sistemas de ventilação instalados na USP Leste. Parte Teórica: - Existência de Gases na área e importância da necessidade da operação do Sistema; - Apresentação de Plantas com distribuição de Pontos e Poços de Medição e localização dos exaustores; - Apresentação do Plano de Contingência; - Apresentação do Manual de Operação/Manutenção dos sistemas e equipamentos; - Apresentação de fichas de campo.	Paula Ramos Raiza CREA: 5063314530 - CRQ: 04263483 / Renan Albuquerque Feres		
Local da Reunião: USP	Período/Duração: 30min.		
Data de realização: 28/06/2017	Necessita de Verificação da Eficácia?	Sim	X
		Não	

Nome do Colaborador	Assinatura	EFICAZ	
		Sim	Não
Luciano Ricatti		X	
Renato Gonçalves Coelho		X	
Roberto de Oliveira		X	
CRISTIAN SILVA JR		X	
Phelsson de Santana		X	
ERLSON PEREIRA SOUSA		X	
EDRILAS CRISTO		X	
Victor Azevedo		X	
EVANDRO FIORAVANTE		X	
Ediana Alves Cignoni		X	
THIAGO SILVA			

MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA

☐	Avaliação de procedimento ou registro - Listar:	
☒	Acompanhamento do trabalho sendo realizado, ou seja, teste prático:	
☐	Entrevista com o colaborador.	Prazo de Avaliação _____ dias.
Responsável pela Avaliação: <u>Paula Ramos</u>		Data: <u>28/06/17</u>
Observação:		

ANEXO X – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
92221220141733799

1. Responsável Técnico

CARLOS FREDERICO EGLI

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LIMITADA**

RNP: **2605281299**

Registro: **0600493705-SP**

Registro: **0671638-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - SEF**

CPF/CNPJ: **63.025.530/0040-10**

Endereço: **Rua DA PRAÇA DO RELÓGIO**

Nº: **109**

Complemento: **BLOCO K**

Bairro: **BUTANTÃ**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **05508-050**

Contrato: **10/2014**

Celebrado em: **27/11/2014**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **2.795.347,50**

Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito público

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua ARLINDO BETTIO**

Nº: **1000**

Complemento:

Bairro: **VILA GUARACIABA**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **03828-000**

Data de Início: **27/11/2014**

Previsão de Término: **16/11/2016**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Consultoria

1

Execução

Monitoramento

De solo

Quantidade

Unidade

258000,00

metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VENTILAÇÃO DE VAPORES DO SOLO E MONITORAMENTO NA ESCOLA DE ARTES E CIÊNCIAS E HUMANIDADES DA USP

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
 Local data

CARLOS FREDERICO EGLI - CPF: 769.719.538-00

SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - SEF - CPF/CNPJ: 63.025.530/0040-10

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
 tel: 0800-17-18-11



ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

_____, CPF _____,

em conjunto com CARLOS FREDERICO EGLI, CPF 769.719.538-00, declaram, sob as penas da lei e de responsabilização administrativa, civil e penal¹, que todas as informações prestadas à CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no Relatório Técnico de MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES EM AMBIENTES FECHADOS – USP LESTE – Relatório de Evolução 2º Trimestre/2017, localizada na Rua Arlindo Bettio, 1000 – Vila Guaraciaba – São Paulo/SP, são verdadeiras em consonância com o que determinam o regulamento da Lei nº 13.577/2009, aprovado pelo Decreto nº 59.263/2013, e os Procedimentos para Proteção da Qualidade do Solo e Gerenciamento de Áreas contaminadas aprovado em Decisão de Diretoria da CETESB, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 10/02/2017.

Declaram, ainda estar cientes de que os documentos e laudos que subsidiam as informações prestadas à CETESB poderão ser requisitados a qualquer momento, durante ou após a implementação do procedimento previsto no documento Procedimento para Gerenciamento de Áreas Contaminadas”, para fins de auditoria.

São Paulo, 20 de Julho de 2017.

RESPONSÁVEL LEGAL

Nome:

C.I.R.G. n°

C.P.F./M.F. n°

RESPONSÁVEL TÉCNICO

WEBER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.

CARLOS FREDERICO EGLI

C.I.R.G. n.º 3.604.421-0

C.P.F./M.F. n.º 769.719.538-00

CREA: 600493705

ALESSANDRO PERENCIN

C.I.R.G. n.º 8.957.804-1

C.P.F./M.F. n.º 155.239.208-27

OAB 170030

1 O artigo 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece: “Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcial falso ou enganoso, inclusive por omissão:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

S1º Se o crime é culposo: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.

S2º A pena é aumentada da 1/3(um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa.
