

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – ÁREA
CAPITAL LESTE (PUSP-LESTE)

EVOLUÇÃO DO MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES E
DA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

3º TRIMESTRE/2023 (JULHO A SETEMBRO)

RUA ARLINDO BÉTTIO, 1.000,
ERMELINO MATARAZZO, SÃO PAULO, SP

Contrato nº 0000001/2022 – PUSP – CL
Processo Administrativo: 22.1.18.95.7

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – ÁREA
CAPITAL LESTE (PUSP-LESTE)**

**EVOLUÇÃO DO MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES E
DA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO**

3º TRIMESTRE/2023 (JULHO A SETEMBRO)

**RUA ARLINDO BÉTTIO, 1.000,
ERMELINO MATARAZZO, SÃO PAULO, SP**

São Paulo, 18 de outubro de 2023

RESUMO EXECUTIVO

A ENGESOLVE Soluções Ambientais Ltda. foi contratada pela Prefeitura da Universidade de São Paulo – Área Capital Leste (PUSP-Leste) para a operação, manutenção dos sistemas de ventilação de gases no solo, bem como o monitoramento de poços de gás e pontos na infraestrutura instalados em edificações da EACH na USP Leste, localizada na Rua Arlindo Bértio, 1.000 – Ermelino Matarazzo, São Paulo/SP, conforme o Processo Administrativo 22.1.18.95.7, Pregão Eletrônico nº 00002/2022 – PUSP – CL e Contrato nº 0000001/2022 – PUSP – CL.

O objetivo da operação dos sistemas de ventilação é impedir o acúmulo de gases sob a laje dos edifícios, aliado ao monitoramento preventivo de intrusão de gases nos ambientes por meio da execução de medições de gases em todos os poços de monitoramentos, pontos de infraestrutura e espaços com pouca circulação de ar.

Com base nos resultados obtidos no segundo trimestre de 2023, foram detectadas concentrações significativas de Metano (acima de 1%Vol CH₄) na porção profunda em 14 dos 117 poços de gases monitorados. Nos demais poços profundos, não foram detectadas concentrações significativas. Para os poços nas porções rasas, não foram detectadas concentrações de metano acima de 1% Vo ICH₄.

Os resultados obtidos nas medições realizadas nos pontos de infraestrutura ao longo do trimestre avaliado (ralos e caixa de passagem) em todas as edificações, bem como em ambientes com pouca circulação de ar, não detectaram concentrações de Metano e nem de VOC. Os sistemas de ventilação operaram 24 horas por dia, 30 dias por mês, durante todo o período do trimestre. Estes demonstraram-se eficientes, não permitindo que os gases existentes no solo se acumulassem no tapete de brita ou diretamente sob a laje (poços a 0,30 m), bem como diminuindo eventualmente até mesmo as concentrações no solo abaixo do tapete de brita (poços a 1,00 m), por influência da ventilação.

Sendo assim, diante dos resultados obtidos a partir do monitoramento do terceiro trimestre de 2023, e considerando a série histórica de monitoramento ao longo dos nove anos e quatro meses (abril/2014 a setembro/2023), verifica-se que não há a intrusão e/ou acúmulo de gases nos ambientes fechados, uma vez que as concentrações de Metano existentes no solo, mesmo com a presença de pressão positiva, não alcançam o tapete de brita (sob a laje) ou, quando alcançam esporadicamente, são arrastadas pelo sistema de ventilação.

Recomenda-se a continuidade da operação dos sistemas de exaustão, bem como a realização dos monitoramentos semanais e quinzenais nos poços de monitoramento e nos pontos de infraestrutura, respectivamente.

EQUIPE TÉCNICA

Integrante	Função	Formação	Tempo de Experiência
Daniel Barel Filho	Operacional	Geólogo	Maior que 25 anos
Felipe Martins Chufi	Operacional	Engenheiro Ambiental	Maior que 15 anos
Gilson Rodrigues Figueirôa	Operacional	Químico	Maior que 15 anos
Letícia Francischeti	Operacional	Engenheira Civil	Maior que 5 anos
Amanda Cristina Garcia	Operacional	Engenheiro Ambiental	Maior que 5 anos
André Sammartano	Operacional	Engenheiro Ambiental	Maior que 5 anos

INFORMAÇÕES INICIAIS

Responsável legal

Nome:

RG:

CPF:

Endereço:

Telefone:

Responsável Técnico

Nome: Felipe Martins Chufi

RG: 29.447.243-5

CPF: 326.774.078-92

Endereço: Avenida Paulista, 2.064, 14º Andar, CEP: 01310-928, Bela Vista, São Paulo, SP

Telefone: 11-2844-4386

Contratante

Prefeitura da Universidade de São Paulo – Área Capital Leste (PUSP-Leste)

CNPJ: 63.025.530/0062-26

Endereço: Rua Arlindo Bértio, 1.000, CEP: 03828-000, Ermelino Matarazzo, São Paulo, SP

Informações do Contrato

Contrato: 00000001/2022 – PUSP - CL

Processo Administrativo: 22.1.00018.95.7

Pregão Eletrônico: 00002/2022 – PUSP - CL

Escopo: Operação, manutenção e monitoramento de poços de gás, pontos na estrutura e de sistemas de ventilação de gases – EACH – USP Leste.

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS	9
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO	11
2.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA.....	11
2.2. SOBRE A PRESENÇA DE GASES	11
2.3. SOBRE O SISTEMA DE VENTILAÇÃO DOS GASES	11
3. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO.....	13
3.1. POÇOS DE MONITORAMENTO	13
3.2. INFRAESTRUTURA	14
4. METODOLOGIA DO MONITORAMENTO DE GASES.....	15
4.1. SOBRE O BIOGÁS E O GÁS METANO	16
4.2. PLANO DE AÇÃO	18
5. RESUMO E TENDÊNCIA EM 9,7 ANOS DE OPERAÇÃO/MONITORAMENTO (ABRIL DE 2014- SETEMBRO DE 2023)	19
6. RESULTADOS OBTIDOS NO 3º TRIMESTRE	43
6.1. RESULTADOS DO MONITORAMENTO EM POÇOS E NA INFRAESTRUTURA.....	43
6.2. RESULTADOS OBTIDOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO.....	45
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES.....	50
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	52

FIGURAS

- 2.1. Localização da Área de Interesse (adaptado de *Google Maps*, 2022)
- 2.3.1. Conceito do Sistema de Circulação de Gases USP Leste
- 3.1.1. Localização dos Poços de Monitoramento de Gás e Abrigos de Exaustores
- 3.2.1. Localização dos Pontos Monitoramento de Gases na Infraestrutura dos Edifícios
- 6.1.1. Resultado da Distribuição das Concentrações de Metano Detectadas >1%Vol
- 6.1.2. Pluma de Isoconcentração de Metano no Solo no Horizonte B (aproximadamente de 1,0 m – 1,3 m de profundidade) no período de Julho de Setembro de 2023

TABELAS

- 3.1.1. Distribuição dos Poços de Monitoramento dos Gases nas Edificações
- 3.2.1. Distribuição dos Pontos de Monitoramento de Infraestrutura nas Edificações
- 6.1.1. Resultados dos poços com concentração igual ou maior que 1%VolCH₄
- 6.2.1. Localização dos Exaustores dos Sistemas de Ventilação
- 6.2.2. Comparativo de Pressão de Sucção de Projeto x Medição no 3º Trimestre/2023

ANEXOS

1. Certificados de Calibração dos Equipamentos
2. Plano de Ação
3. Tabelas de Medições Semanais em PMG
4. Tabelas de Medições Quinzenais na Infraestrutura
5. Evolução das concentrações de Metano x Pressão (Abril/2014 a Setembro/2023)
6. Tabelas de Medições Semanais nos Exaustores
7. Declaração de Responsabilidade
8. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

A ENGESOLVE Soluções Ambientais Ltda. foi contratada pela Prefeitura da Universidade de São Paulo Área Capital Leste (PUSP-Leste) para a operação, manutenção dos sistemas de ventilação de gases no solo, bem como o monitoramento de poços de gás e pontos na infraestrutura instalados em edificações da EACH na USP Leste, localizada na Rua Arlindo Bértio, 1.000 – Ermelino Matarazzo, São Paulo/SP.

A contratação dos serviços ocorreu por meio do Processo Administrativo 22.1.18.95.7, Pregão Eletrônico nº 00002/2022 – PUSP – CL e Contrato nº 0000001/2022 – PUSP – CL, que teve por objetivo prosseguir com o acompanhamento das atividades de operação, manutenção e monitoramento dos poços de gás, pontos na estrutura e de sistemas de ventilação de gases instalados.

Assim sendo, o presente relatório técnico possui como objetivo avaliar a evolução dos resultados de monitoramento de gases no subsolo e a operação do sistema de ventilação ao longo do terceiro trimestre de 2023 (julho a setembro de 2023), além de compará-los com os resultados obtidos desde o início dos trabalhos desenvolvidos na área (março/2014) para uma análise histórica.

Este monitoramento preventivo da intrusão de gases possibilita a elaboração de um diagnóstico contínuo para avaliação da situação da área e, caso necessário, indica ações subsequentes que garantam um uso seguro do local.

Para tanto, foi seguido o resumido escopo de atividades apresentado a seguir:

- Operação e manutenção dos 22 (vinte e dois) Sistemas de Ventilação;
- Monitoramento periódico dos sistemas e monitoramento de gases e explosividade em pontos de estrutura, poços de monitoramento e na entrada dos sistemas de ventilação;
- Compilação dos resultados das medições e tratamento dos dados;
- Elaboração de relatório técnico contendo a descrição dos trabalhos executados e a interpretação dos resultados obtidos, além das conclusões e recomendações pertinentes.

Os trabalhos de campo foram conduzidos em conformidade com as seguintes referências técnicas, além das demais normas e referências pertinentes:

- ABNT NBR 16.209, de setembro de 2013 – Avaliação de risco a saúde humana para fins de gerenciamento de áreas contaminadas;
- CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 2017 – Decisão de Diretoria Nº 038/2017, de 07 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a aprovação do “Procedimento para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas”.

1.1. CONDIÇÕES GERAIS E LIMITAÇÕES

Este relatório é para uso exclusivo do cliente, não podendo ser reproduzido por qualquer meio, ainda que em parte, sem a prévia autorização do cliente. Sua autoria encontra-se protegida nos termos da Lei nº 9.610 de 19.02.98, não sendo permitida sua reprodução parcial ou integral, edição, publicação, divulgação, comercialização, doação, distribuição, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da ENGESOLVE, sob pena de ser compelido o responsável a indenizá-la, mediante composição de perdas e danos, e lucros cessantes, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis.

Este documento foi preparado pela ENGESOLVE em concomitância às normas técnicas recomendáveis e em estrita obediência aos termos do pedido e contrato firmado com o cliente. Em razão disto, a ENGESOLVE isenta-se de qualquer responsabilidade civil e criminal perante o cliente ou terceiros pela utilização deste documento, ainda que parcialmente, fora do escopo para o qual foi preparado.

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

2.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

A área objeto de estudo pertence à Universidade de São Paulo Campus Área Capital Leste (PUSP-Leste) e está inserida no município de São Paulo, Subprefeitura Penha, no bairro Ermelino Matarazzo, registrada na Rua Arlindo Bértio, 1.000 (Portaria P2). As coordenadas em UTM Sirgas 2000 do centro da área de estudo são zona 23K, 7402266.51 m S e 346771.93 m E.

O local de estudo (USP Leste) possui aproximadamente 220.000 m² e conta com três portarias principais, a P1 situada na Rodovia Parque (na margem da Rodovia Ayrton Senna), a P2 situada na Rua Arlindo Bértio e a P3 com acesso pela Estação da CPTM USP Leste. A **Figura 2.1.** apresenta a localização da área de interesse.

2.2. SOBRE A PRESENÇA DE GASES

Estudos anteriores realizados no local comprovaram que a ocorrência de gás Metano identificada na Gleba I da USP Leste é proveniente da matéria orgânica advinda das camadas de origem antrópica oriundas da dragagem do Rio Tietê e também das camadas naturais pertencentes aos depósitos aluviais quaternários associados ao Rio Tietê.


O monitoramento dos poços de gás com medições realizado em campo indica que o composto de interesse predominante na atmosfera gasosa dos poros do solo na área de estudo é o gás Metano.

Pela ocorrência destes gases, foi projetado e instalado um sistema de ventilação com objetivo de impedir a intrusão de gases dos edifícios presentes no local.


2.3. SOBRE O SISTEMA DE VENTILAÇÃO DOS GASES

Na área de estudo há um sistema de ventilação (circulação de ar) composto por tapetes de brita inseridos logo abaixo da laje dos prédios, que permite a circulação dos gases, os quais são extraídos por meio de compressores ou exaustores.


O processo de circulação funciona da seguinte maneira: os eventuais gases formados a partir da matéria orgânica são drenados pelo tapete de brita instalado sob a laje das edificações e então arrastados em um fluxo contínuo de ar limpo promovido por um exaustor para ventilação forçada, conduzidos a um sistema de dispersão na atmosfera.

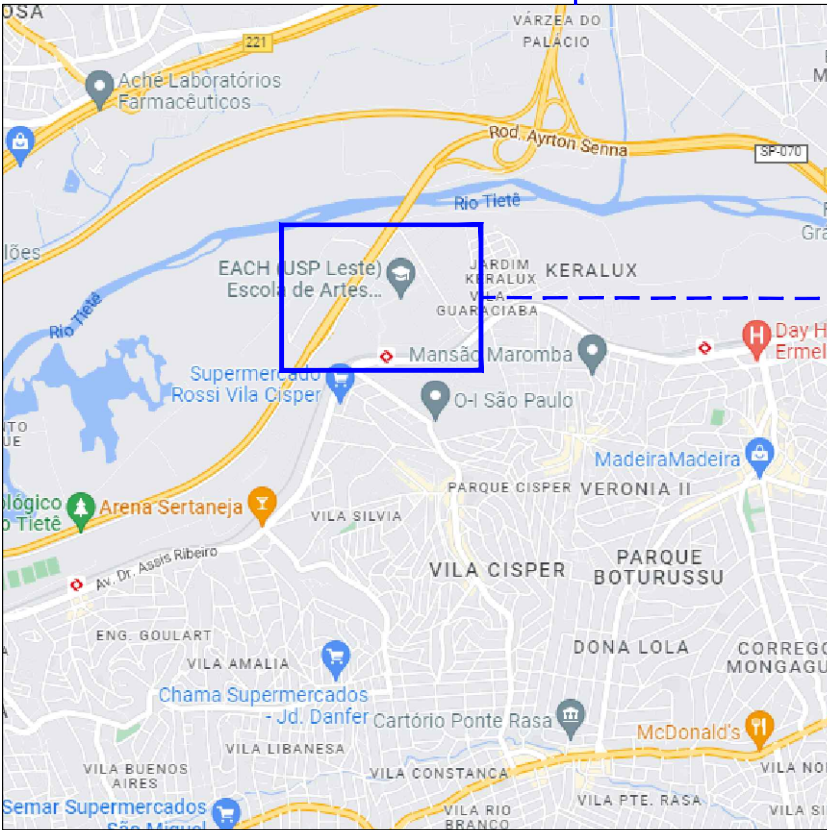

2022, data: 21/05/2022 (Fonte: GOOGLE EARTH)



LEGENDA:

 Área de Interesse


CLIENTE: Universidade de São Paulo - USP Leste		
PROJETO: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação		
ENDEREÇO: Rua Arlindo Bétio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP		
TÍTULO: Localização da Área de Interesse (Adaptado de Google Earth, 2023)		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Chufi	FIGURA Nº: 2.1	DATA: OUT/2023

Dessa forma, mantendo-se a ventilação do tapete de brita, garante-se que os gases que eventualmente emanem do subsolo não atinjam o edifício pela sua laje.

Previamente e como forma de contingência emergencial, os exaustores foram conectados às tubulações drenantes existentes nos edifícios. Durante os meses de março a julho de 2014, os sistemas de ventilação passaram pela etapa de reajuste às características de cada edificação, para que os exaustores fossem conectados à sua situação definitiva.

A eficiência do sistema de ventilação de gases é monitorada por meio de medições das concentrações de Metano (CH_4), Compostos Orgânicos Voláteis (VOC), Gás Carbônico (CO_2), Monóxido de Carbono (CO), Oxigênio (O_2) Sulfeto de Hidrogênio (H_2S) e pressão em poços de monitoramento em duas profundidades distintas.

A **Figura 2.3.1** ilustra o conceito de funcionamento do sistema de circulação de gases instalado na USP Leste.

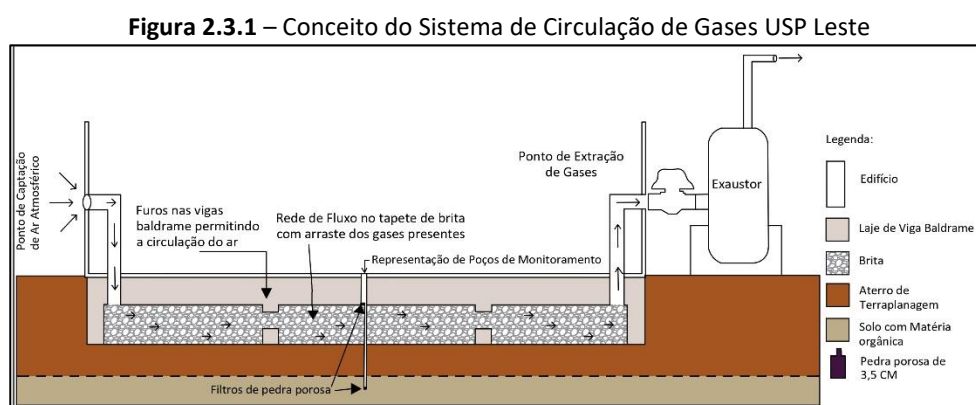

Fonte: Adaptado de Relatório de Instalação de Sistemas (Weber, 2022), Atualizado por Engesolve, 2023.

3. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO

O monitoramento de intrusão de gases/vapores no solo em ambientes fechados é realizado de forma sistemática e programada, com o objetivo de afastar o risco eventual de explosividade nas edificações da USP Leste.

Os pontos de monitoramento se subdividem em Poços de Monitoramento e Infraestrutura.

3.1. POÇOS DE MONITORAMENTO

Atualmente estão instalados na área de estudo 117 (cento e dezessete) conjuntos de poços de monitoramento de gases e 08 (oito) poços de monitoramento de gases, distribuídos nos Edifícios I-1, I-3 (Auditório I-5 e Biblioteca), I-4 (Serviços), Conjunto Laboratorial, Bloco Inicial (Conjunto Didático), Enfermaria, CAT, Incubadora, Ginásio, Guarda Universitária, Portaria P3 e Transportes. Os 03 conjuntos de poços existentes no Edifício Laranjinha foram encerrados com a demolição do prédio.

Entre agosto e novembro de 2013 foram instalados 107 (cento e sete) pares de poços de monitoramento de gases, com duas profundidades distintas, e 08 (oito) poços de monitoramento de gases rasos, sendo intitulados PMG-00 **A** (~0,30 m – sob as lajes/no tapete de brita) e PMG-00 **B** (~1,00 m – no solo).

Em março/2014 os poços A e B encontravam-se conectados em uma mesma mangueira. No início do mês de abril/2014, foram inseridas válvulas de individualização dos poços, as quais os mantém fechados, sendo abertos somente no momento da medição após a conexão da mangueira do equipamento, o que permite a leitura da pressão e das concentrações de uma profundidade sem a interferência da outra, ou da atmosfera.

Em julho/2015 foram instalados mais 09 (nove) conjuntos de poços de monitoramento nos edifícios da Guarda Universitária, Portaria P3 e Transportes. O monitoramento nesses poços se iniciou em Agosto/2015.

Nos edifícios Guarda Universitária e Transportes, na porção rasa foi instalado o poço de monitoramento sob a laje tipo Vapor Pin (**A**) e na porção profunda, com o mesmo perfil construtivo dos já existentes (**B**). No edifício Portaria P3, foi detectada uma segunda laje sob o piso, sendo assim, os poços de monitoramento neste edifício foram instalados em três profundidades: Sob a primeira laje – **A** (~0,30 m), sob a segunda laje, no tapete de brita – **B** (~0,50 m) e no solo – **C** (~1,30 m).

Entre junho/2019 e junho/2020, o sistema de ventilação no edifício da Guarda Universitária foi desligado e o monitoramento interrompido devido à uma reforma ocorrida entre Julho a novembro/2019. Em dezembro/2019, 07 (sete) novos pares de poços de monitoramento foram

instalados, com o mesmo tipo de construção de 2015, bem como foram instaladas novas tubulações do sistema de ventilação.

Em outubro/2021 foram instalados 34 (trinta e quatro) conjuntos de poços de monitoramento de gases, com profundidades distintas sendo PMG-00 B e C (~0,50 m e ~1,20m) e 11 (onze) poços de monitoramento de gases rasos, sendo PMG-00 A (~0,30 m). Ainda neste período foram reinstalados 07 (sete) poços A sob a laje na Guarda Universitária, totalizando em 52 os poços instalados neste período.

A **Tabela 3.1.1** demonstra o quantitativo de poços distribuídos nos edifícios, totalizando 289 poços de monitoramento em solo/laje. A **Figura 3.1.1** ilustra a localização destes poços de monitoramento.

3.2. INFRAESTRUTURA

Além dos poços de monitoramento, foi realizado o levantamento dos ralos, tomadas e grelhas existentes nos edifícios, para incluí-los nas medições e avaliar a intrusão dos gases nas construções. Foi definido o monitoramento em ralos e caixas de passagem numerados e cadastrados em cada prédio.

Em junho de 2021, foram incluídos sete pontos de infraestrutura na Guarda Universitária, retomando o monitoramento da infraestrutura, a qual estava interrompida desde a reforma do prédio de 2020.

Durante a construção dos edifícios, a presença de gás foi detectada e, por isso, como forma de prevenção, o sistema elétrico foi instalado em tubulações aéreas, chegando às salas via canaletas, fazendo com que as tomadas das edificações não possuam contato direto com o solo.

Foram definidos também espaços que possuem pouca circulação de ar para serem monitorados, a partir de vistoria em toda a área de estudo.


Em março de 2023 foi realizado o levantamento detalhado e atualização de todos os pontos de infraestrutura, na ocasião foi verificado que o ponto 177 se encontrava identificado erroneamente como 171, o ponto 176 identificado como 177 e o ponto 171 (posicionado dentro do box) se encontrava sem identificação. Os pontos identificados foram remarcados corretamente, o **Anexo 7** apresenta Relatório Fotográfico referente ao levantamento e atualização.

A **Tabela 3.2.1.** e a **Figura 3.2.1.** apresentam a distribuição e a localização dos pontos de infraestrutura distribuídos nos edifícios (totalizando 180 pontos de medição na infraestrutura), respectivamente.





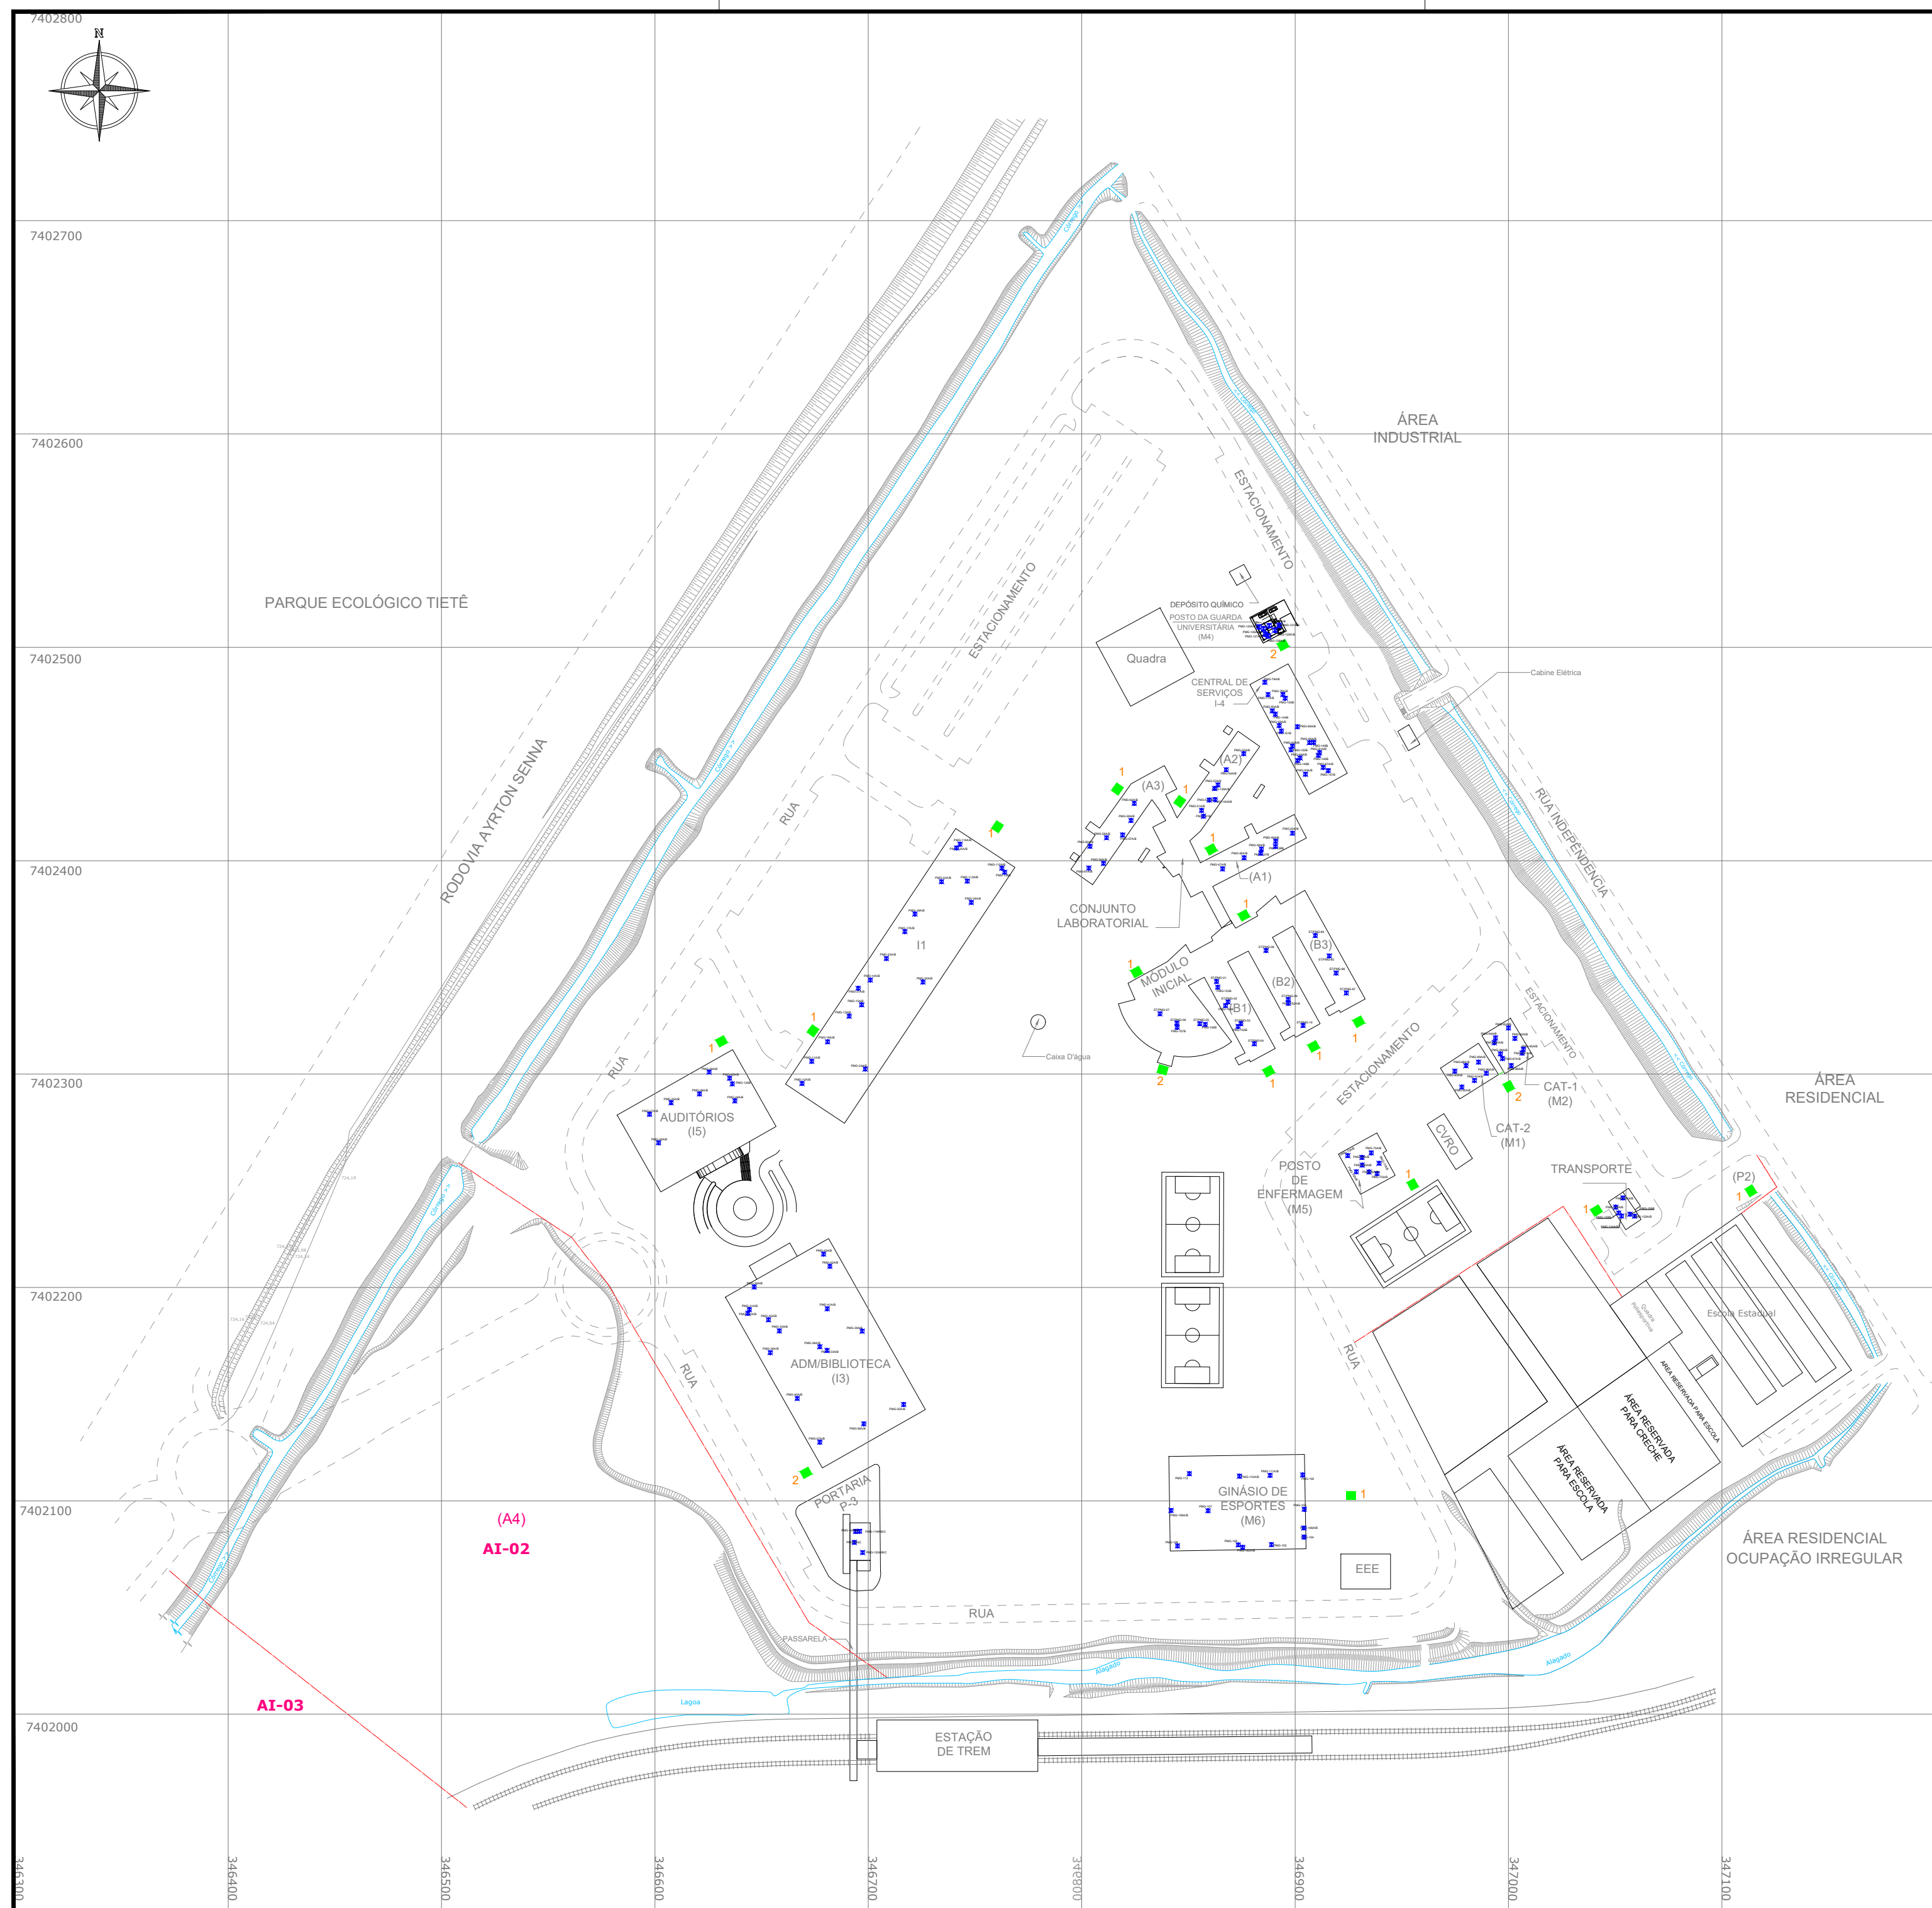


Tabela 3.1.1 – Distribuição dos Poços de Monitoramento dos Gases nas Edificações


Relação de Poços x Edificações																											
Poços				Poços				Poços				Poços				Poços				Poços				Poços			
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	A	37 POÇOS	Edifício I-3 Auditórios (I-5)	PMG-25	A	47 POÇOS	Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	41 POÇOS	Bloco Inicial (Conjunto Didático)	PMG-01	A	35 POÇOS	Edifício I-4	PMG-63	A	32 POÇOS	Ginásio Poliesportivo	PMG-102	18 POÇOS					
	PMG-16	B			PMG-25	B			PMG-46	B			PMG-01	B			PMG-63	B			PMG-103						
	PMG-17	A			PMG-26	A			PMG-47	A			PMG-02	A			PMG-64	A			PMG-104						
	PMG-17	B			PMG-26	B			PMG-47	B			PMG-02	B			PMG-64	B			PMG-105						
	PMG-18	A			PMG-27	A			PMG-48	A			PMG-03	A			PMG-65	A			PMG-106						
	PMG-18	B			PMG-27	B			PMG-48	B			PMG-03	B			PMG-65	B			PMG-107						
	PMG-20	A			PMG-28	A			PMG-49	A			PMG-04	A			PMG-66	A			PMG-108						
	PMG-20	B			PMG-28	B			PMG-49	B			PMG-04	B			PMG-66	B			PMG-109		A				
	PMG-22	A			PMG-29	A			PMG-50	A			PMG-05	A			PMG-67	A			PMG-109		B				
	PMG-22	B			PMG-29	B			PMG-50	B			PMG-05	B			PMG-67	B			PMG-110		A				
	PMG-23	A			PMG-44	A			PMG-51	A			PMG-06	A			PMG-68	A			PMG-110		B				
	PMG-23	B			PMG-44	B			PMG-51	B			PMG-06	B			PMG-68	B			PMG-111		A				
	PMG-113	A			PMG-45	A			PMG-52	A			PMG-07	A			PMG-69	A			PMG-111		B				
	PMG-113	B			PMG-45	B			PMG-52	B			PMG-07	B			PMG-69	B			PMG-112						
	PMG-114	A			PMG-132	A			PMG-53	A			PMG-08	A			PMG-77	A			PMG-162		A				
	PMG-114	B			PMG-132	B			PMG-53	B			PMG-08	B			PMG-77	B			PMG-162		B				
	PMG-115	A			PMG-133	A			PMG-54	A			PMG-09	A			PMG-78	A			PMG-166		A				
	PMG-115	B			PMG-133	B			PMG-54	B			PMG-09	B			PMG-78	B			PMG-166		B				
	PMG-135	A			PMG-134	B			PMG-55	A			PMG-10	A			PMG-79	A			Portaria P3	PMG-119	A	09 poços			
PMG-135	B	PMG-30		A	PMG-55	B			PMG-10	B			PMG-79	B			PMG-119	B									
PMG-136	B	PMG-30		B	PMG-56	A			PMG-84	A			PMG-80	A			PMG-119	C									
PMG-14	A	PMG-31		A	PMG-56	B			PMG-84	B			PMG-80	B			PMG-120	A									
PMG-14	B	PMG-31		B	PMG-57	A			PMG-85	A			PMG-81	A			PMG-120	B									
PMG-21	A	PMG-32		A	PMG-57	B			PMG-85	B			PMG-81	B			PMG-120	C									
PMG-21	B	PMG-32		B	PMG-58	A			PMG-86	A			PMG-144	B			PMG-163	C									
PMG-15	A	PMG-33		A	PMG-58	B			PMG-86	B			PMG-145	B			PMG-164	B									
PMG-15	B	PMG-33		B	PMG-59	A			PMG-87	A			PMG-146	B			PMG-164	C									
PMG-13	A	PMG-34		A	PMG-59	B			PMG-87	B			PMG-147	B			Transportes	PMG-121		A		10 poços					
PMG-13	B	PMG-34		B	PMG-60	A			PMG-152	A			PMG-148	B				PMG-121		B							
PMG-19	A	PMG-35		A	PMG-60	B			PMG-152	B			PMG-149	B				PMG-122		A							
PMG-19	B	PMG-35		B	PMG-61	A			PMG-153	B			PMG-150	B				PMG-122		B							
PMG-11	A	PMG-36		A	PMG-61	B			PMG-154	B			PMG-151	B				PMG-123		A							
PMG-11	B	PMG-36		B	PMG-62	A			PMG-155	B			Incubadora	PMG-88		A		PMG-123		B			14 POÇOS				
PMG-12	A	PMG-37		A	PMG-62	B			PMG-156	B		PMG-88		B		PMG-88		B		PMG-124				A			
PMG-12	B	PMG-37		B	PMG-137	B			PMG-157	B		PMG-89		A		PMG-89		A		PMG-124				B			
PMG-24	A	PMG-38		A	PMG-138	B			CAT	PMG-82		A		PMG-89		B		PMG-90		A				PMG-158	B		
PMG-24	B	PMG-38		B	PMG-139	A				PMG-82		B		PMG-90		B		PMG-90		B				PMG-159	B		
		PMG-39	A	PMG-139	B	PMG-83				A		PMG-91		A		PMG-91	A	PMG-125		A							
		PMG-39	B	PMG-140	A	PMG-83				B		PMG-91		B		PMG-92	A	PMG-125		B							
		PMG-40	A	PMG-140	B	PMG-94				A		PMG-92		B		PMG-92	B	PMG-126		A							
		PMG-40	B	PMG-141	B	PMG-94				B		PMG-93		A		PMG-92	A	PMG-126		B							
		PMG-41	A	PMG-70	A	PMG-95		A		18 POÇOS		PMG-93		B		PMG-93	A	PMG-127		A							
		PMG-41	B	PMG-70	B	PMG-95		B				PMG-96		A		PMG-93	B	PMG-127		B							
		PMG-42	A	PMG-71	A	PMG-96		A				PMG-97		A		PMG-96	B	PMG-128		A							
		PMG-42	B	PMG-71	B	PMG-96		B				PMG-97	B	PMG-97		A	PMG-128	B									
		PMG-43	A	PMG-72	A	PMG-97		A				PMG-98	A	PMG-98		B	PMG-129	A									
		PMG-43	B	PMG-72	B	PMG-97		B				PMG-98	B	PMG-98		B	PMG-129	B									
				PMG-73	A	PMG-98	A	PMG-160				A	PMG-99	A		PMG-130	A										
				PMG-73	B	PMG-98	B	PMG-160				B	PMG-99	B		PMG-130	B										
				PMG-74	A	PMG-160	A	PMG-161				A				PMG-131	A										
				PMG-74	B	PMG-161	A	PMG-161				B				PMG-131	B										
				PMG-75	A																						
				PMG-75	B																						
				PMG-76	A																						
				PMG-76	B																						
				PMG-165	A																						
				PMG-165	B																						

Fonte: Dados de Campo, Engesolve, 2023.



LEGENDA:

- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | Taludes |
|  | Poço de monitoramento de gás |
|  | Abrigo para equipamento |
|  | Quantidades de exaustores nos abrigos |
|  | Cerca de divisa |
|  | Guia e Estacionamento |
|  | Edificações |



CLIENTE:
Universidade de São Paulo - USP Leste

PROJETO:
Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases
e da Operação do Sistema de Ventilação

ENDEREÇO: Rua Arlindo Béttio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP

TÍTULO:

Localização dos Poços de Monitoramento de Gás e Abrigos de Exaustores

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Felipe Chufi

FIGURA N°:

3.1.1

DATA:	OUT/23
-------	--------



EngeSolve
SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS

Tabela 3.2.1 – Distribuição dos Pontos de Monitoramento de Infraestrutura nas Edificações

Relação de Pontos da Infraestrutura x Edificações														
Pontos			Pontos			Pontos			Pontos			Pontos		
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	Edifício I-3 Auditórios	Ralos	160	Edifício I-4	Ralos	95	Conjunto Laboratorial	Ralos	34	Bloco Inicial	Ralos	74
		17			159			97			36			75
		16			162			99			53			76
		14			165			106			69			77
		15			164			96			70			78
		18			176			104			71			79
		19			177			307			67			80
		20			174			122			66			81
		13			171			111			64			82
		25			148			117			65			83
		22	149	100	63			84						
		21	150	101	62			85						
		32	147	105	56			86						
		30	139	91	60			Enfermaria			Ralos	124		
		31	140	102	58							125		
		28	141	88	55							126		
		26	151	108	54							127		
		24	145	107	57			CAT			Ralos	136		
		27	144	94	42							137		
		23	143	92	44			P3			Ralos	138		
01	142	90	43	187										
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	05	146	89	41			186						
		04		87	38			Incubadora	Ralos	132				
		03		123	32					133				
		09		121	61					134				
		08		120	37			135						
		07		119	45			Guarda Universitaria	Ralos	188				
		06		114	46					189				
		02		113	40					190				
				112	47					191				
				109	48					192				
		110	49	193										
			50	194										

Pontos				
Caixas de Passagem	Enfermaria	53	Biblioteca	59
	Enfermaria	55	Biblioteca	57
	Laboratórios	40	Biblioteca	60
	Laboratórios	38	Biblioteca	67
	Laboratórios	24	Biblioteca	58
	Laboratórios	15	Auditório	72
	Laboratórios	13	Auditório	73
	Laboratórios	28	Auditório	74
	Laboratórios	33		
	Laboratórios	37		
	Laboratórios	16		
	Laboratórios	18		
	Laboratórios	21		
Laboratórios	29			

Pontos		
Espaços com pouca circulação de ar	1	Depósito Auditório Vermelho
	2	Depósito Auditório Verde
	3	Depósito Edifício I-3
	4	Depósito Enfermaria
	5	Arquivo Enfermaria
	6	Caixa de inspeção da Caixa d'água
	7	Depósito interior Almoarifado
	8	Depósito exterior Almoarifado
	9	Casa de Máquinas (Hidrante)

Fonte: Dados de Campo, Engesolve, 2023.

4. METODOLOGIA DO MONITORAMENTO DE GASES

O monitoramento de intrusão de vapores/gases do solo em ambientes fechados e espaços com pouca circulação de ar do pavimento térreo, ou seja, que tem contato direto com o solo, é realizado de forma sistemática e programada, visando afastar o risco eventual de explosividade nas edificações da USP Leste.

As leituras são realizadas em poços de monitoramento situados sob a laje (no tapete de brita – 0,30 m) e no solo (à profundidade aproximada de 0,50 m e 1,30 m), bem como em ralos e caixas de passagem distribuídos e numerados nas edificações (conforme descrito nos itens **3.1** e **3.2**).

A sistemática adotada segue abaixo especificada:

- **Poços de Monitoramento:** medições semanais com o equipamento GEM 5000 para avaliação da concentração de Metano ($\text{CH}_4\%$ vol), $\text{CO}_2\%$ vol), CO (ppm), H_2S (ppm), O_2 (%vol), e nível de pressão (bar), explosividade (%LEL) e presença de outros VOCs (Compostos Orgânicos Voláteis) com o equipamento MX6/Gas Alert Micro 5 (BW), totalizando 289 poços de monitoramento em solo/laje;
- **Infraestrutura:** medições quinzenais, com equipamento MX6/ Gas Alert Micro 5 (BW), para medição do nível de explosividade (%LEL) que a possível presença de Metano e/ou outros voláteis podem conferir ao ambiente, totalizando 180 pontos de medição na infraestrutura; e
- **Exaustores:** monitoramento sistemático nos exaustores de cada sistema de ventilação dos edifícios, realizando-se medições semanais de Metano e pressão com o equipamento GEM 5000 e VOCs com o equipamento MX6/ Gas Alert Micro 5 (BW), bem como leitura da pressão na célula de vácuo, totalizando 22 pontos de medição em exaustores.

O monitoramento é realizado por técnicos de campo da ENGESOLVE, treinados, capacitados, e supervisionados por Geólogo e Engenheiro Ambiental. As leituras são realizadas por meio de equipamentos calibrados e certificados da marca Industrial Scientific, modelo MX6 iBrid, Gas Alert Micro 5, Modelo BW, e da marca Landtec, modelo GEM 5000. No **Anexo 1** apresentam-se os certificados de calibração dos equipamentos utilizados.

Os equipamentos MX6 iBrid/Gas Alert Micro 5 (BW) são instrumentos portáteis utilizados em avaliações de passivos para detectar compostos voláteis e incluem até cinco sensores simultâneos. As unidades utilizadas neste projeto estão configuradas com um sensor PID 10,6eV para medição de VOC em ppm e de um sensor catalítico para medição de LEL (*Low Explosivity Level* ou Limite Inferior de Inflamabilidade – LII) em porcentagem.

O MX6/BW tem calibração com validade de até 2 anos, mas as unidades utilizadas na USP são calibradas trimestralmente visando a garantia dos dados, considerando a presença frequente de Metano (Equipamento USP Nº de Série: SK317-003329 e/ou SK317-003332).

O equipamento GEM 5000 é um equipamento portátil especificamente utilizado para monitoramento da migração de gases, como por exemplo em aterros. Ele é composto de uma célula infravermelha de comprimento de onda duplo com canal de referência para leitura de Metano (CH_4) em % volume, Dióxido Carbônico (CO_2) em % volume, de uma célula eletroquímica para medição de Sulfeto de Hidrogênio (H_2S), Monóxido de Carbono (CO), Oxigênio (O_2) em parte por milhão (ppm) e transdutor para medição de BAL (pressão diferencial) e Nível de Pressão.

O GEM 5000 tem uma calibração anual, porém a unidade utilizada na USP é calibrada semestralmente para garantia da qualidade dos dados, considerando a presença frequente de Metano. Além disso, diariamente é realizada uma verificação com ar ambiente antes do início das medições (Equipamento USP Nº de Série: G500491).

4.1. SOBRE O BIOGÁS E O GÁS METANO

Inicialmente, o termo Biogás estava associado aos diversos nomes atribuídos a ele, como: gás dos pântanos, gás de aterro, gás de digestor e gás de fermentação, entre outros e atualmente, o termo refere-se, de forma geral, aquele gás formado a partir da degradação anaeróbia (ausência de oxigênio gasoso) da matéria orgânica, através da ação de determinadas espécies de bactérias. Durante a digestão anaeróbia, a energia química presente na composição é largamente conservada, principalmente, como Metano (Adaptado, CETESB, 2021).

Junto ao Metano (CH_4), estão presentes outros gases que fazem parte do meio ambiente natural, sendo gerados a partir da degradação bacteriana de matéria orgânica, neste caso, sedimentos advindos da dragagem do Rio Tietê e sedimentos quaternários naturalmente depositados na bacia de inundação do Rio Tietê, área sobre a qual a USP Leste foi instaurada, gerando o biogás. A transformação da matéria orgânica é realizada pelo metabolismo bacteriano, tendo participação de fungos e outros microrganismos. As interações entre os diversos grupos de bactérias participantes da decomposição anaeróbia tem múltiplas variáveis, que vão desde a composição dos resíduos e presença de substratos, até variáveis como temperatura, teor de água e pH do meio. Em um ambiente anaeróbio é gerada uma mistura de gases, como:

- Metano (CH_4): 50% - 70% do volume de gás produzido;
- Dióxido de carbono (gás Carbônico, CO_2): 25% - 50% do volume de gás produzido;
- E traços de outros gases como:
 - Hidrogênio (H_2): 0% - 1% do volume;
 - Gás sulfídrico ou Sulfeto de Hidrogênio (H_2S): 0% - 3% do volume;
 - Oxigênio (O_2): 0% - 2% do volume;
 - Amoníaco (NH_3): 0% - 1% do volume; e
 - Nitrogênio (N_2): 0% - 7% do volume (CETESB, 2021).

Ao longo dos mais de 9,4 anos de monitoramento da área de estudo, foi possível observar a presença de outros gases, como Sulfeto de Hidrogênio (H_2S) e Monóxido de Carbono (CO).


Constata-se esta possibilidade devido a produção de biogás, na qual as bactérias produzem estes compostos simultaneamente. Contudo, durante a digestão anaeróbica, eles são produzidos em diferentes proporções, onde o Metano é sempre maior do que H_2S e CO .

O gás Metano (CAS nº 74-82-8) é um gás inflamável comumente encontrado em material orgânico devido à presença de bactérias decompositoras. Ele apresenta faixa de inflamabilidade entre 5% e 15% em volume, isto é, concentrações do gás/vapor que em contato com o ar forma uma mistura inflamável (mistura ideal) na presença de uma fonte de ignição. As concentrações abaixo ou acima dessa faixa não propagam chama, uma vez que a quantidade de gás/vapor é muito pequena (mistura pobre) ou muito elevada (mistura rica) para queimar ou explodir, conforme descrito no manual de produtos químicos (CETESB, 2016).

Para que ocorra a inflamabilidade seria necessária a concentração do gás, em sua mistura ideal com oxigênio em um ambiente confinado, e um meio de ignição. Observou-se em uma vistoria que, em geral, o perfil construtivo das edificações apresenta ventilação fixa, o que dificulta o acúmulo do gás nesses ambientes.

A **Figura 3.4.1.** ilustra a faixa de inflamabilidade de gás Metano, bem como a faixa de medição do equipamento utilizado e o esquema de combustão.

Figura 3.4.1 – Faixa de Inflamabilidade do Gás Metano (CH_4) e sua combustão

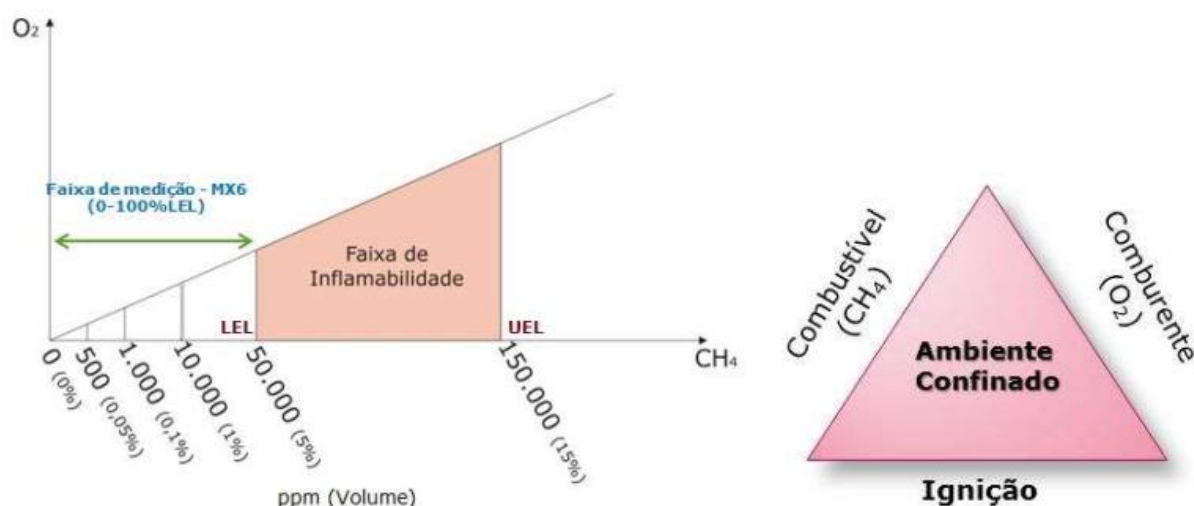

Fonte: Relatório Weber, 2022.

O Sulfeto de Hidrogênio é um gás tóxico, denso e inflamável, com odor de “ovo podre”, já o Monóxido de Carbono é um gás tóxico e inflamável, porém inodoro. Ambos podem ser prejudiciais à saúde quando inalados em ambientes confinados, a depender das concentrações e do tempo de exposição: para o H_2S é necessário concentrações acima de 8,0 ppm por 48 horas e para o CO acima de 39,0 ppm por 48 horas (Manual de Produtos Químicos, CETESB 2016).

Para existir o risco de inflamabilidade, o H_2S e o CO precisam das mesmas características que o Metano, combinando o espaço confinado, fonte de ignição e concentrações dentro da faixa de

4,3 a 45,0%vol ou 43.000 a 450.000 ppm de H₂S; e 12,0 a 75,0%vol ou 120.000 a 750.000 ppm de CO (CETESB, 2016).

4.2. PLANO DE AÇÃO

Um plano de ação foi estabelecido para garantia da segurança durante a realização dos trabalhos de monitoramento e ventilação dos gases. Sua última atualização foi realizada em setembro/2022. O plano completo pode ser visualizado no **Anexo 2**, e a seguir são apresentadas as principais ações relacionadas às concentrações de Metano obtidas:

Sistema Inoperante: Verificar possíveis falhas, solucioná-las e retomar a operação, além de monitorar os poços de monitoramento sob influência do sistema até o reinício da operação;

Ponto de Alerta (PMG-B com concentração de Metano acima de 5%vol): Acompanhar o monitoramento dos poços de profundidade rasa (PMG-A) para verificar se há movimentação do gás no tapete de brita;

Ponto Crítico (PMG-A com concentração de Metano entre 5% e 15%vol): Ajustar o sistema de ventilação, direcionando o fluxo para o ponto em questão e monitorar a redução da concentração, além de monitorar a infraestrutura para garantir a não intrusão dos vapores do edifício afetado, até que as concentrações no ponto estejam inferiores a 5%;

Ponto Extremamente Crítico (PMG-A com concentração de Metano acima de 15%vol): Ajustar o sistema de ventilação, direcionando o fluxo para o ponto em questão, aumentar a pressão e monitorar a redução da concentração, além de monitorar a infraestrutura para garantir a não intrusão dos vapores do edifício afetado, até que as concentrações no ponto estejam inferiores a 5%;

Pontos de Infraestrutura em ambientes internos com concentração acima de 20%LEL (ou 1%volCH₄): Ventilar o ambiente, remover as pessoas do local, eliminar possíveis fontes de ignição, identificar os pontos de entrada de gás e selar;

Entrada dos Exaustores com concentração acima de 20%LEL (ou 1%volCH₄): Aumentar a frequência do compressor, afim de elevar o vácuo e o fluxo, aumentando assim a diluição do Metano na corrente de ar.

5. RESUMO E TENDÊNCIA EM 9,7 ANOS DE OPERAÇÃO/MONITORAMENTO (ABRIL DE 2014-SETEMBRO DE 2023)

O monitoramento de gases no solo e sob a laje das edificações na USP Leste teve início em março de 2014 e se mantém ativo até o presente momento, com previsão de continuidade para os próximos anos.

Avaliando os dados obtidos ao longo destes 9,7 anos de monitoramento (até o mês de setembro/2023), foi possível estabelecer uma linha de tendência da presença de Metano no solo, além de indicar a efetividade do sistema de ventilação em promover o afastamento das concentrações de Metano sob a laje dos edifícios.

As medições realizadas no período entre março e junho, indicaram que as concentrações de Metano acima de 1%Vol. estão localizadas frequentemente em pontos específicos (em até 13 dos 289 poços monitorados), não abrangendo toda a extensão dos edifícios. Também observa-se que, em sua maioria, essas concentrações estão localizadas apenas nas porções profundas (cerca de 1,00 m, com valores variáveis entre 1,10 a 10,1%VolCH₄). No ano de 2014, apenas em dois pontos foram verificadas concentrações de Metano acima de 5%VolCH₄, na profundidade imediatamente abaixo das edificações (subslabs 0,3m).

Os sistemas de ventilação foram ligados da forma como existiam em março de 2014. Neste mês, havia 08 poços com concentração de Metano na porção rasa. Em abril/2014, este número caiu para 04. Em maio/2014, havia apenas 01 e, em junho/2014, ao final da instalação/readequação dos sistemas de ventilação, não havia nenhum poço com concentração de Metano na porção rasa.

Em março/2014, os poços A e B encontravam-se conectados em uma mesma mangueira. No início do mês de abril/2014, foram inseridas válvulas de individualização dos poços. Nos meses e anos seguintes, as concentrações na porção rasa se mantiveram nulas. Quando eventualmente aparecem, o sistema de ventilação é redirecionado, rapidamente extinguindo a concentração existente.

Ao longo de março/2014 a dezembro/2021, as medições de VOC, H₂S e CO nos poços de monitoramento não detectaram concentrações significativas (abaixo de 100 ppm) em nenhum dos pontos monitorados. Tratando-se da pressão, observou-se pressões tanto negativas quanto positivas em alguns poços de monitoramento, indicando a movimentação promovida pelo sistema, além da movimentação natural do nível d'água da região.

Além das medições dos poços de monitoramento, também foram realizadas medições em ralos, caixas de passagem e espaços com pouca circulação de ar, onde não foi detectada nenhuma indicação de inflamabilidade, demonstrando que, mesmo com eventuais pressões positivas, não ocorreu intrusão de gases nos ambientes estudados. Em alguns pontos (principalmente na caixa 55 da Enfermaria) foram verificadas concentrações eventuais de VOC, ligadas ao uso de produtos de limpeza.

As linhas de tendência obtidas para o gás Metano nos 9,7 anos de monitoramento demonstraram que, em alguns poços, as concentrações variam de acordo com o período do ano, enquanto em outros, as concentrações mantêm-se sempre presentes.

De forma geral, nos períodos de julho a novembro, as condições climáticas regionais reportam períodos de seca, corroborando o rebaixamento do nível d'água subterrânea local. Assim, nota-se que o Metano gerado na área encontra mais poros vazios na zona não saturada do solo, conseguindo permear com mais facilidade por este meio. Diferente do que ocorre no período de chuvas, onde o nível d'água se eleva e o Metano encontra-se dissolvido junto à água nos poros da zona saturada.

Ainda durante os 9,7 anos de monitoramento e operação dos sistemas, diversas ações de manutenção preventiva e corretiva foram realizadas. Entre elas, a adequação da pressão de sucção imposta na célula de vácuo, a qual inicialmente era variável em cada edificação, chegando até -40mmHg, e foram gradativamente ajustadas entre setembro e novembro de 2015, até -2,0 mmHg, se aproximando da pressão prevista em projeto.

Periodicamente é realizada a manutenção preventiva nos sistemas e, quando necessário, também ocorrem ações corretivas, além da manutenção das tubulações, desenvolvida preferencialmente no último trimestre.

No último trimestre de 2016, dois pontos de captação de ar do Edifício Módulo Inicial foram reposicionados para fora da área da lanchonete. No último trimestre de 2017 foi realizado um levantamento para manutenção nas tubulações de entrada e saída dos sistemas em todos os prédios, onde fez-se necessário o ajuste nas tubulações do Bloco I, II e III do Conjunto Básico e em uma tubulação no prédio da biblioteca.

No último trimestre de 2018 foram realizados testes de estanqueidade nas tubulações de saída dos sistemas, por meio de fechamento de válvulas e aumento da pressão, com verificação dos pontos de vazamento. Os testes indicaram que as tubulações permaneciam intactas, com exceção de uma parte da tubulação do módulo inicial (B2), que foi substituída. No último trimestre de 2019 foi realizada a manutenção da tubulação quebrada na saída do sistema do Edifício I-1 parte 2. Em 2020, foram realizadas duas manutenções preventivas nos meses de fevereiro e novembro, não havendo necessidade de ações corretivas.

Observou-se também que ao longo dos 9,7 anos de monitoramento, em poços com histórico de concentrações de Metano, houve a presença de outros gases, sendo eles: H₂S (Sulfeto de Hidrogênio), e CO (Monóxido de Carbono). O H₂S é um gás tóxico, denso e inflamável, com odor de “ovo podre”. O CO também é tóxico e inflamável, porém leve e inodoro. Ambos podem ser prejudiciais à saúde quando inalados em ambientes confinados, a depender das concentrações e do tempo de exposição: para o H₂S é necessário concentrações acima de 8,0 ppm por 48 horas e para o CO, acima de 39,0 ppm por 48 horas (Manual de Produtos Químicos, CETESB, 2016).

O H₂S e o CO estão presentes junto ao Metano (CH₄), pois ambos fazem parte do meio ambiente natural, sendo gerados a partir da degradação bacteriana da matéria orgânica, neste caso,

advinda da dragagem do Rio Tietê. A transformação da matéria orgânica é realizada pelo metabolismo bacteriano, tendo participação de fungos e outros microorganismos. As interações entre os diversos grupos de bactérias participantes da decomposição anaeróbia tem múltiplas variáveis, que vão desde a composição dos resíduos e presença de substratos até variáveis externas como temperatura, teor de água e pH do meio. Em um ambiente anaeróbio, é gerada uma mistura de gases como Metano (CH_4), gás carbônico (CO_2), e em menor quantidade, hidrogênio (H_2), nitrogênio (N_2), sulfeto de hidrogênio (H_2S), monóxido de carbono (CO), amônia (NH_3) e oxigênio (O_2) (Adaptado, CETESB, 2021).

Para existir risco de inflamabilidade, o CH_4 , o H_2S e o CO precisam das mesmas características: espaço confinado, fonte de ignição e concentrações dentro da faixa de 5,0 a 15,0% de VolCH_4 ; 4,3 a 45% ou 43000 a 450000 ppm de H_2S ; e 12,0 a 75,0% ou 120000 a 750000 ppm de CO (Manual de Produtos Químicos, CETESB, 2016).

Os gráficos gerados a partir do monitoramento histórico da área indicam que a produção de Metano é maior do que a de H_2S e CO , sendo eles independentes uns dos outros e sem quaisquer correlações, pois as bactérias decompõem a matéria orgânica gerando estes compostos simultaneamente, porém em diferentes proporções. Nota-se que todas as concentrações de H_2S e CO encontradas ao longo dos 9,7 anos de monitoramento, estiveram abaixo do limite de inflamabilidade, apresentando um pico máximo de 12,0 ppm e 7,0 ppm respectivamente, apenas no mês de abril de 2014, sendo que posteriormente a isso, ambos permaneceram em uma média abaixo de 3,5 ppm.


No ano de 2021 e 2022, o monitoramento ocorreu de forma efetiva, de acordo com a sistemática programada nos poços de monitoramento e nos pontos da infraestrutura.

Nos primeiros trimestres de 2023, as concentrações variaram de forma constante. No 3º trimestre de 2023 foi observada concentração atípica no ponto 66A (0,50% VolCH_4), no dia 09 de agosto de 2023, sendo então colocado em prática o Plano de ação, cujo consiste na medição diária do ponto, entretanto, as medições demonstraram que a concentração foi *outline*, visto que em nenhuma das demais medições apresentaram quaisquer concentrações, mantendo-se nulas.

A seguir, descrevem-se as observações em cada edifício, ao longo dos 9,7 anos de monitoramento, para as concentrações de Metano, H_2S e CO .

EDIFÍCIO I-1:

- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Setembro de 2023
Poços existentes: 17 pares (09 na parte 1 e 08 na Parte 2)
Poços que apresentaram concentração >1%: 01 (PMG-11B)
Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

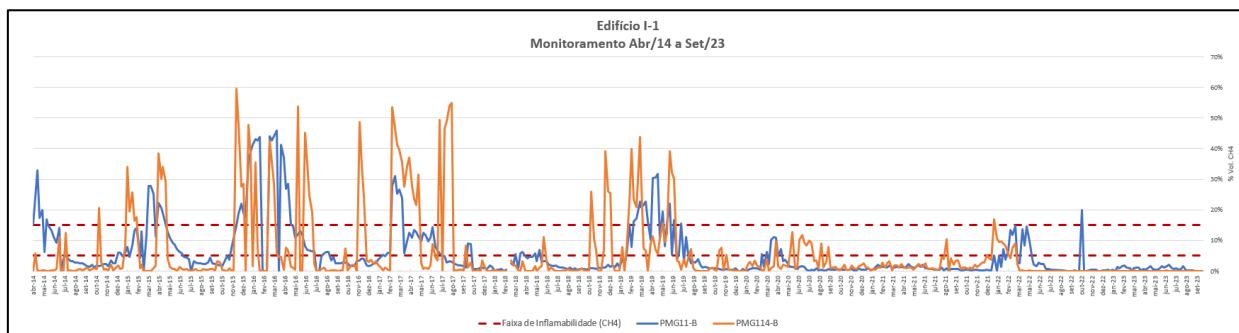


De abril de 2014 a dezembro de 2022 não foram detectadas concentrações de Metano sob a laje do edifício. Percebe-se que, com o início da operação do sistema de ventilação (Jul/2014), houve uma diminuição imediata das concentrações de Metano na porção profunda, porém estas mantiveram-se presentes e variando durante os anos de monitoramento nos poços PMG-11B e PMG 114B. É possível notar que no mês de fevereiro/2018 houve uma redução bem perceptível das concentrações nos dois poços em questão, porém voltaram a se elevar em 2019.

No ano de 2020, nota-se que houve uma diminuição das concentrações, que permaneceram dentro da faixa de inflamabilidade no início do ano, atingindo no máximo 13,0%VolCH₄. Em março, o PMG-11B apresentou concentrações abaixo de 5%, e o mesmo aconteceu com o PMG-114B em outubro do mesmo ano, onde ambos chegaram próximos a concentrações nulas. Este cenário de concentrações abaixo de 5% se manteve durante o ano de 2021, com exceção do mês de agosto e dezembro, onde as concentrações estiveram dentro da faixa de inflamabilidade, atingindo valor máximo de 14,50%VolCH₄ no PMG-114B.

No ano de 2022, ambos os poços seguem variando, ora com concentrações abaixo de 5%, ora com concentrações dentro da faixa de inflamabilidade. No primeiro trimestre de 2023, as concentrações do PMG-114B se encontravam abaixo de 5% apresentando valores entre nulo e 0,1%. No PMG-11B, as concentrações variaram de 0,06% a 1,80%, sendo o valor de pico obtido em 7 de fevereiro, no entanto os valores se mantiveram abaixo de 5%.

No segundo trimestre, apenas o PMG-11B apresentou concentração acima de 1,0%VolCH₄, variando entre 1,20% a 2,10%, sendo o valor de pico obtido em 20 de junho, no entanto os valores se mantiveram abaixo de 5%. No terceiro trimestre, o PMG-11B apresentou concentração acima de 1%VolCH₄, no entanto abaixo de 5%.


➤ Análise de H₂S e CO no período de Abril de 2014 a Setembro de 2023

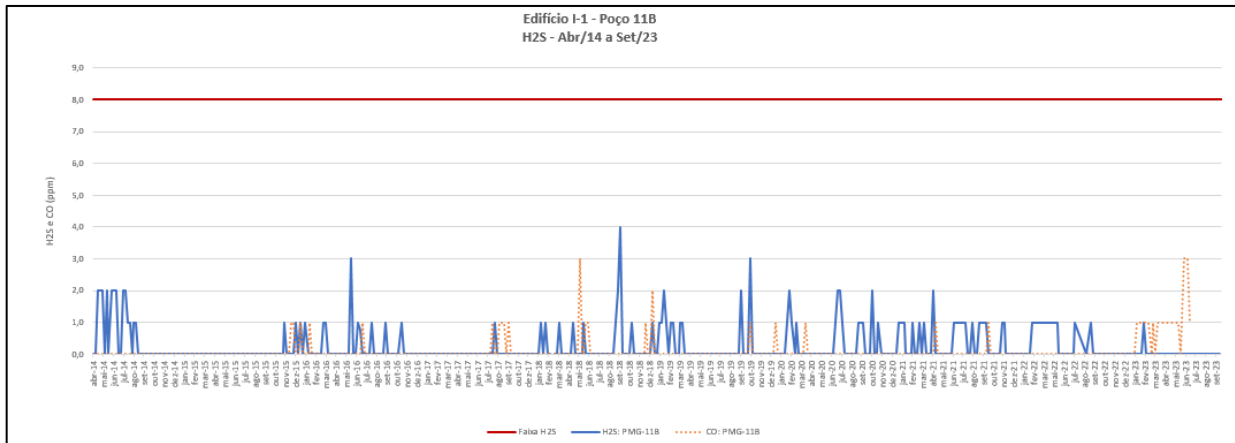

Os gráficos de H₂S e CO demonstram que houve uma variação entre 1,0 e 4,0 ppm para H₂S e entre 1,0 e 3,0 ppm para CO durante os 9,7 anos de monitoramento, estando ambos abaixo do índice de inflamabilidade. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido à degradação da matéria orgânica, porém a proporção é muito menor quando comparado ao CH₄.

EDIFÍCIO I-3 BIBLIOTECA E I-5 AUDITÓRIO:

- **Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2023**
 - Poços existentes: 21 pares (14 na Biblioteca e 07 no Auditório)
 - Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma
 - Deteção (>1%)sob a laje: Nenhuma

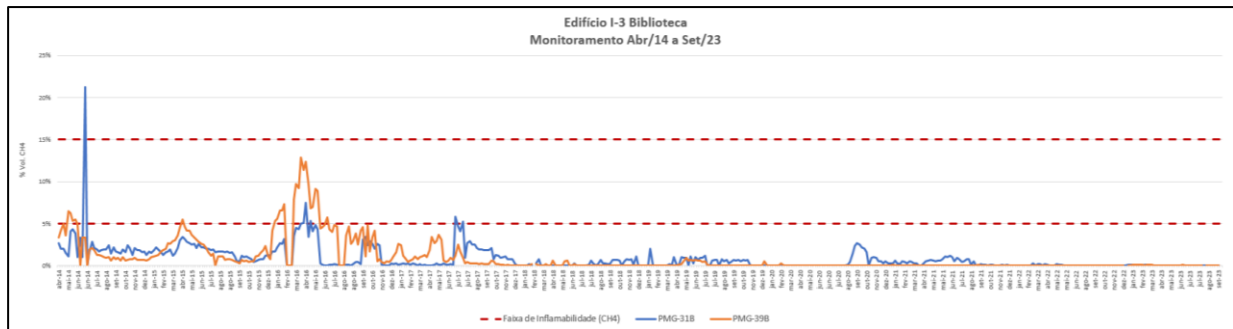

Durante os 9,7 anos de monitoramento não foram detectadas concentrações de Metano sob a laje do edifício. Nota-se que com o início da operação do sistema de ventilação em julho/2014, houve uma diminuição imediata das concentrações de Metano da porção profunda. Contudo, apesar da diminuição, elas se mantiveram presentes e variando durante todos estes anos nos poços PMG-31B e PMG-39B.

No ano de 2016 houve um aumento significativo das concentrações. Porém, em 2017 observa-se que as concentrações começaram a diminuir, permanecendo abaixo dos 5%VolCH₄, sendo que no ano de 2022 foram quase nulas.

No primeiro trimestre de 2023, as concentrações de ambos os poços PMG-31B e PMG-39B se mantiveram entre nulo e 0,1%. Nos segundo e terceiro trimestre de 2023, nenhum poço apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄.


EDIFÍCIO I-4:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Junho de 2023

Poços existentes: 12 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: 01 (PMG-66B)

Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

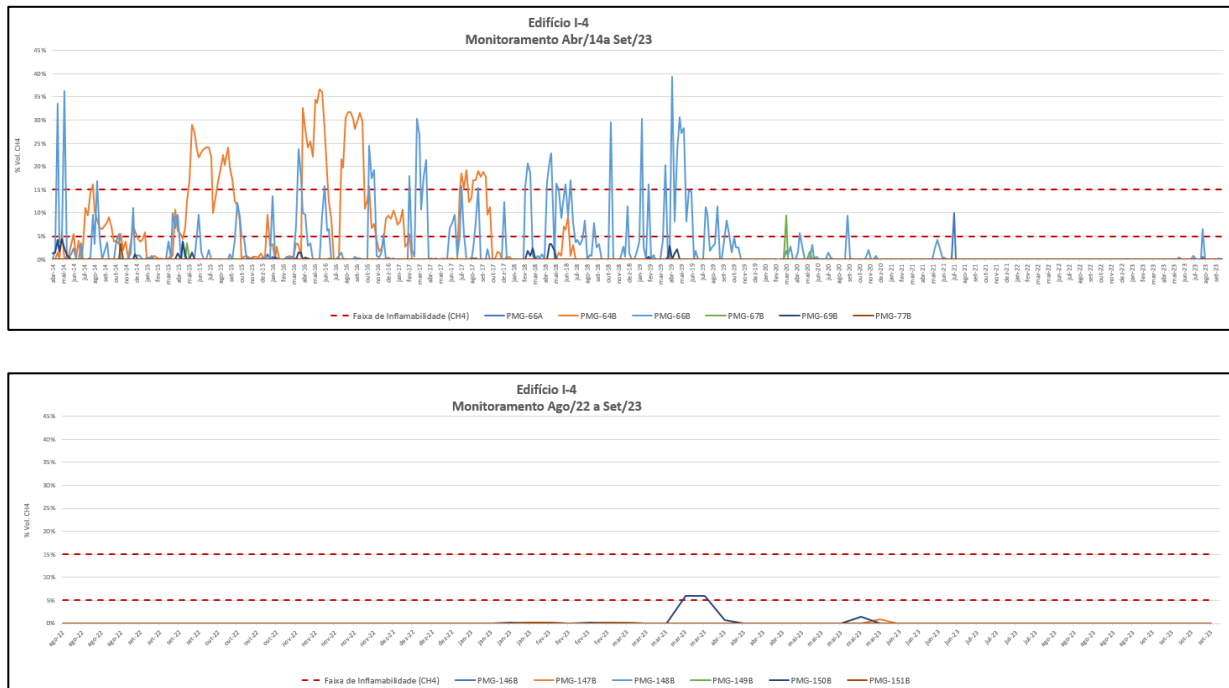

Em Janeiro de 2016, foi detectada concentração de Metano sob a laje do edifício, no poço de monitoramento PMG-66A, sob a concentração de 1,1%. Na porção profunda observa-se a persistência de concentrações de Metano no PMG-66B, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (julho/2014).

Em outros três poços também foram detectadas concentrações de Metano no solo, porém sem continuidade ou com valores fora da faixa de inflamabilidade, sendo eles: PMG-64B (de abril/14 até julho/18), PMG-67B (1x em maio/15), PMG-69B (eventualmente, sempre próximo ao mês de abril de cada ano e abaixo de 5%).


O PMG-77B havia apresentado concentração de Metano abaixo de 5%, somente uma vez, em outubro de 2014. Porém, em março de 2020, voltou a demonstrar concentrações do referido gás, desta vez com concentração de 10,0% VolCH₄, tendo logo depois se estabilizado com concentrações nulas.

No ano de 2021, o PMG-66A atingiu concentração de 10,0% VolCH₄, pontualmente em julho. Nos demais meses as concentrações do poço citado apresentaram-se abaixo de 5%, e nos demais poços obteve-se concentrações nulas. Em 2022, todos os poços apresentaram concentrações nulas.

No primeiro trimestre de 2023 as concentrações dos poços se encontravam nulas. No entanto, foram identificadas concentrações de 1% nos poços PMG-146B, PMG-147B, PMG-148B, PMG-149B, PMG-150B e PM-151B. O poço PMG-150B apresentou medição anômala, acima de 5% em apenas um dia.

No segundo trimestre de 2023, apenas o poço PMG-150B apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄, sendo observado de forma anômala, concentração acima de 5%VolCH₄ durante um dia (31 de maio de 2023). No terceiro trimestre de 2023, apenas o poço 66B apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄, e em apenas uma medição acima de 5%VolCH₄ dentro da faixa de inflamabilidade. Apesar de ter apresentado concentração de forma atípica, o PM 66A apresentou concentração de 0,50%VolCH₄, cuja concentração foi monitorada, e foi considerada outline por não apresentar concentração nas demais medições. Os demais pontos se mantiveram com concentrações nulas ou abaixo de 1%VolCH₄.

➤ Análise de H₂S e CO no período de Abril de 2014 a Setembro de 2023

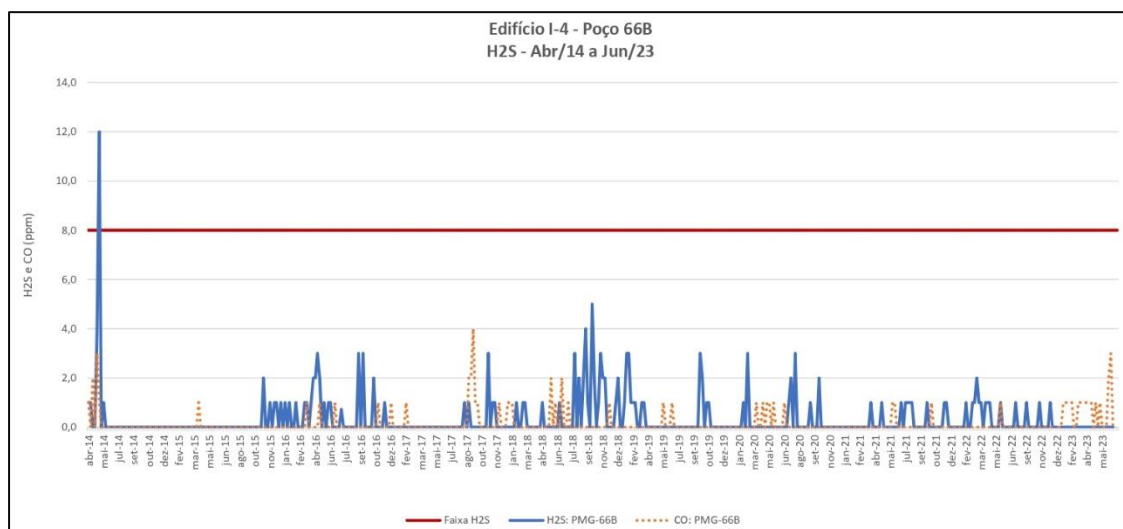

O gráfico de H₂S e CO demonstrou uma variação entre 1,0 e 5,0 ppm para o H₂S e entre 1,0 e 4,0 para o CO no PMG-66B, ambos abaixo do índice de inflamabilidade. No PMG-150B, anteriormente os valores se apresentavam nulos, a partir de janeiro de 2023 os valores variaram de 0 a 1,0 ppm. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica, porém a proporção é muito menor quando comparado ao CH₄.





CONJUNTO LABORATORIAL:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Junho de 2023

Poços existentes: 17 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: 12 A1; (PMG-51B, PMG 53B, PMG-54B, PMG-55B, 139B, 140B, 141B) A2; (PMG-62B)

Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

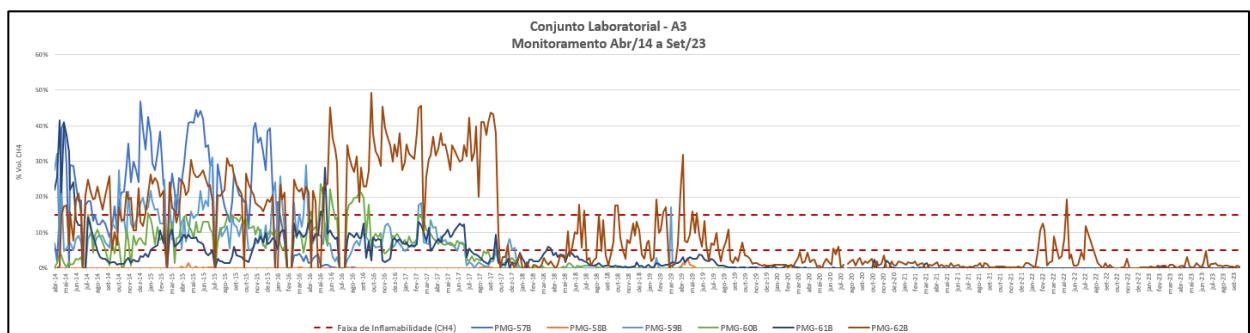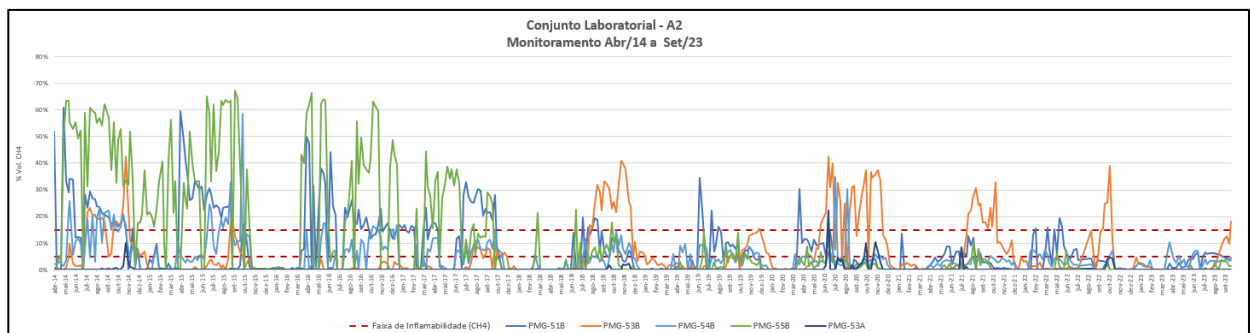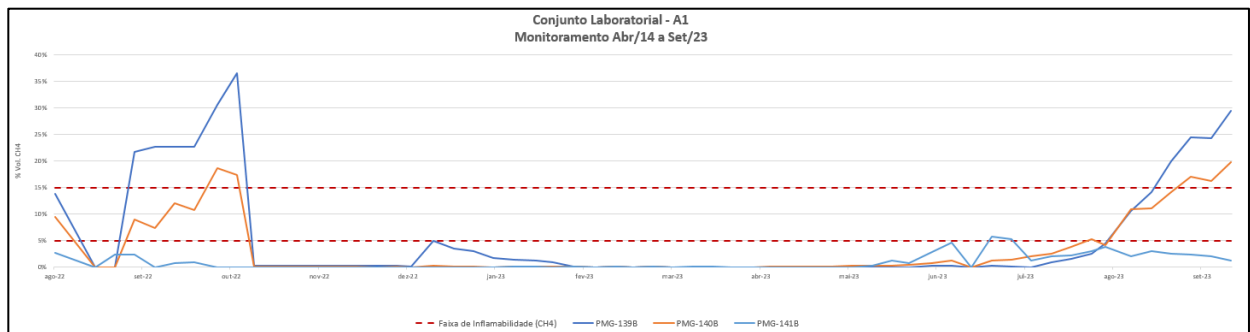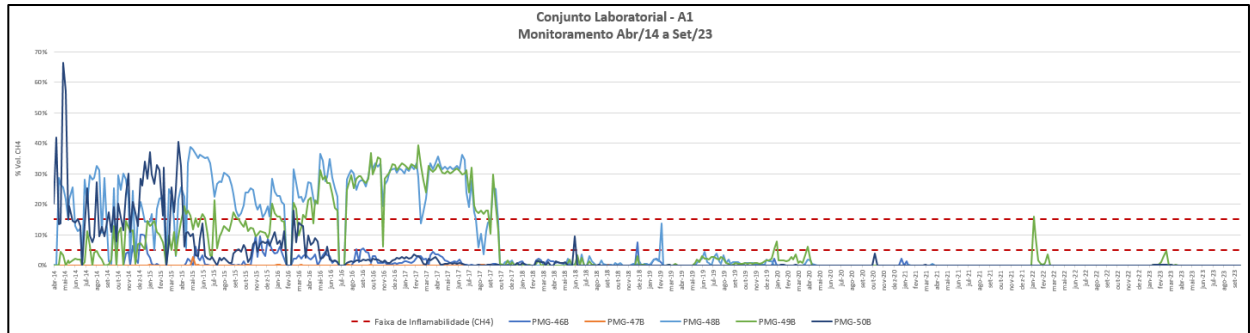

De forma geral, nota-se que os poços dos conjuntos laboratoriais A1 e A3 apresentaram concentrações acima da faixa de inflamabilidade de 2014 a 2017, passando a ficar abaixo de 5% desde então, com exceção do PMG-62B, que em 2019 apresentou concentrações de 5,0 a 30,0% VolCH₄.


No ano de 2021, observa-se que o conjunto laboratorial A2 apresentou um aumento em suas concentrações, passando a demonstrar valores acima da faixa de inflamabilidade nos poços PMG-51B, PMG-53A/B, PMG-54B e PMG-55B de até 32,90 % VolCH₄. Os poços PMG-46B, PMG-52B, PMG-61B e PMG-62B, durante todo referido ano demonstraram concentrações abaixo de 5%, chegando próximo a concentrações nulas.

Em 2022 nota-se um aumento nas concentrações dos três conjuntos laboratoriais (A1, A2 e A3), apresentando concentrações acima da faixa de inflamabilidade nos poços PMG-49B, PMG-51B, PMG-53-B, PMG-54B, PMG-55B e PMG-62B. No último trimestre os valores se mantiveram abaixo dos níveis de inflamabilidade.

Detectou-se concentração de Metano sob a laje do edifício Conjunto Laboratorial A2, no poço PMG-53A, em concentrações variáveis de 1,0 a 39,6% VolCH₄, em períodos pontuais. Este mesmo poço também apresentou concentrações nulas ou abaixo de 1% em outros períodos. Na porção profunda (PMG-53B) nota-se a persistência das concentrações, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (julho/2014), em valores variados, muitas vezes acima da faixa de inflamabilidade. No último trimestre de 2022, os valores se apresentaram abaixo do limite da faixa de inflamabilidade.

Nos meses de novembro de 2014, outubro de 2018 e junho a dezembro de 2021, foram detectadas concentrações de Metano acima de 1% no PMG-53A. Durante tal período os pontos de infraestrutura foram medidos com maior frequência e não foram detectadas concentrações de Metano na infraestrutura, indicando que a via de intrusão de vapores não se completou.

Quanto ao PMG-51B, no terceiro trimestre apresentou concentrações dentro da faixa de inflamabilidade em meados do mês de agosto, no entanto as concentrações diminuíram no fim do trimestre.

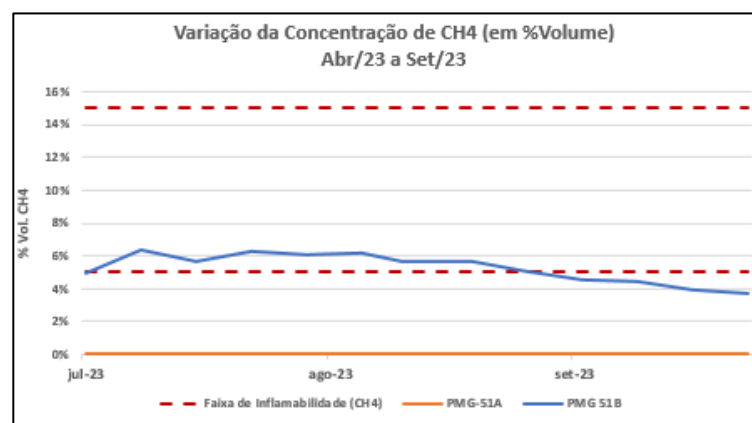

Observando os gráficos específicos das duas profundidades do conjunto monitorado (PMG-53 A e B) durante a linha do tempo de 2014 a 2021, percebe-se que tal situação é comum a este poço nesta época do ano, tendendo à diminuição das concentrações nos meses seguintes.


Também é possível notar que quando as concentrações na porção profunda (PMG-53B) superam valores a cerca de 25% VolCH₄ (junho a novembro/2014, julho a novembro/2018, junho a dezembro/2021), são detectadas concentrações na porção rasa (PMG-53A) iguais ou superiores a 1% VolCH₄. Nos mesmos meses citados, nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, houve aumento nas concentrações da porção profunda, porém em valores menores que 20% VolCH₄, e então na porção rasa verificou-se pequena influência destas concentrações, demonstrando valores sempre abaixo de 1% VolCH₄.

Nos anos de 2020 a 2021, o sistema de ventilação que opera para a área do A2 foi ajustado e teve sua pressão aumentada, variando de -2,0 a 20,0 mmHg, conforme o aumento das concentrações no poço PMG-53B, diminuindo assim a interferência na porção rasa (PMG-53A). Nos dois primeiros trimestres de 2022, as concentrações de Metano no PMG-53B se estiveram acima do limite da faixa de inflamabilidade de 10% de VolCH₄ e as concentrações no PMG-53A abaixo da faixa de inflamabilidade de 5%.

No primeiro trimestre de 2023, nota-se estabilidade dos valores de CH₄, se mantendo abaixo do nível de inflamabilidade de 5% para a porção rasa (PMG-53A), na porção mais profunda verificaram-se níveis acima do 1% VolCH₄, no entanto ainda abaixo da faixa de inflamabilidade.

No segundo trimestre de 2023, o PMG-53 apresentou concentrações abaixo de 1%VolCH₄ e portanto abaixo da faixa de inflamabilidade tanto da faixa rasa quanto a profunda.


No terceiro trimestre de 2023, o PMG-53 apresentou concentrações dentro da faixa de inflamabilidade no mês de agosto e setembro acima da faixa de inflamabilidade, no mês de julho no entanto os valores se encontravam abaixo de 5%VolCH₄. No fim do trimestre, as concentrações ultrapassaram a faixa de inflamabilidade (>15%VolCH₄) e acionado o plano de ação, como se tratava de medição no último dia do trimestre, as ações serão tomadas no próximo trimestre.

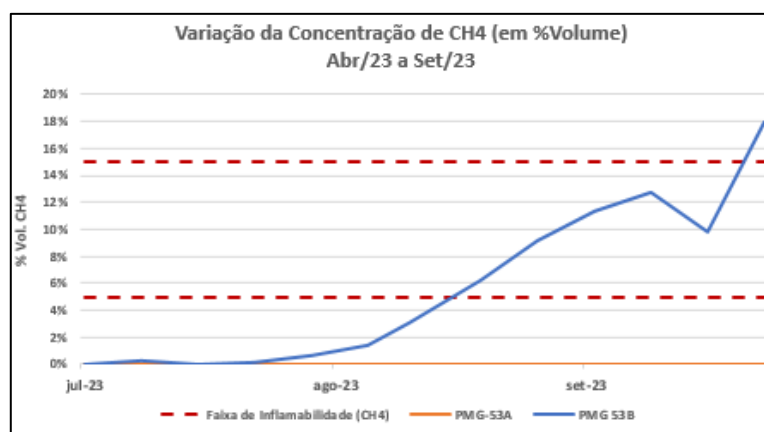

Detectou-se concentração de Metano sob a laje do edifício Conjunto Laboratorial A2, na porção profunda do poço PMG-54, em concentrações variáveis de 1,0 a 58,8% VolCH₄, em períodos pontuais. Este mesmo poço também apresentou concentrações nulas ou abaixo de 1% em outros períodos. Nota-se a persistência das concentrações, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (julho/2014), em valores variados, muitas vezes acima da faixa de inflamabilidade. Os valores identificados na porção profunda (PMG-54B) estiveram acima da faixa de inflamabilidade até o ano de 2020, quando os níveis de mantiveram dentro e abaixo da mesma.

No último trimestre de 2022, os valores se apresentaram abaixo do limite da faixa de inflamabilidade. O primeiro semestre de 2023, apresentaram concentrações acima de 1% VolCH₄ e acima de 5% VolCH₄, ou seja, acima da faixa de inflamabilidade por alguns períodos. A porção rasa do PMG-54 não apresentou concentrações acima de 1% VolCH₄ durante todo o período de avaliação.




No segundo trimestre de 2023, o PMG-54 apresentou concentrações acima de 5%VolCH₄ (dentro da faixa de inflamabilidade), sendo obtido o valor de pico de concentração de 7,10%VolCH₄ em 14 de junho de 2023. A porção rasa não apresentou concentrações. No terceiro trimestre, o PMG-54A/B apresentou concentrações abaixo da concentração de 5%VolCH₄.

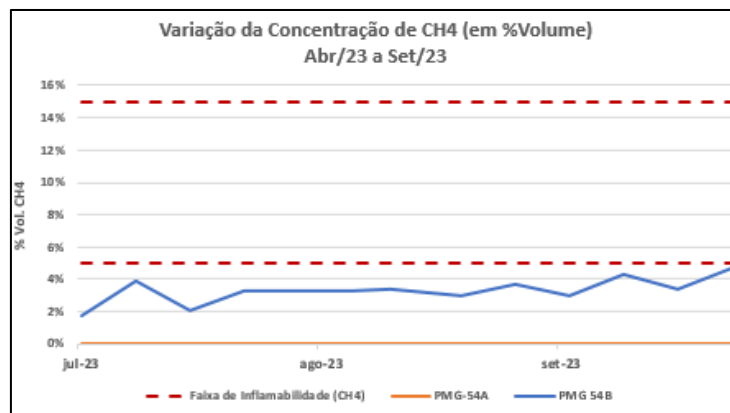

O PMG-139 apresentou concentração de VolCH₄ na porção profunda (PMG-139B) desde o início das medições em agosto de 2022, variando entre 36,5% VolCH₄ em outubro de 2022 a valores nulos identificados a partir da segunda quinzena de fevereiro de 2023. A porção rasa do poço de monitoramento de gases (PMG-139A) se manteve com valores nulos, não apresentando concentrações acima de 1% VolCH₄.





Durante o segundo trimestre de 2023, o PMG-139 não apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄. Os PMG-51B, PMG-62B, PMG-140 B e PMG-141B apesar de apresentarem concentrações acima de 1%Vol CH₄, os valores se mantiveram abaixo de 5%VolCH₄ e portanto abaixo da faixa de Inflamabilidade.

No terceiro trimestre de 2023, o PMG-139B apresentou concentrações dentro e acima da faixa de inflamabilidade, bem como o PMG-140B. O PMG-141B apresentou apenas uma medição dentro a faixa de inflamabilidade.

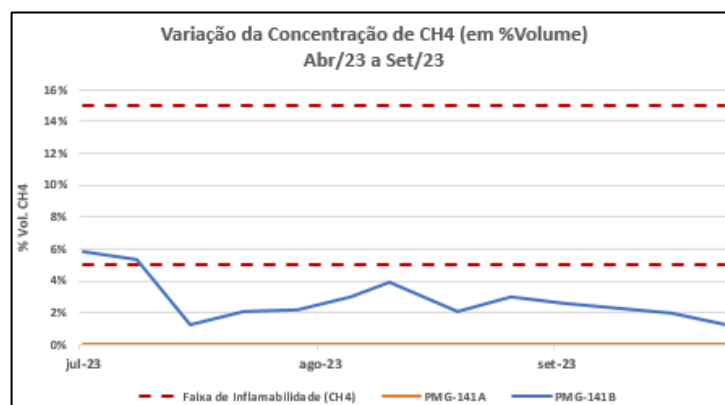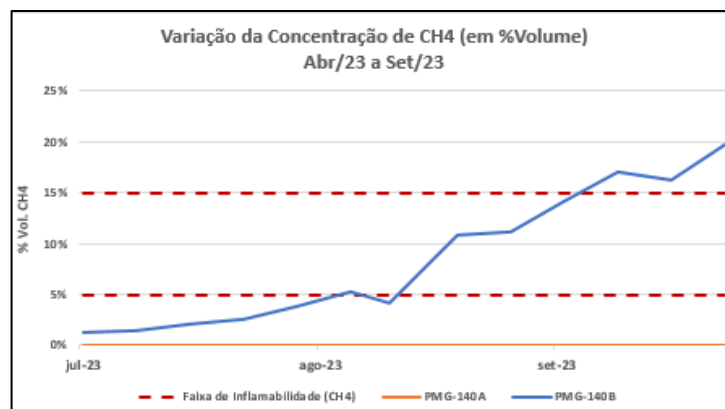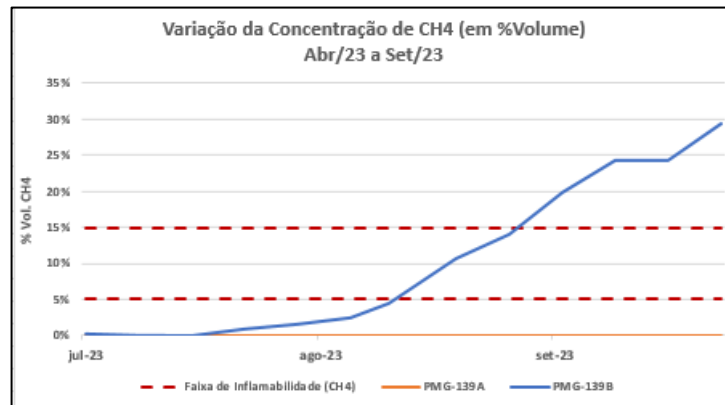

➤ Análise de H₂S e CO no período de Abril de 2014 a Junho de 2023

Os gráficos de H₂S e CO demonstram que houve uma variação nula para H₂S e CO, ambos abaixo do índice de inflamabilidade, exceto pelo PMG-53B que ultrapassou o limite de inflamabilidade em outubro de 2022. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica, porém a proporção é muito menor quando comparado ao CH₄.

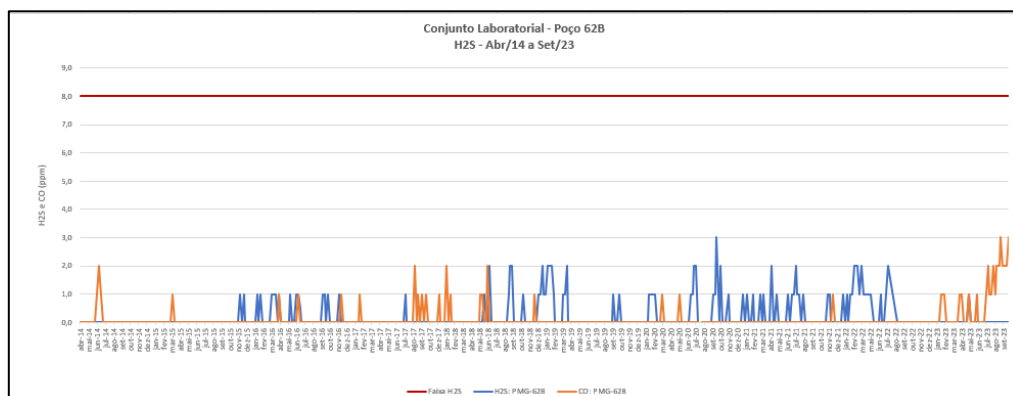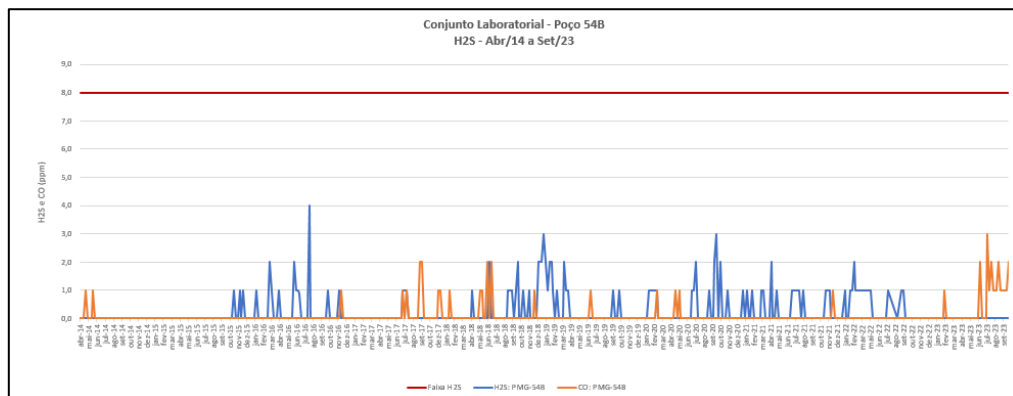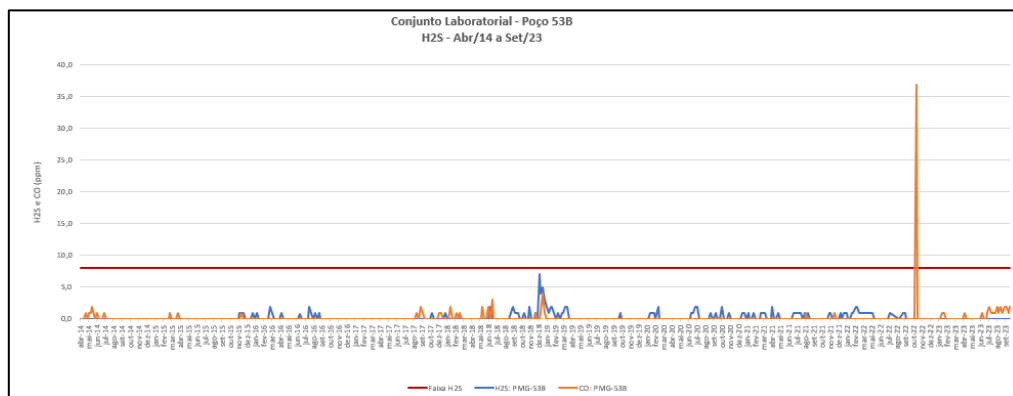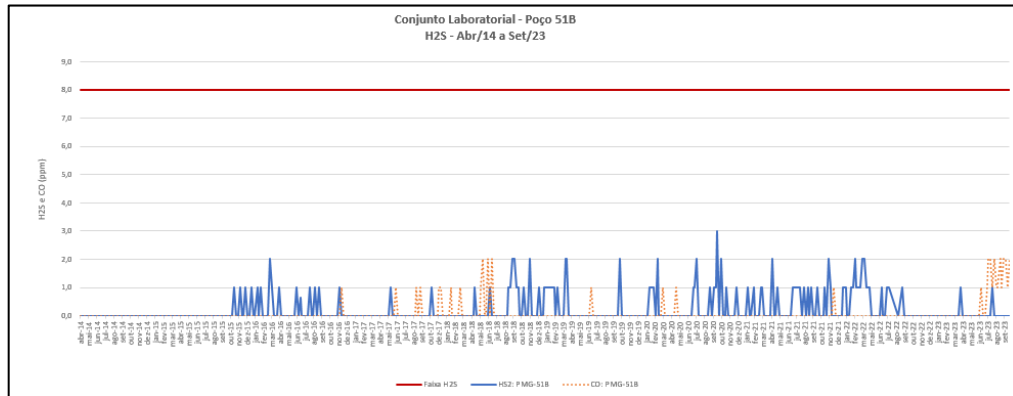


BLOCO INICIAL:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Setembro de 2023

Poços existentes: 14 pares


Poços que apresentaram concentração >1%: 11 (PMG-05B)

Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

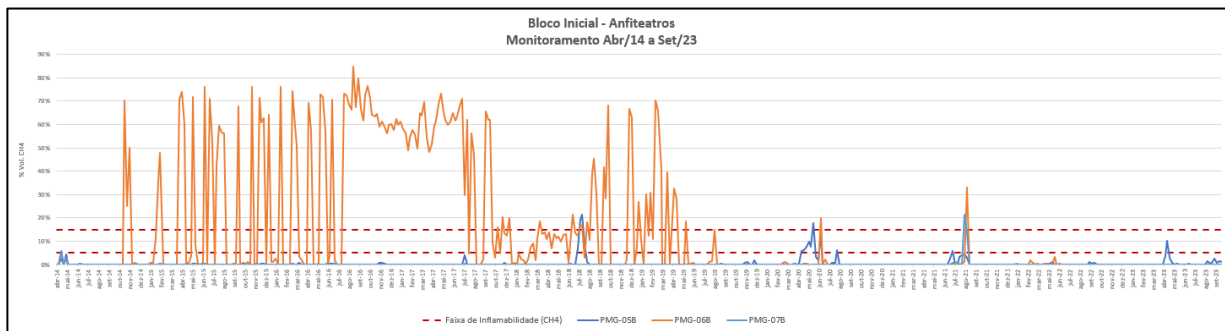

No Bloco dos Anfiteatros, o PMG-06B apresentou persistência das concentrações de Metano durante os anos de monitoramento, alcançando valores de 15 até 80% VolCH₄. Os poços PMG-05B e PMG-07B demonstraram concentrações eventuais de Metano no solo, porém sem persistência. Em 2022 somente o PMG-05B e o PMG-06B apresentaram concentrações de Metano, sendo estas inferiores a 5%, no último semestre se apresentando nulos.


No primeiro trimestre de 2023, as concentrações de todos os poços se mantiveram abaixo do nível de inflamabilidade, e não apresentaram valores acima de 1% VolCH₄. No segundo trimestre de 2023, somente o PMG-05B e apresentou concentração dentro da faixa de inflamabilidade em apenas uma das medições (17 de abril de 2023, considerado anômalo) as demais medições se mantiveram abaixo de 5%VolCH₄. No terceiro trimestre, o PMG-05 apresentou concentrações abaixo de 5%VolCH₄.

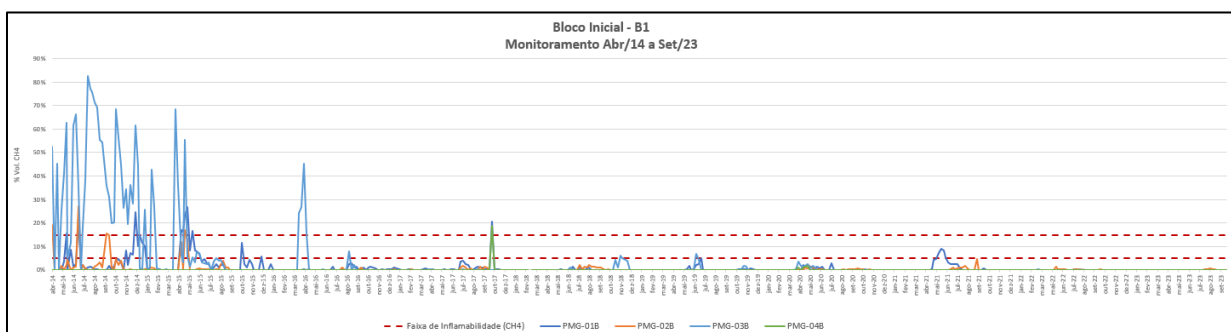


No Bloco B1, os PMG-01B e PMG-02B apresentaram persistência das concentrações de Metano durante os anos monitorados, alcançando valores maiores de 15% até o ano de 2015 e, a partir de 2016, demonstrando valores menores, abaixo de 5%. O PMG-01B em 2021 apresentou concentrações dentro da faixa de inflamabilidade, atingindo valores de até 8,9% VolCH₄.

O PMG-03B demonstra comportamento semelhante, alcançando valores de até 80% em 2014 e decaindo para 5% em novembro/2018. Em 2021, o PMG-03B apresentou somente

concentrações esporádicas abaixo de 1%. No PMG-04B detectou-se concentração de Metano no solo, porém sem continuidade (uma vez em outubro/2017). Em 2022 somente o PMG-02B apresentou concentrações, sendo estas abaixo de 5%, no último trimestre apresentaram concentrações nulas. No primeiro trimestre de 2023, as concentrações no Bloco B1 se encontravam nulas, bem como nos últimos trimestres analisados.

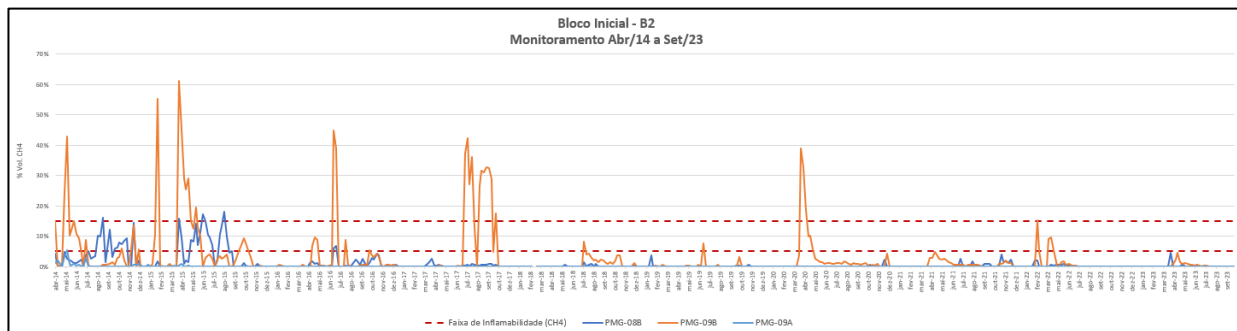


No Bloco B2, foram identificadas concentrações de metano acima do nível de inflamabilidade (15% VolCH₄) no período de abril de 2014 a março de 2022. Em maio de 2022, as concentrações se mantiveram abaixo da faixa de inflamabilidade em todos os poços de monitoramento. No primeiro trimestre de 2023, as concentrações do Bloco B2 se apresentaram nulas, exceto pelo ponto PMG-08B que apresentou concentração acima de 1% VolCH₄ em apenas uma medição realizada no mês de março. No segundo trimestre, somente o PMG-09B apresentou concentração acima de 1%VolCH₄, no entanto abaixo da faixa de inflamabilidade.

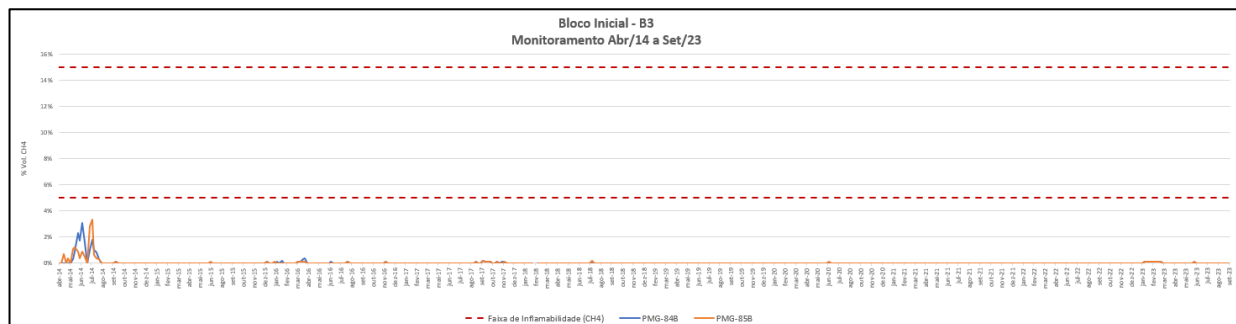

No Bloco B3, os PMG-84B e PMG-85B apresentaram concentrações de Metano no período de abril a outubro de 2014. Posteriormente à isso, as concentrações se mantiveram nulas ou abaixo de 1%.

➤ Análise de H₂S e CO no período de Abril de 2014 a Setembro de 2023

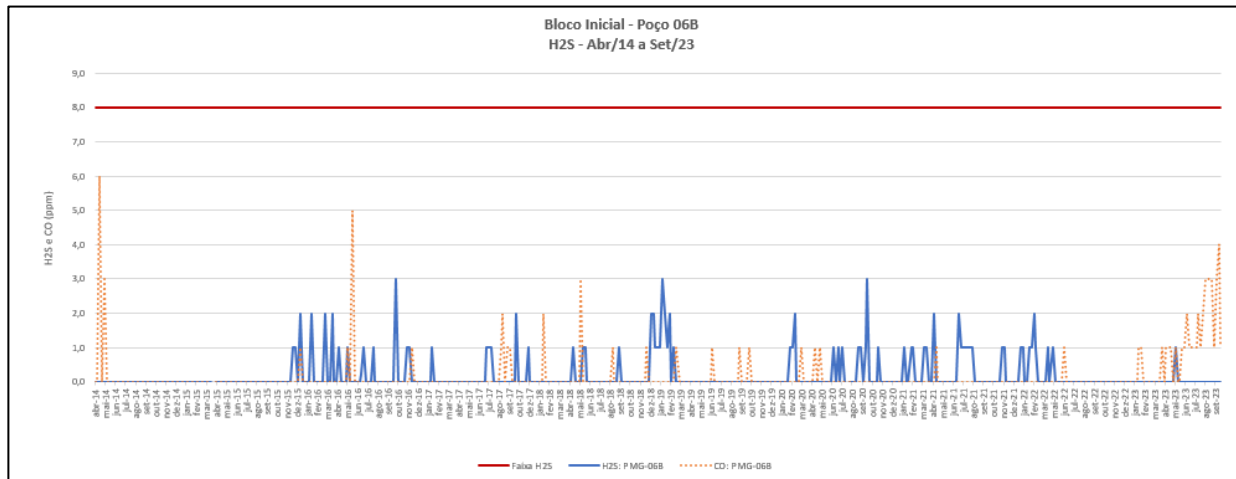

O gráfico de H₂S e CO demonstra que houve uma variação entre 1,0 e 3,0 ppm para H₂S e 1,0 e 6,0 para CO, ambos abaixo do índice de inflamabilidade. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica, porém a proporção é muito menor quando comparado ao CH₄. No último semestre de 2022, as concentrações se apresentaram nulas. No primeiro trimestre de 2023, as concentrações de CO apresentaram variações de concentração de 0 a 1,0 ppm. No terceiro trimestre de 2023, as concentrações de CO apresentaram pico de 4,0 ppm, enquanto as medições de H₂S estiveram nulas.


ENFERMARIA:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Setembro de 2023

Poços existentes: 07 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: 05 (PMG-74B e 165B)

Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

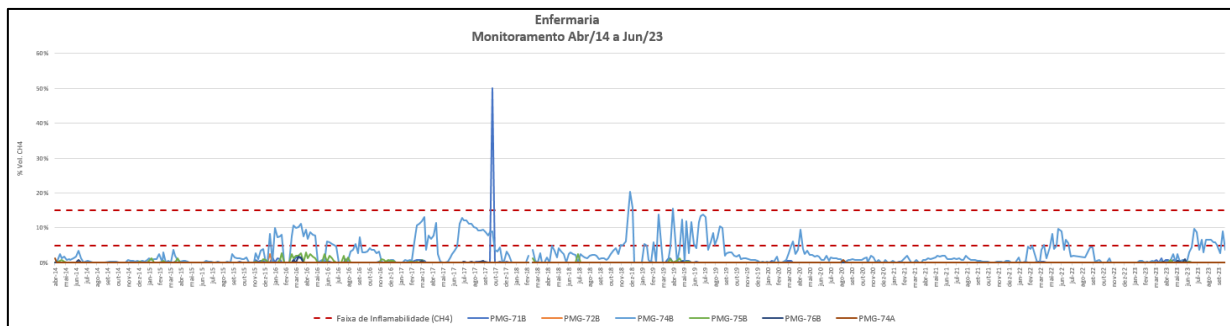



Durante os nove anos de monitoramento foi detectada somente uma vez a concentração de Metano sob a laje do edifício, no poço PMG-74A, com concentração de 1,4% em abril de 2014. Nos poços da porção profunda observa-se a persistência das concentrações, principalmente no PMG-74B, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (julho/2014), prevalecendo até o monitoramento atual (2023).

Em outros quatro poços também foram detectadas concentrações de Metano no solo, porém sem continuidade ou com valores abaixo da faixa de inflamabilidade, sendo eles: PMG-71B (de 1,1 a 1,6% entre janeiro e agosto/16 e 50% 1 vez em outubro/17); PMG-72B (2,5% em janeiro/16); PMG-75B (valores eventuais entre 1,0 e 3,0 %) e PMG-76B (cerca de 1% entre mar e abril/16). Em 2022, os valores permaneceram nulos ou abaixo de 1%, exceto o PMG-74B que apresentou valores nulos apenas em dezembro de 2022.

No primeiro trimestre de 2023, os valores permaneceram nulos ou abaixo de 1%, exceto pelo PMG-71B, que apresentou valores acima de 1% VolCH₄ em uma medição, no entanto abaixo da faixa de inflamabilidade de 5% VolCH₄ no mês de março de 2023.


No segundo trimestre de 2023, o PMG-74B apresentou concentrações acima de 5% VolCH₄, sendo a concentração mais alta de 9,80%VolCH₄. O PMG-76B apresentou concentração acima de 1%VolCH₄ durante apenas uma das medições, considerado anômalo.

No terceiro trimestre de 2023, o PMG-74B e PMG-165B apresentaram concentrações acima de 5%VolCH₄, dentro da faixa de inflamabilidade.

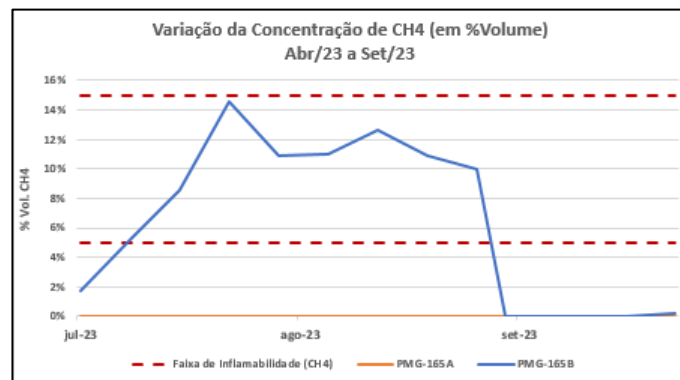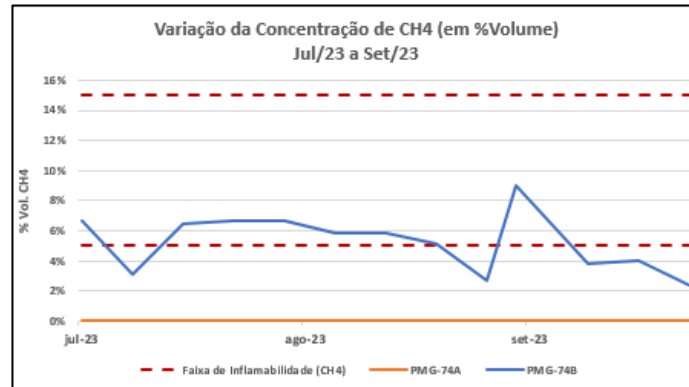

CAT-1 E INCUBADORA (CAT-2):

- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Junho de 2023
Poços existentes: 13 pares (07 no CAT-1 e 06 no CAT-2)
Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma
Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

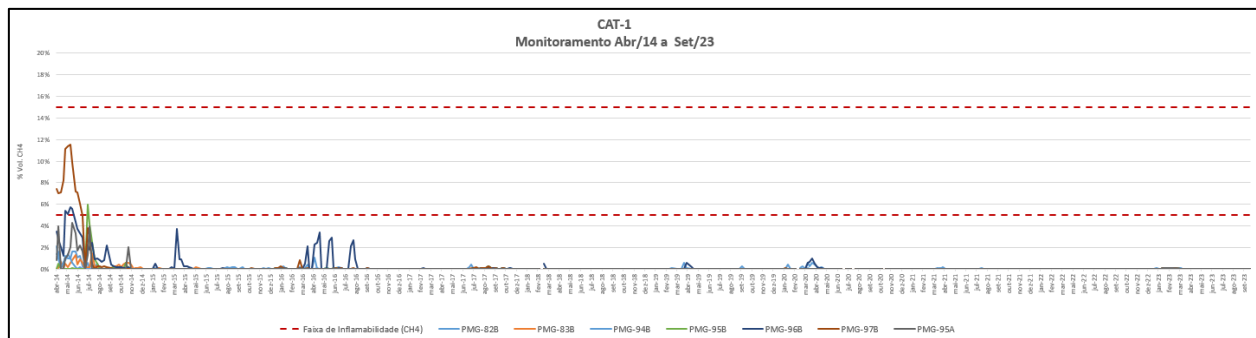

Ao longo de nove anos de monitoramento foi detectada concentração de Metano sob a laje do edifício Enfermaria apenas no PMG-95A, com concentrações variáveis entre 1,0 a 4,0% VoCH₄, que perduraram de abril a novembro de 2014. Posteriormente, as leituras neste ponto permaneceram nulas ou abaixo de 1%.

Nos poços da porção profunda nota-se a redução das concentrações em todos os poços, após o início da operação do sistema de ventilação em julho/2014, sendo que após isso estas se mantiveram abaixo de 5% de CH₄ ou nulas.

No primeiro trimestre de 2023, as concentrações em todos os poços se apresentaram nulas ou abaixo de 1% VoCH₄.

No segundo e terceiro trimestre de 2023, as concentrações em todos os poços se mantiveram nulas ou abaixo de 1% VoCH₄.


GINÁSIO:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Junho de 2023

Poços existentes: 3 pares + 08 poços

Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma

Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

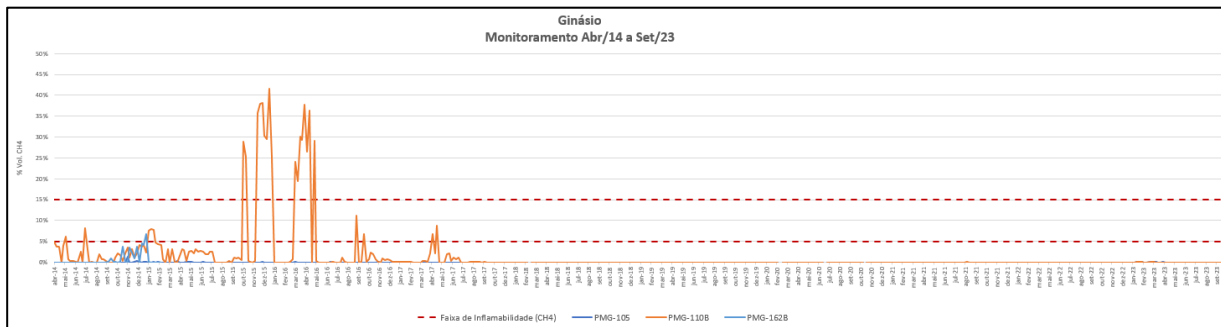

Ao longo dos anos de monitoramento não foram detectadas concentrações de Metano sob a laje do edifício. Percebe-se que com o início da operação do sistema de ventilação (setembro/15) houve um aumento inicial das concentrações no PMG-110B, mas que a partir de julho/2017 os valores das concentrações foram reduzidos para abaixo de 1% ou nulos, permanecendo dessa forma até então.

O PMG-162B, porção rasa do poço de monitoramento apresentou concentrações de nulas a inferior a 1% VolCH₄ até janeiro de 2023. Após esse período as concentrações variam acima de 1% até o valor nulo, no entanto abaixo do nível de inflamabilidade de 5% VolCH₄.

No segundo trimestre de 2023, o PMG-162 apresentou concentração acima de 1%VolCH₄ durante o mês de abril de 2023, e acima de 5%VolCH₄ em maio de 2023, durante o mês de junho de 2023, os valores voltaram a se apresentar nulos ou abaixo de 1%.

No terceiro trimestre de 2023, os valores de todos os poços apresentaram valores nulos.

GUARDA UNIVERSITÁRIA:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Dezembro de 2022

Poços existentes: 3 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhum

Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

O sistema de ventilação foi iniciado em julho de 2014 e os poços de monitoramento da guarda universitária foram instalados em julho de 2015. Nenhum par apresentou concentrações significativas de Metano (>1%VolCH₄) durante todo o período de monitoramento.

O sistema de ventilação no edifício da guarda universitária foi desligado e o monitoramento foi interrompido em maio/2019 devido à reforma do prédio. Em junho de 2020 a obra foi finalizada e constatou-se que os poços instalados na área foram tamponados, portanto, foi realizada a reinstalação destes pontos. O monitoramento foi retomado e as concentrações se mantiveram nulas.

Em 2021 foi possível observar pontualmente no mês de outubro, concentrações de até 1,30% de Metano no PMG-126B. Contudo, nos demais poços foram verificados valores abaixo de 1% ou nulos.

Em 2022 e 2023, todos os poços se mantiveram nulos.


PORTARIA P3:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2023

Poços existentes: 2 Trios

Poços que apresentaram concentração >1%: 1 (PMG-120C)

Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

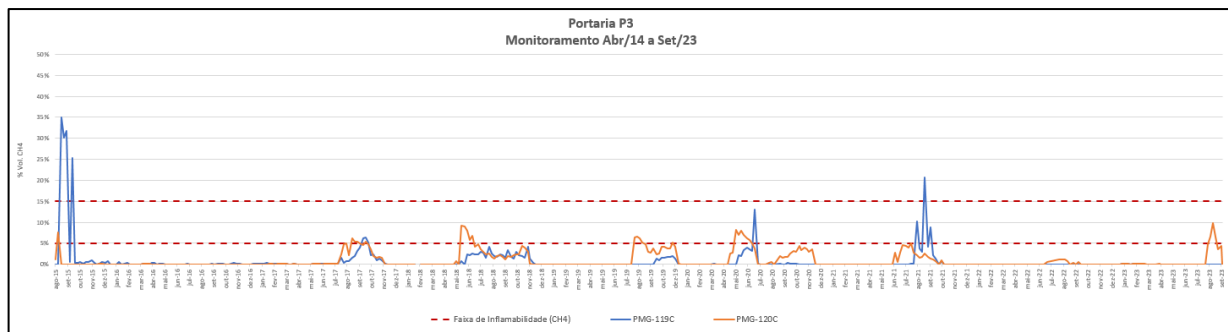

Na Portaria P3, foi detectada uma segunda laje sob o piso. Sendo assim, os poços de monitoramento neste edifício foram instalados em três profundidades: A (sob a primeira laje ~0,30m); B (sob a segunda laje, no tapete de brita ~1,00m); e C (no solo ~1,30m).

Neste edifício o sistema de ventilação foi iniciado em junho/2014 e os poços de monitoramento instalados em julho/2015.

Ao longo do monitoramento, entre ago/2015 e dez/2020, não foram detectadas concentrações de Metano sob as lajes do edifício (0,30 a 0,50m). Nota-se que os meses seguintes à instalação dos poços de monitoramento (agosto e setembro/2015) foram detectadas as concentrações mais elevadas nos poços profundos e, posteriormente estas concentrações mantiveram-se nulas ou abaixo de 1%VolCH₄.

Nos anos de 2020 e 2021, os poços PMG-119C e PMG-120C apresentaram concentrações de até 20,60%Vol CH₄. É possível observar que o aumento das concentrações sempre acontece no segundo semestre do ano.

Em 2022, as concentrações de Metano no PMG-119C se mantiveram nulas e a do PMG-120C esteve inferior a 5% VolCH₄, apresentando valor nulo ao fim do trimestre. Em 2023, as concentrações de metano se mantiveram nulas ou em valor inferior a 1% VolCH₄ em ambos os poços de monitoramento de gás.

No segundo trimestre de 2023, as concentrações se mantiveram nulos ou em valor inferior a 1%VolCH₄. No terceiro trimestre, o poço PMG-120C apresentaram concentrações dentro da faixa de inflamabilidade, atingindo o valor de até 9,90%VolCH₄.


TRANSPORTES:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Junho de 2023

Poços existentes: 4 Pares

Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma

Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

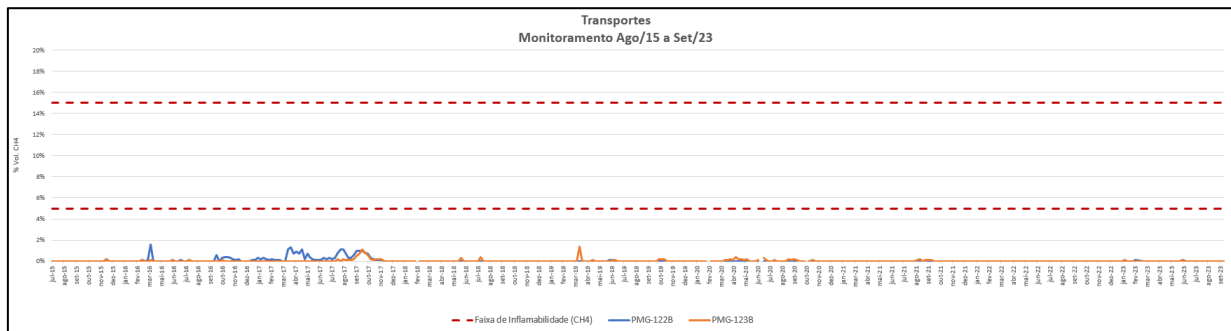

Neste edifício o sistema de ventilação foi iniciado em junho/2014 e os poços de monitoramento instalados em julho/2015.

Ao longo do monitoramento até o presente momento, não foram detectadas concentrações de Metano sob a laje do edifício. Eventualmente, na porção profunda, ocorrem detecções de metano variando entre 1,1 a 1,6%VolCH₄. Desde o final de 2021 as concentrações encontram-se nulas.

No primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2023, as concentrações foram identificadas nulas ou abaixo de 1% VolCH₄.

6. RESULTADOS OBTIDOS NO 3º TRIMESTRE

As medições no terceiro trimestre de 2023 (julho a setembro/2023) ocorreram de forma efetiva nos poços de monitoramento e infraestrutura. Os sistemas de ventilação operaram normalmente.

Porém, durante o 3º trimestre de 2023, houve uma interrupção da medição de alguns dos poços, devido ao acesso negado a equipe técnica, tais como os PMG-46, PMG-47, PMG-48, PMG-49, PMG-50, PMG-56, PMG-58, PMG-59, PMG-60, PMG-61, PMG-137, PMG-148 no Conjunto Laboratorial e PMG-82, PMG-83, PMG-94, PMG-95, PMG-96, PMG-97, PMG-98, PMG-160 e PMG-51 no CAT durante alguns dias de eventos no local de estudo. Contudo, tal situação foi brevemente contornada, sem causar prejuízo ao andamento dos trabalhos. E no PMG-57 com acesso restrito temporariamente por solicitação da contratante. Ainda salienta-se que a operação dos sistemas de ventilação se manteve inalterada, operando por todo o período 24 horas por dia, 30 dias por mês.

Durante este trimestre, foram utilizados para medição dos gases os equipamentos BW nº de série SK317-003329, BW nº de série SK317-003332 e o GEM 5000 nº de série G500491.

Os resultados do monitoramento e operação foram compilados neste relatório trimestral de forma a abordar uma visão geral sobre a variação das concentrações de Metano na área de estudo, e principalmente avaliar a ocorrência de intrusão em ambientes fechados.

A seguir são apresentados os dados compilados de monitoramento (**Item 6.1**) e de operação dos sistemas (**Item 6.2**).

6.1. RESULTADOS DO MONITORAMENTO EM POÇOS E NA INFRAESTRUTURA

As medições realizadas nos poços de monitoramento indicaram que as concentrações de Metano acima de 1%Vol estão localizadas em pontos específicos da área de estudo e não abrangem toda a extensão dos edifícios, além de estarem localizadas nas porções mais profundas (cerca de 1,0m).

Os poços nas porções profundas que demonstraram concentrações acima de 1%VolCH₄ neste trimestre foram: PMG-05B, PMG-11B, PMG-51B, PMG-53B, PMG-54B, PMG-55B, PMG-62B, PMG-66B, PMG-74B, PMG-120C, PMG-139B, PMG-140B, PMG-141B e PMG-165B.

Para os poços nas porções rasas, não foram detectadas concentrações de Metano acima de 1%VolCH₄

Os demais poços rasos e profundos não demonstraram concentrações significativas (>1%Vol) de Metano.

Quanto às medições de H_2S e CO nos poços de monitoramento, foram obtidas concentrações de 5,0 e 1,0, respectivamente. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica. Para VOC, foram constatadas concentrações No PMG-11B no trimestre em questão.

Sobre as medidas de pressão, os valores entre -0,2 a 0,2 mBar são considerados como faixa de variação do equipamento. Sendo assim, foi observada pressão em alguns poços de monitoramento, positiva de até 13,00 e negativa de até -0,12 mBar. Essa variação de pressão pode relacionar-se com a operação dos sistemas e/ou com a variação do nível d'água local.

As medições na infraestrutura, que contemplaram ralos e caixas de passagem em todas as edificações, bem como os ambientes com pouca circulação de ar, detectaram concentrações de Metano e de VOC nos ralos 26, 66 e 69, os ralos 66 e 69 se encontram lado a lado, estando localizados em área onde não foram encontradas concentrações significativas de metano, o que pode indicar fatores externos.

Os **Anexos 3 e 4** apresentam as planilhas de monitoramento semanal dos poços e quinzenal dos pontos de infraestrutura.

Visando facilitar a observação dos resultados obtidos, foram destacados na **Tabela 6.1.1** e na **Figura 6.1.1**, os poços que apresentaram concentração de Metano ao menos uma vez acima de 1%Vol durante o trimestre analisado, a fim de avaliar a distribuição dos poços com concentrações próximas ou na faixa de inflamabilidade de Metano.

A **Figura 6.1.2**, apresenta as plumas de isoconcentração de Metano do terceiro trimestre de 2023.



Os gráficos de concentrações a seguir exibem a variação da concentração semanal de Metano nos poços de monitoramento que demonstraram ao menos uma vez a presença de Metano acima de 1%Vol, a fim de acompanhar a concentração recorrente de Metano nos Poços, mesmo que abaixo da faixa de inflamabilidade.

O **Anexo 5** apresenta a evolução das concentrações e pressões obtidas desde o início do monitoramento em abril/14 até setembro/23.

Tabela 6.1.1 – Resultados dos poços com concentração igual ou maior que 1%VolCH₄ (Julho a Setembro/2023)

Distribuição dos Gases nos Edifícios (3º Trimestre/2023)												
EDIFÍCIOS	Total de Poços	jul/23				ago/23				set/23		
		Poços ≥ 1%VolCH ₄		Posição	≥ Faixa 5-15%	Poços ≥ 1%VolCH ₄		Posição	≥ Faixa 5-15%	Poços ≥ 1%VolCH ₄		Posição
Edifício I-1	17 Pares	Nenhum				1	PMG-11B	Profundo (1,00 m)	Não	Nenhum		
Edifício I-3 e I-5	21 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum		
Edifício I-4	12 Pares	Nenhum				1	PMG-66B	Profundo (1,00 m)	SIM	Nenhum		
Conjunto Laboratorial	17 Pares	4	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-
			PMG-51B	Profundo (1,00 m)	SIM		PMG-51B	Profundo (1,00 m)	SIM		PMG-51B	Profundo (1,00 m)
			-	-	-		PMG-53B	Profundo (1,00 m)	SIM		PMG-53B	Profundo (1,00 m)
			PMG-54B	Profundo (1,00 m)	Não		PMG-54B	Profundo (1,00 m)	Não		PMG-54B	Profundo (1,00 m)
			-	-	-		PMG-55B	Profundo (1,00 m)	Não		PMG-55B	Profundo (1,00 m)
			PMG-62B	Profundo (1,00 m)	Não		-	-	-		-	-
			-	-	-		PMG-139B	Profundo (1,00 m)	SIM		PMG-139B	Profundo (1,00 m)
			PMG-140B	Profundo (1,00 m)	Não		PMG-140B	Profundo (1,00 m)	SIM		PMG-140B	Profundo (1,00 m)
			PMG-141B	Profundo (1,00 m)	SIM		PMG-141B	Profundo (1,00 m)	Não		PMG-141B	Profundo (1,00 m)
Bloco Inicial	14 Pares	Nenhum				1	PMG-05B	Profundo (1,00 m)	Não	1	PMG-05B	Profundo (1,00 m)
Enfermaria	7 Pares	2	PMG-74B	Profundo (1,00 m)	SIM	2	PMG-74B	Profundo (1,00 m)	SIM	1	PMG-74B	Profundo (1,00 m)
			PMG-165B	Profundo (1,00 m)	SIM		PMG-165B	Profundo (1,00 m)	SIM		-	-
CAT	7 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum		
Incubadora	6 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum		
Ginásio	11 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum		
Guarda Universitária	7 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum		
Portaria P3	2 Trios	Nenhum				1	PMG-120C	Profundo (1,00 m)	SIM	1	PMG-120C	Profundo (1,00 m)
Transportes	4 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum		

Fonte: Dados de Campo, Engesolve, 2023.

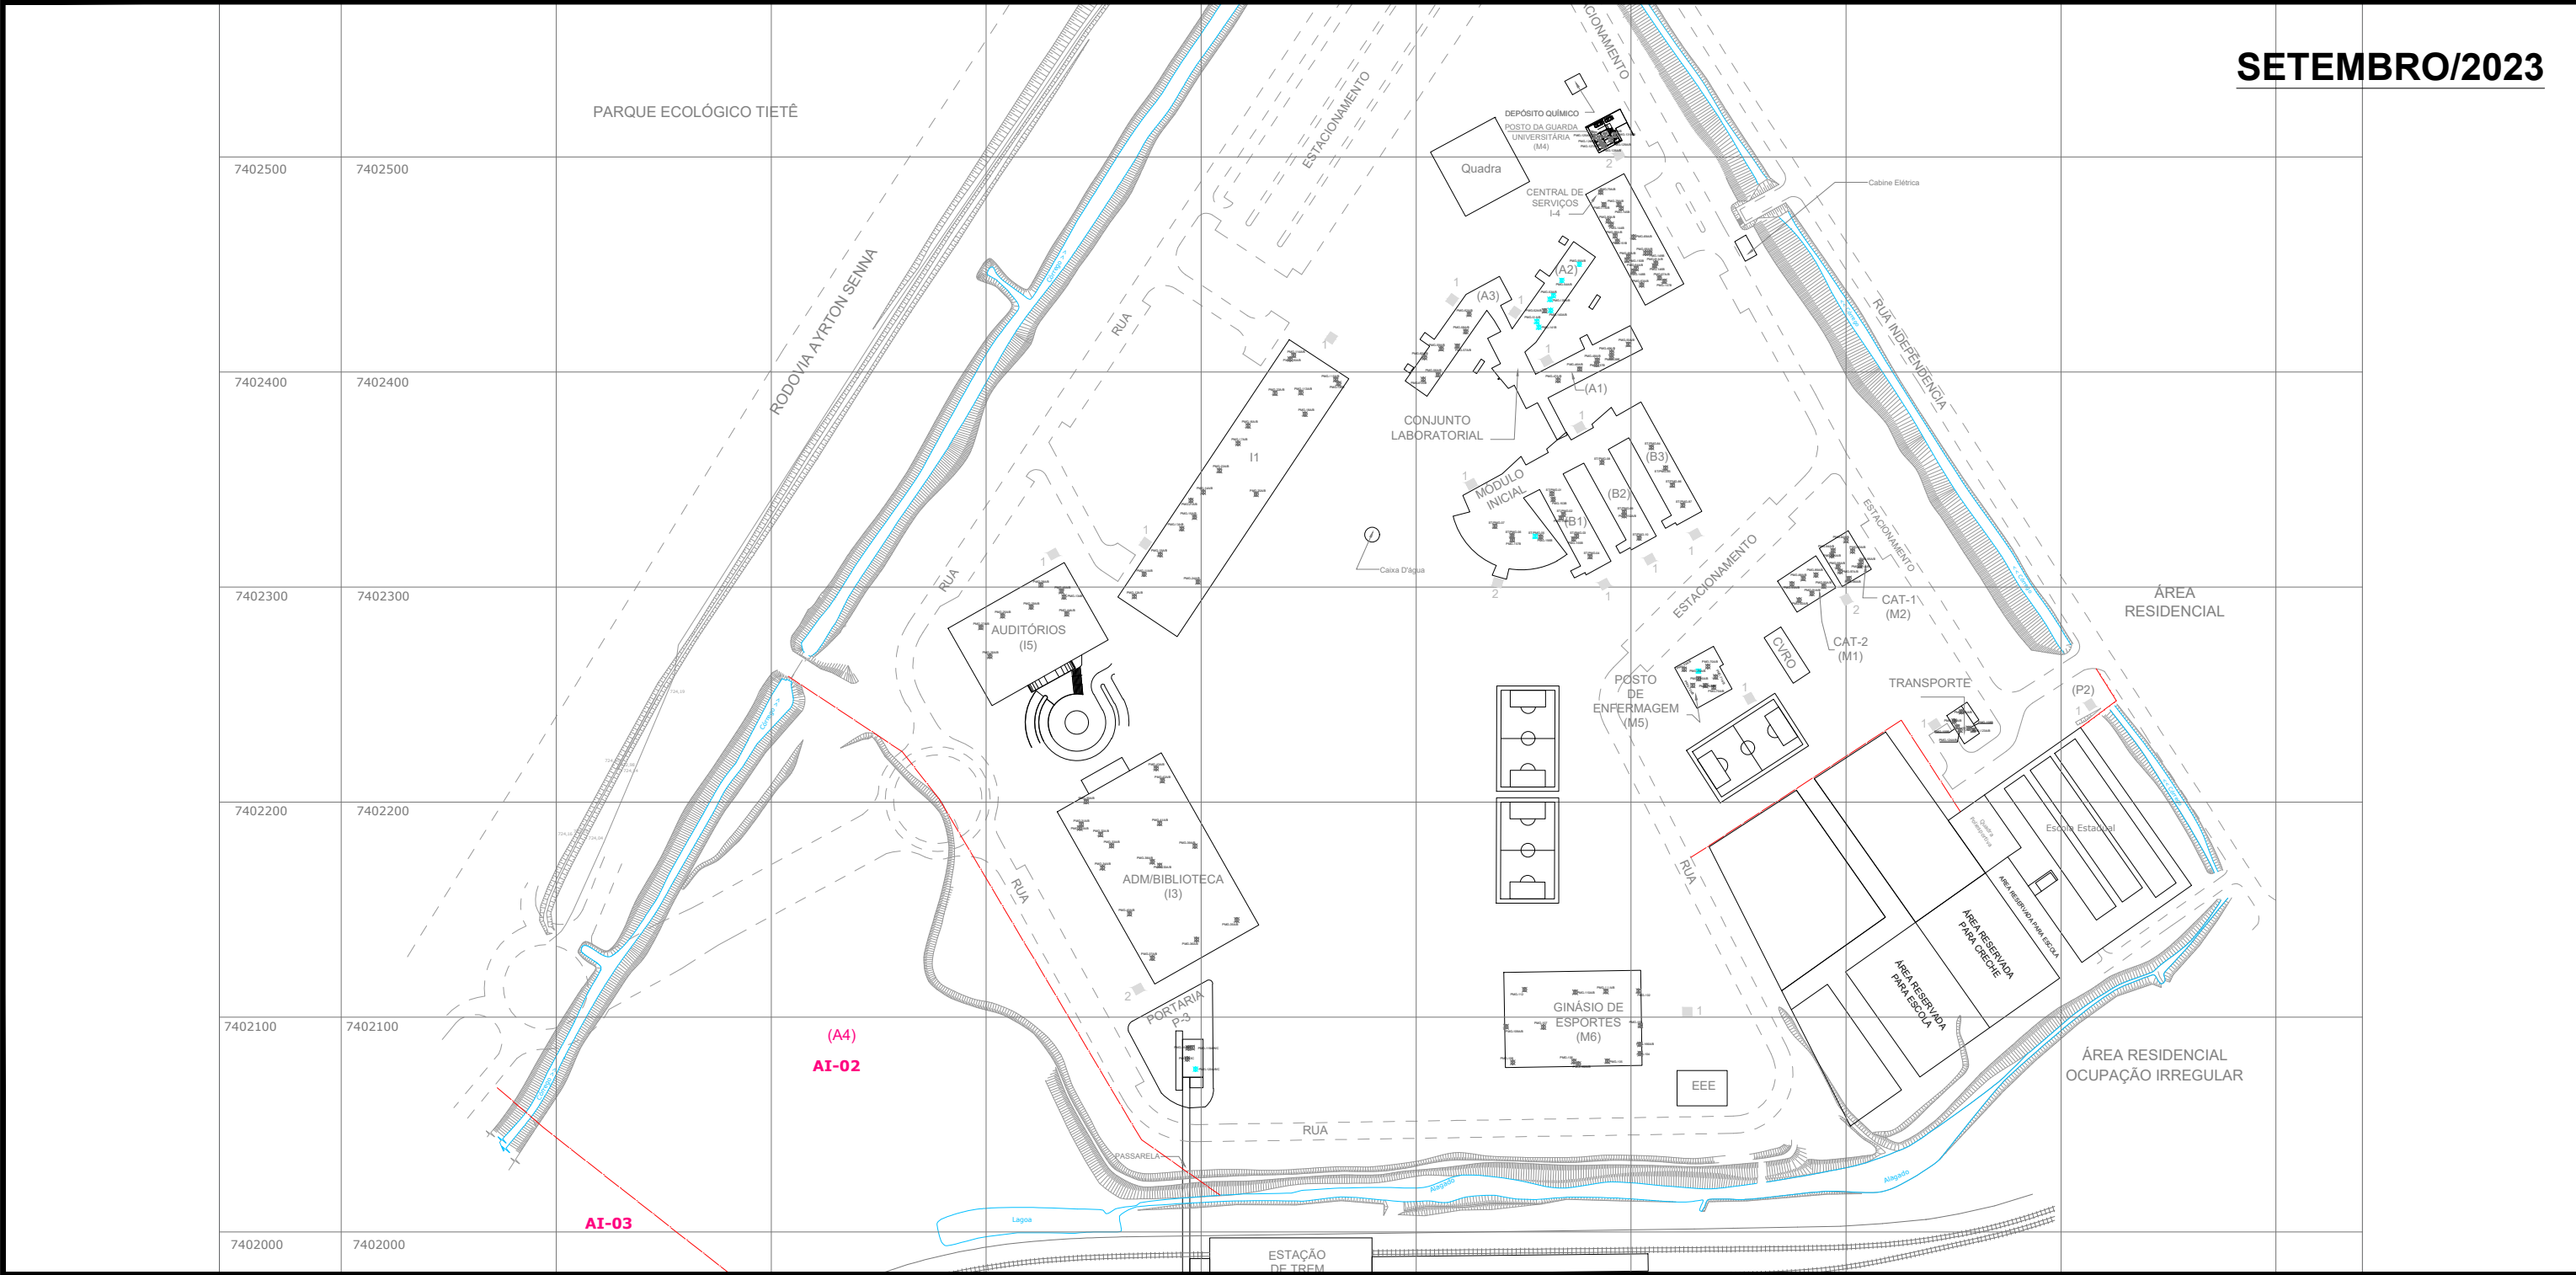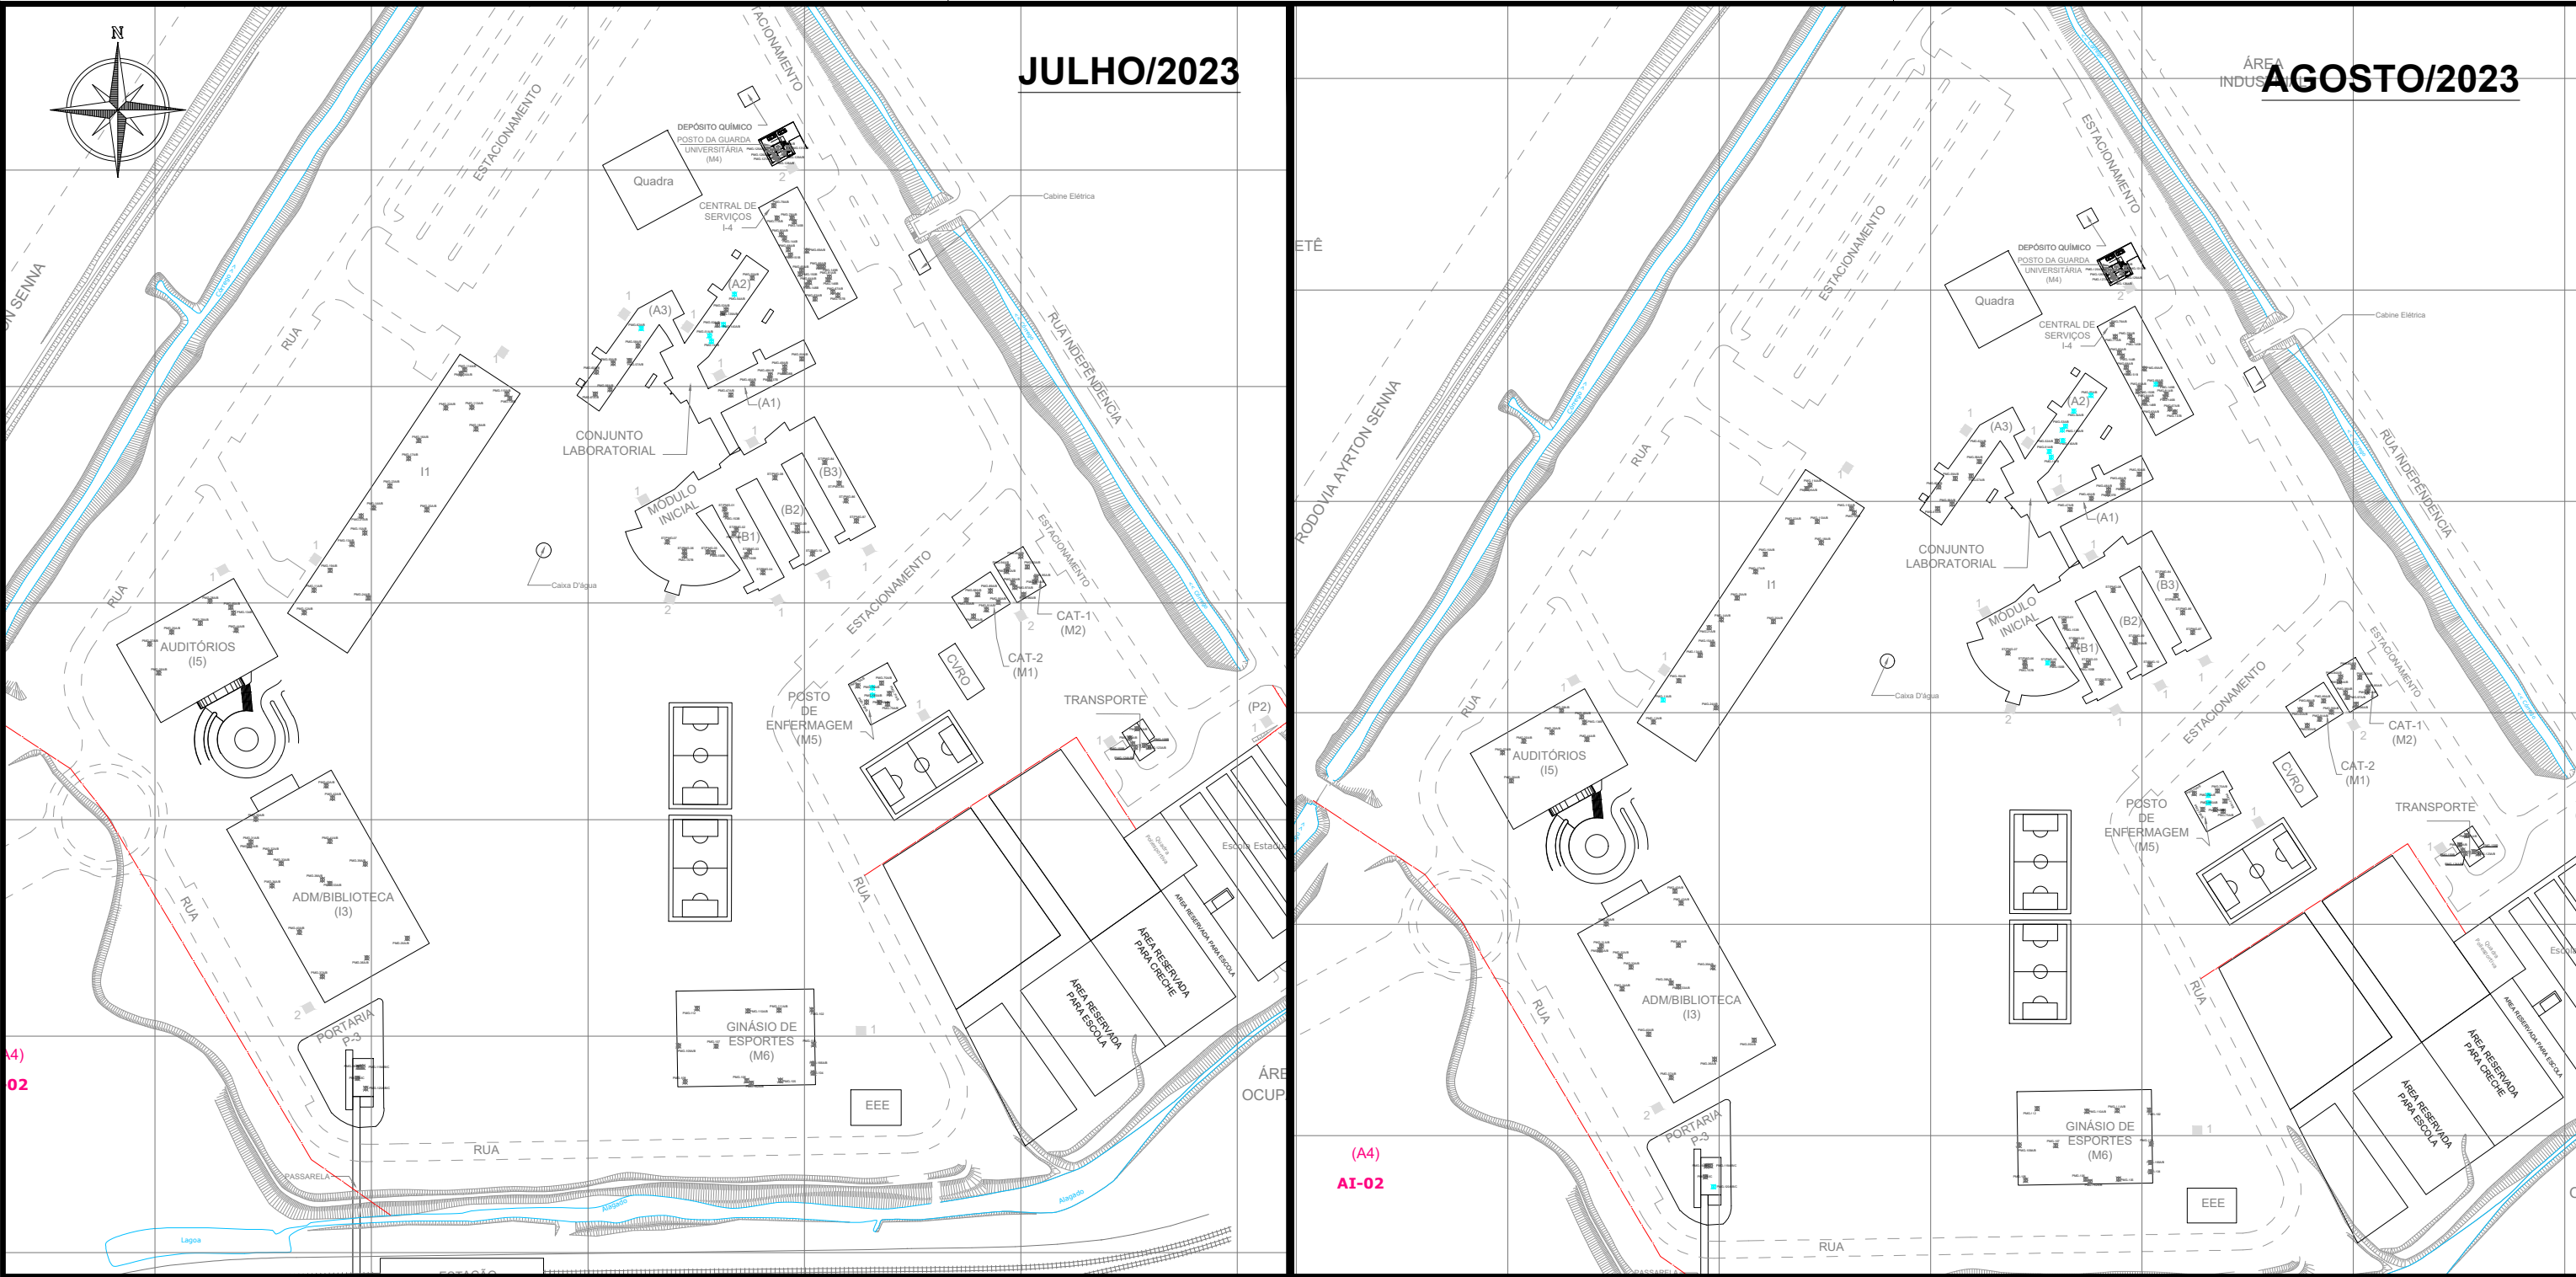

CLIENTE: Universidade de São Paulo - USP Leste		
PROJETO: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação		
ENDEREÇO: Rua Arlindo Bétio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP		
TÍTULO: Resultado da Distribuição das Concentrações de Metano Detectadas >1%Vol (Julho a Setembro/2023)		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Chufi	FIGURA Nº: 6.1.1	DATA: OUT/2023




LEGENDA:

- Taludes
- Abrigo para equipamento
- Quantidades de exaustores nos abrigos
- Cerca de divisa
- Guia e Estacionamento
- Edificações
- Poço de monitoramento de gás
- Poço com concentração de CH4 > 1% na porção profunda (1,00 m)

Escala de cores de Isoconcentração de Metano (%Vol.CH4)

> 50,0
15,0 - 50,0
5,0 - 15,0
1,0 - 4,9
0,0 - 0,9

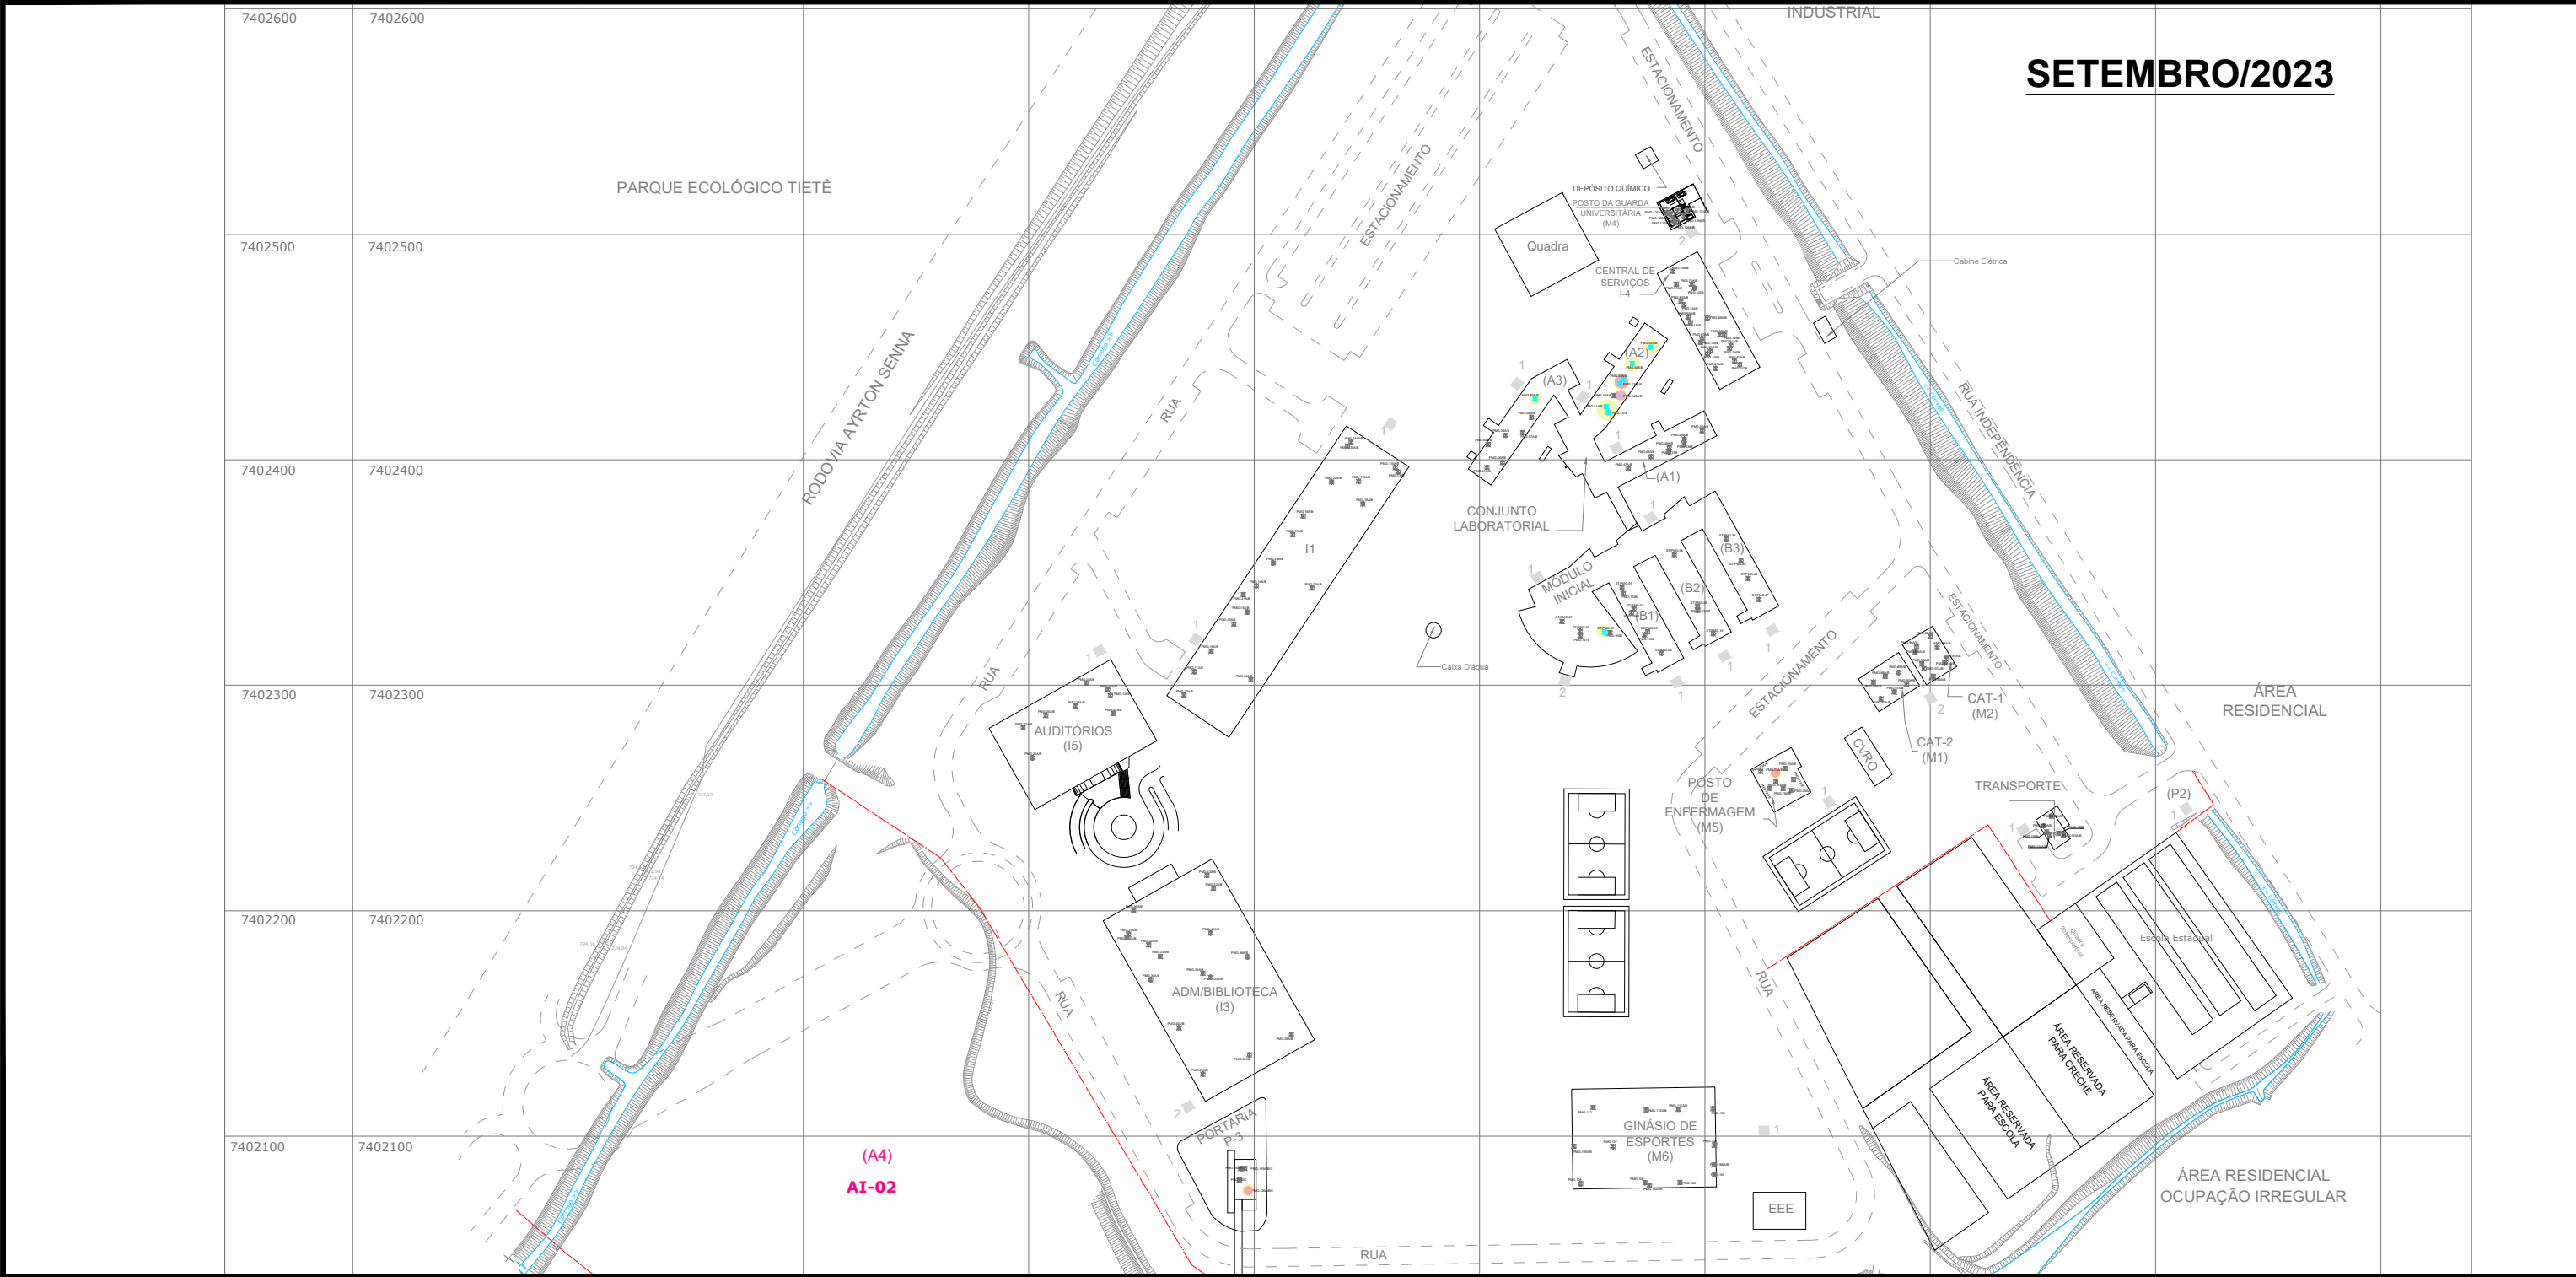

SETEMBRO/2023

Escala Gráfica:

0 31,5 63 94,5 126m

CLIENTE:
Universidade de São Paulo - USP Leste

PROJETO:
Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação

ENDEREÇO:
Rua Arlindo Bétio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP

TÍTULO:
Pluma de Isoconcentração de Metano no Solo no Horizonte B (1 metro de Profundidade) no período de Julho a Setembro de 2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Felipe Chufi




FIGURA Nº:
6.1.2

DATA:
OUT/2023


EngeSolve
SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS



Engesolve
SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS

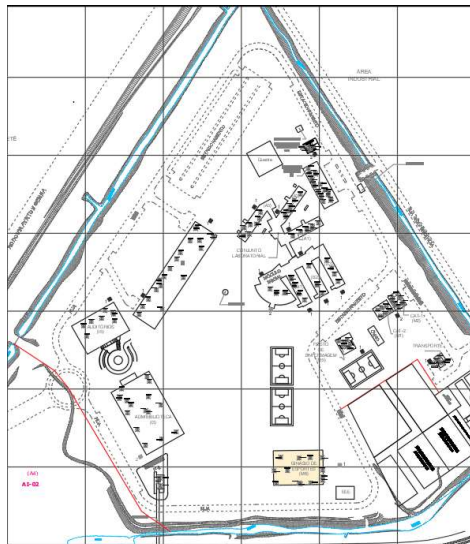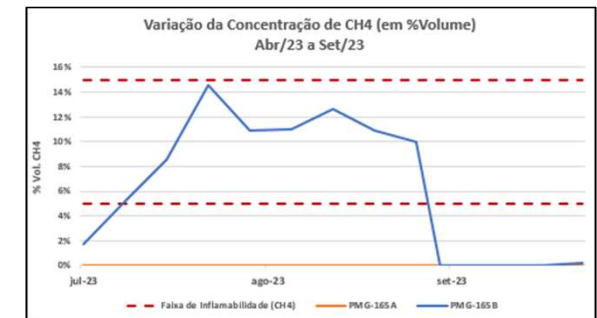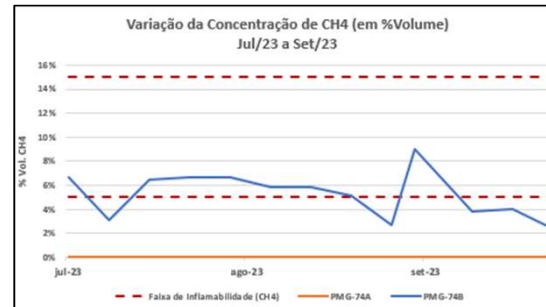

POSTO
DE
ENFERMAGEM
(M5)

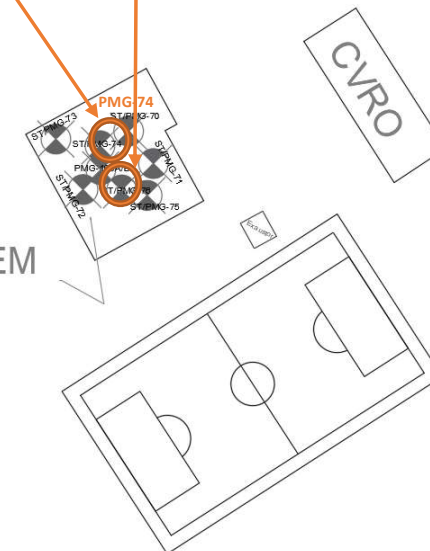









Contrato 0000001/2022 – PUSP – CL
Processo Administrativo 22.1.00018.95.7

Avenida Paulista, 2064 - 14º Andar | Bela Vista | 01310-200 | São Paulo - SP | 11 2844 4386


 engesolve.com.br



Engesolve
SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS

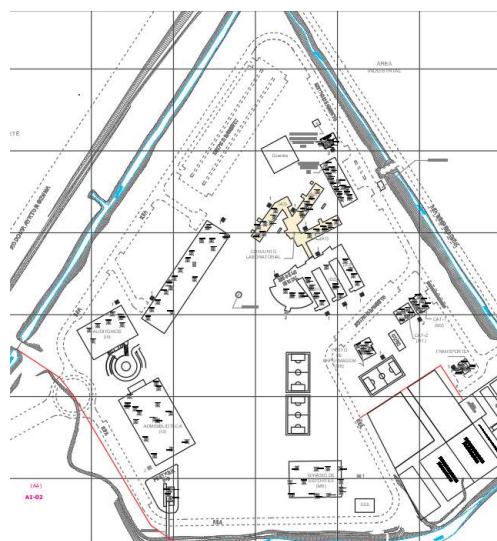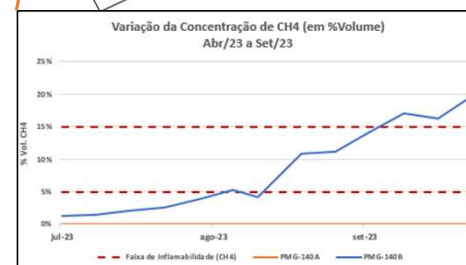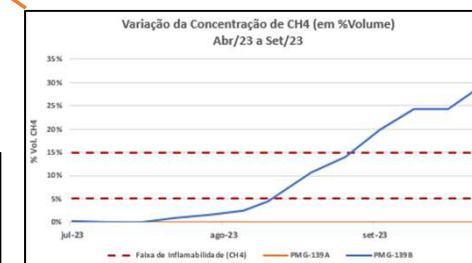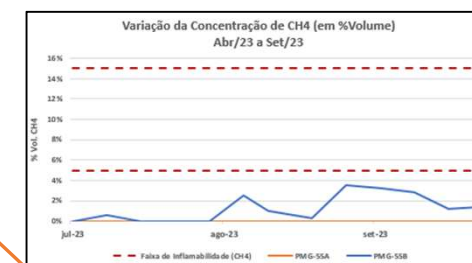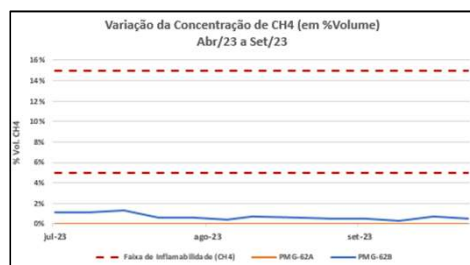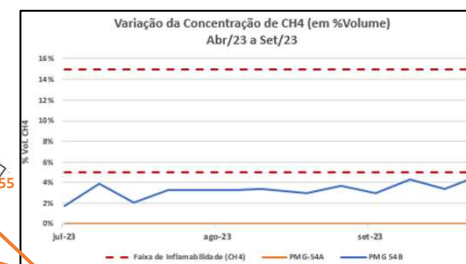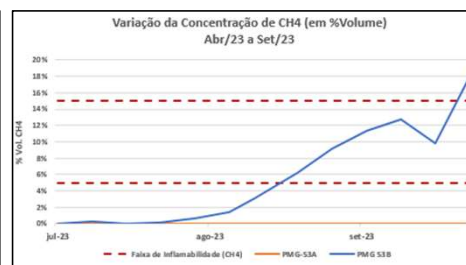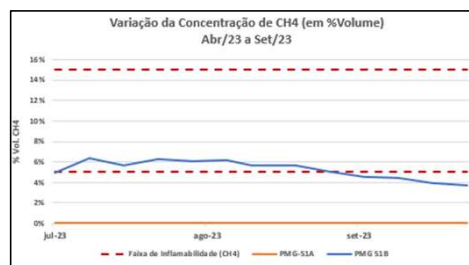



CONJUNTO
LABORATORIAL

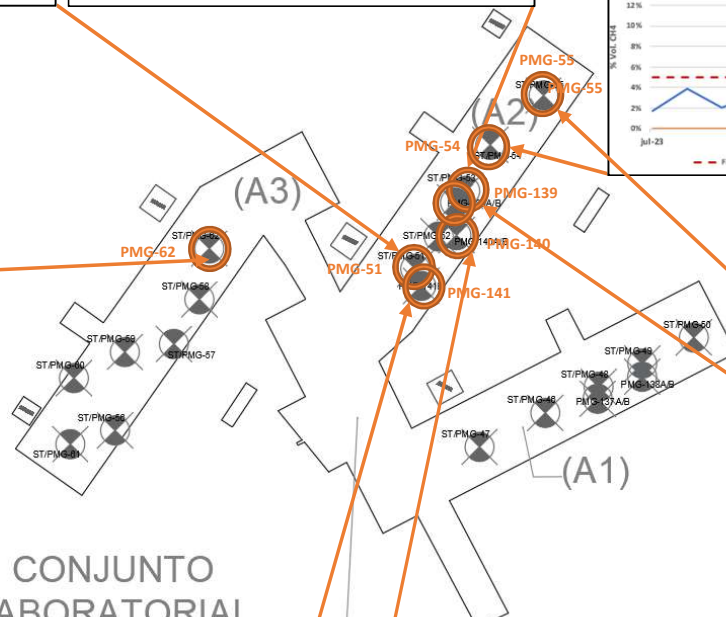




Contrato 0000001/2022 – PUSP – CL
Processo Administrativo 22.1.00018.95.7




Avenida Paulista, 2064 - 14º Andar | Bela Vista | 01310-200 | São Paulo - SP | 11 2844 4386

 engesolve.com.br

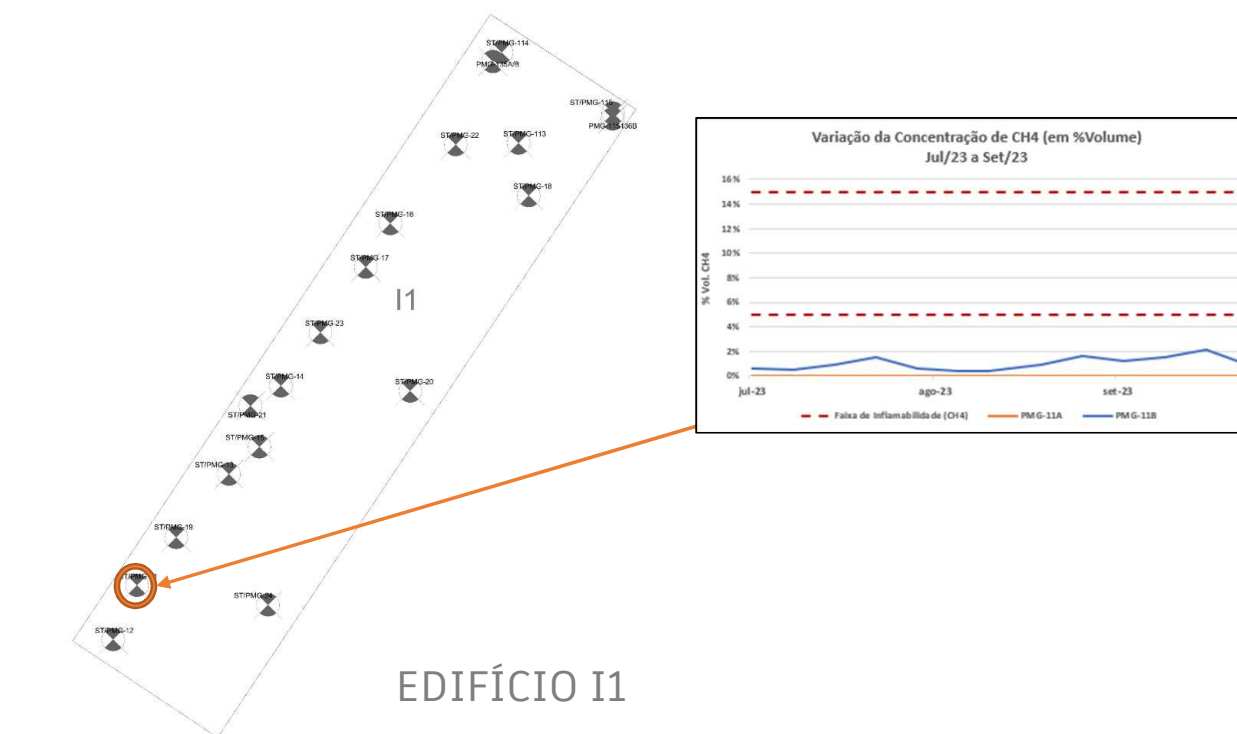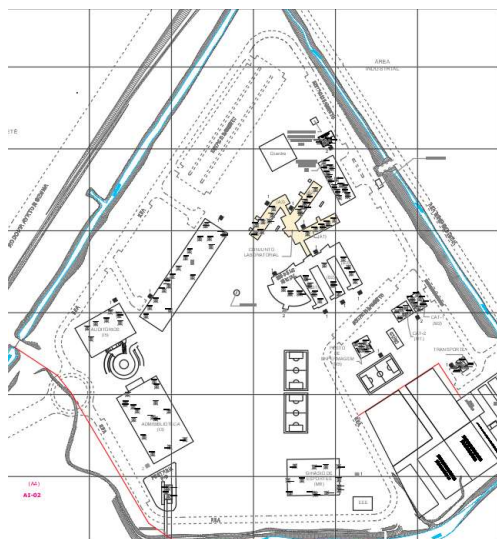

CENTRAL DE
SERVIÇOS
I-4

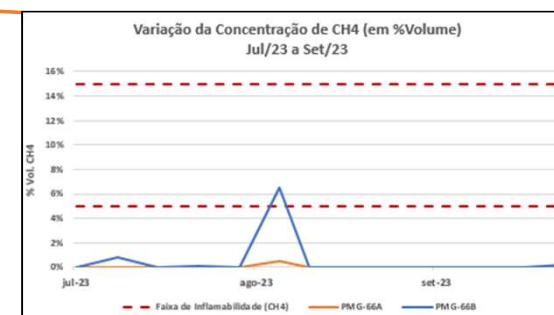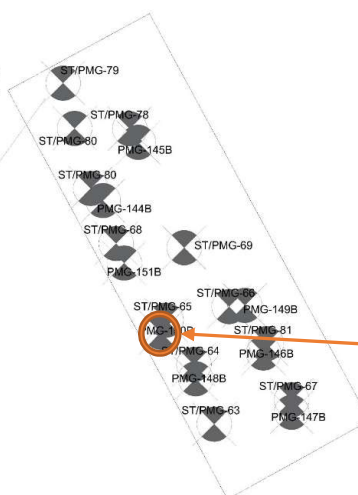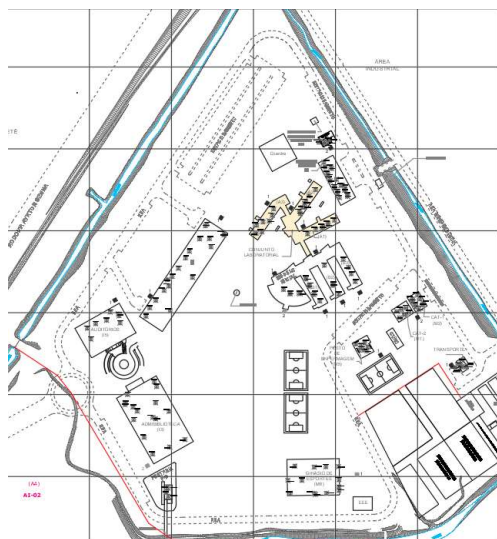

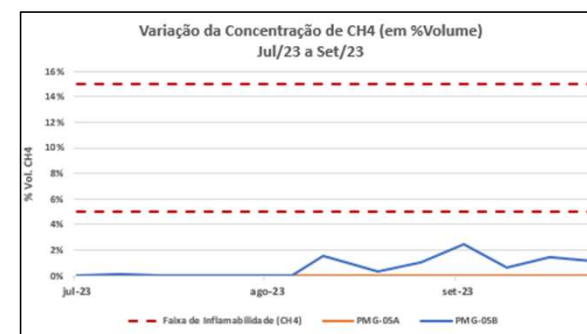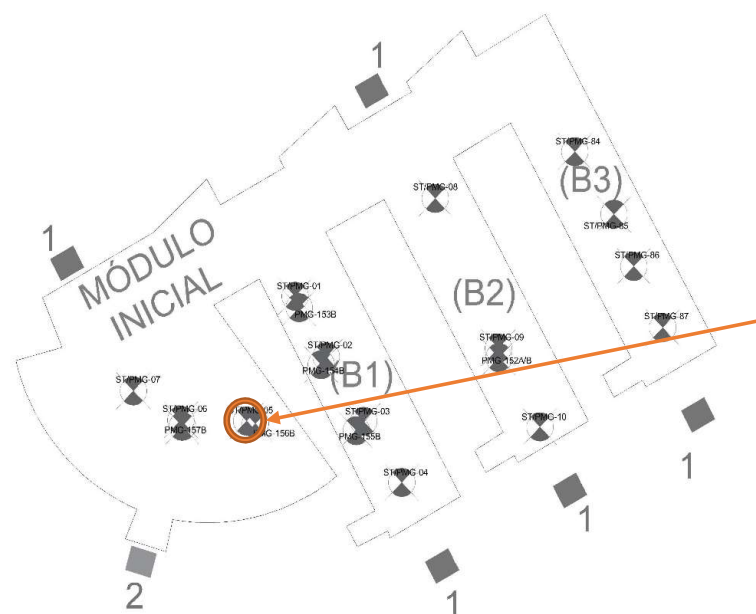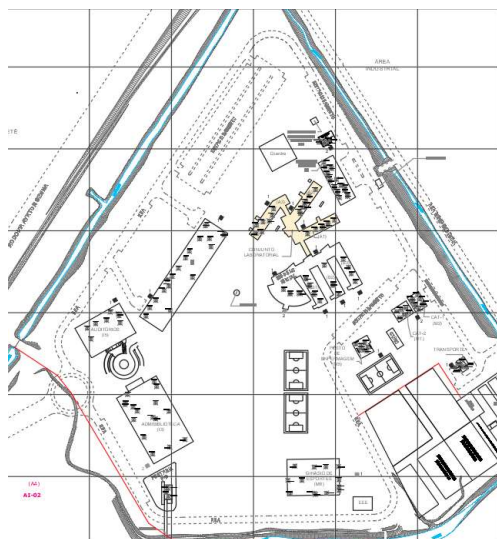

6.2. RESULTADOS OBTIDOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO

A avaliação da eficiência dos sistemas de ventilação (circulação de ar nos tapetes de brita, logo abaixo da laje das edificações) é realizada pela análise dos resultados de monitoramento das concentrações de Metano e da variação de pressão nos poços de monitoramento nas duas profundidades distintas, bem como pela operação ininterrupta dos sistemas (24h por dia, 30 dias por mês).

O sistema de ventilação é individual e específico para cada edificação. De forma geral, ele é composto por elementos de subsuperfície (colchão de brita, pontos de captação de ar atmosférico e de extração de gases e/ou tubulação geomecânica), por elementos de superfície (tubulação de interconexão dos pontos de extração de gases) e por exaustores (montados com compressor, célula de vácuo e painel elétrico).

No total, há 24 exaustores para realização de ventilação forçada, sendo que estão em utilização 22 unidades e 02 são adicionais, servindo como reservas para serem utilizadas em caso de necessidade de substituição de equipamentos quando algum exaustor precisar ser encaminhado para manutenção corretiva.

Os exaustores estão distribuídos em 18 abrigos, pois em alguns abrigos foi possível posicionar dois exaustores, enquanto em outros, somente um. A distribuição dos exaustores e abrigos está apresentada na **Tabela 6.2.1.**

Os sistemas se mostram eficientes no seu propósito de promover a circulação do ar no tapete de brita, evitando o acúmulo e confinamento de gases sob a laje dos edifícios. Essa eficiência se confirma pela ausência de Metano nos poços instalados no tapete de brita. Além disso, também é possível observar na análise histórica do monitoramento que houve uma diminuição das concentrações de Metano até mesmo nos poços de monitoramento instalados na profundidade do solo.

Observa-se que os sistemas de extração instalados com a metodologia de furos na laje (ex. Módulo Inicial) têm atuação diferente daquela que manteve a ventilação via dutos enterrados, como no Conjunto Laboratorial. Ambos os tipos de sistema são eficientes e capazes de eliminar as concentrações no tapete de brita logo abaixo da laje, porém os dados indicam que o primeiro é capaz de diminuir as concentrações também em solo, logo após a camada de brita.

Em fevereiro/2016 iniciou-se o monitoramento sistemático nos exaustores de cada sistema de ventilação dos edifícios, realizando-se medições semanais de Metano e pressão com o equipamento GEM 5000 e VOCs com o equipamento BW/MX6, bem como a leitura de pressão na célula de vácuo.

No trimestre englobado por esse relatório (julho a setembro/2023), os exaustores operaram com pressão na célula de vácuo de -2,0 mmHg (-2,66mBar) com variação do equipamento entre -0,2 e 0,2 mBar.

Tabela 6.2.1 – Localização dos Exaustores dos Sistemas de Ventilação

Identificação do Exaustor	Edifício ao qual está conectado	Identificação do Abrigo
Exaustor I-1 (1)	Edifício I-1 Parte 1	Abrigo I-1 (1)
Exaustor I-1 (2)	Edifício I-1 Parte 2	Abrigo I-1 (2)
Exaustor I-5 Auditórios	Edifício I-5 Auditórios	Abrigo I-5 Auditórios
Exaustor Biblioteca	Edifício I-3 Biblioteca	Abrigo I-3 Biblioteca
Exaustor Portaria 3	Portaria P3	Abrigo I-3 Biblioteca
Exaustor Ginásio	Ginásio	Abrigo Ginásio
Exaustor Enfermaria	Enfermaria	Abrigo Enfermaria
Exaustor CAT 1	CAT 1	Abrigo Incubadora
Exaustor CAT 2	Incubadora (CAT 2)	Abrigo Incubadora
Exaustor Transportes	Transportes	Abrigo Transportes
Exaustor MI (B1)	Módulo Inicial - Bloco 1	Abrigo Módulo Inicial (B1)
Exaustor MI (B2)	Módulo Inicial - Bloco 2	Abrigo Módulo Inicial (B2)
Exaustor MI (B3)	Módulo Inicial - Bloco 3	Abrigo Módulo Inicial (B3)
Exaustor Auditório 1	Módulo Inicial - Auditórios 1	Abrigo Auditórios
Exaustor Auditório 2	Módulo Inicial - Auditórios 2	Abrigo Auditórios
Exaustor Cantina	Módulo Inicial - Cantina	Abrigo Cantina
Exaustor Corredor	Módulo Inicial - Corredor	Abrigo Módulo Inicial (Corredor)
Exaustor Conj. Lab. (A1)	Conjunto Laboratorial Edifício A1	Abrigo Conjunto Laboratorial (A1)
Exaustor Conj. Lab. (A2)	Conjunto Laboratorial Edifício A2	Abrigo Conjunto Laboratorial (A2)
Exaustor Conj. Lab. (A3)	Conjunto Laboratorial Edifício A3	Abrigo Conjunto Laboratorial (A3)
Exaustor I-4	Edifício I-4	Abrigo I-4
Exaustor Guarda	Guarda Universitária	Abrigo I-5
Exaustor Reserva 1	Reserva 1 (sala E-02 Edifício I-1)	
Exaustor Reserva 2	Reserva 2 (sala E-02 Edifício I-1)	

Fonte: Dados de Campo, Engesolve, 2023.

Na entrada de cada exaustor não foram detectadas concentrações para VOC e nem para Metano. O vácuo é variável para cada edifício e, eventualmente há picos de pressão negativa. No momento em que os picos são observados, realiza-se a drenagem da tubulação nos pontos de inspeção e em sua extensão, retirando-se a água acumulada e voltando a pressão média.

Sobre a pressão de sucção de operação do sistema, a pressão medida na entrada do exaustor, quando comparada aos modelos matemáticos de projeto, devem atender à necessidade estabelecida, considerando as perdas de carga no sistema. Ao longo do monitoramento do 2º trimestre de 2023, tais pressões se mantiveram em valores superiores aos de projeto, demonstrando que o arraste previsto ocorreu. A **Tabela 6.2.2.** apresenta este comparativo.

Nos gráficos a seguir demonstra-se a variação da pressão na célula de vácuo em comparação com a entrada nos exaustores. O **Anexo 6** apresenta as planilhas de monitoramento semanal de cada exaustor.

Cabe mencionar que entre o término do processo licitatório da antiga empresa que operava na USP Leste e o início da operação pela ENGESOLVE, houve um período em que as medições dos poços de monitoramento e pontos de infraestrutura tiveram suas frequências alteradas, com um maior espaçamento em determinadas medições e priorização em outras, mas a operação dos sistemas de ventilação se manteve inalterada por todo o período (24 horas por dia, 30 dias por mês).

A limpeza dos abrigos é realizada a cada 3 ou 4 meses, devido ao acúmulo de pó e grama advinda da capinagem.

Tabela 6.2.2. –Comparativo de pressão de sucção de projeto x medição no 3º trimestre/2023









Detalhes de Projeto dos Sistemas (obtidos por meio de simulações - IPT)						Dados Obtidos entre Julho a Setembro de 2023										
SISTEMA		Pressão de Sucção	Vazão total de exaustão	Velocidade principal de escoamento do ar no tapete de brita	Taxa de renovação do ar no tapete de brita	Exaustor (Capacidade de Aplicação de Pressão)	Identificação do Exaustor		Pressão Mínima obtida na entrada do exaustor neste período			Pressão Máxima obtida na entrada do exaustor neste período				
Edifício I-1		153Pa nos pontos de extração	34,8 m³/h	≥10 ⁻⁴ m/s	0,15 renov/h ou 3,7 renov/dia	194,8Pa (153 Pa Rede fluxo + 41,8 Pa Perdas Carga)	Exaustor I-1 (1)		-1,73	mBar	-173,0	Pa	-2,65	mBar	-265,0	Pa
							Exaustor I-1 (2)		-4,23	mBar	-423,0	Pa	-5,51	mBar	-551,0	Pa
Biblioteca I-3		153Pa nos pontos de extração	15,5 m³/h	≥10 ⁻³ m/s	0,05 renov/h ou 1,3 renov/dia	154,9Pa (153 Pa Rede fluxo + 1,9 Pa Perdas Carga)	Exaustor Biblioteca		-1,73	mBar	-173,0	Pa	-2,19	mBar	-219,0	Pa
Auditórios I-5		-	-	-	-	-	Exaustor I-5 Auditórios		-2,59	mBar	-259,0	Pa	-3,22	mBar	-322,0	Pa
Portaria P3		63Pa nos pontos de extração	3,2 m³/h	≥10 ⁻⁵ m/s	1,5 renov/h ou 36 renov/dia	67,4Pa (63 Pa Rede fluxo + 4,5 Pa Perdas Carga)	Exaustor Portaria P3		-3,17	mBar	-317,0	Pa	-4,72	mBar	-472,0	Pa
Ginásio de Esportes		43,1Pa no ponto de aplicação e 13Pa na extremidade oposta	12,6 m³/h	≥10 ⁻⁴ m/s	0,1 renov/h ou 2,4 renov/dia	59,4Pa (43,1 Pa Rede fluxo + 16,3 Pa Perdas Carga)	Exaustor Ginásio		-2,23	mBar	-223,0	Pa	-2,82	mBar	-282,0	Pa
Enfermaria		38Pa nos pontos de extração	46,3 m³/h	≥10 ⁻⁴ m/s	3,6 renov/h ou 86,4 renov/dia	44Pa (38 Pa Rede fluxo + 6 Pa Perdas Carga)	Exaustor Enfermaria		-3,25	mBar	-325,0	Pa	-4,66	mBar	-466,0	Pa
CAT 1		27Pa nos pontos de extração de ar atmosférico	12,6 m³/h	≥10 ⁻⁵ m/s	0,7 renov/h ou 16,8 renov/dia	117Pa (27 Pa Rede fluxo + 87 Pa Perdas Carga)	Exaustor CAT 1		-3,32	mBar	-332,0	Pa	-5,51	mBar	-551,0	Pa
CAT 2 (Incubadora)		11Pa nos pontos de extração de ar atmosférico	4,0 m³/h Tubo 1 8,0 m³/h Tubo 2 4,5 m³/h Tubo 3	≥10 ⁻⁵ m/s	1,3 renov/h ou 31,2 renov/dia	46,3Pa (13,5 Pa Rede fluxo + 30,5 Pa Perdas Carga)	Exaustor CAT 2		-2,18	mBar	-218,0	Pa	-4,8	mBar	-480,0	Pa
Transportes		-	-	-	-	-	Exaustor Transportes		-2,67	mBar	-267,0	Pa	-3,66	mBar	-366,0	Pa
Módulo Inicial	Blocos Padrões	16,5Pa no ponto de aplicação e 2 Pa no ponto mais distante do exaustor	49,5 m³/h	?	?	16,5 Pa	Exaustor MI (B1)		-2,23	mBar	-223,0	Pa	-4,82	mBar	-482,0	Pa
							Exaustor MI (B2)		-2,92	mBar	-292,0	Pa	-3,81	mBar	-381,0	Pa
							Exaustor MI (B3)		-2,43	mBar	-243,0	Pa	-5,07	mBar	-507,0	Pa
	Auditórios	49Pa e 97Pa nos pontos de aplicação (esquerdo e direito, respectivamente) e 2Pa no ponto mais distante do exaustor	73 m³/h	?	?	97Pa	Exaustor Auditório 1		-3,61	mBar	-361,0	Pa	-4,93	mBar	-493,0	Pa
							Exaustor Auditório 2		-2,11	mBar	-211,0	Pa	-2,62	mBar	-262,0	Pa
	Corredor de Serviços		162 Pa no ponto de aplicação e 2 Pa no ponto mais distante do exaustor	122 m³/h	?	?	162 Pa	Exaustor Cantina		-3,81	mBar	-381,0	Pa	-4,77	mBar	-477,0
							Exaustor Corredor		-2,87	mBar	-287,0	Pa	-5,4	mBar	-540,0	Pa
Conjunto Laboratorial		-	3,2 m²/h	?	0,5 renov/h ou 12 renov/dia	?	Exaustor Conj. Lab. (A1)		-4,02	mBar	-402,0	Pa	-5,83	mBar	-583,0	Pa
							Exaustor Conj. Lab. (A2)		-5,43	mBar	-543,0	Pa	-4,49	mBar	-449,0	Pa
							Exaustor Conj. Lab. (A3)		-3,93	mBar	-393,0	Pa	-5,42	mBar	-542,0	Pa
Edifício I-4		23,7Pa no ponto de aplicação e 13 Pa na extremidade oposta	10,7 m³/h	≥10 ⁻⁴ m/s	0,2 renov/h ou 4,8 renov/dia	34,6Pa (23,7 Pa Rede fluxo + 10,9 Pa Perdas carga)	Exaustor I-4		-2,25	mBar	-225,0	Pa	-2,95	mBar	-295,0	Pa
Posto Guarda Universitária		-	-	-	-	-	Exaustor Guarda		-3	mBar	-300,0	Pa	-5,4	mBar	-540,0	Pa

Legenda: (-) não há projeto; (?) não há dados disponíveis.







Fonte: Baseado nos relatórios IPT: Mar, Jun e Jul/2013

(1Pa = 0,01mBar)

Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores CAT2, Transportes, MI (B1), MI (B2), MI (B3), Auditório 1, Auditório 2 e Cantina

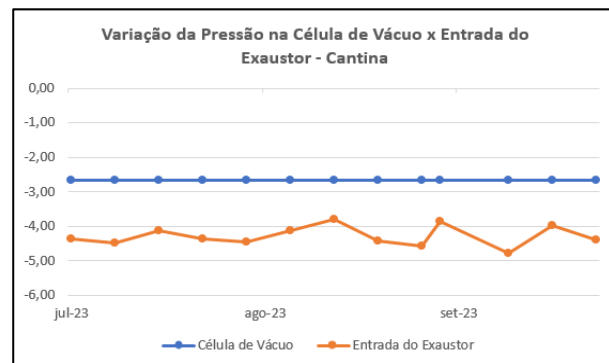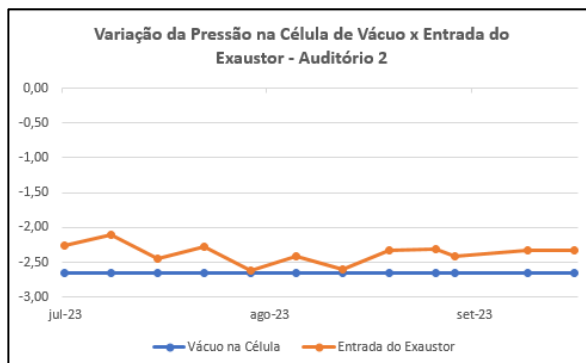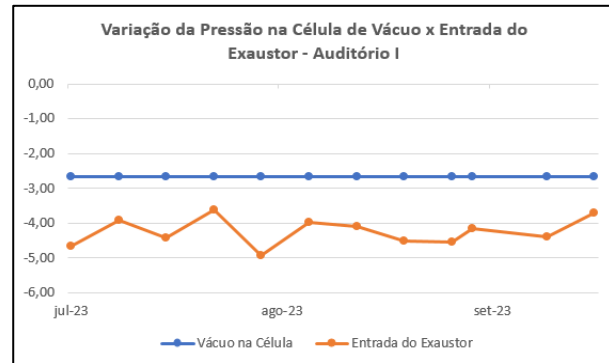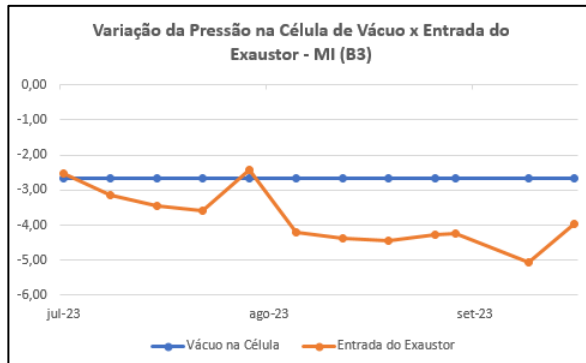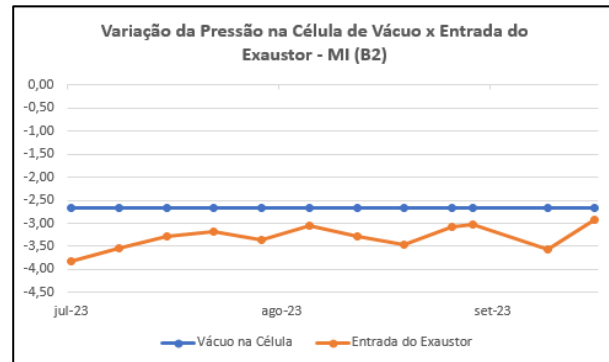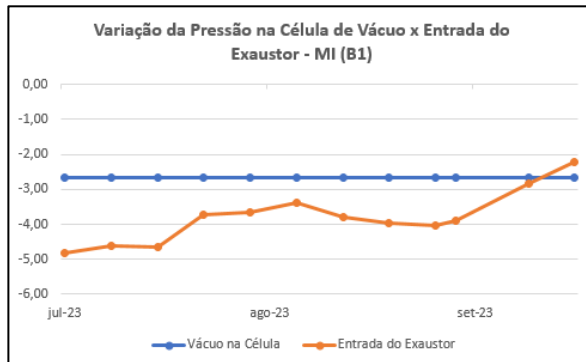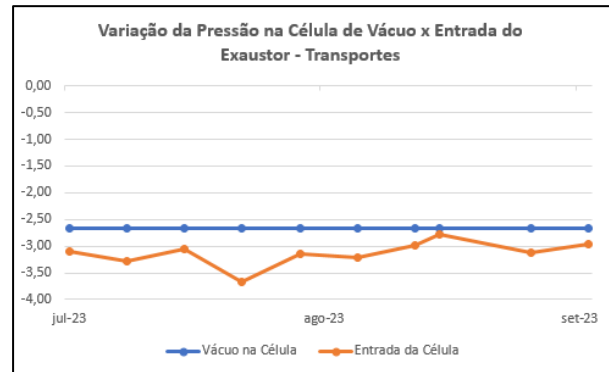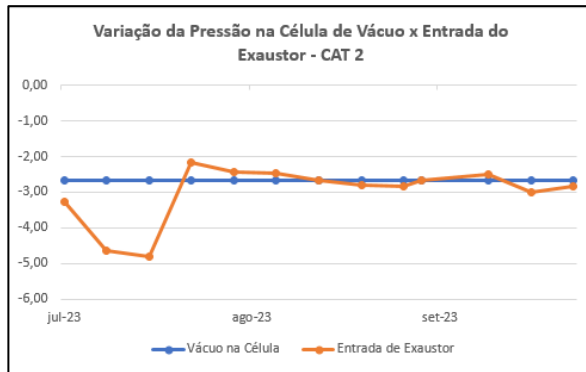

Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores Corredor, Conj. Lab. (A1), Conj. Lab. (A2), Conj. Lab. (A3), I4 e Guarda Universitária

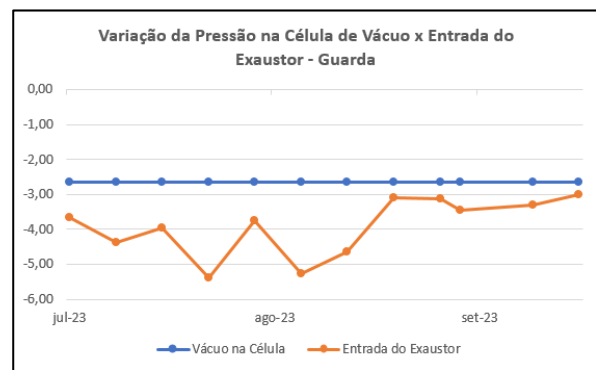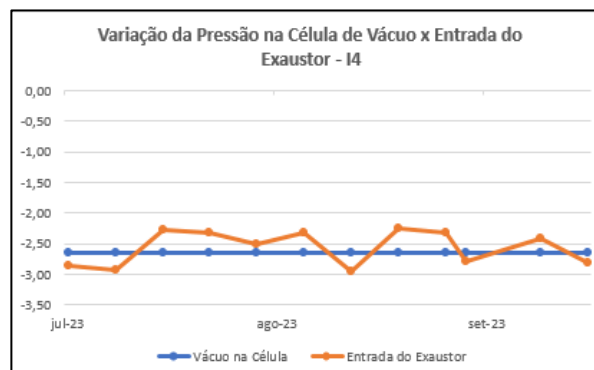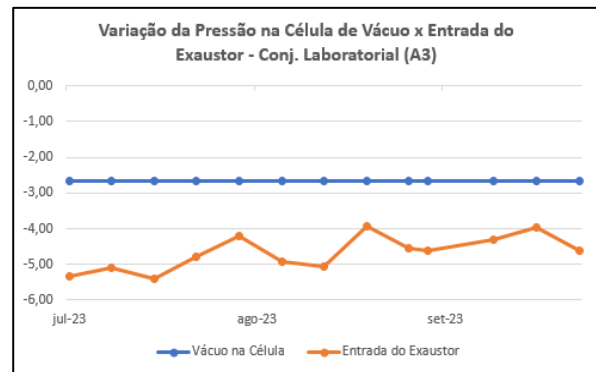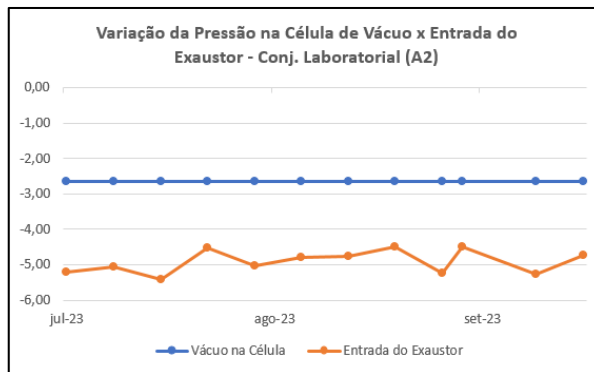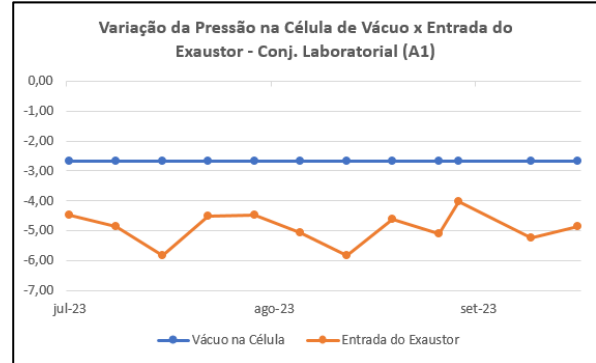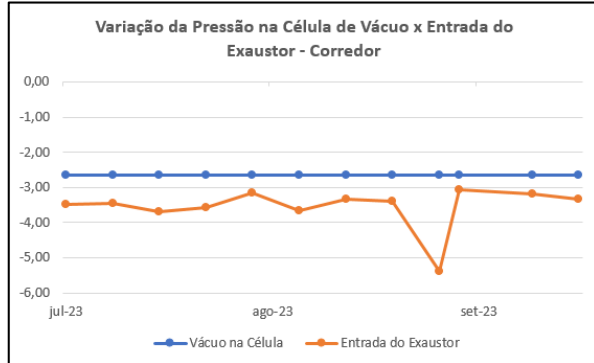

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

A ENGESOLVE Soluções Ambientais Ltda. foi contratada pela Prefeitura da Universidade de São Paulo Área Capital Leste (PUSP-Leste) para a operação, manutenção dos sistemas de ventilação de gases no solo bem como o monitoramento de poços de gás e pontos na infraestrutura instalados em edificações da EACH na USP Leste, localizada na Rua Arlindo Bértio, 1.000 – Ermelino Matarazzo, São Paulo/SP, conforme do Processo Administrativo 22.1.18.95.7, Pregão Eletrônico nº 00002/2022 – PUSP – CL e Contrato nº 0000001/2022 – PUSP – CL.

O objetivo da operação dos sistemas de ventilação é impedir o acúmulo de gases sub a laje dos edifícios, aliado ao monitoramento preventivo de intrusão de gases nos ambientes por meio da execução de medições de gases em todos os poços de monitoramento, pontos de infraestrutura e espaços com pouca circulação de ar.

Com base nos resultados obtidos no terceiro trimestre de 2023, foram detectadas concentrações significativas de Metano (acima de 1%Vol CH₄) na porção profunda em 14 dos 289 poços de gases monitorados. Nos demais poços profundos, não foram detectadas concentrações significativas.

Para os poços nas porções rasas, não foram detectadas concentrações de metano acima de 1% VolCH₄.

Essas concentrações podem ser consideradas esperadas, uma vez que estes poços estão instalados sobre a fonte de geração do gás Metano (camada de matéria orgânica). Porém, tais concentrações estão localizadas em pontos específicos e não abrangem toda a extensão dos edifícios. É importante ressaltar que as concentrações nulas nos pontos de infraestrutura ratificam a ausência do risco de inflamabilidade ou ocorrência de intrusão de gases.

As concentrações obtidas ao longo deste 4º trimestre/2023 se mostraram coerentes com a linha de tendência obtida durante os 9,7 anos de monitoramento da área de estudo. Observa-se que nos períodos de seca há um singelo das concentrações medidas por meio dos poços profundos.

Quanto às medições de H₂S e CO nos poços de monitoramento, foram obtidas concentrações de 5,0 e 1,0, respectivamente. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica. Para VOC, foi detectada concentração somente no PMG-11B em apenas duas medições.

Foram detectadas concentrações nos ralos 26, 66 e 69, no entanto, a localização dos ralos não foram constatadas próximas de pontos onde foi obtida concentração de metano. Os resultados obtidos nas medições realizadas nos demais pontos de infraestrutura ao longo deste trimestre (ralos e caixa de passagem) nas demais as edificações, bem como em ambientes com pouca circulação de ar, não detectaram concentrações de Metano e nem de VOC.

Os sistemas de ventilação operaram 24 horas por dia, 30 dias por mês, durante todo o período do trimestre. Estes demonstraram-se eficientes, não permitindo que os gases existentes no solo se acumulassem no tapete de brita (poços a 0,30 m) ou diretamente sob a laje (vapor pin), bem como diminuindo eventualmente até mesmo as concentrações no solo abaixo do tapete de brita (poços a 1,00 m), por influência da ventilação.

O nível d'água raso existente na área tende a dificultar a migração vertical do gás, bem como as medidas já adotadas ao longo do tempo, como as construções com ventilação fixa, colchão de brita em subsuperfície, drenos geomecânicos, que colaboram com a mitigação da possibilidade de intrusão e gases.

Sendo assim, diante dos resultados obtidos a partir do monitoramento do terceiro trimestre de 2023 e considerando a série histórica de monitoramento ao longo dos nove anos e quatro meses (abril/2014 a setembro/2023), verifica-se que não há a intrusão de gases nos ambientes fechados, uma vez que as concentrações de Metano existentes no solo, mesmo com a presença de pressão positiva, não alcançam o tapete de brita (sob a laje) ou, quando alcançam esporadicamente, são arrastadas pelo sistema de ventilação. Além disso, não há presença de Metano em nenhum dos pontos de infraestrutura.

Portanto, recomenda-se a continuidade da operação dos sistemas de exaustão, bem como a realização dos monitoramentos semanais e quinzenais nos poços de monitoramento e nos pontos de infraestrutura, respectivamente.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 16.209, de setembro de 2013 – Avaliação de risco a saúde humana para fins de gerenciamento de áreas contaminadas;

AVATZ Ambiental. Relatório Técnico – Instalação de Poços de Monitoramento de Gases e de Monitoramento dos Poços Instalados – R047/21-PR014/21. São Paulo: AVATZ AMBIENTAL, Outubro/2021.

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 2021 – Biogás. Disponível em: <<https://cetesb.sp.gov.br/biogas/>>. Acesso em: out 2022.

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 2017 – Decisão de Diretoria Nº 038/2017, de 07 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a aprovação do “Procedimento para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas”, da revisão do “Procedimento para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas” e estabelece “Diretrizes para Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Âmbito do Licenciamento Ambiental”, e dá outras providências;

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 2016 – Manual de Produtos Químicos. Constituído de um Guia Técnico e 96 Fichas de Informação de Produtos Químicos.

ENGESOLVE Soluções Ambientais Integradas. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 1º Trimestre /2023. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Abril/2023.

ENGESOLVE Soluções Ambientais Integradas. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 4º Trimestre /2022. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Janeiro/2023.

ENGESOLVE Soluções Ambientais Integradas. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 3º Trimestre /2022. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Outubro/2022.

IPT. Relatório Técnico 92353-205 – Avaliação e sugestões de aperfeiçoamento para alguns dos sistemas de ventilação de gás e vapor do subsolo de edifícios do campus da USP Leste – resultados preliminares. São Paulo: ITP, 02 de abril de 2007.

SERVMAR. Relatório de Investigação Detalhada, Avaliação de Risco à Saúde Humana e Plano de Intervenção na AI-01 e Investigação Detalhada de Gases – MA/12936/14BLS. São Paulo: SERVMAR, 01 de Fevereiro de 2014.

WEBER Ambiental. Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 2º Trimestre/2022. USP Leste. São Paulo: WEBER, Julho/2022.

WEBER Ambiental. Relatório Técnico: As-Built completo dos sistemas de ventilação de gases instalados na USP Leste – vs.07. Projeto 311.1264.14EGS.VS07 – USP Leste. São Paulo: WEBER, Julho/2021.

WEBER Ambiental. Relatório Técnico: Instalação de novos poços de monitoramento e amostragem de gases – vs.02. Projeto 311.1265.14-IAG.VS02 – USP Leste. São Paulo: WEBER, Janeiro/2016.

WEBER Ambiental. Relatório Técnico: Instalação do Sistema de Exaustão de Gases no Solo sob os Edifícios – Ago/14. Projeto 311.1205.14 – USP Leste. São Paulo: WEBER, Agosto/2014.

ANEXO 1
CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº 3160-2023

Dados do Cliente:

Nome: Engesolve Soluções Ambientais Integradas Ltda
Endereço: Av. Paulista 2064, 2086 14 Andar
Bairro: Bela Vista
Cidade: São Paulo
CEP: 01.310-928

UF: SP
Contato: 11 9308-4713



Interessado: O mesmo

Identificação do Item:

Item: Detector de Gás com Indicação Direta
Marca: Landtec
Modelo: GEM5000
N.º de Série: G500491

Dados da Calibração:

Data da Calibração: 12-jun-23 Validade solicitada pelo Cliente: 12-jun-24
N.º do Processo: 1123 Item: 1
Procedimento de Calibração: PC-10 REV. 14

Condições Ambientais:

Temperatura: 21,3 °C
Umidade Relativa: 74,4 %

Método de Medição:

Os resultados são obtidos através da aplicação de material de referência certificado (MRC) de gás sobre o sensor do instrumento sob teste.

Material de Referência Certificado Utilizado:

MRC	Código	Certificado	Emitente	Validade
Mistura Padrão de Oxigênio	CIL-O2	567023	Coregas	abril-24
Mistura Padrão de Metano	CIL-CH4	567023	Coregas	abril-24
Mistura Padrão de Monóxido de Carbono	CIL-CO	567023	Coregas	abril-24
Mistura Padrão de Sulfeto de Hidrogênio	CIL-H2S	567023	Coregas	abril-24

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

N° 3160-2023

Resultado Obtido:

Gás	V.M	V.R	R.M	Erro	Unidade	Fator k	Incerteza
O2	17,9	17,7	18	0,3	% VOL	2,00	0,7
CH4	1,6	2,5	2,5	0,0	% VOL	2,00	0,6
CO	64	99,3	100	0,7	PPM	2,00	2,1
H2S	16	25,4	25	-0,4	PPM	2,00	1,4

Legenda:

V.M= Valor de uma medição realizada no sensor sob teste isento de ajustes.

V.R=Valor de referência da MRC.

R.M= Resultado da medição. (média de 3 leituras realizadas após ajuste de SPAN).

Observações:

- *Este certificado de calibração é válido apenas para o instrumento e sensores especificados , não sendo extensivo a quaisquer outros instrumentos ainda que similares.*
- *Não é autorizada a reprodução parcial deste documento sem autorização da ALMONT DO BRASIL. As informações fornecidas neste certificado são de responsabilidade da Almont.*
- *A incerteza expandida estimada relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível de confiança de aproximadamente 95 %.*
- *Manutenções, Ajustes e Configurações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.*
- *Esta calibração não isenta o usuário de realizar o teste de resposta conforme NR-33.*
- *Calibração realizada nas instalações permanentes do laboratório Almont do Brasil.*
- *Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.*
- *Calibração inválida se o lacre for rompido.*
- *A versão original deste certificado é um arquivo PDF.*

Técnico Executor:

Vinícius Archilha
Técnico Instrumentista

Data de Emissão: 12/06/2023

Signatário Autorizado
Ailson Ricardo Vichino
Gerente Técnico

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

Fim do certificado de Calibração

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO**Nº 3161-2023****Dados do Cliente:**

Nome: Engesolve Soluções Ambientais Integradas Ltda
Endereço: Av. Paulista 2064, 2086
Bairro: Bela Vista
Cidade: São Paulo
CEP: 01.310-928

UF: SP

Interessado: O mesmo**Identificação do Item:**

Item: Detector de Gás com Indicação Direta
Marca: Landtec
Modelo: GEM5000
N.º de Série: G500491

Dados da Calibração:

Data da Calibração: 12-jun-23 Validade solicitada pelo Cliente: 12-jun-24
N.º do Processo: 1123 Item: 1
Procedimento de Calibração: PC-10-R REV. 2

Condições Ambientais:

Temperatura: 21,4 °C
Umidade Relativa: 73,8 %

Método de Medição:

Os resultados são obtidos através da aplicação da mistura de gás padrão sobre o sensor do instrumento sob teste.

Padrões e Instrumentação Utilizados:

Padrão	Código	Certificado	Emitente	Validade
Mistura Padrão de CO ₂	CIL-CO2	WO263065	Calgaz Ltd	julho-25

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

N° 3161-2023

Resultado Obtido:

Gás	V.M	V.R	R.M	Desvio	Unidade	Fator k	Incerteza
CO2	3,6	5,0	5,0	0,0	%	2,00	0,6

Legenda:

V.M= Valor de uma medição realizada no sensor sob teste isento de ajustes.

V.R=Valor de referência do padrão

R.M= Resultado da medição. (média de 3 leituras realizadas após ajuste de SPAN).

s/ref. = Sem referência

Observações:

- *Este certificado de calibração é válido apenas para o instrumento e sensores especificados , não sendo extensivo a quaisquer outros instrumentos ainda que similares.*
- *Não é autorizada a reprodução parcial deste documento sem autorização da ALMONT DO BRASIL.*
- *A incerteza expandida estimada relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para nível de confiança de aproximadamente 95 %.*
- *Manutenções, Ajustes e Configurações não fazem parte do escopo do laboratório.*
- *Esta calibração não isenta o usuário de realizar o teste de resposta conforme NR-33.*
- *Calibração realizada nas instalações do laboratório Almont Lab.*
- *A versão original deste certificado é um arquivo PDF.*

Técnico Executor:

Vinícius Archilha
Técnico Instrumentista

Responsável Técnico
Ailson Ricardo Vichino
Gerente Técnico

Fim do certificado de Calibração

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº 5046-2023

Dados do Cliente:

Nome: Engesolve Soluções Ambientais Integradas Ltda
Endereço: Av. Paulista 2064, 2086 14 Andar
Bairro: Bela Vista
Cidade: São Paulo
CEP: 01.310-928

UF: SP
Contato: 11 9308-4713



Interessado: O mesmo

Identificação do Item:

Item: Detector de Gás com Indicação Direta
Marca: BW Technologies
Modelo: GasAlert Micro5 PID
N.º de Série: SK317-003332

Dados da Calibração:

Data da Calibração: 4-set-23
N.º do Processo: 1648 Item: 1
Procedimento de Calibração: PC-10 REV. 14

Condições Ambientais:

Temperatura: 23,8 °C
Umidade Relativa: 71,1 %

Método de Medição:

Os resultados são obtidos através da aplicação de material de referência certificado (MRC) de gás sobre o sensor do instrumento sob teste.

Material de Referência Certificado Utilizado:

MRC	Código	Certificado	Emitente	Validade
Mistura Padrão de Metano	CIL-LEL	567023	Coregas	abril-24
Mistura Padrão de Isobutileno	CIL-PID	683633	Coregas	março-27

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

N° 5046-2023

Resultado Obtido:

Gás	V.M	V.R	R.M	Erro	Unidade	Fator k	Incerteza
CH4	39	49,0	50	1,0	% LEL	2,00	1,2
C4H8	88	100,4	101	0,6	PPM	2,00	2,1

Legenda:

V.M= Valor de uma medição realizada no sensor sob teste isento de ajustes.

V.R=Valor de referência da MRC.

R.M= Resultado da medição. (média de 3 leituras realizadas após ajuste de SPAN).

Observações:

- Este certificado de calibração é válido apenas para o instrumento e sensores especificados , não sendo extensivo a quaisquer outros instrumentos ainda que similares.
- Não é autorizada a reprodução parcial deste documento sem autorização da ALMONT DO BRASIL. As informações fornecidas neste certificado são de responsabilidade da Almont.
- A incerteza expandida estimada relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível de confiança de aproximadamente 95 %.
- Manutenções, Ajustes e Configurações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.
- Esta calibração não isenta o usuário de realizar o teste de resposta conforme NR-33.
- Calibração realizada nas instalações permanentes do laboratório Almont do Brasil.
- Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
- Calibração inválida se o lacre for rompido.
- A versão original deste certificado é um arquivo PDF.

Técnico Executor:

Vinícius Archilha
Técnico Instrumentista

Data de Emissão: 05/09/2023

Signatário Autorizado
Ailson Ricardo Vichino
Gerente Técnico

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

Fim do certificado de Calibração

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

N° 5620-2023

Dados do Cliente:

Nome: Engesolve Soluções Ambientais Integradas Ltda
Endereço: Av. Paulista 2064, 2086 14 Andar
Bairro: Bela Vista
Cidade: São Paulo
CEP: 01.310-928

UF: SP
Contato: 11 9308-4713



Interessado: O mesmo

Identificação do Item:

Item: Detector de Gás com Indicação Direta
Marca: BW Technologies
Modelo: GasAlert Micro5 PID
N.º de Série: SK317-003329

Dados da Calibração:

Data da Calibração: 10-out-23
N.º do Processo: 1859 Item: 1
Procedimento de Calibração: PC-10 REV. 14

Condições Ambientais:

Temperatura: 24,1 °C
Umidade Relativa: 64,1 %

Método de Medição:

Os resultados são obtidos através da aplicação de material de referência certificado (MRC) de gás sobre o sensor do instrumento sob teste.

Material de Referência Certificado Utilizado:

MRC	Código	Certificado	Emitente	Validade
Mistura Padrão de Metano	CIL-LEL	567023	Coregas	abril-24
Mistura Padrão de Isobutileno	CIL-PID	683633	Coregas	março-27

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

N° 5620-2023

Resultado Obtido:

Gás	V.M	V.R	R.M	Erro	Unidade	Fator k	Incerteza
CH4	46	49,0	50	1,0	% LEL	2,00	1,2
C4H8	97	100,4	101	0,6	PPM	2,00	2,1

Legenda:

V.M= Valor de uma medição realizada no sensor sob teste isento de ajustes.

V.R=Valor de referência da MRC.

R.M= Resultado da medição. (média de 3 leituras realizadas após ajuste de SPAN).

Observações:

- Este certificado de calibração é válido apenas para o instrumento e sensores especificados , não sendo extensivo a quaisquer outros instrumentos ainda que similares.
- Não é autorizada a reprodução parcial deste documento sem autorização da ALMONT DO BRASIL. As informações fornecidas neste certificado são de responsabilidade da Almont.
- A incerteza expandida estimada relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível de confiança de aproximadamente 95 %.
- Manutenções, Ajustes e Configurações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.
- Esta calibração não isenta o usuário de realizar o teste de resposta conforme NR-33.
- Calibração realizada nas instalações permanentes do laboratório Almont do Brasil.
- Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
- Calibração inválida se o lacre for rompido.
- A versão original deste certificado é um arquivo PDF.

Técnico Executor:

Vinicius Archilha
Técnico Instrumentista

Signatário Autorizado

Anderson Fusari de Andrade
Gerente Técnico Subst.

Data de Emissão: 10/10/2023

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

Fim do certificado de Calibração

ANEXO 2
PLANO DE AÇÃO

ANEXO 3
TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM PMG

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Edifício I 1	PMG-16	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	3,30	18,90	0,00	2,00	77,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	4,40	18,00	0,00	2,00	77,60	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	20,30	0,00	2,00	77,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,80	0,00	2,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	2,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	19,20	0,00	2,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	20,00	0,00	1,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,60	0,00	0,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,30	0,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	2,40	19,40	0,00	2,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,60	0,00	0,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,90	0,00	1,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	0,00	79,80	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,20	0,00	0,00	79,40	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	0,00	79,30	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	0,00	79,30	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	0,00	79,40	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,00	0,00	0,00	79,20	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	20,00	0,00	2,00	78,60	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	04/07/2023	0,70%	0,70%	2,70	18,40	0,00	2,00	78,20	0,19		0,00	53,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	4,10	18,00	0,00	1,00	77,90	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	4,00	18,60	0,00	0,00	77,40	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,80	0,00	1,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	19,60	0,00	0,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	3,60	18,40	0,00	2,00	78,00	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	5,70	16,90	0,00	2,00	77,40	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	21,00	0,00	3,00	78,30	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	21,10	0,00	1,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,70	0,00	2,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,30	0,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	2,30	20,00	0,00	2,00	77,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	2,20	19,60	0,00	2,00	78,20	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	0,00	79,80	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,60	0,00	0,00	79,60	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	0,00	79,30	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	0,00	79,30	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	0,00	79,40	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,90	0,00	0,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,80	0,00	1,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,80	0,00	2,00	78,10	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,70	0,00	1,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	2,00	19,90	0,00	2,00	78,00	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	4,90	17,00	0,00	2,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	20,00	0,00	1,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,30	0,00	2,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,50	0,00	2,00	78,10	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	20,10	0,00	2,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,60	0,00	2,00	78,20	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	20,30	0,00	1,00	78,00	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,10	0,00	1,00	78,60	0,11		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-5 Auditórios	PMG-45	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	21,10	0,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,20	0,00	1,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,90	0,00	1,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,20	0,00	1,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,30	0,00	1,00	79,00	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,60	0,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	07/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,40	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	07/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,60	0,00	2,00	79,50	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,80	0,00	1,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	4,40	17,30	0,00	1,00	78,30	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,50	0,00	2,00	78,40	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,70	0,00	2,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,60	0,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,10	0,00	1,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,80	0,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	3,50	18,00	0,00	1,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,90	0,00	1,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	20,00	0,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,70	0,00	1,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,30	0,00	2,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,70	0,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	12,70	12,80	0,00	1,00	74,50	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,80	0,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,70	0,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	21,00	0,00	1,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	21,00	0,00	2,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	07/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,70	0,00	2,00	79,10	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	07/07/2023	0,00%	0,00%	6,70	16,40	0,00	2,00	76,90	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	1,00	79,10	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,30	0,00	1,00	78,90	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	0,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	03/07/2023	0,30%	0,30%	1,10	19,70	0,00	1,00	78,80	0,02		0,00	8,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	20,00	0,00	1,00	78,40	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,20	0,00	2,00	78,80	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	21,00	0,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,60	0,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,80	0,00	2,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,20	0,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,80	0,00	1,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,50	0,00	1,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,80	0,00	1,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,00	0,00	2,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,90	0,00	1,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,20	0,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,90	0,00	1,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,40	0,00	1,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,10	0,00	2,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	2,60	18,90	0,00	2,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,00	0,00	1,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,90	0,00	1,00	79,00	0,05		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-78	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,10	0,00	1,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	2,00	19,40	0,00	1,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,90	0,00	2,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,00	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	21,10	0,00	2,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,80	0,00	1,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	21,10	0,00	1,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,70	0,00	1,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	21,00	0,00	1,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,80	0,00	2,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,90	0,00	2,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	18,40	0,00	1,00	80,00	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	2,20	18,80	0,00	2,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,70	0,00	2,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	2,90	18,10	0,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,10	0,00	2,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,40	0,00	1,00	78,40	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	5,50	15,90	0,00	1,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	20,20	0,00	1,00	78,30	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,90	0,00	1,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,40	0,00	1,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	2,20	19,50	0,00	1,00	78,30	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	20,30	0,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	12,70	13,70	0,00	1,00	73,60	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,50	0,00	1,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	4,00	18,40	0,00	1,00	77,60	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,30	0,00	0,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	05/07/2023	4,90%	4,90%	2,00	17,40	0,00	1,00	75,70	0,02		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,70	0,00	0,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,60	0,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,30	0,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	5,30	14,30	0,00	1,00	80,40	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,70	0,00	0,00	78,80	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	05/07/2023	1,70%	1,70%	4,20	15,40	0,00	0,00	78,70	-0,02		0,00	50,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	1,00	79,40	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	6,20	15,50	0,00	0,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,70	0,00	1,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	20,10	0,00	2,00	78,00	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	21,00	0,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	3,40	18,30	0,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,90	0,00	1,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,50	0,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,80	0,00	1,00	78,40	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	4,00	17,70	0,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,70	0,00	1,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	10,60	12,70	0,00	1,00	76,70	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	2,50	19,70	0,00	1,00	77,80	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	05/07/2023	0,00%	0,00%	9,80	15,90	0,00	1,00	74,30	0,10		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	1,00	79,10	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	05/07/2023	0,20%	0,20%	2,10	17,80	0,00	1,00	79,80	-0,04		0,00	4,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	1,00	79,10	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	05/07/2023	1,20%	1,20%	0,40	19,90	0,00	0,00	78,50	0,03		0,00	19,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	05/07/2023	5,80%	6,10%	5,40	12,50	0,00	1,00	76,30	0,04		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	05/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	21,00	0,00	1,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	05/07/2023	1,10%	2,30%	0,40	20,60	0,00	1,00	77,90	0,10		0,00	24,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	21,00	0,00	2,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,10	0,00	2,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	21,30	0,00	2,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,30	0,00	1,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,00	0,00	2,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	2,90	17,30	0,00	2,00	79,80	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,60	0,00	2,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,40	0,00	2,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,10	0,00	1,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,10	0,00	1,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	2,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	20,10	0,00	1,00	78,50	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	9,30	12,80	0,00	1,00	78,00	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,70	0,00	0,00	78,60	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	06/07/2023	0,30%	0,30%	12,90	12,80	0,00	0,00	74,10	-0,08		0,00	9,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	2,60	19,00	0,00	0,00	78,40	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	3,10	17,90	0,00	0,00	79,00	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,60	0,00	0,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	4,90	17,30	0,00	0,00	77,80	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	3,50	18,40	0,00	0,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	4,80	16,50	0,00	0,00	78,70	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,90	0,00	1,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	2,90	17,00	0,00	1,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	04/07/2023	0,00%	0,00%	4,00	15,90	0,00	0,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	4,50	16,80	0,00	0,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	2,00	19,20	0,00	0,00	78,70	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	06/07/2023	0,10%	0,10%	7,50	15,20	0,00	0,00	77,20	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,20	0,00	2,00	78,80	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,30	0,00	2,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	04/07/2023	0,00%	0,00%	2,20	18,30	0,00	2,00	79,50	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,10	0,00	1,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,00	0,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,20	0,00	2,00	80,20	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,50	0,00	0,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	06/07/2023	0,10%	0,10%	1,40	11,60	0,00	0,00	86,90	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,50	0,00	2,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,30	0,00	2,00	79,80	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	2,00	79,10	0,24		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,30	0,00	3,00	79,10	0,22		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Enfermaria	PMG-74	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,70	0,00	2,00	79,70	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	06/07/2023	6,70%	6,70%	0,50	13,50	0,00	2,00	79,30	0,11		0,00	100,00	
Enfermaria	PMG-75	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	4,40	10,30	0,00	1,00	85,20	0,17		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,90	0,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	4,40	13,90	0,00	1,00	81,70	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,50	0,00	0,00	79,80	0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	06/07/2023	1,70%	1,70%	0,30	19,50	0,00	1,00	78,60	0,05		0,00	34,00	Atípico dar metano neste poço
CAT	PMG-82	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	3,80	18,10	0,00	0,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	12,70	13,00	0,00	0,00	74,30	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	3,60	17,90	0,00	0,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	9,10	14,50	0,00	0,00	76,40	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,50	0,00	0,00	78,90	-0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	6,40	16,00	0,00	0,00	77,60	-0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	2,80	18,90	0,00	0,00	78,30	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	3,90	18,80	0,00	0,00	77,30	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,90	0,00	0,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	7,30	12,50	0,00	0,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,00	0,00	0,00	79,40	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	5,40	15,30	0,00	0,00	79,30	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,60	0,00	0,00	79,20	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,70	0,00	0,00	79,40	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,80	0,00	0,00	79,00	-0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	7,10	15,30	0,00	0,00	77,60	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	3,10	18,60	0,00	0,00	78,30	-0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	5,40	16,90	0,00	0,00	77,70	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	07/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,20	0,00	1,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	07/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,20	0,00	1,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	07/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	1,00	79,50	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	07/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,60	0,00	1,00	79,40	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	07/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	1,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	07/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,20	0,00	1,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	07/07/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,10	0,00	1,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	07/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,40	0,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	07/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,50	0,00	1,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	07/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,80	0,00	1,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	07/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,50	0,00	1,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	07/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,70	0,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		03/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,00	0,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		03/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,70	0,00	1,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		03/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,70	0,00	1,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		03/07/2023	0,00%	0,00%	3,40	18,90	0,00	2,00	77,80	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		03/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,80	0,00	1,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		03/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	18,90	0,00	1,00	79,70	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		03/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	21,00	0,00	1,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,10	0,00	1,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,70	0,00	1,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,00	0,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,00	0,00	2,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,00	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,70	0,00	1,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		03/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,30	0,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,00	0,00	1,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	6,30	13,30	0,00	1,00	80,40	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	1,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,10	0,00	1,00	80,40	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,20	0,00	1,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,30	0,00	2,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,30	0,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,40	0,00	1,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,30	0,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,30	0,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,30	0,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,30	0,00	2,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	03/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,30	0,00	2,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	07/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,70	0,00	0,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	07/07/2023	0,00%	0,00%	9,80	11,80	0,00	0,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	07/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,00	0,00	0,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	07/07/2023	0,00%	0,00%	11,50	12,60	0,00	0,00	75,90	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	07/07/2023	0,00%	0,00%	2,00	19,20	0,00	1,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	07/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,00	0,00	0,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	07/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	0,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	07/07/2023	0,00%	0,00%	4,60	16,70	0,00	0,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	07/07/2023	0,00%	0,00%	6,60	16,30	0,00	0,00	77,10	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	07/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,80	0,00	0,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,10	0,00	2,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	3,10	18,80	0,00	3,00	78,10	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,80	0,00	3,00	78,70	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	2,60	19,00	0,00	3,00	78,40	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,70	0,00	2,00	78,80	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	19,40	0,00	2,00	78,60	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,80	0,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	2,70	18,70	0,00	3,00	78,60	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,90	0,00	3,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	19,60	0,00	2,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,60	0,00	2,00	78,60	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	2,90	18,70	0,00	3,00	78,40	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,50	0,00	2,00	78,50	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	06/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,20	0,00	2,00	78,80	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	3,00	18,90	0,00	3,00	78,10	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	4,80	17,70	0,00	2,00	77,60	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	20,30	0,00	3,00	78,10	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,60	0,00	3,00	78,50	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	1,00	79,40	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	2,20	19,10	0,00	1,00	78,70	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,80	0,00	2,00	78,60	0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,60	0,00	2,00	79,00	0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	21,10	0,00	2,00	78,70	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	19,40	0,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,30	0,00	1,00	79,00	0,13		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-23	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,40	0,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	1,00	79,20	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,50	0,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,60	0,00	1,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,40	0,00	1,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,20	0,00	1,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,70	0,00	3,00	79,30	0,23		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	11/07/2023	0,90%	0,90%	3,20	17,50	0,00	3,00	78,40	0,09		0,00	56,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	5,40	16,10	0,00	1,00	78,50	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	5,30	16,50	0,00	1,00	78,30	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,40	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	2,30	19,00	0,00	1,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	3,30	18,10	0,00	3,00	78,60	0,21		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	4,80	16,80	0,00	2,00	78,40	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,80	0,00	2,00	78,90	0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,90	0,00	3,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,10	0,00	2,00	78,80	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,70	0,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,60	0,00	3,00	78,50	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,80	0,00	2,00	78,60	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,40	0,00	0,00	78,90	0,22		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,90	0,00	0,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	1,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,40	0,00	1,00	79,30	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,70	0,00	1,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,90	0,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,50	0,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	19,20	0,00	1,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	2,20	19,10	0,00	3,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	4,70	16,70	0,00	2,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,20	0,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,20	0,00	2,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,50	0,00	2,00	78,30	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	20,00	0,00	2,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,90	0,00	2,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,80	0,00	2,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,00	0,00	2,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	21,00	0,00	1,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,10	0,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	0,00	79,60	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,60	0,00	1,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,80	0,00	1,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	1,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	21,00	0,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,40	0,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,70	0,00	2,00	78,90	0,21		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	4,30	17,00	0,00	2,00	78,70	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,40	0,00	2,00	79,10	0,19		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,30	0,00	3,00	78,90	0,23		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,40	0,00	1,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,70	0,00	1,00	79,00	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,60	0,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	3,10	18,10	0,00	2,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	1,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,80	0,00	2,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,50	0,00	2,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	1,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	1,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	11,00	12,80	0,00	1,00	76,20	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	1,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,50	0,00	2,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,60	0,00	2,00	78,70	0,23		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	2,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	14/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,40	0,00	0,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	7,20	16,60	0,00	1,00	76,20	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	1,00	79,40	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,80	0,00	1,00	79,30	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	1,00	79,90	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	10/07/2023	0,30%	0,30%	1,00	19,10	0,00	1,00	79,70	0,07		0,00	8,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,90	0,00	1,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,90	0,00	1,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,50	0,00	3,00	78,80	0,22		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	3,00	79,30	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,50	0,00	2,00	78,90	0,22		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,50	0,00	3,00	79,50	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,30	0,00	2,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	2,00	79,40	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	2,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	12/07/2023	0,80%	0,80%	2,00	18,10	0,00	2,00	79,10	0,21		0,00	34,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	2,00	79,10	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,60	0,00	3,00	79,80	0,24		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	3,00	79,50	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	2,00	79,50	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,30	0,00	2,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,00	0,00	3,00	79,00	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,80	0,00	2,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	2,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,10	0,00	2,00	79,00	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,00	0,00	3,00	78,90	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,00	0,00	3,00	78,90	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,40	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	3,00	79,60	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,90	0,00	3,00	78,90	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,40	0,00	2,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,90	0,00	2,00	78,80	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	3,00	79,40	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,60	0,00	2,00	78,50	0,18		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
Edifício I-4	PMG-147	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	3,00	79,10	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	2,50	18,20	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,90	0,00	3,00	79,20	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	18,10	0,00	2,00	80,00	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	3,00	79,50	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	78,40	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	5,30	15,60	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,40	0,00	3,00	78,30	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,90	0,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,50	0,00	3,00	78,50	0,23		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	19,50	0,00	3,00	78,40	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,60	0,00	2,00	78,20	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	11,90	13,60	0,00	3,00	74,50	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,60	0,00	2,00	78,30	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	3,70	18,60	0,00	3,00	77,70	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,30	0,00	2,00	78,70	0,20		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	12/07/2023	6,40%	8,10%	2,30	16,90	0,00	2,00	74,40	0,02		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,80	0,00	3,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,80	0,00	3,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,70	0,00	3,00	78,90	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	12/07/2023	0,20%	0,20%	3,20	16,30	0,00	2,00	80,40	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,10	0,00	3,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	12/07/2023	3,90%	3,90%	4,60	14,10	0,00	3,00	77,30	0,14		0,00	76,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	2,00	79,20	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	12/07/2023	0,60%	0,60%	5,30	14,70	0,00	2,00	79,40	0,16		0,00	18,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,80	0,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,90	0,00	2,00	78,50	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,40	0,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	3,10	18,10	0,00	2,00	78,80	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,60	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	2,90	18,10	0,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	2,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	3,10	18,10	0,00	2,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,40	0,00	2,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	13,00	11,40	0,00	2,00	75,60	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	2,30	20,00	0,00	2,00	77,70	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	12/07/2023	0,00%	0,00%	8,60	16,30	0,00	3,00	75,10	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,00	0,00	3,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	12/07/2023	0,10%	0,10%	0,30	20,20	0,00	2,00	79,30	0,15		0,00	7,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,00	0,00	3,00	79,00	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	12/07/2023	1,40%	1,40%	0,30	20,20	0,00	3,00	78,20	0,17		0,00	27,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	12/07/2023	5,30%	6,10%	2,50	16,70	0,00	2,00	75,50	0,16		0,00	68,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	12/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,40	0,00	2,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	12/07/2023	1,10%	1,50%	0,50	20,00	0,00	2,00	78,40	0,12		0,00	26,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	3,00	79,70	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,60	0,16		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,20	0,00	2,00	79,40	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	2,60	16,80	0,00	3,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,90	0,00	3,00	79,00	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	3,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	3,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	11/07/2023	0,10%	0,10%	0,10	20,50	0,00	3,00	79,40	0,19		0,00	3,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	14/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,90	0,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,80	0,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	3,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,80	0,00	3,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,90	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	11,30	11,30	0,00	1,00	77,40	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	3,20	18,50	0,00	3,00	78,20	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	11/07/2023	0,30%	0,30%	10,60	12,60	0,00	3,00	76,50	0,19		0,00	9,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	1,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	2,70	17,40	0,00	0,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	1,00	79,20	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	5,80	16,30	0,00	1,00	77,90	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	3,20	18,30	0,00	2,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	4,20	16,60	0,00	1,00	79,20	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,90	0,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,20	0,00	1,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	3,20	16,60	0,00	1,00	80,20	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	4,20	16,40	0,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	3,00	79,70	0,20		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	11/07/2023	0,30%	0,30%	6,50	14,40	0,00	3,00	78,80	0,08		0,00	5,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,80	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	3,00	79,70	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	17,90	0,00	2,00	80,80	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	11/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	3,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,30	0,18		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,10	0,00	2,00	80,30	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,20	0,00	2,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	11,70	0,00	2,00	87,20	0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	2,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,30	0,00	2,00	80,00	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,50	0,00	2,00	79,20	0,18		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	2,00	79,60	0,18		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	13/07/2023	3,10%	3,10%	1,20	12,20	0,00	2,00	83,50	0,12		0,00	78,00	
Enfermaria	PMG-75	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,70	0,00	1,00	78,80	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	4,10	11,70	0,00	2,00	84,20	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,90	0,00	2,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	3,70	14,00	0,00	1,00	82,30	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	2,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	13/07/2023	5,20%	5,20%	0,30	17,90	0,00	2,00	76,60	0,12		0,00	81,00	
CAT	PMG-82	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	5,30	15,50	0,00	2,00	79,30	0,15		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	10,00	12,70	0,00	2,00	77,30	0,16		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	4,40	16,00	0,00	2,00	79,60	0,16		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
CAT	PMG-83	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	7,00	15,40	0,00	2,00	77,60	0,15		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,00	0,00	1,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,80	0,00	1,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,80	0,00	2,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	2,60	19,10	0,00	2,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,60	0,00	2,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	6,60	12,50	0,00	1,00	80,80	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,70	0,00	1,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	5,00	15,20	0,00	2,00	79,90	0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	2,00	79,50	0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,50	0,00	2,00	79,20	0,15		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	2,00	79,60	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	3,20	18,40	0,00	1,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,30	0,00	2,00	79,40	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	4,90	16,50	0,00	1,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,90	0,00	2,00	78,70	0,17		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,90	0,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	21,10	0,00	2,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,80	0,00	2,00	78,50	0,16		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,20	0,00	2,00	78,70	0,17		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,60	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	14/07/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,80	0,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	21,10	0,00	3,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,30	0,00	3,00	78,70	0,16		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,70	0,00	3,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	21,20	0,00	2,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,70	0,00	3,00	78,40	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		10/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	2,00	79,00	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		10/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,70	0,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		10/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,70	0,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		10/07/2023	0,00%	0,00%	3,50	18,70	0,00	1,00	77,80	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		10/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,80	0,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		10/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,60	0,00	1,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		10/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,00	0,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,80	0,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,10	0,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	2,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	1,00	79,10	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	2,00	79,20	-0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		10/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,10	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	5,30	14,40	0,00	1,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	2,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,00	0,00	2,00	80,50	0,15		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,10	0,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,10	0,00	2,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,10	0,00	2,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,10	0,00	2,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,10	0,00	1,00	78,90	0,14		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Portaria P3	PMG-120	C	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,10	0,00	2,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,10	0,00	2,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,10	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	10/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,10	0,00	1,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	14/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,30	0,00	1,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	9,90	11,80	0,00	2,00	78,20	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,60	0,00	1,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	10,10	12,70	0,00	1,00	77,20	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	14/07/2023	0,00%	0,00%	2,50	19,30	0,00	1,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,50	0,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	14/07/2023	0,00%	0,00%	2,00	19,40	0,00	0,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	4,60	16,70	0,00	1,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	7,40	15,70	0,00	1,00	76,90	0,09		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	14/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	1,00	79,30	0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	2,00	79,10	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	3,60	18,00	0,00	3,00	78,40	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,70	0,00	2,00	78,80	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	2,40	19,00	0,00	3,00	78,60	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,60	0,00	2,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,50	0,00	3,00	78,70	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,50	0,00	2,00	78,70	0,20		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	2,50	18,70	0,00	3,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,60	0,00	3,00	78,90	0,21		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	2,00	19,40	0,00	2,00	78,60	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,40	0,00	3,00	78,60	0,23		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	2,90	18,50	0,00	3,00	78,50	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	13/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,20	0,00	2,00	78,90	0,22		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	13/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,80	0,00	3,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	2,30	19,30	0,00	3,00	78,40	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	4,40	17,90	0,00	3,00	77,70	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,40	0,00	3,00	78,70	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,60	0,00	3,00	78,70	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	0,00	79,90	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	2,00	18,80	0,00	0,00	79,20	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,40	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	2,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	3,00	79,60	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	2,00	18,70	0,00	3,00	79,30	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,00	0,00	1,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	1,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,20	0,00	1,00	79,30	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	0,00	79,50	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	0,00	79,50	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	0,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	0,00	79,40	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	1,70	20,00	0,00	3,00	78,30	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	18/07/2023	0,50%	0,50%	3,40	17,70	0,00	3,00	78,40	0,13		0,00	40,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	4,60	18,00	0,00	3,00	77,40	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	4,30	18,10	0,00	3,00	77,60	0,15		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-13	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,90	0,00	3,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,50	0,00	3,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	3,70	18,70	0,00	3,00	77,60	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	5,30	17,10	0,00	3,00	77,60	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	2,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,80	0,00	2,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,40	0,00	3,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,20	0,00	3,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	2,50	19,90	0,00	3,00	77,60	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	2,20	19,60	0,00	3,00	78,20	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	21,10	0,00	3,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	21,00	0,00	2,00	78,40	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	0,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	0,00	79,50	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	0,00	79,40	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,50	0,00	1,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,60	0,00	2,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	20,00	0,00	2,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	2,20	19,00	0,00	1,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	2,30	19,20	0,00	1,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	4,80	16,80	0,00	2,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,10	0,00	1,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	20,00	0,00	2,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,40	0,00	1,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	20,00	0,00	2,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	20,10	0,00	2,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	20,00	0,00	2,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,10	0,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,90	0,00	2,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,00	0,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	1,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,50	0,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,50	0,00	0,00	79,80	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,80	1,00	1,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	21/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,10	0,00	2,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	21/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,00	0,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	21/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,30	0,00	2,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	21/07/2023	0,00%	0,00%	4,80	16,70	0,00	2,00	78,40	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	21/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	1,00	79,50	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	21/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,20	0,00	2,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,40	0,00	2,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,60	0,00	1,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,50	0,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	2,90	18,30	0,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	1,00	79,30	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,80	0,00	1,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,80	0,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,10	0,00	1,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	1,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	12,20	12,40	0,00	1,00	75,50	0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,50	0,00	1,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	1,00	79,30	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	1,00	79,40	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	1,00	79,40	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	21/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,20	0,00	1,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	21/07/2023	0,00%	0,00%	7,90	16,10	0,00	2,00	76,10	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	1,00	79,40	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,80	0,00	1,00	79,30	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	1,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	17/07/2023	0,30%	0,30%	1,20	18,50	1,00	1,00	80,00	0,03		0,00	10,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,20	0,00	1,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,90	0,00	2,00	79,30	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,80	0,00	1,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,20	0,00	2,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,80	0,00	1,00	78,80	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,90	0,00	1,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,80	0,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,80	0,00	1,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,70	0,00	2,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,70	0,00	2,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,20	0,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,90	0,00	2,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,50	0,00	1,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,90	0,00	1,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,10	0,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	2,80	18,70	0,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,00	0,00	1,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,90	0,00	1,00	79,00	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,00	0,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,40	0,00	2,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,10	0,00	1,00	78,80	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,10	0,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	21,00	0,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,80	0,00	2,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,00	0,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,60	0,00	2,00	78,90	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	21,00	0,00	1,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,80	0,00	2,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,90	0,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,90	0,00	2,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	2,40	18,80	0,00	1,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,10	0,00	1,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	4,60	15,70	0,00	2,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	1,00	79,30	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,50	0,00	1,00	78,40	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	5,50	15,80	0,00	1,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,50	0,00	2,00	78,20	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,90	0,00	2,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,60	0,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	19,50	0,00	2,00	78,30	0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	20,50	0,00	2,00	78,20	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	11,00	14,30	0,00	2,00	74,70	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,40	0,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	4,00	18,50	0,00	2,00	77,60	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,90	0,00	1,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	19/07/2023	5,70%	6,10%	2,80	16,30	0,00	2,00	75,30	0,10		0,00	89,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,50	0,00	2,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,70	0,00	1,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,70	0,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	4,60	14,60	0,00	1,00	80,80	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,00	0,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	19/07/2023	2,10%	2,10%	4,60	14,60	0,00	1,00	78,70	0,08		0,00	50,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,50	0,00	1,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	5,70	15,70	0,00	1,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,40	0,00	0,00	79,10	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,80	0,00	1,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,50	0,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	2,70	18,70	0,00	1,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	1,00	79,20	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,30	0,00	1,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	1,00	79,50	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	3,20	17,90	0,00	1,00	78,80	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,40	0,00	1,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	11,80	12,20	0,00	1,00	76,00	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	2,20	19,90	0,00	1,00	77,80	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	7,30	17,10	0,00	2,00	75,70	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,80	0,00	1,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,20	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	1,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	19/07/2023	2,00%	2,00%	0,50	19,60	0,00	1,00	77,80	0,04		0,00	36,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	19/07/2023	1,20%	1,20%	3,20	16,70	0,00	2,00	78,90	0,11		0,00	21,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	19/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,30	0,00	1,00	79,20	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	19/07/2023	1,30%	1,30%	0,70	19,70	0,00	1,00	78,30	0,09		0,00	36,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,40	0,00	0,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	1,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	1,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,60	0,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	3,00	16,90	0,00	2,00	80,00	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,80	0,00	2,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,70	0,00	3,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	1,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	1,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	1,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	2,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,50	0,00	2,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,90	0,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	20,00	0,00	1,00	78,50	0,12		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	4,30	16,30	0,00	1,00	79,40	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	2,50	18,80	0,00	1,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	18/07/2023	0,10%	0,10%	11,40	12,70	0,00	1,00	75,80	0,10		0,00	3,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,80	0,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,10	0,00	1,00	79,60	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,20	0,00	1,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	6,10	15,80	0,00	0,00	78,10	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	2,90	18,40	0,00	0,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	4,40	16,40	0,00	1,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,80	0,00	1,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,80	0,00	0,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	4,00	15,60	0,00	1,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	4,70	16,40	0,00	1,00	78,90	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	18/07/2023	0,00%	0,00%	2,00	19,30	0,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	8,70	13,60	0,00	1,00	77,60	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,30	0,00	1,00	80,20	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	1,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	18/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,00	0,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,60	0,00	1,00	79,90	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,00	0,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,90	0,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	1,80	8,10	0,00	1,00	90,20	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	2,00	79,40	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,10	0,00	1,00	79,80	0,14		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	1,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,50	0,00	1,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	20/07/2023	6,50%	6,50%	0,70	12,70	0,00	2,00	80,10	0,12		0,00	100,00	
Enfermaria	PMG-75	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,30	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	4,50	10,90	0,00	2,00	84,60	0,17		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,10	0,00	1,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	4,00	14,30	0,00	1,00	81,70	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	1,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	20/07/2023	8,60%	8,60%	0,40	16,20	0,00	2,00	74,90	0,09		0,00	100,00	
CAT	PMG-82	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	3,00	19,00	0,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	8,30	15,20	0,00	1,00	76,50	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	2,40	19,00	0,00	1,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	10,40	14,70	0,00	1,00	74,90	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,50	0,00	0,00	79,30	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,60	0,00	1,00	79,30	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	2,60	18,90	0,00	1,00	78,40	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	3,00	19,10	0,00	1,00	78,00	-0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,00	0,00	1,00	79,30	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	8,40	11,80	0,00	1,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,30	0,00	1,00	79,60	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	4,80	15,90	0,00	1,00	79,30	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,80	0,00	1,00	79,30	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,90	0,00	1,00	79,40	0,02		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
CAT	PMG-160	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	0,00	79,80	-0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	6,70	15,20	0,00	1,00	78,10	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,60	0,00	0,00	79,00	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	4,60	17,40	0,00	1,00	78,10	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	21/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,30	0,00	2,00	79,10	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	21/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	1,00	79,20	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	21/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	21/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,20	0,00	1,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	21/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	1,00	79,10	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	21/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	1,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	21/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,40	0,00	1,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	21/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,20	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	21/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,40	0,00	2,00	79,30	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	21/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,90	0,00	2,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	21/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	1,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	21/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,50	0,00	2,00	79,60	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		17/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,20	0,18		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		17/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,60	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		17/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,50	0,00	2,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		17/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,50	0,00	2,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		17/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,10	0,00	2,00	78,80	0,16		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		17/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	18,90	0,00	2,00	79,90	0,17		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		17/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,70	0,00	2,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,10	0,00	2,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,30	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	2,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		17/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	1,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	2,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	4,90	14,50	0,00	2,00	80,60	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	18,40	0,00	2,00	80,50	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	1,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	2,00	79,10	-0,02		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	2,00	79,10	0,15		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,80	0,00	1,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	2,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	2,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	2,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	17/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,60	0,00	1,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	10,10	12,10	0,00	2,00	77,80	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,80	0,00	2,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	12,00	12,40	0,00	1,00	75,60	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,80	0,00	1,00	78,70	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,80	0,00	1,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	21,00	0,00	1,00	78,80	0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Transportes	PMG-124	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	4,40	18,40	0,00	1,00	77,20	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	4,60	17,80	0,00	2,00	77,60	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,00	0,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,80	0,00	2,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	4,10	18,00	0,00	2,00	77,90	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,60	0,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	2,70	19,00	0,00	2,00	78,30	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,60	0,00	2,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	19,30	0,00	1,00	78,60	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,70	0,00	2,00	78,90	0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	2,70	18,50	0,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,40	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	2,20	19,30	0,00	2,00	78,50	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,50	0,00	1,00	78,60	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	3,10	18,50	0,00	2,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	20/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,50	0,00	2,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	20/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,20	0,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	3,20	18,30	0,00	2,00	78,60	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	4,60	17,20	0,00	2,00	78,20	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,90	0,00	2,00	78,50	0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,50	0,00	2,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	0,00	79,40	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	2,20	19,10	0,00	0,00	78,70	-0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,10	0,00	3,00	78,80	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,90	0,00	3,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	3,00	79,60	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	2,20	18,70	0,00	2,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,90	0,00	2,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,50	0,00	2,00	79,40	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,30	0,00	0,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,30	0,00	0,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	0,00	79,60	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	0,00	79,60	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	0,00	79,20	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,10	0,00	0,00	79,30	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	2,20	19,40	0,00	3,00	78,40	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	25/07/2023	0,60%	0,60%	4,20	16,40	0,00	3,00	78,80	0,19		0,00	35,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	3,70	17,50	0,00	3,00	78,80	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	3,90	17,60	0,00	3,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,50	0,00	3,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,10	0,00	2,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	3,10	18,30	0,00	3,00	78,60	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	4,80	17,20	0,00	3,00	78,00	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,50	0,00	2,00	79,10	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,30	0,00	3,00	78,80	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,90	0,00	3,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,50	0,00	2,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	2,20	18,80	0,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,40	0,00	2,00	78,60	0,16		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Edifício I 1	PMG-24	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,40	0,00	2,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	0,00	79,50	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	0,00	79,60	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	0,00	79,50	-0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,40	0,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,60	0,00	2,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,80	0,00	2,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	19,00	0,00	1,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	2,20	19,00	0,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	3,70	17,70	0,00	2,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,90	0,00	2,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,80	0,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,30	0,00	2,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,90	0,00	2,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,00	0,00	2,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,90	0,00	2,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,90	0,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,80	0,00	2,00	78,90	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	2,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,40	0,00	2,00	78,90	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,90	0,00	2,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,00	0,00	1,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,20	0,00	1,00	79,40	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,50	0,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,60	0,00	2,00	79,30	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	1,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	4,40	17,10	0,00	1,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,30	0,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,60	0,00	2,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,20	0,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,40	0,00	1,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,40	0,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	3,30	17,80	0,00	1,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,60	0,00	1,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	1,00	79,40	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	1,00	79,50	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	1,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	14,20	11,80	0,00	1,00	73,90	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	1,00	79,40	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	1,00	79,40	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,70	0,00	2,00	79,00	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,90	0,00	2,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	7,40	16,20	0,00	1,00	76,30	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,60	0,00	2,00	79,30	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	1,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	24/07/2023	0,50%	0,50%	1,60	18,70	0,00	1,00	79,20	0,03		0,00	12,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,10	0,00	1,00	79,00	0,04		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,80	0,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,10	0,00	3,00	78,80	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,70	0,00	2,00	79,50	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	2,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,40	0,00	2,00	79,60	0,22		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,40	0,00	2,00	79,10	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	2,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,20	0,00	2,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	26/07/2023	0,10%	0,10%	1,60	18,30	0,00	2,00	80,00	0,16		0,00	4,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,40	0,00	2,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	18,80	0,00	2,00	80,00	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,20	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,90	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	2,60	18,30	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,40	0,00	2,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	18,80	0,00	3,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,60	0,00	2,00	79,10	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,20	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	2,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,30	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	3,00	79,50	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,60	0,00	2,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	2,00	79,80	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,00	0,00	2,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,70	17,60	0,00	2,00	80,70	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	6,20	14,80	0,00	2,00	78,90	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,60	0,00	2,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	4,80	14,60	0,00	2,00	80,60	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,70	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,10	0,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	4,50	16,20	0,00	2,00	79,30	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,00	0,00	2,00	78,80	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,60	0,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,10	0,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,40	0,00	2,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	20,00	0,00	2,00	78,60	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	12,00	13,60	0,00	2,00	74,40	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,10	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	3,50	18,30	0,00	2,00	78,20	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,40	0,00	1,00	79,70	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	26/07/2023	6,30%	6,90%	3,20	14,90	1,00	1,00	75,60	0,05		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,50	0,00	1,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	1,00	79,80	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,50	0,00	1,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	26/07/2023	0,10%	0,10%	4,50	14,20	0,00	1,00	81,20	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,60	0,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	26/07/2023	3,30%	3,30%	5,10	13,90	0,00	2,00	77,70	0,11		0,00	50,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,60	0,00	2,00	79,30	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	7,50	13,60	0,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,50	0,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,70	0,00	2,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	1,00	79,40	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	2,70	18,20	0,00	2,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,20	0,00	2,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,10	0,00	2,00	79,50	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,40	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	2,80	18,00	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,20	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	12,00	11,60	0,00	2,00	76,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	2,70	19,30	0,00	1,00	78,00	0,26		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	26/07/2023	0,00%	0,00%	7,60	16,40	0,00	2,00	76,00	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	1,00	79,70	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	26/07/2023	0,90%	0,90%	3,30	15,20	0,00	1,00	80,60	0,08		0,00	13,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	1,00	79,80	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	26/07/2023	2,60%	2,60%	0,70	18,50	1,00	1,00	78,10	0,05		0,00	40,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	26/07/2023	2,10%	2,10%	2,20	16,50	0,00	1,00	79,20	-0,03		0,00	38,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	26/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,70	0,00	1,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	26/07/2023	0,60%	1,00%	0,50	19,90	0,00	1,00	79,00	0,12		0,00	27,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	1,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	1,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	1,00	79,40	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	0,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	1,00	79,20	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	2,90	16,70	0,00	1,00	80,40	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,90	0,00	2,00	79,40	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	3,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,10	0,00	1,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	1,00	79,20	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	1,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	1,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	1,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	1,00	79,30	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	2,00	19,30	0,00	1,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	11,70	11,20	0,00	1,00	77,00	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	4,20	17,60	0,00	0,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	13,70	11,50	0,00	0,00	74,70	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,00	0,00	0,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,50	0,00	0,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	0,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	7,10	14,60	0,00	0,00	78,20	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	4,10	17,10	0,00	0,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	5,60	14,80	0,00	0,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,30	0,00	0,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,00	0,00	1,00	79,70	0,07		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	3,70	16,30	0,00	0,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	4,70	16,00	0,00	0,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,90	0,00	0,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	8,90	13,00	0,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,40	0,00	0,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	0,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	18,10	0,00	1,00	80,50	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	1,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	25/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	1,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	1,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	18,10	0,00	2,00	80,90	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,30	0,00	2,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	5,90	0,00	2,00	92,00	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	2,00	79,50	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	18,40	0,00	1,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	1,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,00	0,00	2,00	80,40	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,10	0,00	2,00	80,10	0,18		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	27/07/2023	6,70%	6,70%	0,70	12,10	0,00	2,00	80,50	0,14		0,00	100,00	
Enfermaria	PMG-75	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	2,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	3,90	12,00	0,00	2,00	84,10	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,90	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	3,80	14,40	0,00	2,00	81,80	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,20	0,00	1,00	80,10	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	27/07/2023	14,60%	14,60%	0,70	12,50	0,00	1,00	72,20	0,11		0,00	100,00	
CAT	PMG-82	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	5,20	16,90	0,00	2,00	77,90	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	15,30	11,30	0,00	1,00	73,50	0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	4,40	17,00	0,00	1,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	17,90	11,30	0,00	1,00	70,80	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,30	0,00	1,00	79,40	-0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	3,20	17,70	0,00	1,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	2,60	18,50	0,00	0,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	4,40	18,00	0,00	1,00	77,50	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,30	0,00	0,00	79,50	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	12,70	9,10	0,00	1,00	78,20	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	18,90	0,00	1,00	79,70	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	6,40	14,30	0,00	1,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,50	0,00	1,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,60	0,00	2,00	79,70	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	0,00	80,00	-0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	8,90	13,60	0,00	0,00	77,50	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	3,30	18,00	0,00	1,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	6,30	15,90	0,00	1,00	77,80	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	28/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	28/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,20	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	28/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	1,00	79,50	0,17		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	28/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,60	0,00	2,00	79,60	0,21		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	28/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	1,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	28/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	1,00	79,70	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	28/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,20	0,00	2,00	78,90	0,15		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Incubadora	PMG-91	B	28/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,60	0,00	2,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	28/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,10	0,00	1,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	28/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,50	0,00	2,00	79,50	0,17		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	28/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,20	0,00	2,00	79,40	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	28/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,70	0,00	2,00	79,70	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		24/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		24/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	2,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		24/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,40	0,00	2,00	79,00	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		24/07/2023	0,00%	0,00%	2,70	18,90	0,00	2,00	78,40	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		24/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	2,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		24/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	18,90	0,00	2,00	79,80	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		24/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,80	0,00	2,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,30	0,18		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,30	0,18		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		24/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	4,00	15,30	0,00	2,00	80,70	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	1,70	17,50	0,00	2,00	80,80	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	1,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	1,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	24/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,20	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	28/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,80	0,00	2,00	78,90	0,16		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	28/07/2023	0,00%	0,00%	9,80	12,10	0,00	1,00	78,10	0,15		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	28/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	28/07/2023	0,00%	0,00%	13,90	11,10	0,00	2,00	75,00	0,09		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	28/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,50	0,00	1,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	28/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	2,00	79,40	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	28/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	1,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	28/07/2023	0,00%	0,00%	4,20	17,40	0,00	1,00	78,40	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	28/07/2023	0,00%	0,00%	8,00	15,10	0,00	2,00	76,90	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	28/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	1,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	3,90	17,80	0,00	2,00	78,30	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,40	0,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	2,50	18,70	0,00	2,00	78,70	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	2,00	79,20	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	19,00	0,00	2,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	2,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	2,80	18,20	0,00	2,00	79,00	0,19		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,20	0,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	2,20	19,00	0,00	2,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,20	0,00	2,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	3,00	18,20	0,00	2,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	27/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,10	0,00	2,00	78,90	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	27/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,80	0,00	3,00	79,20	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	3,40	18,50	0,00	2,00	78,20	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	4,80	17,30	0,00	2,00	77,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	20,00	0,00	2,00	78,10	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,50	0,00	2,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	1,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,50	0,00	1,00	79,40	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	1,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,60	0,00	2,00	79,00	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	2,50	18,70	0,00	2,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	2,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,70	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	1,00	79,50	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,90	0,00	1,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	1,00	79,60	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	1,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	1,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,70	0,00	1,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	2,50	18,50	0,00	2,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	01/08/2023	1,60%	1,60%	23,70	7,30	0,00	2,00	67,50	0,07		2,00	15,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	4,00	17,50	0,00	2,00	78,60	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	4,50	17,10	0,00	2,00	78,30	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,50	0,00	2,00	78,70	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	2,30	19,10	0,00	2,00	78,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	3,30	18,00	0,00	2,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	5,10	16,90	0,00	2,00	77,90	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,40	0,00	2,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,10	0,00	2,00	79,30	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	2,20	19,40	0,00	2,00	78,40	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	2,60	18,60	0,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,60	0,00	2,00	78,80	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,30	0,00	2,00	79,10	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	1,00	79,60	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	1,00	79,60	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	1,00	79,60	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,50	0,00	2,00	78,80	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,50	0,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,50	20,00	0,00	2,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,20	0,00	2,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,40	0,00	2,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	4,00	17,30	0,00	2,00	78,60	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,60	0,00	2,00	79,20	0,16		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
I-5 Auditórios	PMG-28	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	2,40	18,40	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,40	0,00	1,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,80	0,00	2,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	20,10	0,00	2,00	78,50	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,00	0,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,90	0,00	2,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,80	0,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	2,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,20	0,00	2,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,90	0,00	2,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,30	0,00	1,00	79,80	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,50	0,00	1,00	80,10	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,80	0,00	1,00	79,40	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,30	0,00	1,00	79,50	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,30	0,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	4,50	16,90	0,00	2,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,20	0,00	1,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,20	0,00	2,00	79,00	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,20	0,00	1,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,10	0,00	2,00	79,50	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	3,10	18,00	0,00	1,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	1,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,50	0,00	2,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,60	0,00	1,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,90	0,00	1,00	79,40	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	1,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	14,00	11,70	0,00	1,00	74,30	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	1,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	1,00	79,50	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,60	0,00	2,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,30	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,20	0,00	2,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	6,20	17,10	0,00	2,00	76,70	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	1,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,60	0,00	1,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,20	0,00	0,00	80,50	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	31/07/2023	0,70%	0,70%	2,00	17,60	0,00	1,00	79,60	0,08		0,00	13,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	1,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	1,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,40	0,00	2,00	79,00	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,70	0,00	1,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	2,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,60	0,00	2,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	2,00	79,50	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	18,80	0,00	2,00	80,00	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,10	0,00	3,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,20	0,00	3,00	79,80	0,19		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-68	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,60	0,00	2,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,10	0,00	1,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	2,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	2,60	18,30	0,00	2,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,30	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,50	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	2,00	79,20	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	2,00	18,90	0,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	2,00	79,60	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,20	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	3,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,80	0,00	2,00	79,20	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,00	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	2,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	4,10	14,00	0,00	3,00	81,90	0,23		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,40	0,00	3,00	79,40	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,60	0,00	2,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	4,40	15,10	0,00	2,00	80,40	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,20	0,00	2,00	79,00	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,20	0,00	2,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	5,70	15,40	0,00	2,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,00	0,00	2,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,50	0,00	2,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	20,00	0,00	1,00	78,40	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,00	0,00	1,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	20,00	0,00	1,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	9,40	14,80	0,00	1,00	75,80	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,70	0,00	2,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	4,00	18,20	0,00	2,00	77,90	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,70	0,00	1,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	02/08/2023	6,10%	6,10%	3,60	14,50	0,00	2,00	75,80	0,07		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	1,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,20	0,00	1,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,60	0,00	2,00	78,90	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	02/08/2023	0,70%	0,70%	4,50	14,30	0,00	1,00	80,50	0,09		0,00	21,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,10	0,00	0,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	02/08/2023	3,30%	3,30%	5,10	14,30	0,00	1,00	77,40	-0,04		0,00	73,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	1,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	7,90	13,20	0,00	1,00	78,90	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,90	0,00	2,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,50	0,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	2,80	18,40	0,00	2,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	1,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,20	0,00	2,00	79,60	0,13		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	2,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	4,10	16,80	0,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	1,00	79,60	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	9,20	12,70	0,00	1,00	78,20	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	2,90	19,10	0,00	2,00	78,00	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	02/08/2023	0,00%	0,00%	7,10	16,80	0,00	1,00	76,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	2,00	79,50	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	02/08/2023	1,60%	1,60%	3,80	14,80	0,00	1,00	79,80	0,10		0,00	25,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	1,00	79,50	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	02/08/2023	3,90%	3,90%	1,10	18,30	0,00	1,00	76,60	0,06		0,00	55,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	02/08/2023	2,20%	2,20%	3,30	15,90	0,00	1,00	78,60	0,06		0,00	33,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	02/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	02/08/2023	0,60%	1,10%	0,30	20,40	0,00	2,00	78,70	0,11		0,00	35,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	2,00	79,30	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,40	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	01/08/2023	0,30%	0,30%	3,20	17,00	0,00	2,00	79,50	-0,02		0,00	17,00	Atípico dar metano neste poço.
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,30	0,00	1,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	2,50	17,20	0,00	3,00	80,30	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,00	0,00	2,00	78,80	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	3,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,80	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,20	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,80	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,30	0,00	2,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	6,30	14,40	0,00	2,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,40	0,00	2,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	17,60	10,10	0,00	2,00	72,30	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,60	0,00	2,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	3,00	16,50	0,00	1,00	80,50	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	1,00	1,00	79,70	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	6,20	15,00	1,00	2,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	3,80	17,10	1,00	2,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	5,70	14,60	1,00	2,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,40	0,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,20	0,00	2,00	79,70	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	3,80	16,10	0,00	2,00	80,20	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	4,60	16,60	0,00	2,00	78,80	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,80	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	15,70	11,50	0,00	2,00	72,90	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,90	0,00	2,00	79,00	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,30	0,00	2,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	17,60	0,00	2,00	80,50	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	01/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,80	0,00	2,00	79,20	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	2,00	79,50	0,22		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	18,60	0,00	3,00	80,70	0,17		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
Enfermaria	PMG-71	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,10	0,00	3,00	78,60	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	11,10	0,00	3,00	87,60	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,50	0,00	3,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,10	0,00	3,00	79,90	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	3,00	79,70	0,21		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	3,00	79,90	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,60	0,00	2,00	80,00	0,21		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	03/08/2023	6,70%	6,70%	0,50	11,20	0,00	2,00	81,60	0,13		0,00	100,00	
Enfermaria	PMG-75	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	3,00	79,30	0,20		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	4,30	11,00	0,00	3,00	84,70	0,23		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,20	0,00	3,00	79,00	0,21		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	3,50	13,90	0,00	3,00	82,60	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,80	0,00	2,00	79,70	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	03/08/2023	10,90%	10,90%	0,50	14,10	0,00	3,00	74,50	0,14		0,00	100,00	
CAT	PMG-82	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,60	0,00	3,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	10,00	13,30	0,00	3,00	76,70	0,15		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	4,50	17,20	0,00	3,00	78,30	0,19		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	9,00	14,30	0,00	3,00	76,80	0,17		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,70	0,00	2,00	79,20	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	1,00	2,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,30	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,40	0,00	3,00	78,60	0,16		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,90	0,00	3,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	8,40	11,30	0,00	3,00	80,30	0,19		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,60	0,00	3,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	5,40	14,90	0,00	3,00	79,80	0,15		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,00	0,00	2,00	78,70	0,19		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,00	0,00	3,00	79,30	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,90	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	4,90	15,90	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	2,50	18,60	0,00	2,00	79,00	0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	4,60	17,00	0,00	2,00	78,40	0,16		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	04/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,90	0,00	1,00	79,50	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	04/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	2,00	79,50	0,20		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	04/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	2,00	79,50	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	04/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,50	0,00	1,00	79,60	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	04/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,20	0,00	2,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	04/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,70	0,00	1,00	79,80	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	04/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	2,00	79,50	0,17		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	04/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,60	0,00	1,00	80,00	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	04/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	1,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	04/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,50	0,00	1,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	04/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	1,00	79,70	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	04/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,10	0,00	2,00	79,80	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		31/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		31/07/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,50	0,00	3,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		31/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,50	0,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		31/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	19,20	0,00	2,00	78,70	0,16		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		31/07/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,30	0,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		31/07/2023	0,00%	0,00%	1,60	18,30	0,00	2,00	80,00	0,13		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		31/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	1,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	2,00	79,50	0,16		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,80	0,00	2,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	2,00	79,20	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	2,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		31/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	2,00	79,40	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,00	0,00	2,00	79,90	0,16		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	1,40	17,70	0,00	2,00	80,90	0,18		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,60	0,00	2,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	1,00	79,30	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	31/07/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,00	0,00	2,00	78,90	0,21		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	10,90	11,60	0,00	3,00	77,50	0,21		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	2,00	79,40	0,20		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	14,40	10,30	0,00	3,00	75,30	0,24		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,50	0,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	2,00	79,50	0,20		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,50	0,00	3,00	79,80	0,16		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	4,00	17,10	0,00	3,00	78,80	0,18		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	7,70	14,90	0,00	3,00	77,40	0,19		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	3,00	79,70	0,20		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,40	0,00	4,00	79,30	0,21		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	3,50	17,80	0,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	3,00	79,20	0,24		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,80	0,00	3,00	79,00	0,23		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	3,00	79,30	0,22		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	2,00	18,80	0,00	3,00	79,30	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	3,00	79,30	0,20		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,30	0,00	3,00	79,40	0,22		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,40	0,00	3,00	79,40	0,22		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,00	0,00	3,00	79,20	0,21		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,10	0,00	3,00	79,00	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	2,70	18,30	0,00	4,00	78,90	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,10	0,00	3,00	79,20	0,22		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	03/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,70	0,00	3,00	79,40	0,24		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	5,40	16,80	0,00	2,00	77,80	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	4,90	17,60	0,00	2,00	77,60	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	1,70	20,00	0,00	2,00	78,30	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,50	0,00	2,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	2,00	79,50	0,06		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-18	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,10	0,00	2,00	79,10	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,30	0,00	2,00	78,60	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,50	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	21,00	0,00	4,00	78,90	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	2,00	19,20	0,00	3,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,50	0,00	2,00	79,20	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,60	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,20	0,00	1,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,90	0,00	1,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	1,00	79,50	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	2,00	79,40	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	2,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	1,00	79,40	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,00	0,00	3,00	78,80	0,23		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	08/08/2023	0,20%	0,20%	4,60	16,10	0,00	3,00	79,10	0,16		2,00	13,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	3,40	18,50	0,00	2,00	78,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	4,00	17,70	0,00	2,00	78,30	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,60	0,00	2,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	2,10	19,30	0,00	2,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	3,30	18,30	0,00	3,00	78,40	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	4,70	17,20	0,00	3,00	78,10	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	21,00	0,00	3,00	78,50	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,10	0,00	3,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,60	0,00	3,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,10	0,00	4,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	2,10	20,00	0,00	3,00	78,00	0,21		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,40	0,00	3,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,40	0,00	2,00	78,50	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,60	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,40	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	2,00	79,50	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	1,00	79,40	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,40	0,00	2,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,70	0,00	2,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	20,30	0,00	2,00	78,20	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,20	0,00	2,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	18,80	0,00	2,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	4,70	16,50	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,40	0,00	2,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	2,20	18,40	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,40	0,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,70	0,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,60	0,00	2,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,60	0,00	2,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,50	0,00	2,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,70	1,00	3,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	1,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	2,00	79,50	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,90	0,00	2,00	79,20	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,70	0,00	1,00	79,50	0,06		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,00	1,00	1,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,00	1,00	1,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,30	0,00	1,00	79,70	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,50	0,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	4,80	16,40	0,00	2,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,30	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,30	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	18,80	0,00	2,00	79,70	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	18,90	0,00	2,00	79,20	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	2,00	79,60	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,60	0,00	2,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,20	0,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,80	0,00	1,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,90	0,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	11,80	12,30	0,00	1,00	75,80	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	1,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	2,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	2,00	79,20	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	1,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,50	0,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	7,70	15,70	0,00	1,00	76,60	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,00	0,00	2,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	1,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	07/08/2023	0,30%	0,30%	1,30	18,70	1,00	1,00	79,70	0,07		0,00	41,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	1,00	79,70	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	2,00	79,70	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	2,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,50	0,00	2,00	79,70	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,40	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,20	0,00	2,00	79,80	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	2,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	2,00	79,50	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	09/08/2023	0,50%	0,50%	0,70	19,20	0,00	2,00	79,50	0,17		0,00	12,00	Atípico encontrar metano neste poço.
Edifício I-4	PMG-66	B	09/08/2023	6,50%	6,50%	1,60	18,30	0,00	2,00	73,60	0,13		0,00	100,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,40	0,00	2,00	79,00	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	18,90	0,00	2,00	80,10	0,27		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,40	0,00	2,00	79,00	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,00	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	2,00	79,50	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,60	0,00	2,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,30	0,00	2,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	2,00	18,80	0,00	1,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,50	0,00	2,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	1,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,40	0,12		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-80	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	2,00	79,60	-0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,50	0,00	2,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	2,00	79,70	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,10	0,00	2,00	78,80	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	2,80	15,00	0,00	2,00	82,20	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,90	0,00	2,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,60	0,00	2,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	3,60	16,20	0,00	2,00	80,20	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,60	0,00	2,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,10	0,00	1,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	5,30	15,40	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,90	0,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,40	0,00	2,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,90	0,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,90	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,90	0,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	12,30	13,80	0,00	2,00	74,00	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,80	0,00	1,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	4,30	18,00	0,00	1,00	77,70	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,60	0,00	1,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	09/08/2023	6,20%	6,20%	4,10	13,90	0,00	1,00	75,90	0,07		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	1,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	1,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	09/08/2023	1,40%	1,40%	4,50	14,00	0,00	2,00	80,10	0,04		0,00	36,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,60	0,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	09/08/2023	3,30%	3,30%	5,40	14,10	0,00	1,00	77,20	-0,01		0,00	60,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	1,00	79,50	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	09/08/2023	2,50%	2,50%	7,70	13,00	0,00	1,00	76,90	0,01		0,00	54,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,90	0,00	2,00	78,60	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,90	0,00	2,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,40	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	3,10	18,10	0,00	2,00	78,80	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,30	0,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,30	0,00	2,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,60	0,00	2,00	79,00	13,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	3,20	17,80	0,00	2,00	79,00	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	11,20	12,00	0,00	2,00	76,80	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	4,90	18,30	0,00	2,00	76,80	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	09/08/2023	0,00%	0,00%	6,80	16,90	0,00	2,00	76,20	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	1,00	79,40	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	09/08/2023	2,50%	2,50%	4,10	14,20	0,00	1,00	79,10	0,10		0,00	38,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	1,00	79,50	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	09/08/2023	5,20%	5,20%	1,40	17,80	0,00	2,00	75,50	0,07		0,00	73,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	09/08/2023	3,00%	3,00%	3,00	16,30	0,00	1,00	77,70	0,08		0,00	58,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	09/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,20	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	09/08/2023	0,40%	0,90%	0,30	20,30	0,00	1,00	78,90	0,08		0,00	7,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	3,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,20	0,00	3,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	2,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	08/08/2023	0,50%	0,50%	6,00	14,10	0,00	3,00	79,40	0,19		0,00	16,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,60	0,00	3,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	3,30	15,80	0,00	3,00	80,90	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,20	0,00	3,00	78,50	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,40	0,00	3,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,80	0,00	4,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	3,00	79,00	0,20		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	3,00	79,10	0,21		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	3,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,80	0,00	3,00	79,20	0,21		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	3,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,70	0,00	2,00	78,50	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	10,50	11,70	0,00	2,00	77,80	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	3,00	18,20	0,00	1,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	11,90	12,10	0,00	2,00	76,00	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,00	0,00	2,00	80,50	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	3,00	15,80	0,00	2,00	81,20	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	2,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	6,00	15,10	0,00	1,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	3,80	17,60	0,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	5,20	14,80	0,00	2,00	79,90	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,70	0,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,10	0,00	2,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	3,80	16,70	0,00	2,00	79,50	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	4,10	15,90	0,00	2,00	80,00	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	08/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,60	0,00	2,00	78,60	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	10,10	12,40	0,00	2,00	77,40	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,80	0,00	3,00	78,90	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,50	0,00	3,00	78,60	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	1,70	18,00	0,00	2,00	80,30	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	3,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	08/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	3,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	1,00	79,80	0,14		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	18,10	0,00	1,00	80,80	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,50	0,00	1,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	9,20	0,00	1,00	89,20	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	1,00	79,70	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	18,70	0,00	2,00	80,40	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,60	0,00	2,00	79,00	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,70	0,00	2,00	79,80	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,20	0,00	2,00	80,10	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	10/08/2023	5,90%	5,90%	0,60	11,80	0,00	1,00	81,70	0,17		0,00	100,00	
Enfermaria	PMG-75	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	2,00	79,80	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	4,20	11,80	0,00	1,00	83,90	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,70	0,00	2,00	79,40	0,15		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Enfermaria	PMG-76	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	3,70	14,00	0,00	2,00	82,30	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,40	0,00	1,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	10/08/2023	11,00%	11,00%	0,70	13,20	0,00	1,00	75,10	0,13		0,00	100,00	
CAT	PMG-82	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,10	0,00	1,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	8,80	14,60	0,00	1,00	76,60	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	3,40	18,00	0,00	1,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	6,50	15,60	0,00	1,00	77,90	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,30	0,00	1,00	79,50	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	4,00	18,20	0,00	0,00	78,00	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	2,50	18,70	0,00	0,00	78,90	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	3,00	18,80	0,00	1,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,40	0,00	1,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	8,40	11,70	0,00	1,00	79,80	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,10	0,00	1,00	79,60	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	3,90	16,60	0,00	1,00	79,50	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,60	0,00	1,00	79,30	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,70	0,00	1,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	0,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	5,40	15,70	0,00	1,00	78,90	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	2,90	18,10	0,00	1,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	5,10	16,60	0,00	1,00	78,30	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	11/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,20	0,00	3,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	11/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	3,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	11/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	2,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	11/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,80	0,00	3,00	79,40	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	11/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	2,00	79,50	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	11/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,50	0,00	3,00	80,00	0,17		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	11/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	2,00	79,70	0,20		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	11/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	18,70	0,00	3,00	79,90	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	11/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	2,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	11/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,60	0,00	2,00	79,60	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	11/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	2,00	79,60	0,20		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	11/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,30	0,00	3,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		07/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	2,00	79,50	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		07/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	3,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		07/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,30	0,00	3,00	79,20	0,23		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		07/08/2023	0,00%	0,00%	3,00	18,50	0,00	3,00	78,50	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		07/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	3,00	79,40	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		07/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	18,90	0,00	3,00	80,10	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		07/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,40	0,00	3,00	79,40	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	3,00	79,70	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,40	0,00	2,00	79,70	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	3,00	79,50	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,00	0,00	3,00	79,80	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	3,00	79,50	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	3,00	79,60	0,24		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		07/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,50	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	3,00	79,50	0,21		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	4,50	14,30	0,00	3,00	81,10	0,24		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	3,00	79,50	0,22		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	17,50	0,00	3,00	81,20	0,21		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	3,00	79,30	0,18		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,50	0,16		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	2,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,00	0,18		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	07/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,60	0,00	2,00	79,40	0,15		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,80	0,00	2,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	10,50	11,90	0,00	2,00	77,60	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	1,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	10,40	12,00	0,00	2,00	77,60	0,15		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,90	0,00	2,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	2,00	79,60	0,16		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	2,00	79,50	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	4,10	17,90	0,00	2,00	78,00	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	7,10	15,20	0,00	2,00	77,70	0,17		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,50	0,00	1,00	80,00	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,40	0,00	2,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	3,50	17,80	0,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	2,00	79,20	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	2,40	18,70	0,00	2,00	78,90	0,20		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	2,00	79,20	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,70	0,00	2,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,20	0,00	1,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	2,50	18,30	0,00	2,00	79,20	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,20	0,00	2,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	2,00	19,00	0,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,10	0,00	2,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	2,80	18,30	0,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	10/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,00	0,00	2,00	79,00	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	10/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,70	0,00	3,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	4,80	17,60	0,00	2,00	77,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	7,70	15,50	0,00	2,00	76,80	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	3,40	18,70	0,00	2,00	77,90	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	2,60	18,80	0,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	1,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,50	0,00	1,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,40	0,00	2,00	79,00	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	5,00	16,60	0,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	1,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,00	0,00	2,00	79,30	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	1,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	1,70	18,70	0,00	2,00	79,60	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	1,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	1,00	79,70	0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-115	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	2,00	79,60	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	1,00	79,60	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,30	0,00	3,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	15/08/2023	0,30%	0,30%	4,70	15,60	0,00	4,00	79,40	0,16		0,00	9,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	3,40	17,90	0,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	5,20	16,40	0,00	2,00	78,40	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	2,10	19,30	0,00	2,00	78,60	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	3,60	17,80	0,00	2,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	3,10	17,80	0,00	4,00	79,00	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	5,10	16,60	0,00	3,00	78,40	0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	3,00	79,10	0,22		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	3,00	79,40	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,90	0,00	2,00	78,60	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,00	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	2,00	19,40	0,00	3,00	78,60	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	18,90	0,00	3,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	3,00	79,50	0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	3,00	79,50	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,00	0,00	1,00	79,50	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	1,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	2,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,40	0,00	2,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,60	0,00	3,00	79,00	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	3,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,30	0,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,50	0,00	2,00	79,10	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	4,80	16,90	0,00	2,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,40	0,00	0,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,00	0,00	0,00	79,20	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	0,00	79,50	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,40	0,00	0,00	79,30	-0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	20,00	0,00	2,00	78,60	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,90	0,00	2,00	78,90	0,18		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,80	0,00	3,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,24		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,20	0,00	3,00	79,70	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,20	0,00	2,00	79,00	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	2,00	79,50	0,20		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,40	0,00	2,00	79,20	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,10	0,00	1,00	79,70	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,30	0,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	4,20	16,90	0,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,20	0,00	3,00	79,20	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,20	0,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,30	0,00	2,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	18,70	0,00	2,00	79,80	0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,50	0,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	3,00	17,90	0,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,60	0,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,80	0,00	2,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	2,00	79,30	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	2,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	12,30	12,10	0,00	2,00	75,60	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	3,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	2,00	79,70	0,23		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	3,00	79,80	0,24		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,40	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	8,40	15,30	0,00	1,00	76,30	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,80	0,21		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,70	0,00	3,00	79,90	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	2,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	16/08/2023	0,70%	0,70%	2,00	18,20	0,00	3,00	79,10	0,17		0,00	14,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,30	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	2,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,30	0,00	1,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,40	0,00	1,00	79,10	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,40	0,00	1,00	79,30	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,70	0,00	1,00	79,50	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,00	0,00	1,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,10	0,00	1,00	79,20	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	1,00	79,60	0,04		0,00	0,00	Medição feita pela manhã.
Edifício I-4	PMG-66	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,50	0,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	Medição feita à tarde.
Edifício I-4	PMG-66	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,60	0,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	Medição feita pela manhã.
Edifício I-4	PMG-66	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	3,00	79,50	0,19		0,00	0,00	Medição feita à tarde.
Edifício I-4	PMG-66	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,70	0,00	1,00	80,00	0,08		0,00	0,00	Medição feita pela manhã.
Edifício I-4	PMG-66	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	3,00	79,70	0,17		0,00	0,00	Medição feita à tarde.
Edifício I-4	PMG-66	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,50	0,00	1,00	79,60	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	1,00	79,40	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,20	0,00	1,00	79,60	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	1,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,10	0,00	1,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	2,40	18,70	0,00	1,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,40	0,00	2,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,20	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	2,00	18,90	0,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	2,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	1,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,20	0,00	1,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	2,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	1,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	1,00	79,20	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,70	0,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,40	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,20	0,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-147	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	1,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,50	0,00	1,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,70	0,00	1,00	79,50	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	3,30	17,30	0,00	1,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,80	0,00	2,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,30	0,00	2,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	6,80	14,70	0,00	1,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	20,20	0,00	1,00	78,40	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,70	0,00	2,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	1,70	20,20	0,00	2,00	78,10	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	2,40	19,40	0,00	2,00	78,20	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	20,10	0,00	2,00	78,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	10,10	14,80	0,00	2,00	75,10	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,30	0,00	1,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	4,00	18,40	0,00	2,00	77,70	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,80	0,00	1,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	14/08/2023	5,70%	6,30%	3,80	14,50	0,00	1,00	76,00	0,09		0,00	81,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,60	0,00	1,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,70	0,00	1,00	78,90	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,60	0,00	2,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	14/08/2023	3,00%	3,00%	5,20	13,30	0,00	1,00	78,50	0,08		0,00	63,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	20,00	0,00	1,00	78,50	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	14/08/2023	3,40%	3,40%	5,50	14,00	0,00	1,00	77,10	0,08		0,00	50,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,60	0,00	1,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	14/08/2023	1,00%	1,00%	8,20	12,80	0,00	1,00	78,10	0,08		0,00	22,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,60	0,00	1,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,90	0,00	1,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	20,00	0,00	2,00	78,60	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	3,30	18,10	0,00	2,00	78,60	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,10	0,00	2,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,50	0,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	5,00	16,30	0,00	2,00	78,80	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,30	0,00	2,00	78,80	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	10,40	12,30	0,00	2,00	77,30	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	4,70	18,50	0,00	1,00	76,80	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	14/08/2023	0,00%	0,00%	6,60	17,30	0,00	1,00	76,10	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	2,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	14/08/2023	4,40%	4,40%	4,80	13,60	0,00	2,00	77,20	0,08		0,00	60,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	1,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	14/08/2023	4,20%	4,20%	1,10	18,80	0,00	2,00	75,90	0,14		0,00	89,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	14/08/2023	3,90%	3,90%	3,60	15,70	0,00	2,00	76,80	0,08		0,00	55,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	14/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	0,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	14/08/2023	0,70%	1,00%	0,40	20,30	0,00	2,00	78,60	0,11		0,00	38,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	3,00	80,10	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	7,00	12,60	0,00	3,00	80,50	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,50	0,00	3,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	15/08/2023	0,70%	0,70%	7,50	13,00	0,00	3,00	78,80	0,15		0,00	13,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	3,00	79,60	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	3,60	15,20	0,00	3,00	81,20	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,80	0,00	3,00	79,10	0,20		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,40	0,00	3,00	79,70	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	3,00	79,50	0,20		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	15/08/2023	1,60%	3,10%	0,70	19,80	0,00	3,00	77,90	0,17		0,00	32,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	3,00	79,50	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	3,00	79,50	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	3,00	79,50	0,21		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	2,00	79,50	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,90	0,00	2,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	10,90	11,50	0,00	2,00	77,70	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	4,10	17,40	0,00	1,00	78,50	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	10,60	11,30	0,00	1,00	78,10	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,20	0,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	3,10	16,10	0,00	2,00	80,80	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	2,00	79,50	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	7,00	14,50	0,00	2,00	78,50	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	3,90	17,10	0,00	2,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	5,60	14,40	0,00	2,00	80,00	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,60	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	2,00	18,00	0,00	2,00	80,00	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	15/08/2023	0,00%	0,00%	3,90	16,00	0,00	1,00	80,10	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	4,60	16,80	0,00	2,00	78,60	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	2,10	19,10	0,00	2,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	12,20	11,70	0,00	2,00	76,10	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,60	0,00	3,00	80,00	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,70	0,00	3,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	18,30	0,00	3,00	80,70	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	3,00	79,50	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	15/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	2,00	79,50	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	1,00	80,10	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	17,80	0,00	0,00	81,20	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	0,00	79,60	0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	12,10	0,00	0,00	86,70	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	1,00	80,20	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	18,50	0,00	1,00	80,60	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,40	0,00	2,00	79,60	0,20		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,50	0,00	2,00	80,10	0,20		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,00	0,00	1,00	80,30	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	17/08/2023	5,90%	5,90%	0,60	11,80	0,00	1,00	81,70	0,07		0,00	100,00	
Enfermaria	PMG-75	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,30	0,00	2,00	79,20	0,22		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	3,60	13,20	0,00	2,00	83,20	0,24		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,80	0,00	2,00	79,60	0,21		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	5,40	11,30	0,00	3,00	83,30	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,20	0,00	0,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	17/08/2023	12,60%	12,60%	0,80	12,50	0,00	0,00	74,00	0,09		0,00	100,00	
CAT	PMG-82	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	1,70	18,60	0,00	1,00	79,70	0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	10,50	13,30	0,00	1,00	76,20	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	4,40	17,00	0,00	1,00	78,60	0,12		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
CAT	PMG-83	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	8,40	14,20	0,00	0,00	77,40	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,20	0,00	1,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	6,30	15,00	0,00	1,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	18,90	0,00	1,00	79,30	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	3,70	18,60	0,00	1,00	77,70	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,60	0,00	1,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	8,10	11,60	0,00	1,00	80,30	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,30	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	4,60	15,60	0,00	1,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,80	0,00	1,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,70	0,00	1,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,70	0,00	1,00	79,80	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	4,90	15,70	0,00	1,00	79,30	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,00	0,00	1,00	79,80	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	3,90	17,00	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	18/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	3,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	18/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	2,00	79,50	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	18/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	2,00	79,80	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	18/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,00	0,00	3,00	80,00	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	18/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	2,00	79,70	0,20		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	18/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,70	0,00	2,00	80,00	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	18/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	2,00	79,50	0,20		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	18/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	18,50	0,00	2,00	80,10	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	18/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	2,00	79,60	0,20		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	18/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,20	0,00	2,00	79,90	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	18/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	2,00	79,80	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	18/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	18,90	0,00	3,00	80,00	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		16/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	2,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		16/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	2,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		16/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	1,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		16/08/2023	0,00%	0,00%	2,90	18,20	0,00	1,00	78,80	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		16/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	2,00	79,90	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		16/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	17,80	0,00	2,00	80,40	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		16/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	1,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	1,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,50	0,00	1,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	2,00	79,70	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	1,00	79,70	-0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	2,00	79,70	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		16/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	1,00	79,90	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	4,70	14,70	0,00	1,00	80,60	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	2,00	79,70	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	17,40	0,00	1,00	81,10	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	2,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	2,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,60	0,00	2,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	2,00	79,50	0,11		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Portaria P3	PMG-120	C	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	2,00	79,60	0,15		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,60	0,15		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	16/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	2,00	79,50	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,40	0,00	2,00	79,40	0,19		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	10,30	11,30	0,00	3,00	78,40	0,19		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	2,00	79,80	0,18		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	13,30	9,90	0,00	2,00	76,80	0,19		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,40	0,00	2,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	2,00	79,80	0,19		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	17/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,60	0,00	2,00	80,10	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	3,70	17,50	0,00	2,00	78,90	0,14		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	5,60	16,00	0,00	2,00	78,40	0,14		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	17/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,30	0,00	2,00	80,20	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	18/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	1,00	80,00	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	18/08/2023	0,00%	0,00%	3,40	17,40	0,00	2,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	18/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,70	0,00	2,00	79,70	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	18/08/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,30	0,00	2,00	79,50	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	18/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,60	0,00	2,00	79,70	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	18/08/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,30	0,00	2,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	18/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,80	0,00	2,00	79,60	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	18/08/2023	0,00%	0,00%	2,40	18,00	0,00	2,00	79,70	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	18/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,80	0,00	2,00	79,60	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	18/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	18,50	0,00	2,00	79,60	7,91		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	18/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,80	0,00	2,00	79,60	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	18/08/2023	0,00%	0,00%	2,70	18,00	0,00	2,00	79,30	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	18/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,70	0,00	3,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	18/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,30	0,00	2,00	79,60	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	3,00	18,30	0,00	4,00	78,70	0,24		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	4,20	17,40	0,00	4,00	78,40	0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,80	0,00	2,00	79,30	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	18,80	0,00	2,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	1,00	80,60	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	18,20	0,00	1,00	80,00	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,70	0,00	2,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	2,00	79,60	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	4,00	79,20	0,21		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	18,90	0,00	3,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	2,00	79,70	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,40	0,00	2,00	79,70	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	1,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,40	0,00	1,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	1,00	79,80	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,80	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	2,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,70	0,00	1,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,30	0,00	4,00	79,20	0,28		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	22/08/2023	0,10%	0,10%	4,00	16,00	0,00	3,00	79,90	0,17		0,00	4,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	3,80	17,30	0,00	2,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	4,50	17,00	0,00	2,00	78,60	0,14		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-13	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,40	0,00	2,00	79,00	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	2,00	19,00	0,00	2,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	4,00	17,60	0,00	4,00	78,40	0,24		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	5,10	16,50	0,00	5,00	78,40	0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	4,00	79,20	0,23		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	3,00	79,40	0,24		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	4,00	79,50	0,22		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,50	0,00	4,00	79,30	0,26		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	2,60	18,80	0,00	3,00	78,60	0,27		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	2,20	18,70	0,00	3,00	79,10	0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,70	0,00	2,00	79,20	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,50	0,00	2,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	1,00	79,80	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	1,00	79,80	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	2,00	79,80	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	3,00	80,40	0,26		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,70	0,00	3,00	79,80	0,21		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,70	0,00	3,00	79,20	0,20		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,70	0,00	3,00	79,80	0,24		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	18,70	0,00	3,00	79,50	0,23		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	4,60	15,70	0,00	3,00	79,70	0,24		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,40	0,00	1,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,00	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,00	0,00	1,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,40	0,00	1,00	79,40	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,50	0,00	1,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,60	0,00	2,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,50	0,00	1,00	79,50	0,16		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	2,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	2,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,90	0,00	2,00	78,70	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,40	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,00	0,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	0,00	79,40	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	3,00	79,40	0,26		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,60	0,00	3,00	79,80	0,25		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	2,00	79,40	0,23		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	3,70	16,70	0,00	3,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	3,00	79,70	0,24		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,00	0,00	3,00	79,70	0,23		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,80	0,00	1,00	79,20	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,70	18,40	0,00	2,00	80,00	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	1,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	3,00	17,90	0,00	1,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	1,00	79,70	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,30	0,00	2,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,30	0,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	1,00	79,60	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	1,00	79,70	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	13,10	11,60	0,00	1,00	75,30	0,07		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	1,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	1,00	79,70	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,40	0,00	2,00	79,20	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,40	0,00	4,00	79,40	0,24		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	5,40	16,60	0,00	4,00	77,90	0,23		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,40	0,22		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	2,00	79,50	0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	1,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	21/08/2023	0,80%	0,80%	2,40	17,90	0,00	1,00	78,80	0,07		0,00	15,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	1,00	79,80	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	2,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	3,00	79,30	0,24		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,30	0,00	3,00	80,00	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	2,00	79,60	0,23		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,60	0,00	3,00	79,90	0,23		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,00	0,00	3,00	79,40	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	3,00	79,80	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	3,00	79,80	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,70	0,00	3,00	79,90	0,26		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	2,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,10	0,00	2,00	80,20	0,22		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,90	0,00	3,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,60	0,00	3,00	79,60	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	2,00	79,80	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	18,50	0,00	3,00	79,70	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	3,00	79,70	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,20	0,00	2,00	80,10	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	3,00	79,70	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,80	0,00	2,00	79,70	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,20	0,00	3,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	2,00	79,70	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	3,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	3,00	79,80	0,23		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,60	0,00	3,00	80,00	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	2,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,60	0,00	3,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	2,00	79,60	0,24		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,70	0,00	2,00	79,90	0,26		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,50	0,00	3,00	79,90	0,23		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,70	0,00	3,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	18,40	0,00	3,00	80,20	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,30	0,00	2,00	79,50	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,60	0,00	3,00	79,90	0,23		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	5,00	15,00	0,00	3,00	80,00	0,24		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,50	0,00	3,00	79,30	0,23		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	3,00	79,70	0,21		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,80	0,00	3,00	78,50	0,21		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,20	0,00	3,00	79,00	0,19		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,80	0,00	2,00	78,90	0,21		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	9,90	13,90	0,00	3,00	76,20	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	3,00	79,70	0,24		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	3,20	17,90	0,00	3,00	78,90	0,20		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	198,00	0,00	2,00	79,90	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	23/08/2023	5,70%	6,30%	3,70	13,50	0,00	2,00	77,10	0,15		0,00	78,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	3,00	79,50	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	2,00	79,70	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,40	0,00	2,00	79,30	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	23/08/2023	6,30%	6,30%	5,00	13,00	0,00	2,00	75,80	0,15		0,00	98,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	18,90	0,00	1,00	79,70	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	23/08/2023	3,00%	3,00%	4,70	14,20	0,00	2,00	78,00	0,04		0,00	66,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,30	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	23/08/2023	0,30%	0,30%	7,20	12,80	0,00	1,00	79,80	0,06		0,00	13,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,10	0,00	1,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,00	0,00	2,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	2,00	79,70	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	17,20	0,00	2,00	79,80	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,60	0,00	2,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,40	0,00	2,00	79,70	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,20	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	3,60	16,70	0,00	2,00	79,70	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,60	0,00	1,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	9,60	11,90	0,00	1,00	78,50	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	4,30	18,10	0,00	3,00	77,60	0,24		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	23/08/2023	0,00%	0,00%	6,70	16,80	0,00	3,00	76,50	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	3,00	79,50	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	23/08/2023	10,60%	10,60%	4,70	12,70	0,00	2,00	72,00	0,16		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	2,00	79,70	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	23/08/2023	10,90%	10,90%	2,10	16,50	0,00	2,00	70,50	0,16		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	23/08/2023	2,10%	2,60%	3,20	15,80	0,00	2,00	78,90	0,18		0,00	54,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	23/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,80	0,00	1,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	23/08/2023	0,60%	1,00%	0,40	19,70	0,00	2,00	79,40	0,19		0,00	32,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,80	0,00	4,00	78,80	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	3,20	16,80	0,00	3,00	80,00	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	3,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	22/08/2023	0,50%	0,50%	7,60	12,50	0,00	4,00	79,40	0,24		0,00	7,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	3,00	79,70	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	2,70	16,00	0,00	3,00	81,30	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	4,00	79,70	0,22		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	3,00	79,80	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	80,00	0,20		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	22/08/2023	0,30%	0,70%	0,10	19,90	0,00	3,00	79,70	0,20		0,00	17,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	79,90	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	3,00	79,80	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	4,00	79,90	0,20		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	3,00	79,80	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,70	0,00	2,00	79,20	0,18		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	6,70	13,80	0,00	2,00	79,50	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	2,20	17,90	0,00	1,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	12,60	11,50	0,00	1,00	75,90	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,10	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	3,00	16,00	0,00	2,00	81,00	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	2,00	79,90	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	7,20	14,00	0,00	2,00	78,70	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	4,10	16,80	0,00	2,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	5,20	14,50	0,00	2,00	80,40	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,30	0,00	2,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	2,20	17,60	0,00	2,00	80,20	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	3,30	16,60	0,00	2,00	80,10	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	4,50	16,30	0,00	2,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	22/08/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,70	0,00	2,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	12,50	11,30	0,00	2,00	76,30	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	4,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	4,00	79,30	0,20		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	2,70	17,00	0,00	4,00	80,30	0,20		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	22/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	3,00	79,80	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	3,00	79,70	0,20		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	18,10	0,00	3,00	81,10	0,24		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	2,00	79,50	0,21		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	10,70	0,00	3,00	88,10	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	2,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	18,90	0,00	2,00	80,30	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,80	0,00	2,00	79,70	0,23		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	3,00	80,00	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,30	0,00	3,00	80,10	0,24		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	24/08/2023	5,10%	5,10%	0,50	12,10	0,00	2,00	82,30	0,21		0,00	100,00	
Enfermaria	PMG-75	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,40	0,00	3,00	78,90	0,21		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	4,70	11,60	0,00	3,00	83,70	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,80	0,00	3,00	79,30	0,22		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	3,30	13,90	0,00	3,00	82,80	0,23		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,50	0,00	3,00	79,90	0,21		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	24/08/2023	10,90%	10,90%	0,60	12,90	0,00	3,00	75,50	0,24		0,00	100,00	
CAT	PMG-82	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	2,20	18,30	0,00	3,00	79,60	0,22		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	10,90	12,90	0,00	3,00	76,20	0,24		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	3,20	17,30	0,00	2,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	8,60	14,10	0,00	2,00	77,30	0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,60	0,00	2,00	79,60	0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,20	0,00	2,00	80,10	0,16		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	2,60	19,00	0,00	2,00	78,40	0,19		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	2,30	19,10	0,00	3,00	78,60	0,19		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,80	0,00	3,00	79,50	0,23		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	6,40	12,60	0,00	3,00	80,90	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,60	0,00	3,00	79,10	0,21		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	4,30	15,80	0,00	2,00	79,90	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,80	0,00	2,00	79,20	0,24		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,80	0,00	3,00	79,70	0,18		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
CAT	PMG-160	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,70	0,00	1,00	79,70	0,16		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	4,20	16,30	0,00	2,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	2,60	18,50	0,00	2,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	4,70	16,90	0,00	2,00	78,40	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	25/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	2,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	25/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,40	0,00	2,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	25/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	25/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,00	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	25/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,50	0,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	25/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	1,00	79,60	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	25/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,80	0,00	2,00	79,70	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	25/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,40	0,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	25/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,50	0,00	2,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	25/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,00	0,00	2,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	25/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	25/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,00	0,00	2,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		21/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	3,00	79,50	0,24		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		21/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	4,00	79,50	0,24		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		21/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	3,00	79,20	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		21/08/2023	0,00%	0,00%	2,90	18,50	0,00	3,00	78,90	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		21/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	3,00	79,40	0,24		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		21/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	18,60	0,00	3,00	80,10	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		21/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	3,00	79,40	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	3,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,40	0,00	3,00	79,80	0,17		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,60	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	3,00	79,50	0,23		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	4,00	79,70	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		21/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	3,00	79,50	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	3,00	79,50	0,21		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	4,70	14,40	0,00	3,00	80,90	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	3,00	79,40	0,21		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	17,10	0,00	3,00	81,30	0,28		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,60	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	2,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	2,00	79,70	0,15		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	21/08/2023	4,70%	4,70%	11,00	8,30	0,00	2,00	76,00	0,14		0,00	50,00	Atípico encontrar metano neste poço.
Portaria P3	PMG-163	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,60	0,18		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	21/08/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,50	0,00	2,00	78,80	0,14		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	21/08/2023	0,10%	0,30%	0,30	20,20	0,00	2,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	25/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,60	0,00	2,00	78,80	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	25/08/2023	0,00%	0,00%	9,00	12,20	0,00	2,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	25/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	2,00	79,50	0,15		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	25/08/2023	0,00%	0,00%	13,80	9,40	0,00	2,00	76,80	0,09		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	25/08/2023	0,00%	0,00%	2,80	18,60	0,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	25/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,10	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	25/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	2,00	79,40	0,12		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Transportes	PMG-124	B	25/08/2023	0,00%	0,00%	4,50	16,50	0,00	2,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	25/08/2023	0,00%	0,00%	8,80	14,10	0,00	2,00	77,10	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	25/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	2,00	79,60	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	4,00	79,60	0,20		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	3,40	17,60	0,00	3,00	79,00	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	3,00	79,50	0,28		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	18,60	0,00	3,00	79,60	0,24		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	4,00	79,50	0,25		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	18,70	0,00	3,00	79,70	0,24		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	3,00	79,40	0,24		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	18,50	0,00	4,00	79,70	0,20		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	3,00	79,40	0,24		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	18,60	0,00	4,00	79,90	0,20		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,80	0,00	3,00	79,50	0,26		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	2,40	18,20	0,00	3,00	79,40	0,24		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	24/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,60	0,00	3,00	79,20	0,27		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	24/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,30	0,00	3,00	79,60	0,29		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	3,50	17,90	0,00	1,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	6,60	15,90	0,00	1,00	77,50	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	2,60	19,30	0,00	1,00	78,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	2,80	18,40	0,00	2,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	0,00	80,30	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	3,00	17,80	0,00	0,00	79,10	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	1,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	1,00	79,40	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	3,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	3,30	18,10	0,00	3,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	1,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,10	0,00	1,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,60	0,00	0,00	79,70	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	2,90	17,70	0,00	0,00	79,40	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	0,00	79,70	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	0,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,80	0,00	0,00	79,60	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	0,00	79,70	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,80	0,00	3,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	29/08/2023	0,20%	0,20%	10,20	12,60	0,00	3,00	77,00	0,11		0,00	4,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	2,80	18,30	0,00	1,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	4,90	16,80	0,00	1,00	78,40	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	2,30	19,10	0,00	1,00	78,60	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	3,00	18,30	0,00	1,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	4,30	17,50	0,00	3,00	78,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	5,50	16,70	0,00	3,00	77,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,60	0,00	3,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	3,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,40	0,00	3,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,70	0,00	2,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	2,50	19,40	0,00	2,00	78,10	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	2,30	19,10	0,00	3,00	78,60	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,00	0,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-24	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,90	0,00	1,00	79,20	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	0,00	79,80	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	0,00	79,80	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	0,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,70	0,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,40	0,00	1,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,30	0,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,30	0,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,70	0,00	1,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,10	0,00	1,00	78,70	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,20	0,00	1,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,20	0,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,20	0,00	2,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,70	0,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,40	0,00	1,00	78,50	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,30	0,00	1,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,10	0,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,70	0,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	1,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,60	0,00	4,00	78,60	0,20		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,90	0,00	5,00	79,10	0,23		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,60	0,00	0,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	1,00	79,40	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,80	0,00	4,00	79,10	0,22		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,90	0,00	5,00	79,40	0,22		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,70	0,00	5,00	79,00	0,23		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	3,60	17,50	0,00	5,00	78,90	0,24		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,50	0,00	5,00	78,70	0,22		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,60	0,00	5,00	79,00	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,10	0,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	2,00	18,30	0,00	1,00	79,80	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	1,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	3,20	17,80	0,00	1,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	1,00	79,50	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,40	0,00	1,00	79,20	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,20	0,00	1,00	79,40	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	1,00	79,50	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	0,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	11,20	12,70	0,00	1,00	76,10	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	1,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	0,00	79,60	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,80	0,00	3,00	79,00	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	3,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,10	0,00	3,00	78,90	0,22		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	6,10	16,50	0,00	3,00	77,40	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,00	0,00	2,00	78,90	0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,40	0,00	3,00	79,00	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	0,00	79,70	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	28/08/2023	0,80%	0,80%	2,80	17,70	0,00	0,00	78,70	0,02		0,00	15,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,10	0,00	1,00	79,00	0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,60	0,00	1,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,40	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,70	0,00	2,00	79,70	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	2,00	79,50	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,50	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	2,00	79,30	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	2,00	79,60	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	3,00	79,50	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	2,00	79,60	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	2,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,20	0,00	2,00	79,70	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	2,00	79,40	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	3,00	79,60	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	2,20	18,50	0,00	2,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	2,00	79,50	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,40	0,00	2,00	79,60	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	2,00	79,40	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	18,90	0,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,50	0,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	2,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	2,00	79,70	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	2,00	79,40	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	2,00	79,60	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	2,00	79,50	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,70	0,00	2,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,90	0,00	2,00	79,40	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	2,40	15,70	0,00	2,00	81,90	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,70	0,00	2,00	79,20	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	3,20	16,60	0,00	2,00	80,30	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,70	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,00	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	5,80	15,10	0,00	2,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,80	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,50	0,00	2,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,90	0,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,40	0,00	2,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,90	0,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	9,70	14,70	0,00	2,00	75,60	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,10	0,00	1,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	3,70	18,20	0,00	2,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	1,00	79,70	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	30/08/2023	5,10%	5,10%	3,90	14,00	0,00	1,00	77,00	0,05		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,60	0,00	1,00	79,80	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	1,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,00	0,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	30/08/2023	9,20%	9,20%	5,30	13,50	0,00	1,00	72,10	0,08		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,40	0,00	1,00	79,50	0,09		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	30/08/2023	3,70%	3,70%	5,30	14,30	0,00	1,00	76,80	0,06		0,00	64,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,60	0,00	1,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	30/08/2023	3,50%	3,50%	6,20	14,00	0,00	1,00	76,40	0,01		0,00	54,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,20	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,60	0,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	2,00	79,20	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	2,90	18,30	0,00	2,00	78,90	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,00	0,00	2,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,50	0,00	1,00	79,30	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,60	0,00	1,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	4,50	16,40	0,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,50	0,00	1,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	10,40	12,30	0,00	1,00	77,30	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,50	0,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	30/08/2023	0,00%	0,00%	4,60	18,00	0,00	2,00	77,40	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	1,00	79,70	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	30/08/2023	14,10%	14,10%	5,90	12,40	0,00	1,00	67,50	0,06		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	1,00	79,80	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	30/08/2023	11,10%	11,10%	2,60	16,20	0,00	1,00	70,20	0,04		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	30/08/2023	3,00%	3,00%	3,40	15,50	0,00	1,00	78,10	0,04		0,00	46,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	30/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,50	0,00	2,00	79,00	0,21		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	30/08/2023	0,50%	0,80%	0,30	20,30	0,00	3,00	78,90	0,12		0,00	50,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,30	0,00	1,00	78,80	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	6,00	14,70	0,00	1,00	79,30	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	2,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	29/08/2023	0,50%	0,50%	11,90	11,10	0,00	2,00	76,50	0,11		0,00	6,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,60	0,00	2,00	80,10	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	4,90	13,60	0,00	2,00	81,50	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,60	0,00	2,00	79,10	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	2,00	18,40	0,00	2,00	79,60	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	2,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	29/08/2023	1,00%	2,30%	0,50	20,00	0,00	2,00	78,40	0,16		0,00	33,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	3,00	79,50	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	3,00	79,60	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,60	0,00	3,00	79,40	0,20		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,60	0,00	2,00	79,40	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	2,00	19,10	0,00	0,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	16,00	10,20	0,00	1,00	73,80	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	4,20	17,20	0,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	15,60	10,30	0,00	1,00	74,10	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,50	0,00	2,00	80,00	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	2,50	17,30	0,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	0,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	6,80	14,80	0,00	0,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	4,00	17,00	0,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	6,20	13,80	0,00	1,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,20	0,00	1,00	79,30	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	2,50	17,50	0,00	0,00	80,10	0,06		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	4,10	15,90	0,00	0,00	80,00	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	4,40	17,10	0,00	0,00	78,40	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	29/08/2023	0,00%	0,00%	2,00	19,10	0,00	1,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	18,00	10,40	0,00	0,00	71,60	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,80	0,00	0,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,70	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	3,70	16,00	0,00	2,00	80,30	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	3,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	29/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,60	0,00	3,00	79,40	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,30	0,00	2,00	79,50	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	18,30	0,00	2,00	80,90	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,00	0,00	2,00	79,00	0,14		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	1,20	12,00	0,00	2,00	86,80	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	2,00	79,60	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,10	0,00	2,00	80,20	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	2,00	79,50	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	2,00	79,70	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	3,00	79,80	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	31/08/2023	2,70%	2,70%	0,30	15,00	0,00	2,00	82,00	0,14		0,00	78,00	
Enfermaria	PMG-75	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	2,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	4,10	12,60	0,00	2,00	83,30	0,14		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,10	0,00	2,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	3,30	14,50	0,00	2,00	82,20	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,70	0,00	2,00	79,70	0,18		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	31/08/2023	10,00%	10,00%	0,60	13,30	0,00	2,00	76,10	0,12		0,00	100,00	
CAT	PMG-82	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,60	0,00	2,00	79,30	0,15		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	9,70	13,90	0,00	2,00	76,50	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	3,60	17,70	0,00	1,00	78,70	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	8,00	14,80	0,00	1,00	77,20	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	1,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	1,00	79,60	-0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	3,00	18,60	0,00	2,00	78,40	0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	2,90	18,90	0,00	1,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,70	0,00	2,00	79,30	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	7,50	12,40	0,00	1,00	80,10	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,40	0,00	2,00	79,30	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	5,00	15,20	0,00	1,00	79,80	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,80	0,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,80	0,00	1,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,70	0,00	1,00	79,50	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	6,10	15,30	0,00	2,00	78,60	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	2,70	18,50	0,00	2,00	78,80	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	5,20	16,60	0,00	2,00	78,20	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	01/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,00	0,00	1,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	01/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	2,00	79,40	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	01/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,40	0,00	1,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	01/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,80	0,00	2,00	79,30	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	01/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	1,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	01/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,80	0,00	2,00	79,80	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	01/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	1,00	79,50	0,12		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Incubadora	PMG-91	B	01/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	18,70	0,00	2,00	79,60	-0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	01/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	1,00	79,80	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	01/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	2,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	01/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	2,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	01/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,30	0,00	1,00	79,70	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		28/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,80	0,00	1,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		28/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,40	0,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		28/08/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,60	0,00	1,00	78,60	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		28/08/2023	0,00%	0,00%	3,60	18,50	0,00	1,00	77,90	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		28/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,60	0,00	1,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		28/08/2023	0,00%	0,00%	3,10	16,90	0,00	1,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		28/08/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,70	0,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	1,00	79,00	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,00	0,00	1,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,80	0,00	1,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	1,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	1,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		28/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	0,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	1,00	79,00	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	5,60	14,10	0,00	1,00	80,30	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,80	0,00	1,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	2,30	16,60	0,00	1,00	81,10	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	1,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	1,00	79,10	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	1,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	1,00	79,10	0,07		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	28/08/2023	6,70%	6,70%	7,20	11,30	0,00	1,00	74,80	0,12		0,00	86,00	
Portaria P3	PMG-163	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	1,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	28/08/2023	0,00%	0,00%	1,60	20,00	0,00	1,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	28/08/2023	0,40%	0,40%	0,40	20,50	0,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	01/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,00	0,00	1,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	01/09/2023	0,00%	0,00%	8,20	12,60	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	01/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	2,00	79,60	0,16		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	01/09/2023	0,00%	0,00%	12,10	10,30	0,00	2,00	77,70	0,14		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	01/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,60	0,00	1,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	01/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	1,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	01/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	2,00	79,60	0,16		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	01/09/2023	0,00%	0,00%	3,90	17,60	0,00	2,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	01/09/2023	0,00%	0,00%	3,60	18,00	0,00	2,00	78,30	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	01/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	2,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	3,00	79,20	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	2,40	18,70	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,50	0,00	2,00	79,00	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,10	0,00	3,00	79,00	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,50	0,00	3,00	79,00	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,10	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,50	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,60	0,00	2,00	79,30	-0,09		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,20	0,00	3,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,10	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,30	0,00	2,00	79,00	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,40	0,00	3,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,20	0,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,80	0,00	2,00	79,30	0,24		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	31/08/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,80	0,00	2,00	79,30	0,24		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	3,00	18,10	0,00	2,00	79,00	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	4,00	17,30	0,00	3,00	78,70	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,60	0,00	2,00	78,90	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	18,90	0,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	1,00	80,30	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	3,70	17,10	0,00	1,00	79,20	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,60	0,00	1,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,00	0,00	2,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	2,00	80,20	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,10	0,00	2,00	79,70	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,50	0,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,70	0,00	3,00	79,40	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,50	0,00	1,00	79,60	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,10	0,00	1,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	1,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	1,00	79,90	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,70	0,00	1,00	79,70	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,60	0,00	1,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,00	0,00	3,00	79,30	0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	4,30	16,40	0,00	3,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	4,10	16,50	0,00	2,00	79,40	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	4,30	16,40	0,00	2,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,70	0,00	2,00	78,90	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,30	0,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	3,20	17,90	0,00	3,00	78,90	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	4,30	17,10	0,00	3,00	78,50	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,60	0,00	2,00	79,00	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,20	0,00	2,00	79,40	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,60	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	2,00	19,30	0,00	2,00	78,70	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	2,00	18,90	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,80	0,00	2,00	79,40	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	2,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	1,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	1,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	2,00	79,90	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,20	0,00	4,00	79,00	0,25		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,20	0,00	4,00	79,20	0,23		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,50	0,00	5,00	79,20	0,27		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	2,60	17,60	0,00	5,00	79,80	0,23		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	2,20	18,60	0,00	4,00	79,10	0,26		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	7,50	14,90	0,00	4,00	77,60	0,15		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-5 Auditórios	PMG-28	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,70	0,00	2,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,60	0,00	3,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,50	0,00	2,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,90	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,00	0,00	2,00	78,90	0,16		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,80	0,00	2,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,80	0,00	3,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	2,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,20	0,20		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,30	0,00	3,00	79,10	0,24		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,00	0,00	4,00	79,30	0,25		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,20	0,00	4,00	78,80	0,25		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	4,00	79,30	0,26		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,70	0,00	1,00	79,40	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,30	0,00	1,00	79,50	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	1,00	79,80	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	4,20	16,90	0,00	1,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	3,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,50	0,00	3,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,00	0,00	4,00	78,90	0,23		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	2,70	17,20	0,00	4,00	80,00	0,24		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	5,00	79,20	0,28		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	6,90	14,60	0,00	4,00	78,50	0,25		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	4,00	79,40	0,24		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,30	0,00	4,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,90	0,00	5,00	78,60	0,24		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,00	0,00	4,00	79,40	0,20		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	4,00	79,40	0,23		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	22,90	8,00	0,00	4,00	69,10	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	5,00	79,20	0,25		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	5,00	79,40	0,24		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,70	0,00	3,00	79,00	0,22		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	4,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,60	0,00	1,00	79,30	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	7,90	15,80	0,00	1,00	76,30	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	4,00	79,10	0,21		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,10	0,00	4,00	78,70	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,40	0,00	3,00	79,00	0,25		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	04/09/2023	0,90%	0,90%	2,90	17,20	0,00	3,00	79,10	0,24		0,00	14,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	4,00	79,40	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,90	0,00	5,00	79,40	0,24		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	21,00	0,00	3,00	79,00	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,10	0,00	2,00	79,20	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	3,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,60	0,00	3,00	79,60	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,50	0,00	3,00	79,00	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	3,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,50	0,00	3,00	79,00	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	3,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,70	0,00	2,00	78,90	0,16		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-67	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,40	0,00	2,00	79,00	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,60	0,00	3,00	78,90	0,24		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	3,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	3,00	79,10	0,22		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	2,50	18,20	0,00	4,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,10	0,00	2,00	79,90	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,80	0,00	2,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,10	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	2,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	2,00	79,20	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,90	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,60	0,00	2,00	79,20	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	2,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	2,00	79,10	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,80	0,00	2,00	79,20	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	2,20	18,70	0,00	3,00	79,10	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,00	0,00	2,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	3,80	16,40	0,00	3,00	79,80	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,80	0,00	3,00	79,20	0,21		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,30	0,00	2,00	78,80	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	5,90	15,20	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,30	0,00	2,00	78,50	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,70	0,00	2,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,40	0,00	2,00	78,50	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,70	0,00	2,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,30	0,00	2,00	78,40	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	10,90	14,40	0,00	2,00	74,70	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,30	0,00	2,00	78,60	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	3,60	18,50	0,00	2,00	77,90	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	20,00	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	06/09/2023	4,50%	4,50%	3,60	14,50	0,00	2,00	77,40	0,09		0,00	91,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,20	0,00	2,00	79,20	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,40	0,00	2,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,20	0,00	2,00	79,00	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	06/09/2023	11,30%	11,30%	5,50	13,60	0,00	2,00	69,60	0,16		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,70	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	06/09/2023	3,00%	3,00%	4,70	14,80	0,00	1,00	77,50	0,12		0,00	53,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	06/09/2023	3,20%	3,20%	6,40	13,80	0,00	1,00	76,60	0,12		0,00	54,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	2,90	19,10	0,00	2,00	78,00	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	1,00	79,30	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	1,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	3,10	18,10	0,00	2,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,00	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,50	0,00	1,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,70	0,00	2,00	79,10	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	3,60	17,00	0,00	2,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	2,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	9,50	12,60	0,00	1,00	77,90	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	3,30	19,20	0,00	2,00	77,40	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	6,20	17,50	0,00	2,00	76,30	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	2,00	79,20	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	06/09/2023	19,90%	19,90%	6,30	12,20	0,00	2,00	61,70	0,13		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	06/09/2023	14,10%	14,10%	2,60	16,40	0,00	1,00	67,00	0,23		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	06/09/2023	2,60%	2,60%	3,40	15,70	0,00	2,00	78,30	0,12		0,00	46,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	06/09/2023	0,50%	0,90%	0,30	20,40	0,00	2,00	78,90	0,24		0,00	45,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	4,00	79,80	0,27		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	4,00	79,80	0,29		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	3,00	79,80	0,27		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	4,00	79,80	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	4,00	79,80	0,28		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	3,10	15,50	0,00	4,00	81,40	0,26		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,30	0,00	3,00	79,20	0,28		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,90	0,00	4,00	79,60	0,28		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,50	0,00	2,00	78,90	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	05/09/2023	2,50%	2,50%	1,20	19,40	0,00	2,00	76,90	0,19		0,00	54,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	2,00	79,70	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	1,00	79,70	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	2,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,60	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	2,00	79,70	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	16,30	9,20	0,00	2,00	74,50	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	4,60	16,50	0,00	2,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	35,00	6,00	0,00	2,00	59,00	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,70	0,00	1,00	79,20	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	4,30	15,10	0,00	2,00	80,70	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	1,00	80,00	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	9,00	13,40	0,00	1,00	77,70	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	5,60	15,00	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	9,10	11,30	0,00	1,00	79,70	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,10	0,00	1,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,60	0,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	3,20	17,00	0,00	2,00	79,80	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	7,00	14,80	0,00	2,00	78,20	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	2,60	18,20	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	15,90	10,40	0,00	2,00	73,70	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	5,00	79,80	0,20		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	5,00	79,70	0,25		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	3,40	16,00	0,00	3,00	80,60	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	1,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	2,00	79,60	0,21		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	79,90	0,18		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Enfermaria	PMG-70	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	3,00	79,90	0,22		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,80	0,00	2,00	79,30	0,18		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	3,00	79,80	0,17		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	79,90	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	17,60	0,00	3,00	81,00	0,22		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	3,00	79,80	0,17		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,20	0,00	3,00	80,10	0,20		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	18,60	0,00	3,00	80,40	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	04/09/2023	9,00%	9,00%	0,90	4,90	0,00	2,00	85,20	0,22		0,00	75,00	
Enfermaria	PMG-75	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	3,00	79,90	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	5,50	9,20	0,00	3,00	85,20	0,21		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,70	0,00	3,00	79,40	0,21		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	4,50	10,30	0,00	3,00	85,20	0,20		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	3,00	80,00	0,21		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,22		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	3,20	18,40	0,00	2,00	78,40	0,21		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	6,50	15,50	0,00	2,00	78,00	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	2,20	18,20	0,00	2,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	7,60	14,30	0,00	2,00	78,10	0,17		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,10	0,00	2,00	80,00	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	3,10	19,60	0,00	2,00	80,30	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	18,80	0,00	2,00	80,30	0,16		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	2,40	18,60	0,00	1,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,20	0,00	2,00	79,80	0,16		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	7,30	12,00	0,00	2,00	80,70	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,20	0,00	2,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	4,20	15,80	0,00	2,00	80,10	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	2,00	79,70	0,19		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,40	0,00	3,00	80,10	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,40	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	4,40	15,60	0,00	2,00	80,00	0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	2,50	17,70	0,00	2,00	79,70	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	4,60	16,40	0,00	2,00	79,00	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,50	0,00	2,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	3,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	2,00	79,20	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,10	0,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,70	0,00	3,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	2,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,00	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,10	0,00	2,00	78,60	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,00	0,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,30	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,80	0,00	3,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		04/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	3,00	79,70	0,26		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		04/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	3,00	79,50	0,24		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		04/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	3,00	79,40	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		04/09/2023	0,00%	0,00%	2,90	18,30	0,00	3,00	78,70	0,24		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		04/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,90	0,00	3,00	79,40	0,24		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		04/09/2023	0,00%	0,00%	2,20	17,40	0,00	3,00	80,40	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		04/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	3,00	79,50	0,24		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	3,00	79,90	0,25		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	18,60	0,00	3,00	80,10	0,23		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	3,00	79,70	0,26		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	3,00	79,70	0,24		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	3,00	79,70	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	4,00	79,80	0,28		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		04/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,70	0,00	3,00	79,60	0,24		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	3,00	79,70	0,26		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	4,40	14,60	0,00	3,00	81,00	0,21		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	3,00	79,70	0,24		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	16,40	0,00	3,00	81,80	0,25		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,27		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	79,90	0,29		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	3,00	79,80	0,27		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	3,00	79,80	0,26		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	3,00	79,80	0,24		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	04/09/2023	9,90%	9,90%	9,70	8,30	0,00	4,00	72,10	0,21		0,00	100,00	
Portaria P3	PMG-163	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,26		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	04/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,70	0,00	3,00	79,10	0,28		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	04/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	3,00	79,70	0,27		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,70	0,00	2,00	78,90	0,17		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	8,80	12,60	0,00	3,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,80	0,00	2,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	13,00	10,20	0,00	3,00	76,80	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	20,40	0,00	3,00	78,30	0,15		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,70	0,00	2,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	2,00	79,10	0,15		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	3,40	18,70	0,00	2,00	77,90	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	2,10	19,40	0,00	2,00	78,40	0,09		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	06/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	2,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,70	0,00	3,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	2,60	18,70	0,00	3,00	78,70	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,70	0,00	3,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,20	0,00	3,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,80	0,00	3,00	79,10	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,20	0,00	3,00	79,20	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,70	0,00	3,00	79,00	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,60	0,00	3,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,60	0,00	3,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,00	0,00	3,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,20	0,00	3,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,80	0,00	2,00	79,00	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	05/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,10	0,00	3,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	05/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,70	0,00	3,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	2,50	18,30	0,00	2,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	4,30	17,20	0,00	2,00	78,50	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,50	0,00	2,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,20	0,00	2,00	79,40	0,16		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Edifício I 1	PMG-18	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	1,00	80,60	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	18,10	0,00	1,00	80,00	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	1,00	79,60	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	2,00	79,80	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	3,00	79,20	0,21		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,90	19,00	0,00	4,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,10	0,00	2,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,00	0,00	2,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,40	0,00	1,00	80,10	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	18,50	0,00	2,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	1,00	80,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,50	0,00	2,00	80,00	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,50	0,00	2,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,30	0,00	4,00	79,40	0,24		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	3,90	16,10	0,00	3,00	80,00	0,25		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	4,30	15,60	0,00	3,00	80,10	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	5,10	15,40	0,00	2,00	79,50	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,40	0,00	2,00	79,70	0,21		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,00	0,00	2,00	79,30	0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	2,90	18,30	0,00	4,00	78,80	0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	3,80	17,60	0,00	3,00	78,50	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	3,00	79,40	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	2,00	79,60	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	4,00	79,30	0,24		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,70	0,00	4,00	79,30	0,23		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	2,00	19,30	0,00	4,00	78,60	0,24		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,40	0,00	4,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,20	0,00	4,00	79,20	0,21		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	4,00	79,50	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	1,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	1,00	80,10	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	1,00	80,20	0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	2,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,40	0,00	3,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,10	0,00	2,00	79,20	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,10	0,00	2,00	79,50	0,16		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,00	0,00	3,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	4,20	16,80	0,00	2,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,50	0,00	3,00	79,30	0,18		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,10	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,10	0,00	2,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,70	0,00	3,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,00	0,00	2,00	79,00	0,16		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,90	0,00	3,00	79,00	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,70	0,00	2,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,60	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,20	0,00	2,00	79,10	0,21		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,60	0,00	3,00	79,30	0,16		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,20	0,00	2,00	79,80	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,50	0,00	2,00	80,10	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,70	0,00	2,00	79,20	0,20		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,50	0,00	2,00	79,40	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	2,00	79,20	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	3,90	17,10	0,00	3,00	79,00	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	20,10	0,00	3,00	78,80	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,30	0,00	2,00	79,20	0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	2,00	79,50	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	2,30	17,80	0,00	2,00	79,90	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	2,00	79,60	0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	2,60	18,00	0,00	2,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,10	0,00	2,00	79,60	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,10	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,60	0,00	2,00	79,80	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	1,00	80,00	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	13,30	11,50	0,00	1,00	75,20	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	2,00	79,80	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	2,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	2,00	79,40	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	2,00	79,50	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,80	0,00	2,00	79,00	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	7,50	15,90	0,00	2,00	76,60	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	2,00	79,50	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	3,00	79,40	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,20	0,00	1,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	11/09/2023	0,50%	0,50%	2,80	17,00	0,00	1,00	79,70	0,07		0,00	8,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	1,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,50	0,00	2,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	1,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,70	0,00	1,00	79,60	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	3,00	79,70	0,27		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,50	0,00	3,00	80,00	0,24		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	2,00	79,50	0,23		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	2,00	79,90	0,26		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	3,00	79,70	0,23		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	3,00	79,90	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,60	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,80	0,00	3,00	79,60	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	2,00	79,60	0,22		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	2,00	79,70	0,24		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,22		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,50	0,00	3,00	79,40	0,24		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,70	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,00	0,00	2,00	79,80	0,22		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	3,00	79,50	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	18,80	0,00	3,00	79,60	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	3,00	79,50	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	2,00	79,70	0,22		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Edifício I-4	PMG-80	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	3,00	79,70	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	2,00	79,90	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	3,00	79,90	0,24		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	3,00	79,70	0,22		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	3,00	79,70	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	3,00	79,70	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	3,00	79,50	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,50	0,00	3,00	80,00	0,27		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,30	0,00	3,00	79,20	0,25		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	4,00	15,80	0,00	3,00	80,10	0,23		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,80	0,00	2,00	79,60	0,20		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,70	0,00	3,00	79,30	0,22		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	6,10	14,40	0,00	2,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,40	0,00	3,00	79,10	0,21		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	3,00	79,40	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,90	0,00	2,00	78,70	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,30	0,00	2,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,80	0,00	2,00	78,80	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	8,20	14,70	0,00	2,00	77,00	0,21		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,90	0,00	2,00	78,90	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	3,40	18,10	0,00	2,00	78,50	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	80,00	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	13/09/2023	4,40%	4,40%	3,40	14,10	0,00	2,00	78,10	0,08		0,00	83,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	1,00	79,70	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	2,20	18,00	0,00	2,00	79,80	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	13/09/2023	12,70%	12,70%	4,20	14,00	0,00	2,00	69,10	0,11		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,20	0,00	2,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	13/09/2023	4,30%	4,30%	4,40	14,70	0,00	1,00	76,60	0,09		0,00	68,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,30	0,00	2,00	79,70	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	13/09/2023	2,80%	2,80%	5,90	13,60	0,00	2,00	77,60	0,13		0,00	63,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,70	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,40	0,00	2,00	79,50	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,00	0,00	2,00	79,40	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	3,10	17,50	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	2,00	79,60	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	18,80	0,00	2,00	79,50	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,40	0,00	2,00	79,10	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	3,30	16,70	0,00	2,00	80,00	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	2,00	79,90	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	8,70	12,30	0,00	2,00	79,00	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	3,70	18,20	0,00	2,00	78,10	0,20		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	13/09/2023	0,00%	0,00%	5,40	17,30	0,00	2,00	77,30	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,60	0,00	2,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	13/09/2023	24,40%	24,40%	6,10	11,90	0,00	1,00	57,70	0,14		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	1,00	80,10	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	13/09/2023	17,00%	17,00%	2,80	15,50	0,00	2,00	64,70	0,13		0,00	100,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	13/09/2023	2,30%	2,30%	3,30	15,50	0,00	1,00	78,90	0,09		0,00	48,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	13/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,50	0,00	2,00	79,50	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	13/09/2023	0,30%	0,80%	0,40	19,70	0,00	2,00	79,60	0,19		0,00	16,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	3,00	79,60	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	3,00	79,60	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	3,00	79,70	0,22		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	3,00	79,60	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,80	0,00	3,00	79,60	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	3,60	15,70	0,00	3,00	80,80	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,90	0,00	3,00	79,00	0,23		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,60	0,00	3,00	79,60	0,22		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	5,00	79,50	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	12/09/2023	0,60%	0,60%	0,20	20,20	0,00	4,00	79,10	0,24		0,00	24,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	3,00	79,60	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,60	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	5,00	79,60	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	4,00	79,60	0,25		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,50	0,00	2,00	79,40	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	7,10	12,60	0,00	2,00	80,30	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,20	0,00	1,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	13,20	11,80	0,00	2,00	75,00	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,00	0,00	2,00	79,40	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	2,90	16,80	0,00	2,00	80,30	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	2,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	5,20	16,10	0,00	2,00	78,80	-0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	2,50	17,00	0,00	2,00	80,50	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	4,50	14,70	0,00	2,00	80,80	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,30	0,00	2,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,30	0,00	2,00	80,20	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	3,00	16,70	0,00	2,00	80,30	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	4,30	16,50	0,00	2,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,30	0,00	1,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	10,70	12,50	0,00	2,00	76,80	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	3,00	79,40	0,21		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	3,00	79,70	0,21		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,00	0,00	3,00	80,60	0,22		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,60	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	12/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,60	0,24		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	3,00	79,70	0,21		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,10	0,00	3,00	80,30	0,20		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,00	0,00	2,00	79,20	0,20		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	12,90	0,00	2,00	86,10	0,23		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,00	0,00	2,00	80,30	0,22		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	3,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	2,00	79,50	0,22		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	3,00	79,80	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	79,90	0,20		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	14/09/2023	3,80%	3,80%	0,50	12,30	0,00	3,00	83,40	0,20		0,00	84,00	
Enfermaria	PMG-75	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	2,00	79,80	0,24		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	4,30	11,90	0,00	3,00	83,80	0,19		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Enfermaria	PMG-76	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	20,00	0,00	3,00	79,20	0,18		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	2,60	15,70	0,00	3,00	81,70	0,17		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,80	0,00	2,00	79,70	0,18		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	3,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	3,80	18,20	0,00	3,00	78,00	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	8,40	13,90	0,00	3,00	77,60	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	3,30	17,50	0,00	2,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	7,00	15,10	0,00	2,00	77,90	0,16		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,50	0,00	2,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	18,90	0,00	2,00	79,90	0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	2,40	18,80	0,00	2,00	78,80	0,16		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	2,80	18,80	0,00	2,00	78,40	0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,70	0,00	2,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	7,50	12,10	0,00	2,00	80,30	0,16		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,30	0,00	2,00	79,30	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	4,60	15,80	0,00	2,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,60	0,00	2,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,70	0,00	2,00	79,80	0,16		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,20	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	3,90	16,50	0,00	2,00	79,70	0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	2,50	18,20	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	4,40	17,00	0,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	15/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	1,00	79,40	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	15/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	2,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	15/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	15/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,70	0,00	2,00	79,20	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	15/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	1,00	79,30	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	15/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	1,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	15/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	1,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	15/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,00	0,00	1,00	79,30	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	15/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	15/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,80	0,00	1,00	79,40	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	15/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,90	0,00	2,00	79,10	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	15/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,50	0,00	1,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		11/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	3,00	79,70	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		11/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	2,00	79,50	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		11/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	3,00	79,40	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		11/09/2023	0,00%	0,00%	3,10	18,40	0,00	3,00	78,50	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		11/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	2,00	79,40	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		11/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	18,20	0,00	2,00	80,20	0,21		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		11/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	3,00	79,60	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,60	0,17		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	3,00	79,60	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	2,00	79,70	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	3,00	79,70	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	3,00	79,70	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	3,00	79,80	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		11/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	3,00	79,60	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	7,60	12,20	0,00	2,00	80,20	0,17		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	3,00	79,70	0,17		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	17,40	0,00	2,00	81,00	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,60	0,16		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,60	0,18		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,60	0,15		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	11/09/2023	6,60%	6,60%	7,50	10,60	0,00	3,00	75,30	0,18		0,00	87,00	
Portaria P3	PMG-163	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,60	0,18		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	11/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,00	0,00	3,00	79,00	0,17		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	11/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	3,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	15/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,70	0,00	2,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	15/09/2023	0,00%	0,00%	8,30	12,50	0,00	2,00	79,20	0,17		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	15/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	1,00	79,70	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	15/09/2023	0,00%	0,00%	9,50	11,80	0,00	2,00	78,70	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	15/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,10	0,00	2,00	79,10	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	15/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	2,00	79,70	0,09		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	15/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,50	0,00	2,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	15/09/2023	0,00%	0,00%	3,80	17,30	0,00	2,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	15/09/2023	0,00%	0,00%	5,00	16,40	0,00	2,00	78,60	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	15/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	2,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	2,00	18,70	0,00	3,00	79,30	0,20		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	3,00	79,30	0,20		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,00	0,00	3,00	79,40	0,20		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	3,00	79,20	0,21		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,00	0,00	3,00	79,50	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	3,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,40	0,00	3,00	79,50	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,30	0,00	3,00	79,10	0,20		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	18,80	0,00	3,00	79,50	0,22		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	3,00	79,30	0,25		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,40	0,00	3,00	79,30	0,24		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	14/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,80	0,00	3,00	79,20	0,24		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	14/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,40	0,00	3,00	79,60	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,50	0,00	3,00	79,20	0,21		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	3,80	17,30	0,00	4,00	78,90	0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,40	0,00	3,00	78,90	0,22		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	18,80	0,00	3,00	79,40	0,24		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	2,00	80,20	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	18,50	0,00	2,00	79,70	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,70	0,00	3,00	79,30	0,22		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	2,00	79,80	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	4,00	79,80	0,28		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	18,60	0,00	3,00	79,70	0,25		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	3,00	80,00	0,22		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,10	0,00	3,00	79,90	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	2,00	79,80	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	18,70	0,00	2,00	80,10	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-114	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,70	0,00	2,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,10	0,00	5,00	80,10	0,29		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	4,10	16,40	0,00	4,00	79,50	0,24		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	4,80	14,90	0,00	3,00	80,30	0,23		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	5,30	15,00	0,00	3,00	79,70	0,19		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,10	0,00	3,00	79,30	0,23		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	18,90	0,00	3,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	3,10	17,40	0,00	4,00	79,40	0,26		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	4,80	16,20	0,00	4,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	4,00	79,20	0,25		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	3,00	79,60	0,26		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,70	0,00	5,00	78,80	0,29		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,50	0,00	4,00	79,50	0,21		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,90	0,00	5,00	78,70	0,29		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	18,90	0,00	4,00	79,50	0,27		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,80	0,00	3,00	79,30	0,24		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,70	0,00	2,00	79,60	0,24		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,00	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,16		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,90	0,00	2,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,10	0,00	3,00	79,40	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	3,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	18,80	0,00	2,00	79,90	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	18,80	0,00	2,00	79,60	0,18		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	4,10	16,50	0,00	2,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	18,80	0,00	3,00	79,90	0,18		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	18,80	0,00	2,00	79,60	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,70	0,00	2,00	79,50	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,30	0,00	2,00	79,70	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	18,80	0,00	2,00	79,80	0,18		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	1,90	18,50	0,00	2,00	79,60	0,21		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,00	0,00	3,00	79,70	0,20		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	2,00	79,80	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	3,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,25		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,00	0,00	3,00	79,90	0,25		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,90	0,00	1,00	79,40	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,40	0,00	1,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	1,00	79,50	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,60	0,00	1,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	3,00	79,50	0,20		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	4,10	16,50	0,00	3,00	79,40	0,24		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	2,00	79,70	0,25		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	18,70	0,00	3,00	79,50	0,26		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,80	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	2,30	17,80	0,00	2,00	79,90	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,80	0,00	2,00	79,70	0,18		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	2,80	17,80	0,00	1,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,00	0,00	2,00	79,60	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,30	0,00	2,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,80	0,00	1,00	79,60	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	1,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	13,90	11,60	0,00	2,00	74,40	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	1,00	79,70	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	2,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	3,00	79,80	0,24		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	3,00	80,00	0,21		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	18,60	0,00	1,00	79,70	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	8,10	14,60	0,00	1,00	77,30	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	79,90	0,24		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,50	0,00	2,00	79,90	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	2,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	18/09/2023	0,40%	0,40%	2,40	18,00	0,00	1,00	79,10	0,08		0,00	11,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	1,00	79,80	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	1,00	79,80	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,10	0,00	3,00	79,20	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	3,00	79,70	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	3,00	79,70	0,22		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,70	0,00	3,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,80	0,00	2,00	79,70	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	2,00	79,70	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	3,00	79,80	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,90	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,70	0,00	2,00	79,90	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	2,00	79,30	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,80	0,00	2,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	2,00	79,60	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	2,00	18,80	0,00	3,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	2,00	79,80	0,23		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,10	0,00	2,00	79,80	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	2,00	79,60	0,23		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	18,60	0,00	2,00	79,60	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	2,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	2,00	79,70	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,50	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	2,00	79,70	0,20		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	2,00	79,70	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	2,00	79,80	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	2,00	79,70	0,22		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,30	0,00	2,00	79,70	0,19		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	2,00	79,80	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	2,00	79,70	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	2,00	18,30	0,00	2,00	79,70	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	79,90	0,22		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	18,70	0,00	3,00	79,90	0,19		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-151	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	2,00	79,50	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,20	0,00	2,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	6,20	14,50	0,00	2,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,50	0,00	2,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	2,00	79,80	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,80	0,00	2,00	78,80	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	19,20	0,00	2,00	79,20	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,60	0,00	2,00	78,90	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	10,40	14,10	0,00	2,00	75,60	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	2,00	79,70	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	3,30	18,00	0,00	1,00	78,70	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,20	0,00	0,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	20/09/2023	3,90%	3,90%	3,90	13,80	0,00	1,00	78,40	0,12		0,00	85,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,40	0,00	1,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	1,00	80,00	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	18,40	0,00	1,00	79,70	0,17		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	20/09/2023	9,80%	9,80%	3,90	14,90	0,00	1,00	71,40	0,06		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,00	0,00	1,00	79,70	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	20/09/2023	3,40%	3,40%	4,70	14,50	0,00	1,00	77,40	0,08		0,00	65,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	1,00	80,50	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	20/09/2023	1,20%	1,20%	5,30	14,30	0,00	1,00	79,30	0,07		0,00	30,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,60	0,00	2,00	79,50	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,40	0,00	2,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,80	0,00	2,00	79,40	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	2,70	17,90	0,00	2,00	79,30	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,60	0,00	1,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	1,90	18,40	0,00	2,00	79,70	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,40	0,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	2,20	17,80	0,00	1,00	80,00	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,80	0,00	2,00	79,70	0,20		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	9,10	12,40	0,00	2,00	78,50	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	4,00	18,30	0,00	2,00	77,60	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	20/09/2023	0,00%	0,00%	6,90	16,60	0,00	2,00	76,50	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	1,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	20/09/2023	24,20%	24,20%	6,70	11,50	0,00	1,00	57,60	0,13		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	1,00	80,10	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	20/09/2023	16,20%	16,20%	2,80	15,50	0,00	1,00	65,50	0,20		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	20/09/2023	2,00%	2,00%	3,90	14,80	0,00	1,00	79,30	0,12		0,00	31,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	20/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,90	0,00	2,00	79,30	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	20/09/2023	0,70%	1,80%	0,40	19,80	0,00	2,00	79,20	0,19		0,00	12,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	5,00	79,90	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	4,00	79,90	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,30	0,00	4,00	80,30	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	4,00	80,40	0,22		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,20	0,00	4,00	80,20	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	3,60	15,20	0,00	3,00	81,20	0,25		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,50	0,00	3,00	79,30	0,25		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,40	0,00	3,00	80,10	0,27		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,80	0,25		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	19/09/2023	1,50%	1,50%	0,40	19,60	0,00	3,00	78,50	0,28		0,00	38,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	4,00	79,80	0,25		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	4,00	79,70	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	5,00	79,80	0,26		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	4,00	79,70	0,23		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,70	0,00	2,00	79,10	0,20		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	6,70	13,80	0,00	2,00	79,50	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,40	0,00	3,00	79,70	0,21		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	5,50	14,60	0,00	3,00	79,90	0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	2,10	17,80	0,00	4,00	80,10	0,23		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	2,60	16,80	0,00	5,00	80,60	0,25		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	2,00	80,00	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	7,20	13,90	0,00	2,00	78,90	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	4,10	16,50	0,00	3,00	79,40	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	5,60	13,80	0,00	2,00	80,50	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,30	0,00	2,00	79,50	0,20		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,60	0,00	2,00	79,90	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	2,70	17,00	0,00	3,00	80,30	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	4,20	16,70	0,00	3,00	79,10	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	19/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	18,80	0,00	3,00	79,90	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	7,40	14,20	0,00	4,00	78,40	0,21		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	4,00	79,90	0,25		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	3,00	80,30	0,22		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	17,50	0,00	3,00	81,00	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	3,00	79,80	0,24		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	19/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	4,00	79,70	0,26		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	1,00	80,10	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	18,40	0,00	1,00	80,80	0,14		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,10	0,00	2,00	79,40	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	13,50	0,00	1,00	85,50	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,60	0,00	2,00	80,10	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	17,90	0,00	2,00	80,70	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,60	0,00	2,00	80,10	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,00	0,00	2,00	80,40	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	18,90	0,00	2,00	80,30	0,19		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	21/09/2023	4,00%	4,00%	0,60	11,30	0,00	1,00	84,10	0,19		0,00	100,00	
Enfermaria	PMG-75	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	80,00	0,18		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	2,80	15,30	0,00	2,00	81,90	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,70	0,00	2,00	79,80	0,18		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	4,10	12,70	0,00	2,00	83,30	0,20		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,00	0,00	1,00	80,30	0,16		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	2,00	80,10	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	5,00	17,00	0,00	1,00	78,00	0,16		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	11,50	12,50	0,00	1,00	76,00	0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	5,50	16,10	0,00	1,00	78,40	0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	13,40	12,70	0,00	1,00	73,80	0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,20	0,00	1,00	79,80	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	18,90	0,00	1,00	80,20	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,50	0,00	1,00	80,00	0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
CAT	PMG-95	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	3,00	18,30	0,00	1,00	78,70	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,20	0,00	1,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	6,60	13,00	0,00	1,00	80,40	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,20	0,00	1,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	4,80	16,30	0,00	1,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,20	0,00	0,00	79,60	0,14		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,30	0,00	1,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	1,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	3,90	16,50	0,00	1,00	79,70	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	2,80	18,30	0,00	1,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	6,10	15,60	0,00	1,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	22/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,60	0,00	2,00	79,90	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	22/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,50	0,00	3,00	80,10	0,21		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	22/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,30	0,00	2,00	80,00	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	22/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,20	0,00	3,00	79,90	0,17		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	22/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	3,00	80,30	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	22/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,20	0,00	3,00	80,50	0,20		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	22/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	3,00	80,30	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	22/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	18,30	0,00	3,00	80,10	0,21		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	22/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,40	0,00	2,00	80,40	0,19		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	22/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	18,80	0,00	2,00	80,40	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	22/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,60	0,18		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	22/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	18,40	0,00	2,00	80,70	0,18		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		18/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	3,00	79,70	0,23		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		18/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	3,00	79,80	0,24		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		18/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	3,00	79,60	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		18/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	18,80	0,00	3,00	79,60	0,23		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		18/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	3,00	79,70	0,25		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		18/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,40	0,00	3,00	80,20	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		18/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,70	0,00	3,00	79,60	0,24		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	4,00	80,00	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,10	0,00	4,00	80,20	0,23		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	3,00	79,50	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	3,00	79,70	0,18		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,70	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	3,00	79,80	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		18/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	3,00	79,60	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	79,90	0,24		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	5,10	14,40	0,00	3,00	80,50	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	3,00	79,80	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	2,10	16,30	0,00	3,00	81,60	0,23		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	1,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,60	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,70	0,18		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	2,00	79,80	0,18		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	18/09/2023	3,60%	3,60%	5,70	12,60	0,00	2,00	78,20	0,14		0,00	89,00	
Portaria P3	PMG-163	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	2,00	79,70	0,13		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,70	0,00	2,00	79,50	0,16		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	18/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	2,00	79,80	0,15		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Transportes	PMG-121	A	22/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,30	0,00	3,00	79,60	0,23		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	22/09/2023	0,00%	0,00%	9,40	11,60	0,00	3,00	79,00	0,21		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	22/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	3,00	80,10	0,23		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	22/09/2023	0,00%	0,00%	14,30	9,20	0,00	3,00	76,50	0,17		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	22/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	18,60	0,00	2,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	22/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,40	0,00	3,00	80,20	0,16		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	22/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	18,90	0,00	3,00	80,40	0,19		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	22/09/2023	0,00%	0,00%	4,60	16,20	0,00	3,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	22/09/2023	0,00%	0,00%	7,50	14,20	0,00	2,00	78,30	0,21		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	22/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,30	0,00	2,00	80,40	0,24		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	18,70	0,00	2,00	79,60	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	2,00	79,60	0,21		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	18,90	0,00	2,00	79,70	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	2,00	79,60	0,20		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,70	0,00	2,00	79,80	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	2,00	79,70	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	2,00	18,20	0,00	3,00	79,90	0,16		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	2,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	18,70	0,00	2,00	80,10	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,70	0,00	2,00	79,70	0,19		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,20	0,00	2,00	79,50	0,22		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,60	0,00	2,00	79,50	0,21		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	21/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,50	0,00	2,00	79,70	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	3,10	17,70	0,00	2,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	4,00	17,10	0,00	2,00	78,80	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,00	0,00	2,00	79,20	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	1,90	18,40	0,00	2,00	79,70	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	1,00	80,70	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	2,00	17,90	0,00	1,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,00	0,00	2,00	79,50	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,60	0,00	2,00	80,10	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	2,00	79,70	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	2,60	18,10	0,00	2,00	79,30	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,30	0,00	2,00	80,20	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	18,70	0,00	2,00	80,00	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,30	0,00	1,00	80,20	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	18,40	0,00	0,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,30	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,40	0,00	1,00	80,20	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	1,00	80,30	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	18,50	0,00	2,00	79,80	0,20		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	5,10	15,50	0,00	1,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	4,30	16,50	0,00	2,00	79,20	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	5,80	15,70	0,00	2,00	78,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	18,80	0,00	2,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	2,00	18,50	0,00	2,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	4,00	16,90	0,00	2,00	79,10	0,16		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	5,40	15,90	0,00	2,00	78,70	0,13		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-15	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,80	0,00	2,00	79,60	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	2,00	79,90	0,15		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,50	0,00	2,00	80,10	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	18,80	0,00	1,00	80,00	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	2,40	18,60	0,00	2,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	2,20	18,20	0,00	1,00	79,60	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,20	0,00	1,00	79,60	0,22		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,70	0,00	1,00	79,40	0,18		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	1,00	80,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	1,00	80,10	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	0,00	80,40	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,20	0,00	1,00	79,60	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	18,90	0,00	2,00	79,80	0,18		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	2,00	79,60	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,10	0,00	1,00	79,80	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	2,10	17,80	0,00	2,00	80,10	0,22		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	3,60	16,70	0,00	1,00	79,70	0,19		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	19,00	0,00	2,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	18,90	0,00	2,00	79,90	0,16		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	1,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,20	0,00	2,00	80,00	0,15		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	1,90	18,50	0,00	1,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	2,50	17,70	0,00	1,00	79,80	0,14		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,00	0,00	1,00	80,20	0,16		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	1,00	79,70	0,12		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,40	0,00	1,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	20,00	0,00	1,00	79,00	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,40	0,00	2,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	18,80	0,00	2,00	80,10	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,30	0,00	1,00	80,40	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	1,00	79,40	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,70	0,00	1,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,20	0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	3,60	16,70	0,00	2,00	79,70	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	2,00	79,80	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,60	0,00	2,00	79,90	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	3,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	2,50	17,50	0,00	3,00	80,00	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	3,00	79,60	0,23		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	3,30	17,40	0,00	3,00	79,30	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	79,90	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,00	0,00	3,00	79,70	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	3,00	79,90	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	80,00	0,19		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,70	0,00	2,00	79,70	0,17		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	13,40	11,30	0,00	2,00	75,30	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,21		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	3,00	80,00	0,18		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,50	0,00	2,00	79,20	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	2,00	79,60	0,15		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,80	0,00	2,00	79,10	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	6,30	16,50	0,00	1,00	77,20	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	1,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,70	0,00	2,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	18,60	0,00	2,00	81,00	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	25/09/2023	0,40%	0,40%	2,20	16,90	0,00	2,00	80,50	0,13		0,00	13,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	19,00	0,00	2,00	79,20	0,15		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,30	0,00	2,00	79,80	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	2,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	2,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,40	0,00	2,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,80	0,00	2,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	2,00	79,30	0,16		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	2,00	79,50	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	2,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	27/09/2023	0,20%	0,20%	0,70	19,50	0,00	2,00	79,60	0,02		0,00	9,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	2,00	79,70	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	18,90	0,00	2,00	80,30	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	3,00	80,00	0,25		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,40	0,00	3,00	80,10	0,25		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	1,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	1,90	18,90	0,00	2,00	79,10	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	80,00	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	18,90	0,00	3,00	79,90	0,25		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	3,00	79,80	0,23		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	1,80	18,60	0,00	3,00	79,60	0,25		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	3,00	80,10	0,26		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	3,00	80,10	0,21		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	3,00	79,70	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	79,90	0,25		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,50	0,00	3,00	80,10	0,17		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	79,90	0,24		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	2,00	80,30	0,24		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	3,00	79,90	0,25		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	2,00	79,50	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	2,40	18,30	0,00	2,00	79,30	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	20,00	0,00	2,00	79,00	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	5,10	14,20	0,00	2,00	80,60	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,10	0,00	3,00	79,90	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,70	0,00	3,00	79,60	0,25		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	6,30	14,40	0,00	3,00	79,30	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,60	0,00	3,00	79,20	0,21		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	3,00	79,80	0,22		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,80	0,00	3,00	79,10	0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,00	0,00	3,00	79,50	0,22		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,60	0,00	3,00	79,10	0,22		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	10,30	13,90	0,00	3,00	75,80	0,18		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,60	0,00	3,00	79,40	0,24		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	3,50	17,80	0,00	3,00	78,70	0,18		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,50	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	27/09/2023	3,70%	3,70%	4,00	13,60	0,00	2,00	78,70	0,06		0,00	67,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,30	0,00	2,00	80,10	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,50	0,00	2,00	80,20	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	2,50	17,60	0,00	3,00	79,90	0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	27/09/2023	18,00%	18,00%	6,20	12,80	0,00	2,00	63,10	0,08		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,10	0,00	2,00	79,90	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	27/09/2023	4,70%	4,70%	4,90	14,20	0,00	2,00	76,30	0,16		0,00	89,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,30	0,00	2,00	79,90	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	27/09/2023	1,40%	1,40%	4,70	14,80	0,00	2,00	79,10	0,15		0,00	26,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,30	0,00	3,00	79,40	0,23		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,20	0,00	2,00	79,60	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	3,00	80,00	0,22		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	2,70	17,40	0,00	3,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,60	0,00	3,00	79,70	0,23		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	2,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	3,00	79,80	0,22		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	3,30	16,40	0,00	3,00	80,30	0,24		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	2,00	80,10	0,22		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	11,20	11,40	0,00	3,00	77,40	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	3,50	18,30	0,00	3,00	78,30	0,22		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	27/09/2023	0,00%	0,00%	6,30	16,60	0,00	3,00	77,10	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,30	0,00	2,00	80,10	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	27/09/2023	29,50%	29,50%	8,50	10,50	0,00	2,00	51,50	0,18		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,20	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	27/09/2023	19,80%	19,80%	3,30	15,10	0,00	2,00	61,90	0,26		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	27/09/2023	1,30%	1,30%	3,80	14,90	0,00	2,00	80,00	0,10		0,00	28,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	27/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	2,00	79,70	0,20		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	27/09/2023	0,50%	1,10%	0,30	19,40	0,00	3,00	79,70	0,17		0,00	16,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	0,00	80,20	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	1,00	80,00	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,70	0,00	0,00	79,70	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	1,00	79,90	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	1,40	19,30	0,00	0,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	2,90	17,50	0,00	1,00	79,60	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	19,10	0,00	0,00	79,60	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,70	0,00	1,00	79,60	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	1,00	80,10	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	26/09/2023	1,10%	1,10%	0,60	18,70	0,00	0,00	79,60	0,14		0,00	29,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	1,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	1,00	79,70	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	1,00	79,50	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	0,00	79,60	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	18,90	0,00	1,00	79,70	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	12,20	11,20	0,00	1,00	76,60	0,19		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	2,30	18,30	0,00	1,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	4,80	16,00	0,00	0,00	79,20	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	18,90	0,00	1,00	79,40	0,19		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	2,40	19,40	0,00	2,00	78,20	0,21		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	19,50	0,00	1,00	80,30	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	8,70	13,30	0,00	1,00	77,80	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	4,40	16,20	0,00	1,00	79,40	0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	6,40	13,20	0,00	1,00	80,40	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,20	0,00	1,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	18,60	0,00	0,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	3,40	16,80	0,00	1,00	79,80	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	4,50	15,90	0,00	0,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	26/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	18,70	0,00	0,00	80,20	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	8,10	13,50	0,00	1,00	78,40	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	1,00	80,30	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	0,00	80,10	0,15		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	1,30	18,10	0,00	1,00	80,60	0,17		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	0,00	79,50	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	26/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,70	0,00	1,00	79,30	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	1,00	80,00	0,14		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	18,50	0,00	1,00	80,30	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	1,00	79,60	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	28/09/2023	0,10%	0,10%	1,00	13,00	0,00	1,00	86,00	0,07		0,00	6,00	
Enfermaria	PMG-72	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	1,00	79,70	0,11		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	18,90	0,00	2,00	80,30	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,10	0,00	1,00	80,40	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	18,80	0,00	1,00	80,80	0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,60	0,00	1,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	28/09/2023	2,40%	2,40%	0,50	13,70	0,00	1,00	83,30	0,09		0,00	72,00	
Enfermaria	PMG-75	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,40	0,00	2,00	80,20	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	3,60	14,20	0,00	1,00	82,20	0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,80	0,00	2,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	3,30	14,10	0,00	2,00	82,60	0,14		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,40	0,00	1,00	79,90	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	28/09/2023	0,20%	0,20%	0,20	19,80	0,00	2,00	79,80	0,11		0,00	7,00	
CAT	PMG-82	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	5,30	16,20	0,00	3,00	78,50	0,22		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	12,70	11,70	0,00	3,00	75,60	0,25		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	5,80	15,00	0,00	3,00	79,20	0,24		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	11,10	13,50	0,00	3,00	75,50	0,19		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	3,00	79,50	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,40	0,00	3,00	80,00	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,80	0,00	2,00	79,70	0,21		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	2,30	19,00	0,00	3,00	78,60	0,22		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,60	0,00	3,00	79,50	0,24		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	8,00	12,10	0,00	3,00	79,90	0,22		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,90	19,60	0,00	2,00	79,50	0,24		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	4,60	16,20	0,00	3,00	79,20	0,22		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,70	0,00	3,00	79,50	0,26		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,60	0,00	3,00	79,90	0,24		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	3,00	79,80	0,20		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	3,10	17,60	0,00	3,00	79,30	0,15		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	2,40	18,50	0,00	3,00	79,10	0,18		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	5,20	16,30	0,00	3,00	78,60	0,24		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Incubadora	PMG-88	A	29/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	2,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	29/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	2,00	79,50	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	29/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	1,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	29/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,60	0,00	2,00	79,40	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	29/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	1,00	79,50	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	29/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	19,80	0,00	2,00	79,70	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	29/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	2,00	79,60	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	29/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	18,80	0,00	2,00	79,40	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	29/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	2,00	79,60	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	29/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,70	0,00	2,00	79,50	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	29/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	1,00	79,70	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	29/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	1,00	79,70	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		25/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,24		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		25/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,60	0,00	3,00	80,00	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		25/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,70	0,00	2,00	79,90	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		25/09/2023	0,00%	0,00%	2,10	18,60	0,00	2,00	79,20	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		25/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	19,70	0,00	2,00	79,70	0,17		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		25/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	18,00	0,00	1,00	80,40	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		25/09/2023	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	2,00	79,80	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,80	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	1,10	19,30	0,00	2,00	79,70	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	3,00	80,20	0,20		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	3,00	80,20	0,22		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,21		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	2,00	80,40	0,23		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		25/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	2,00	79,80	0,17		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	3,20	16,40	0,00	2,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,19		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	16,80	0,00	2,00	81,50	0,19		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	80,00	0,19		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	80,00	0,20		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	80,00	0,24		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	2,00	79,90	0,23		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,21		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	25/09/2023	4,30%	4,30%	8,00	10,10	0,00	3,00	77,60	0,21		0,00	80,00	
Portaria P3	PMG-163	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	3,00	79,80	0,23		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	25/09/2023	0,00%	0,00%	1,70	18,90	0,00	2,00	79,40	0,21		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	25/09/2023	0,10%	0,10%	0,20	19,90	0,00	3,00	79,80	0,22		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	29/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	19,90	0,00	1,00	79,40	0,16		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	29/09/2023	0,00%	0,00%	9,50	11,90	0,00	1,00	78,60	-0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	29/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,18		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	29/09/2023	0,00%	0,00%	13,50	10,90	0,00	2,00	75,60	0,17		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	29/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,60	0,00	2,00	78,90	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	29/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	1,00	79,80	0,09		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	29/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	1,00	79,90	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	29/09/2023	0,00%	0,00%	4,50	17,20	0,00	2,00	78,30	0,16		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	29/09/2023	0,00%	0,00%	3,70	17,80	0,00	2,00	78,40	0,16		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	29/09/2023	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	1,00	79,90	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,70	20,30	0,00	2,00	79,10	0,14		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	19,10	0,00	2,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,20	0,00	2,00	79,40	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	79,60	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	2,00	79,30	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,20	0,00	2,00	79,60	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,40	20,30	0,00	3,00	79,30	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	1,90	18,60	0,00	2,00	79,50	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,60	20,20	0,00	2,00	79,20	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	1,50	18,90	0,00	2,00	79,60	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	0,80	19,70	0,00	2,00	79,50	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	1,60	18,90	0,00	2,00	79,60	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	28/09/2023	0,00%	0,00%	1,00	19,60	0,00	2,00	79,40	0,17		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	28/09/2023	0,00%	0,00%	1,20	19,40	0,00	2,00	79,40	0,17		0,00	0,00	

ANEXO 4

TABELAS DE MEDIÇÕES QUINZENAIS NA INFRAESTRUTURA

PONTOS DE INFRAESTRUTURA						
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
				(ppm)	(5%Vol.)	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	1	03/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	2	03/07/2023	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaco c/ pouca circulação de ar	3	03/07/2023	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	4	06/07/2023	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	5	06/07/2023	0	0	
Caixa d'água	Espaco c/ pouca circulação de ar	6	04/07/2023	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	7	05/07/2023	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	8	05/07/2023	0	0	
Casa de Máquinas	Espaco c/ pouca circulação de ar	9	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	04/07/2023	4	0	
Edifício I-1	Ralo	27	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	04/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	04/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	03/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	03/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	03/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	03/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	03/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	03/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	03/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	03/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	03/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	03/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	03/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	03/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	03/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	05/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	05/07/2023	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	-	-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	05/07/2023	16	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	05/07/2023	5	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	05/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	05/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	04/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	04/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	76	04/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	04/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	04/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	04/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	04/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	04/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	04/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	04/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	04/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	04/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	04/07/2023	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	06/07/2023	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	06/07/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	06/07/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	06/07/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	06/07/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	06/07/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	136	06/07/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	137	06/07/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	138	06/07/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	132	07/07/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	133	07/07/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	134	07/07/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	135	07/07/2023	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	03/07/2023	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	03/07/2023	0	0	
Base Guard	Ralo	188	06/07/2023	0	0	
Base Guard	Ralo	189	06/07/2023	0	0	
Base Guard	Ralo	190	06/07/2023	0	0	
Base Guard	Ralo	191	06/07/2023	0	0	
Base Guard	Ralo	192	06/07/2023	0	0	
Base Guard	Ralo	193	06/07/2023	0	0	
Base Guard	Ralo	194	06/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	1	17/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	2	17/07/2023	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaco c/ pouca circulação de ar	3	17/07/2023	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	4	20/07/2023	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	5	20/07/2023	0	0	
Caixa d'água	Espaco c/ pouca circulação de ar	6	18/07/2023	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	7	19/07/2023	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	8	19/07/2023	0	0	
Casa de Máquinas	Espaco c/ pouca circulação de ar	9	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	18/07/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	18/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	17/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	17/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	17/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	17/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	17/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	17/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	17/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	17/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	17/07/2023	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
I-5 Auditórios	Ralo	174	17/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	17/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	17/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	17/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	19/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	-	-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	19/07/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	19/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	18/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	18/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	76	18/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	18/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	18/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	18/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	18/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	18/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	18/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	18/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	18/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	18/07/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	18/07/2023	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	20/07/2023	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	20/07/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	20/07/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	20/07/2023	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Enfermaria	Ralo	126	20/07/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	20/07/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	136	20/07/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	137	20/07/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	138	20/07/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	132	21/07/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	133	21/07/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	134	21/07/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	135	21/07/2023	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	17/07/2023	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	17/07/2023	0	0	
base guarda	Ralo	188	20/07/2023	0	0	
base guarda	Ralo	189	20/07/2023	0	0	
base guarda	Ralo	190	20/07/2023	0	0	
base guarda	Ralo	191	20/07/2023	0	0	
base guarda	Ralo	192	20/07/2023	0	0	
base guarda	Ralo	193	20/07/2023	0	0	
base guarda	Ralo	194	20/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	1	31/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	2	31/07/2023	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaco c/ pouca circulação de ar	3	31/07/2023	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	4				
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	5				
Caixa d'água	Espaco c/ pouca circulação de ar	6				
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	7				
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	8				
Casa de Máquinas	Espaco c/ pouca circulação de ar	9				
Edifício I-1	Ralo	1				
Edifício I-1	Ralo	2				
Edifício I-1	Ralo	3				
Edifício I-1	Ralo	4				
Edifício I-1	Ralo	5				
Edifício I-1	Ralo	6				
Edifício I-1	Ralo	7				
Edifício I-1	Ralo	8				
Edifício I-1	Ralo	9				
Edifício I-1	Ralo	12				
Edifício I-1	Ralo	13				
Edifício I-1	Ralo	14				
Edifício I-1	Ralo	15				
Edifício I-1	Ralo	16				
Edifício I-1	Ralo	17				
Edifício I-1	Ralo	18				
Edifício I-1	Ralo	19				
Edifício I-1	Ralo	20				
Edifício I-1	Ralo	21				
Edifício I-1	Ralo	22				
Edifício I-1	Ralo	23				
Edifício I-1	Ralo	24				
Edifício I-1	Ralo	25				
Edifício I-1	Ralo	26				
Edifício I-1	Ralo	27				
Edifício I-1	Ralo	28				
Edifício I-1	Ralo	30				
Edifício I-1	Ralo	31				
Edifício I-1	Ralo	32				
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	31/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	31/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	31/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	31/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	31/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	31/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	31/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	31/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	31/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	31/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	31/07/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	31/07/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	31/07/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	02/08/2023	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Central de Serviços I-4	Ralo	112	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	02/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	-	-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	02/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	02/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	01/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	01/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	76	01/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	01/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	01/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	01/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	01/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	01/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	01/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	01/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	01/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	01/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	01/08/2023	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	03/08/2023	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	03/08/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	03/08/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	03/08/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	03/08/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	03/08/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	136	03/08/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	137	03/08/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	138	03/08/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	132	04/08/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	133	04/08/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	134	04/08/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	135	04/08/2023	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	31/07/2023	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	31/07/2023	0	0	
base guarnição	Ralo	188	03/08/2023	0	0	
base guarnição	Ralo	189	03/08/2023	0	0	
base guarnição	Ralo	190	03/08/2023	0	0	
base guarnição	Ralo	191	03/08/2023	0	0	
base guarnição	Ralo	192	03/08/2023	0	0	
base guarnição	Ralo	193	03/08/2023	0	0	
base guarnição	Ralo	194	03/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	1	16/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	2	17/08/2023	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaco c/ pouca circulação de ar	3	16/08/2023	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	4	17/08/2023	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	5	17/08/2023	0	0	
Caixa d'água	Espaco c/ pouca circulação de ar	6	15/08/2023	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	7	14/08/2023	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	8	14/08/2023	0	0	
Casa de Máquinas	Espaco c/ pouca circulação de ar	9	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	15/08/2023	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Edifício I-1	Ralo	26	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	15/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	15/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72				
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73				
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74				
I-5 Auditórios	Ralo	159				
I-5 Auditórios	Ralo	160				
I-5 Auditórios	Ralo	162				
I-5 Auditórios	Ralo	164				
I-5 Auditórios	Ralo	165				
I-5 Auditórios	Ralo	171				
I-5 Auditórios	Ralo	174				
I-5 Auditórios	Ralo	176				
I-5 Auditórios	Ralo	177				
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57				
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58				
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59				
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60				
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67				
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139				
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140				
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141				
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142				
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143				
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144				
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145				
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146				
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147				
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148				
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149				
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150				
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151				
Central de Serviços I-4	Ralo	95	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	14/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	-	-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	14/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	14/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	15/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	15/08/2023	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Conjunto Didático	Ralo	76	15/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	15/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	15/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	15/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	15/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	15/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	15/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	15/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	15/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	15/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	15/08/2023	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	17/08/2023	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	17/08/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	17/08/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	17/08/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	17/08/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	17/08/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	136	17/08/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	137	17/08/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	138	17/08/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	132	18/08/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	133	18/08/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	134	18/08/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	135	18/08/2023	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	16/08/2023	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	16/08/2023	0	0	
Base Guardado	Ralo	188	18/08/2023	0	0	
Base Guardado	Ralo	189	18/08/2023	0	0	
Base Guardado	Ralo	190	18/08/2023	0	0	
Base Guardado	Ralo	191	18/08/2023	0	0	
Base Guardado	Ralo	192	18/08/2023	0	0	
Base Guardado	Ralo	193	18/08/2023	0	0	
Base Guardado	Ralo	194	18/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	1	28/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	2	28/08/2023	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaco c/ pouca circulação de ar	3	28/08/2023	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	4	31/08/2023	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	5	31/08/2023	0	0	
Caixa d'água	Espaco c/ pouca circulação de ar	6	29/08/2023	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	7	30/08/2023	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	8	30/08/2023	0	0	
Casa de Máquinas	Espaco c/ pouca circulação de ar	9	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	29/08/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	29/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	28/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	28/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	28/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	28/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	28/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	28/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	28/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	28/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	28/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	28/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	28/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	28/08/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	28/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	30/08/2023	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Central de Serviços I-4	Ralo	102	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	30/08/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	-	-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	30/08/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	30/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	29/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	29/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	76	29/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	29/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	29/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	29/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	29/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	29/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	29/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	29/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	29/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	29/08/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	29/08/2023	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	31/08/2023	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	31/08/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	31/08/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	31/08/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	31/08/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	31/08/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	136	31/08/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	137	31/08/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	138	31/08/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	132		0	0	
CAT 2	Ralo	133		0	0	
CAT 2	Ralo	134		0	0	
CAT 2	Ralo	135		0	0	
Portaria 3	Ralo	186	28/08/2023	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	28/08/2023	0	0	
Base Guarára	Ralo	188	31/08/2023	0	0	
Base Guarára	Ralo	189	31/08/2023	0	0	
Base Guarára	Ralo	190	31/08/2023	0	0	
Base Guarára	Ralo	191	31/08/2023	0	0	
Base Guarára	Ralo	192	31/08/2023	0	0	
Base Guarára	Ralo	193	31/08/2023	0	0	
Base Guarára	Ralo	194	31/08/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	1	11/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	2	11/09/2023	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaco c/ pouca circulação de ar	3	11/09/2023	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	4	14/09/2023	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	5	14/09/2023	0	0	
Caixa d'água	Espaco c/ pouca circulação de ar	6	15/09/2023	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	7	13/09/2023	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	8	13/09/2023	0	0	
Casa de Máquinas	Espaco c/ pouca circulação de ar	9	15/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	12/09/2023	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Edifício I-1	Ralo	9	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	12/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	12/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	11/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	11/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	11/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	11/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	11/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	11/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	11/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	11/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	11/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	11/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	11/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	11/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	11/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	13/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	13/09/2023	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	-	-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	13/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	13/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	12/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	12/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	76	12/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	12/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	12/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	12/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	12/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	12/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	12/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	12/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	12/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	12/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	12/09/2023	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	14/09/2023	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	14/09/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	14/09/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	14/09/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	14/09/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	14/09/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	136	14/09/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	137	14/09/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	138	14/09/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	132	15/09/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	133	15/09/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	134	15/09/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	135	15/09/2023	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	11/09/2023	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	11/09/2023	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	188	14/09/2023	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	189	14/09/2023	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	190	14/09/2023	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	191	14/09/2023	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	192	14/09/2023	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	193	14/09/2023	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	194	14/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	1	25/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Espaço c/ pouca circulação de ar	2	25/09/2023	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaço c/ pouca circulação de ar	3	25/09/2023	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	4	28/09/2023	0	0	
Enfermaria	Espaço c/ pouca circulação de ar	5	28/09/2023	0	0	
Caixa d'água	Espaço c/ pouca circulação de ar	6	29/09/2023	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	7	27/09/2023	0	0	
Edifício I-4	Espaço c/ pouca circulação de ar	8	27/09/2023	0	0	
Casa de Máquinas	Espaço c/ pouca circulação de ar	9	29/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	26/09/2023	0	0	


Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Edifício I-1	Ralo	17	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	26/09/2023	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	26/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	25/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	25/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	25/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	25/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	25/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	25/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	25/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	25/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	25/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	25/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	25/09/2023	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	25/09/2023	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	25/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	27/09/2023	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	27/09/2023	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	-	-	-	Não medido. Local temporariamente com acesso restrito.
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	27/09/2023	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	27/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	26/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	26/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	76	26/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	26/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	26/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	26/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	26/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	26/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	26/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	26/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	26/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	26/09/2023	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	26/09/2023	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	28/09/2023	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	28/09/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	28/09/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	28/09/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	28/09/2023	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	28/09/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	136	28/09/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	137	28/09/2023	0	0	
CAT 1	Ralo	138	28/09/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	132	29/09/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	133	29/09/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	134	29/09/2023	0	0	
CAT 2	Ralo	135	29/09/2023	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	25/09/2023	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	25/09/2023	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	188	28/09/2023	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	189	28/09/2023	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	190	28/09/2023	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	191	28/09/2023	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	192	28/09/2023	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	193	28/09/2023	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	194	28/09/2023	0	0	


ANEXO 5

EVOLUÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE METANO X PRESSÃO (ABRIL/2014 A SETEMBRO/2023)




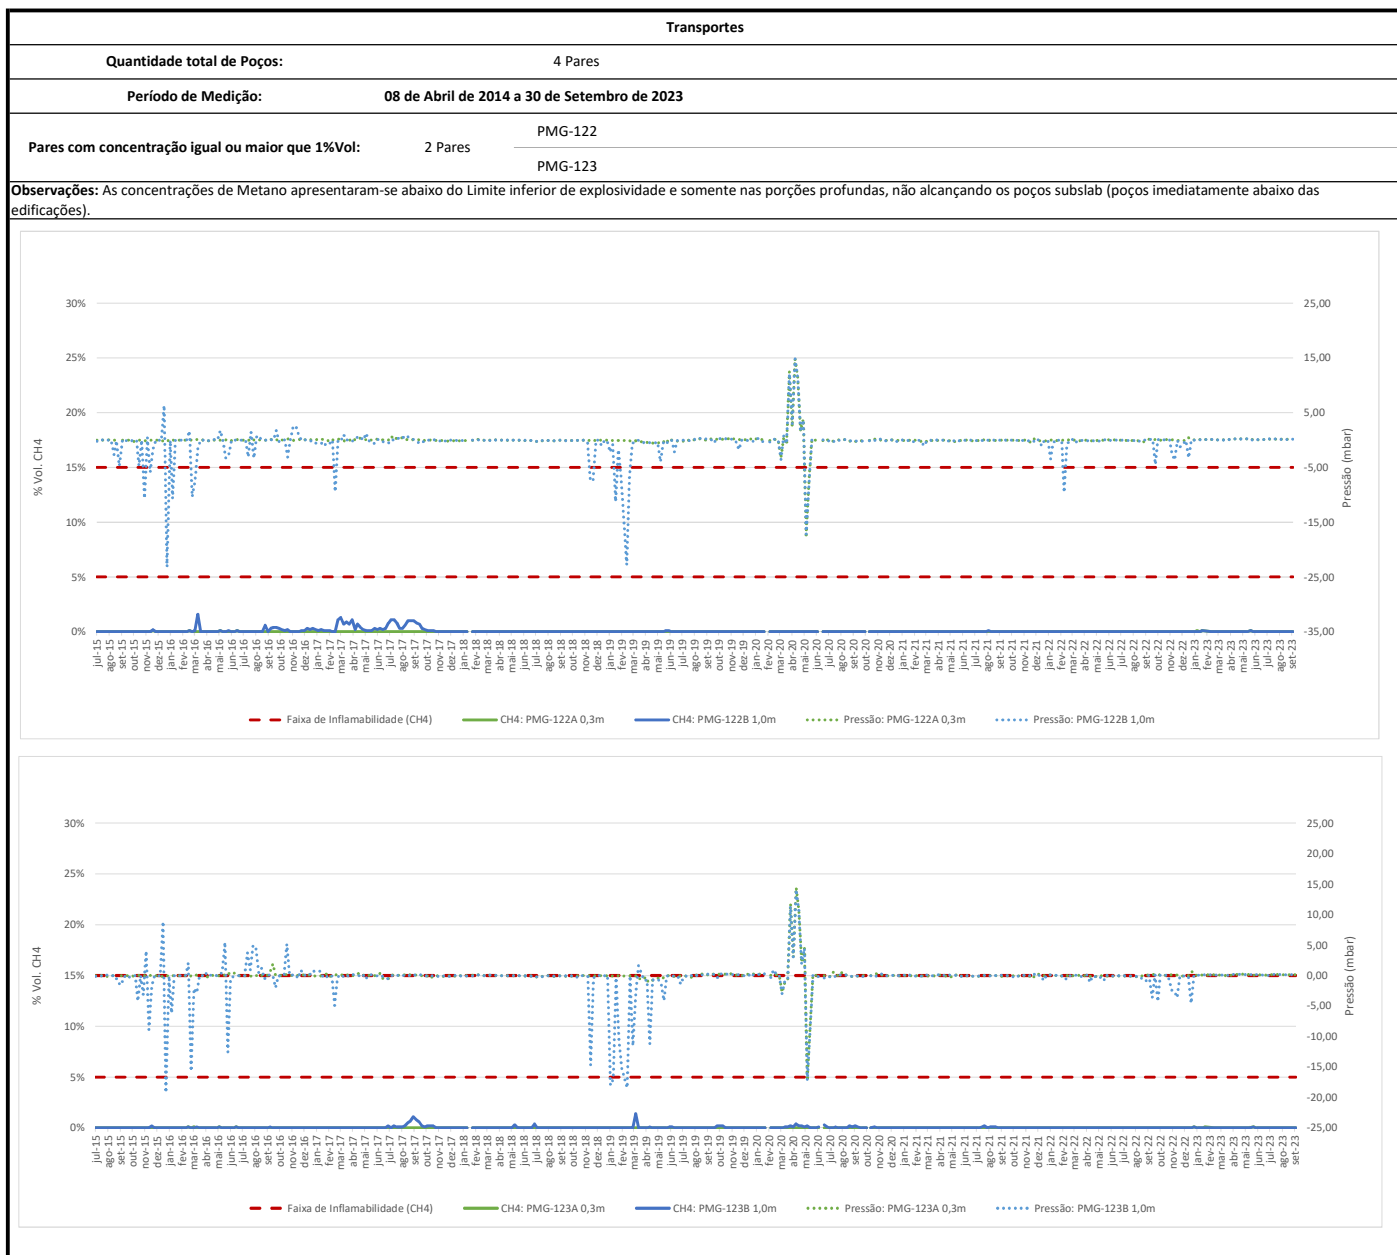




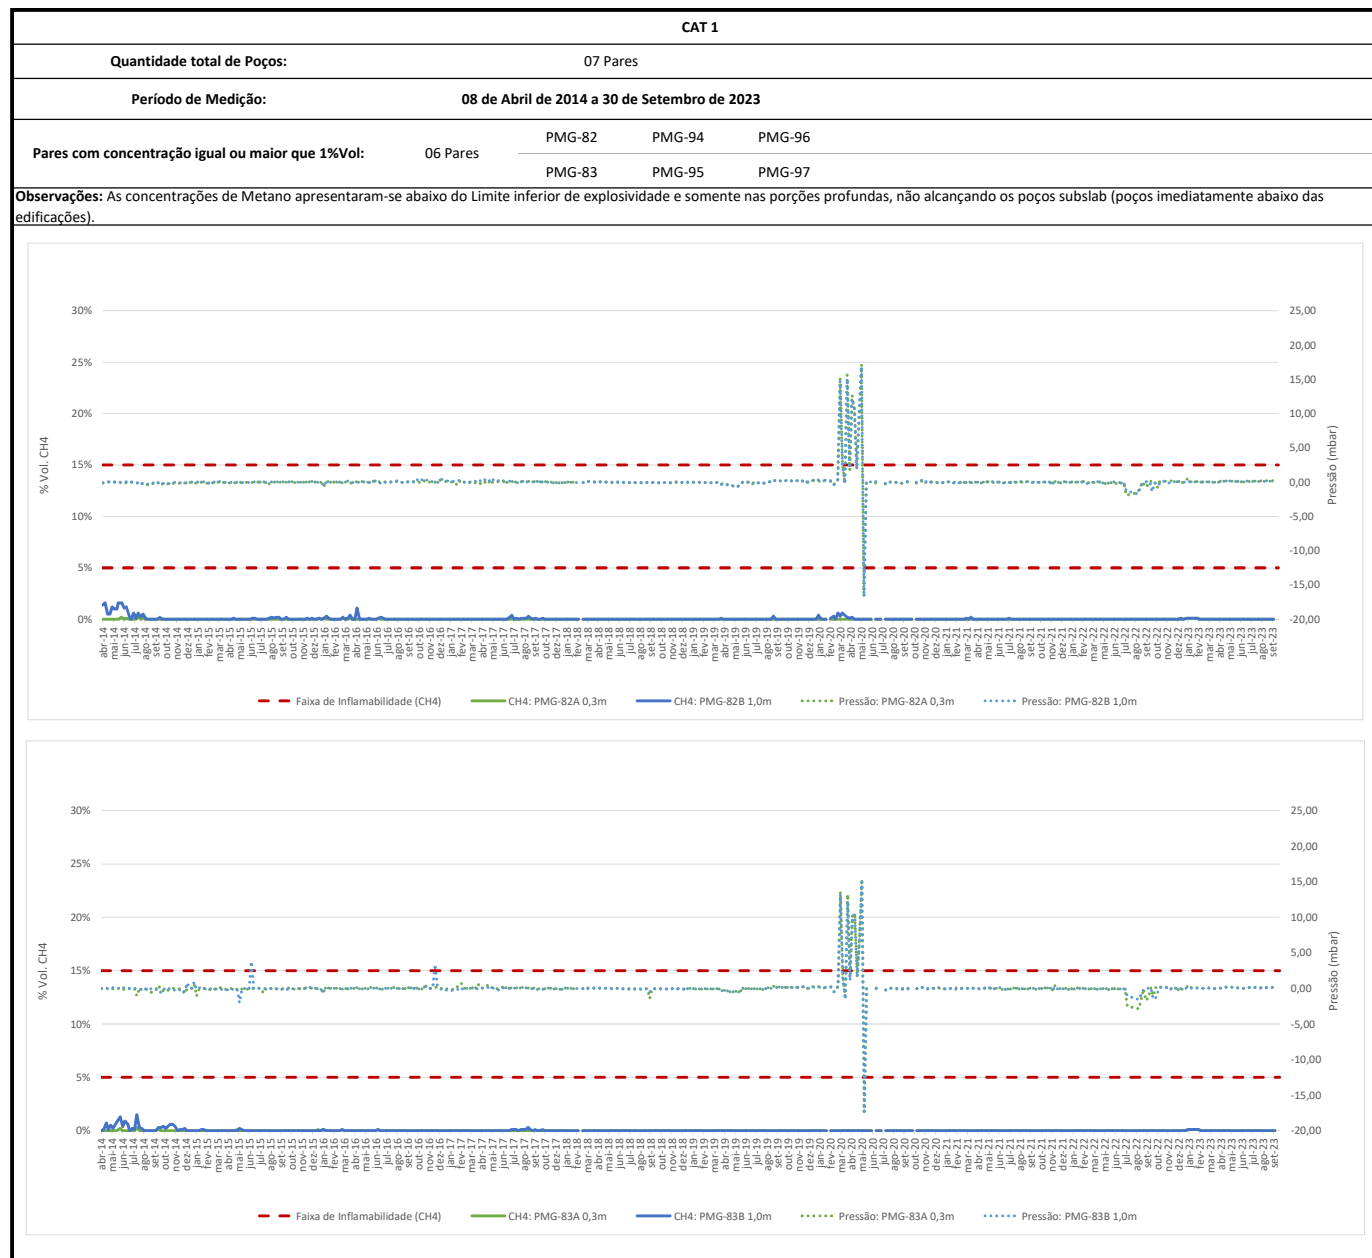




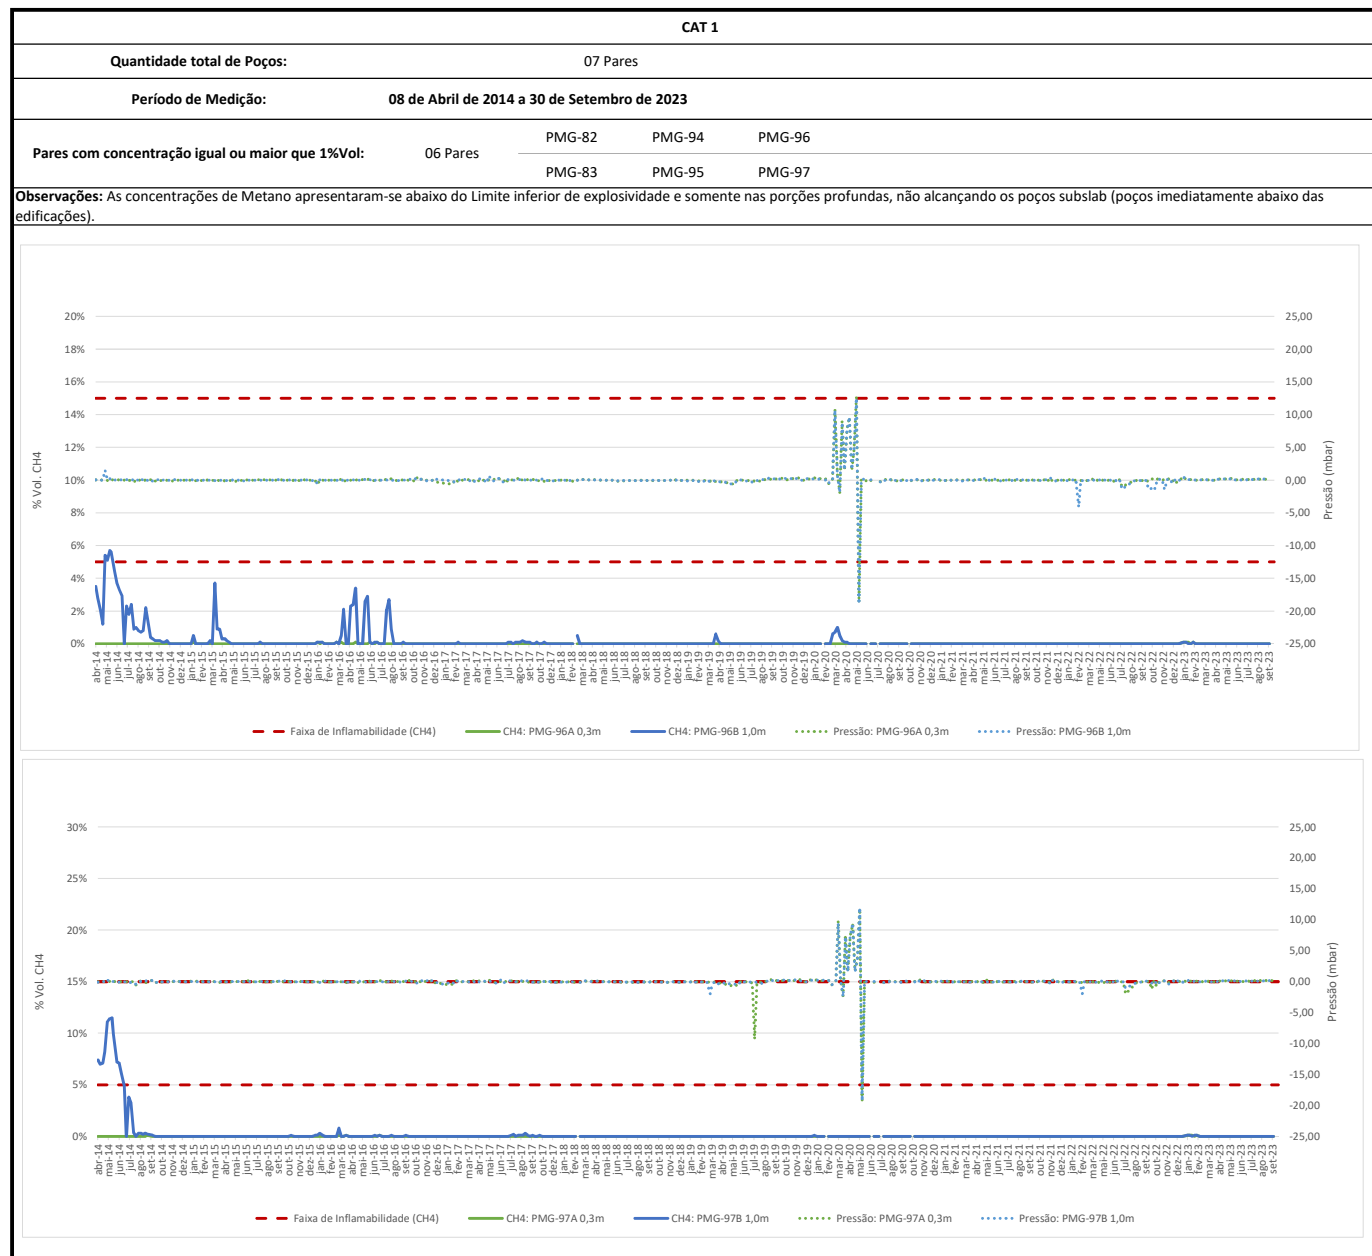





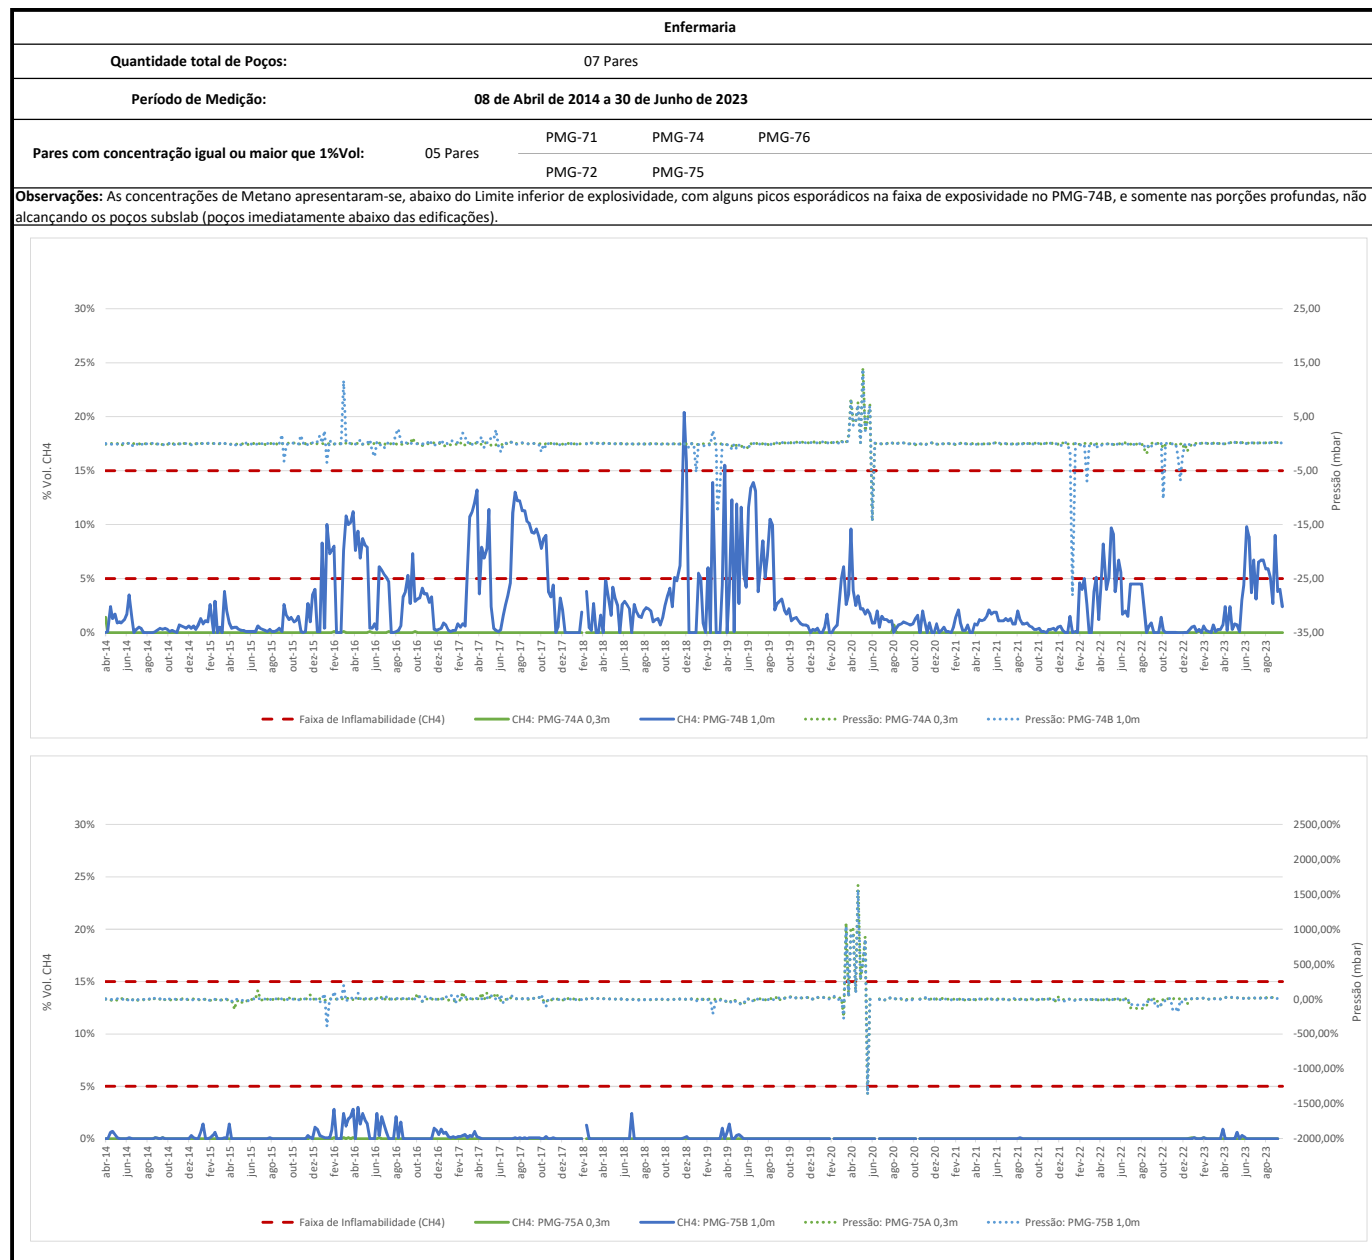





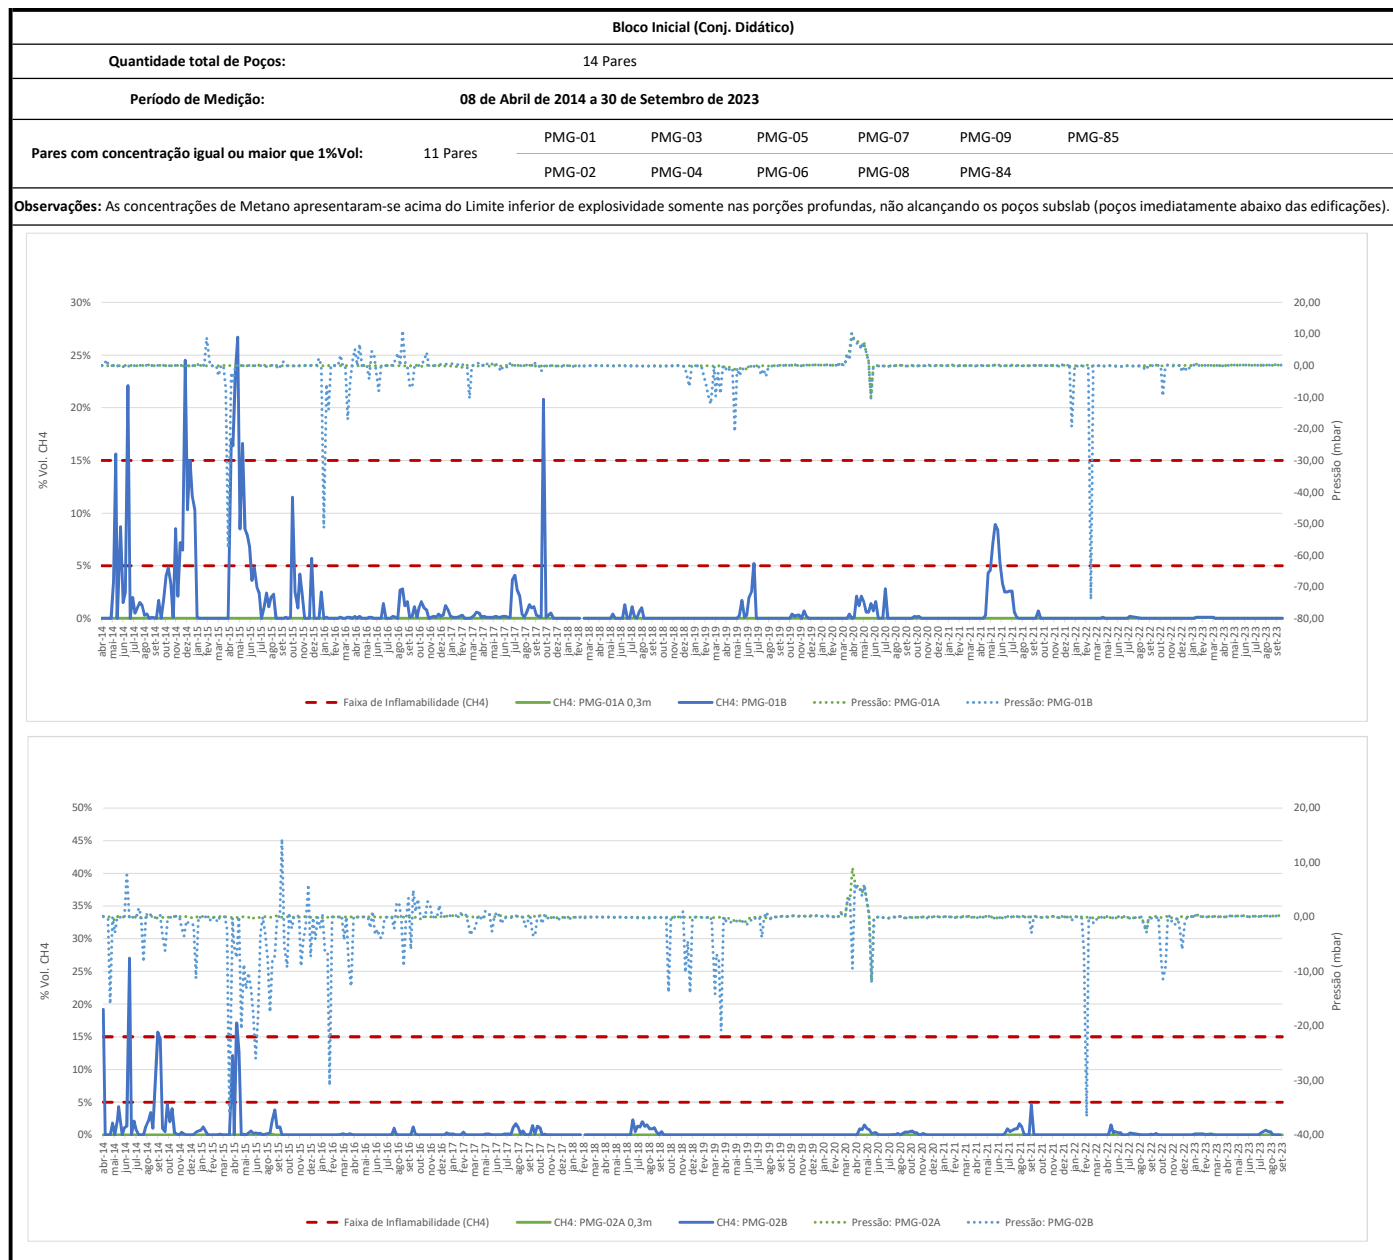

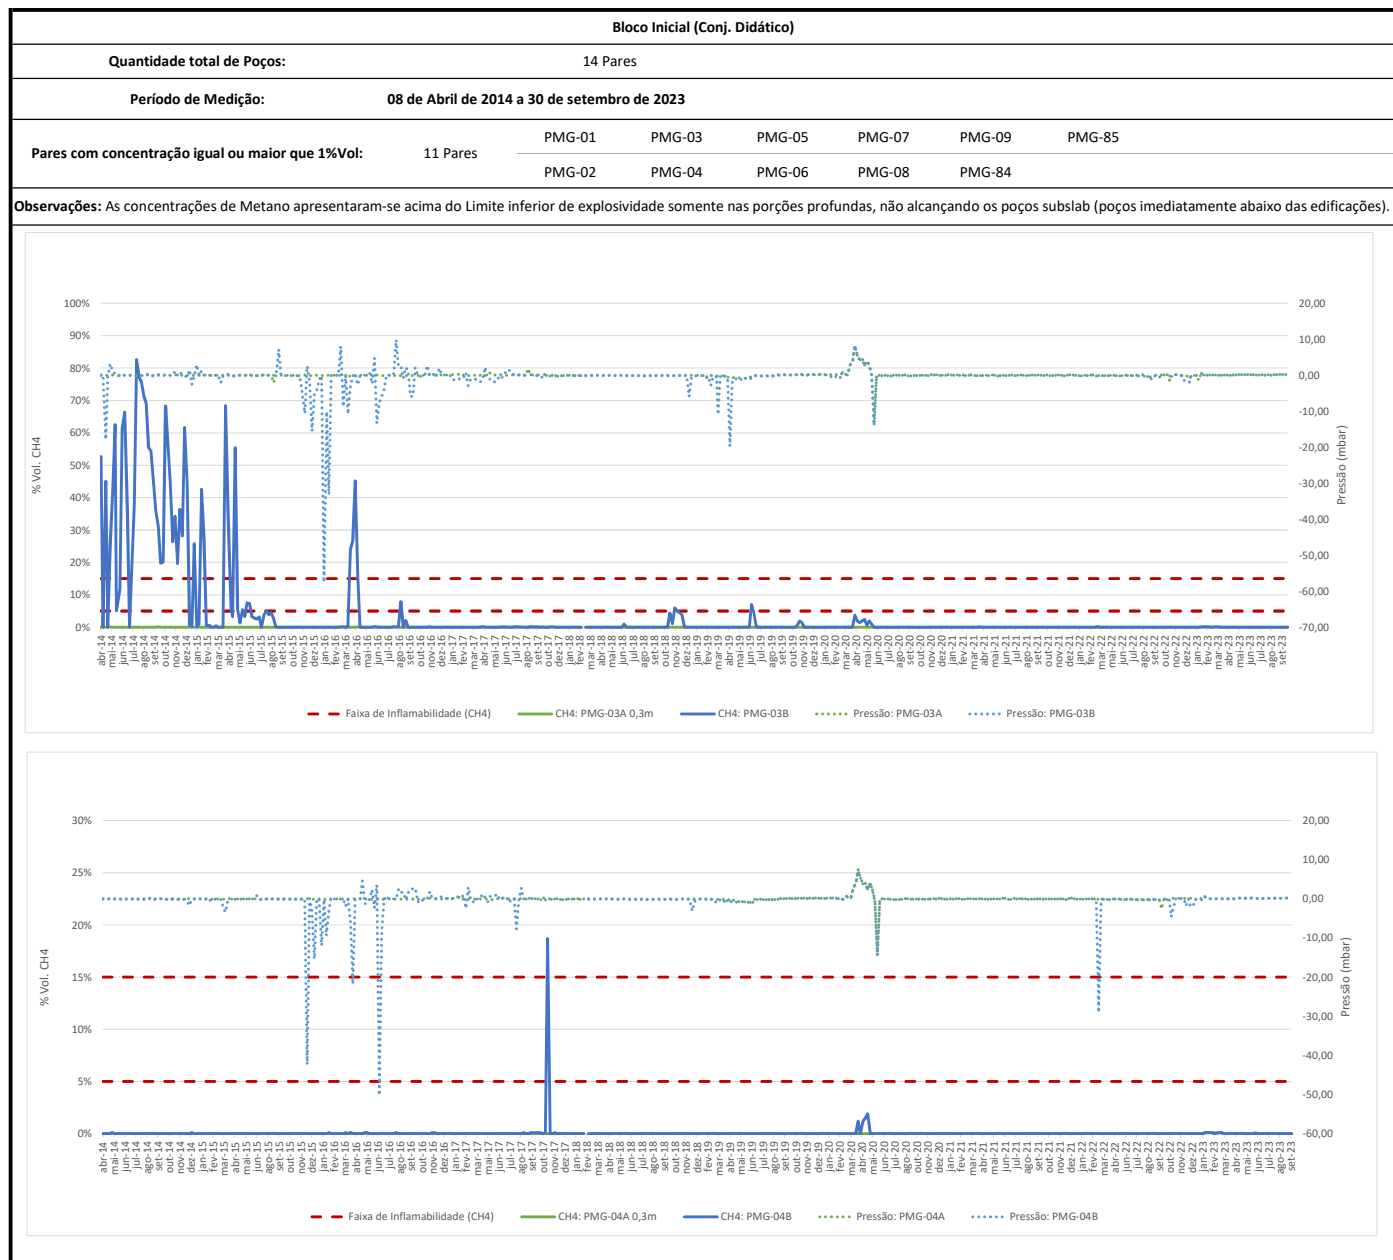


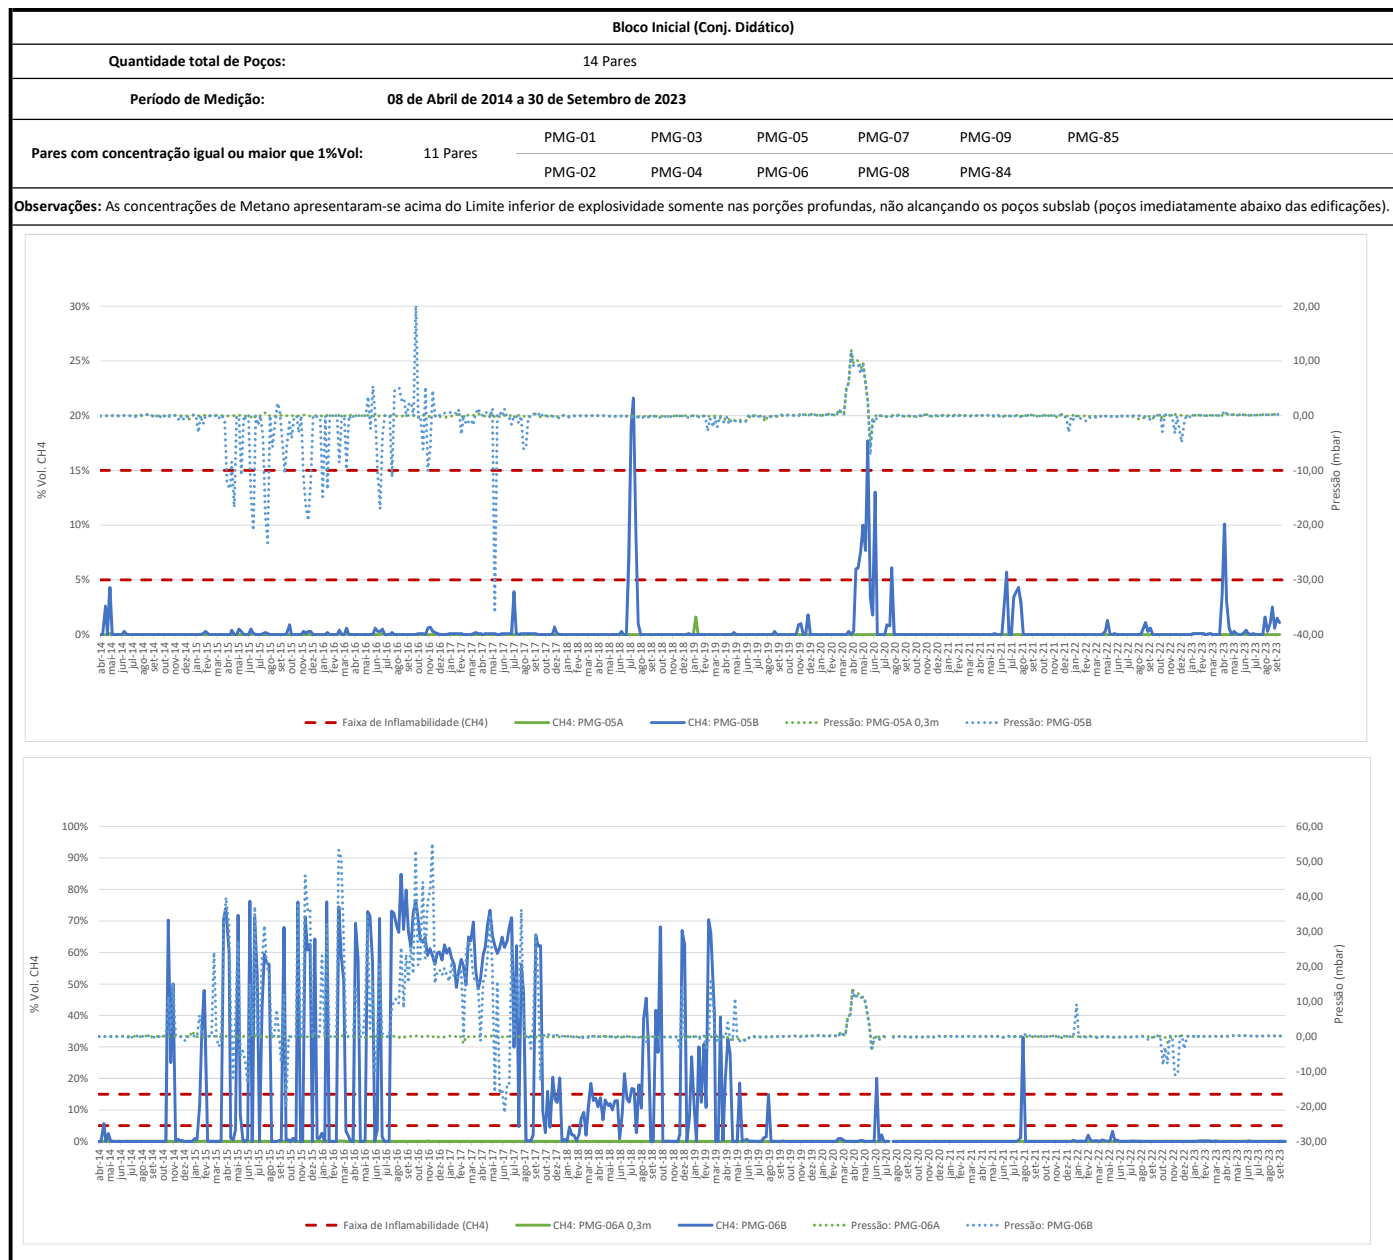


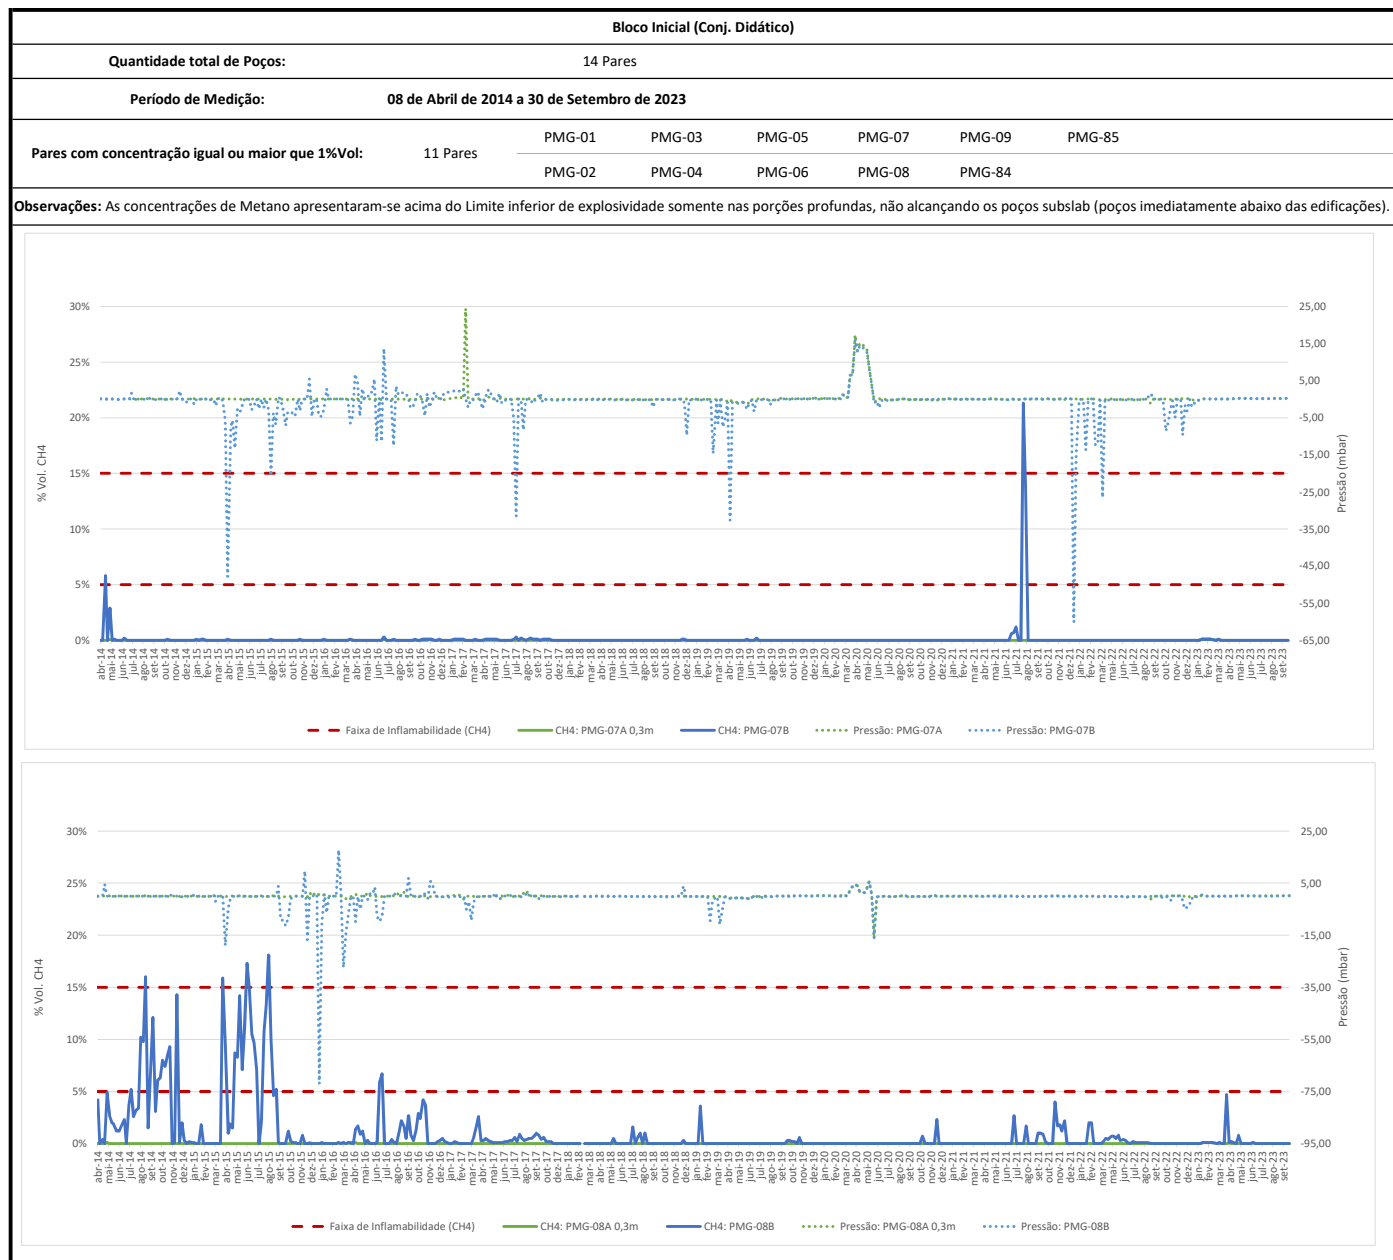


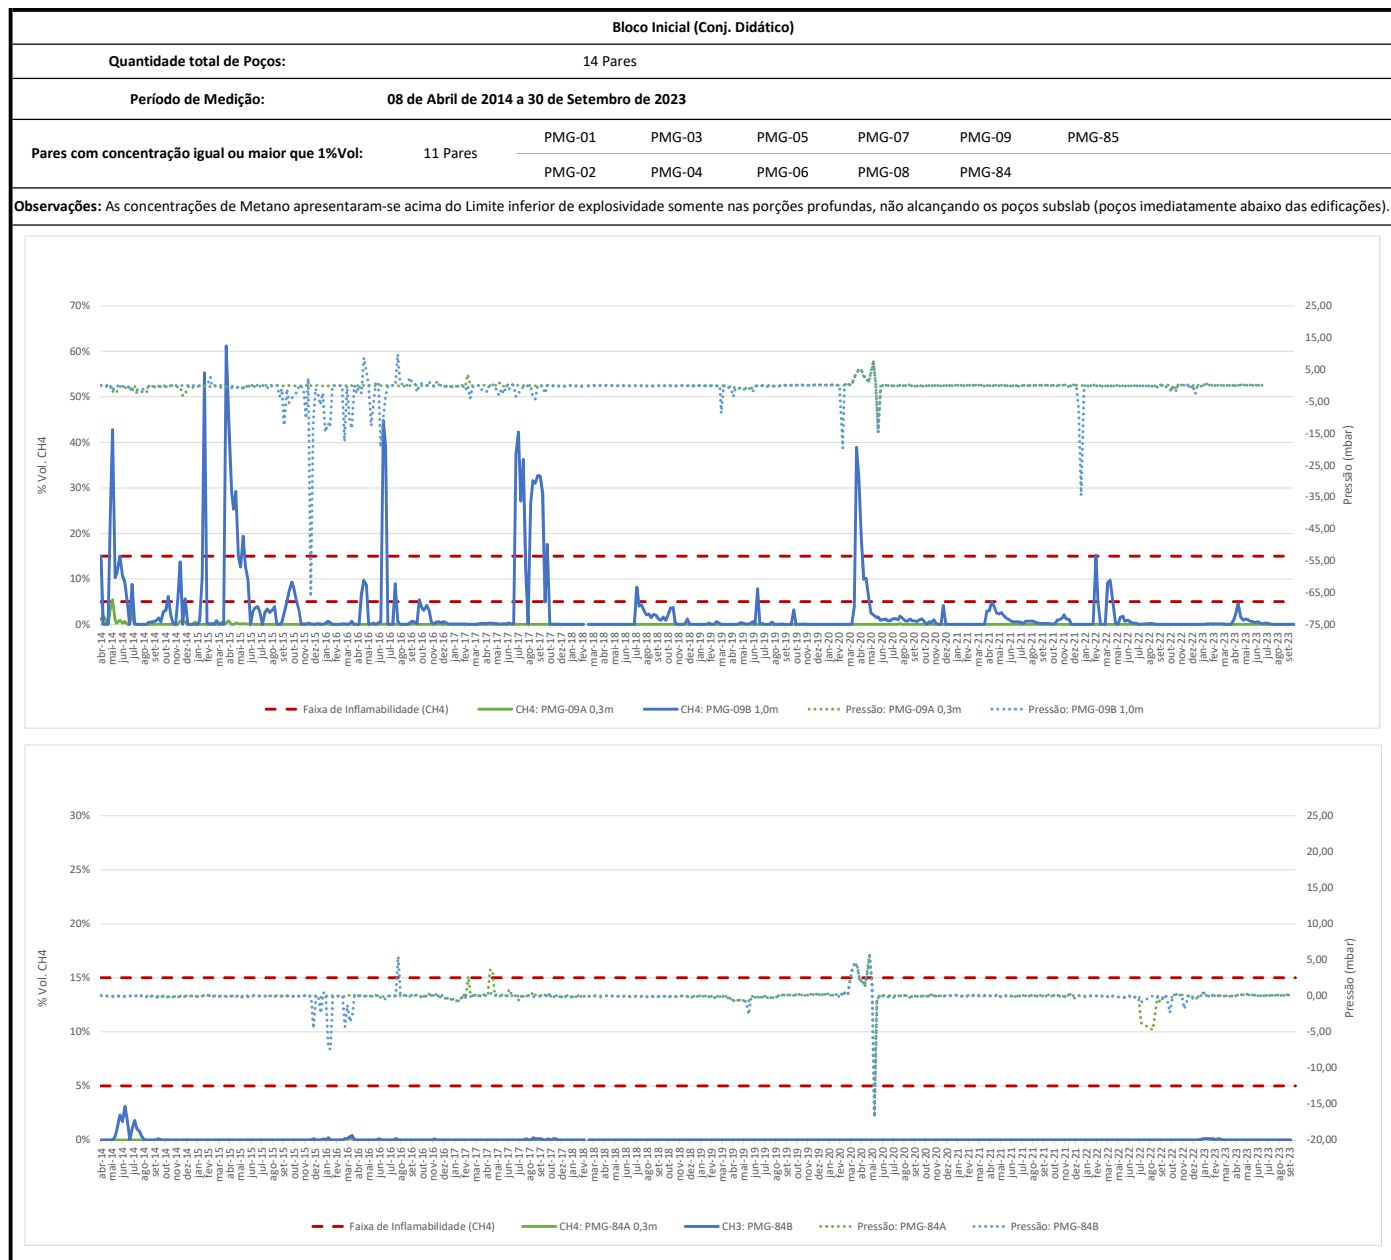





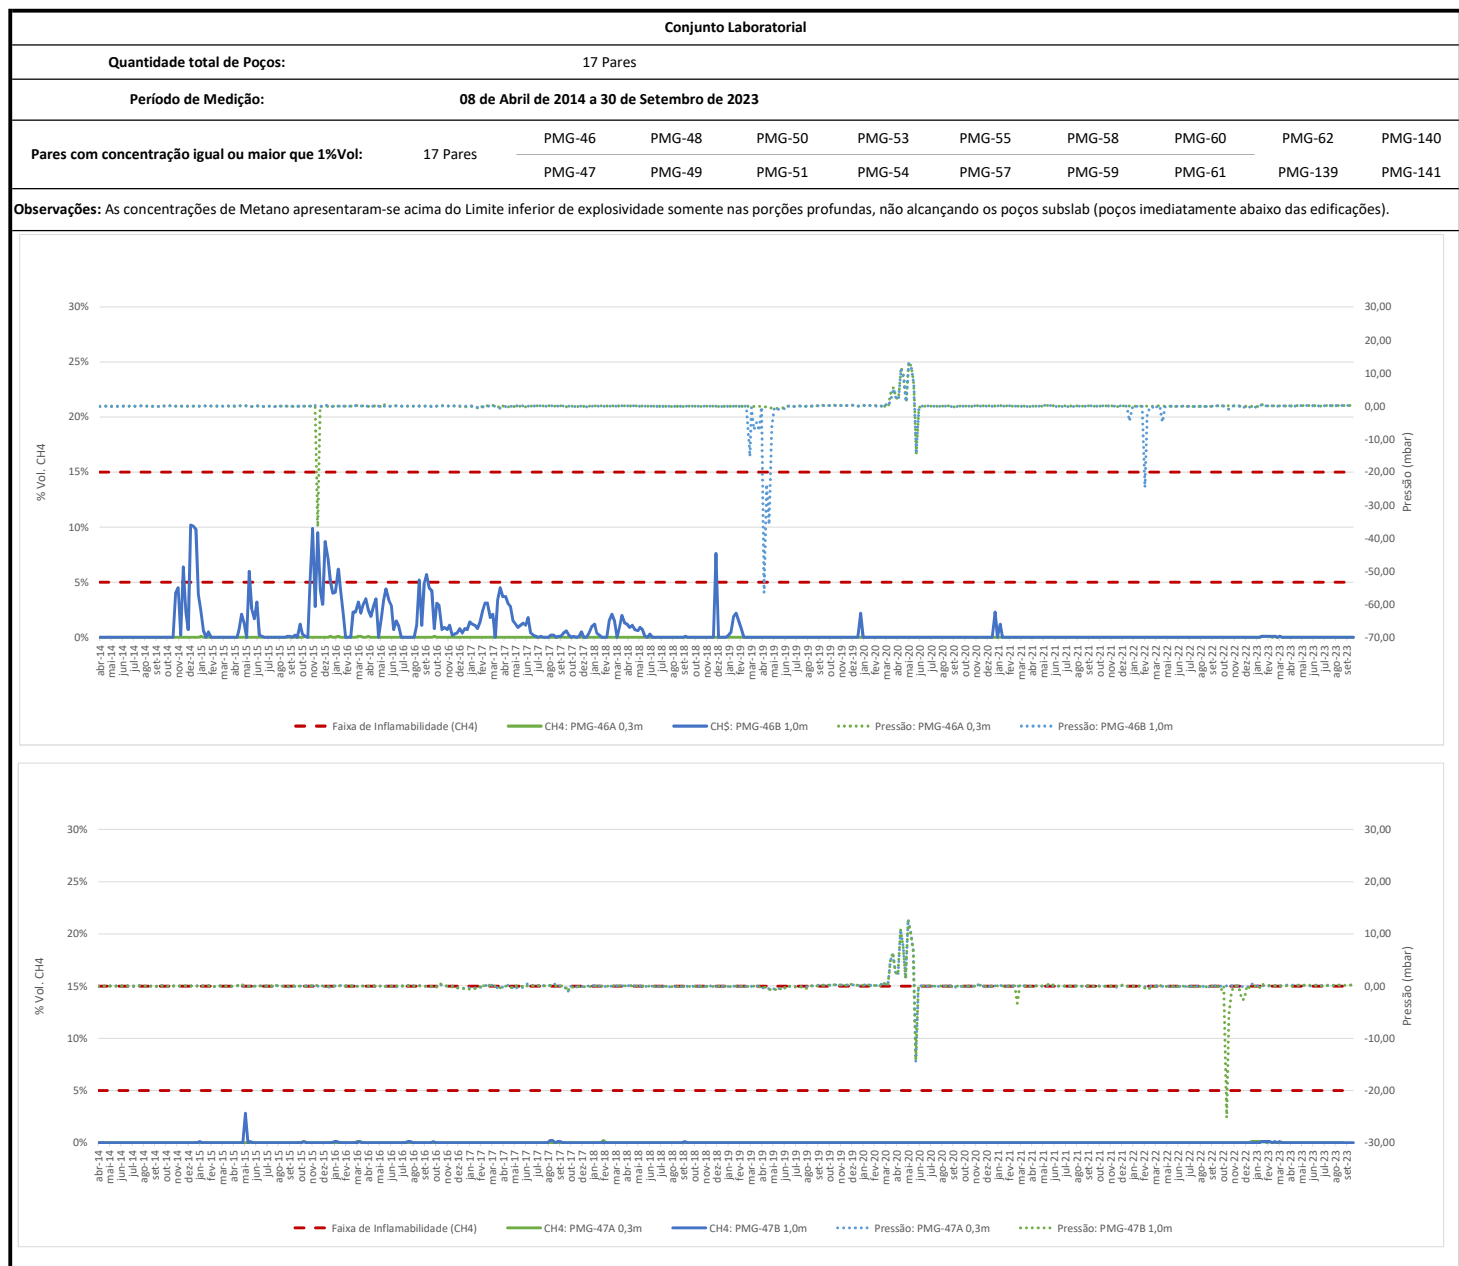

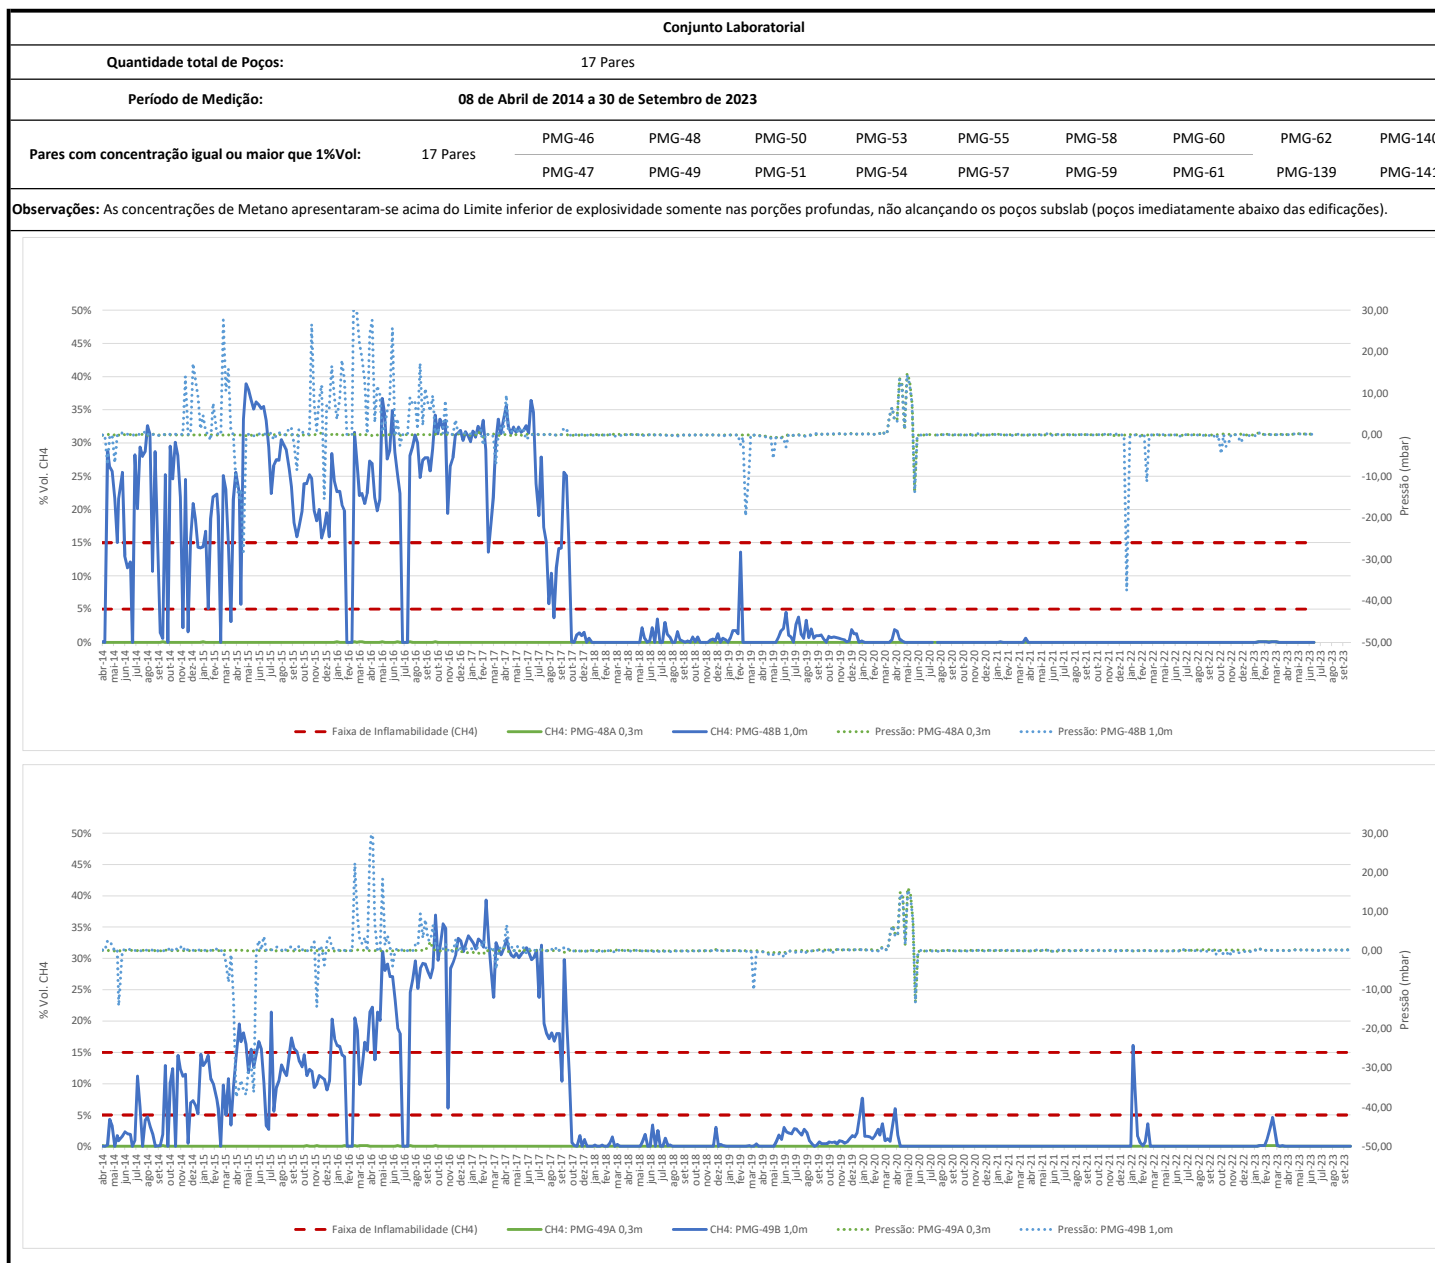


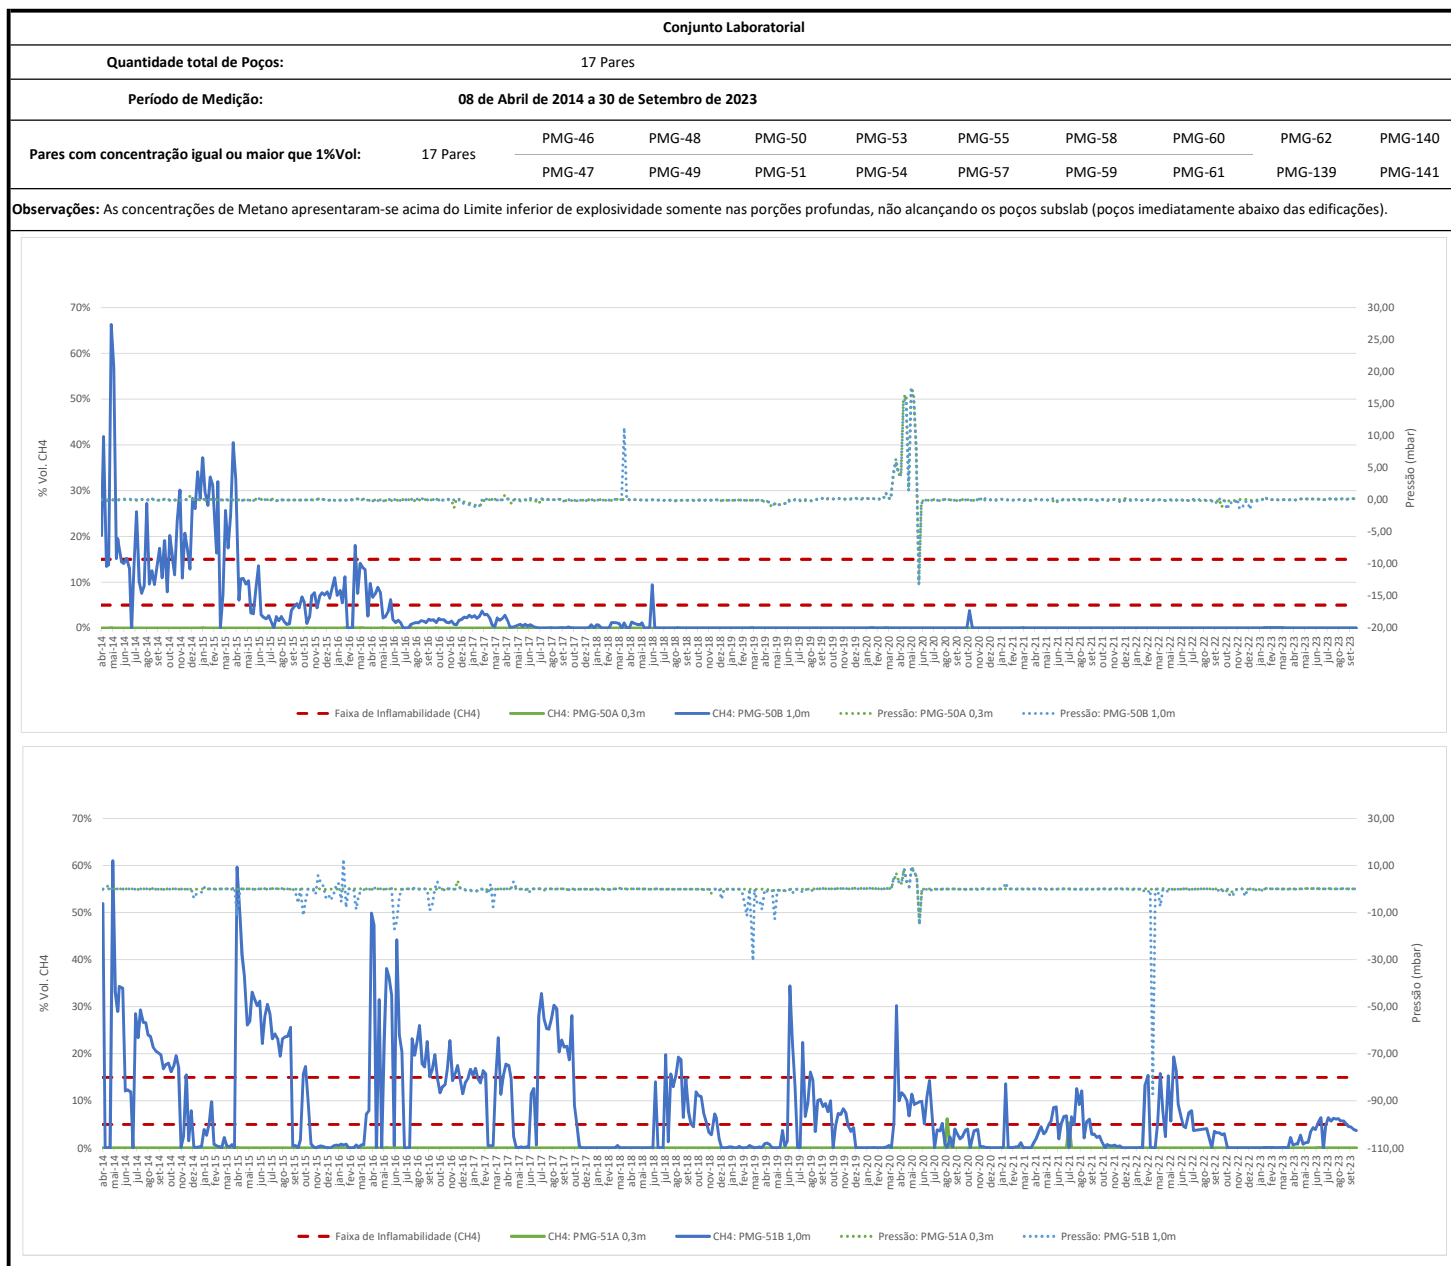


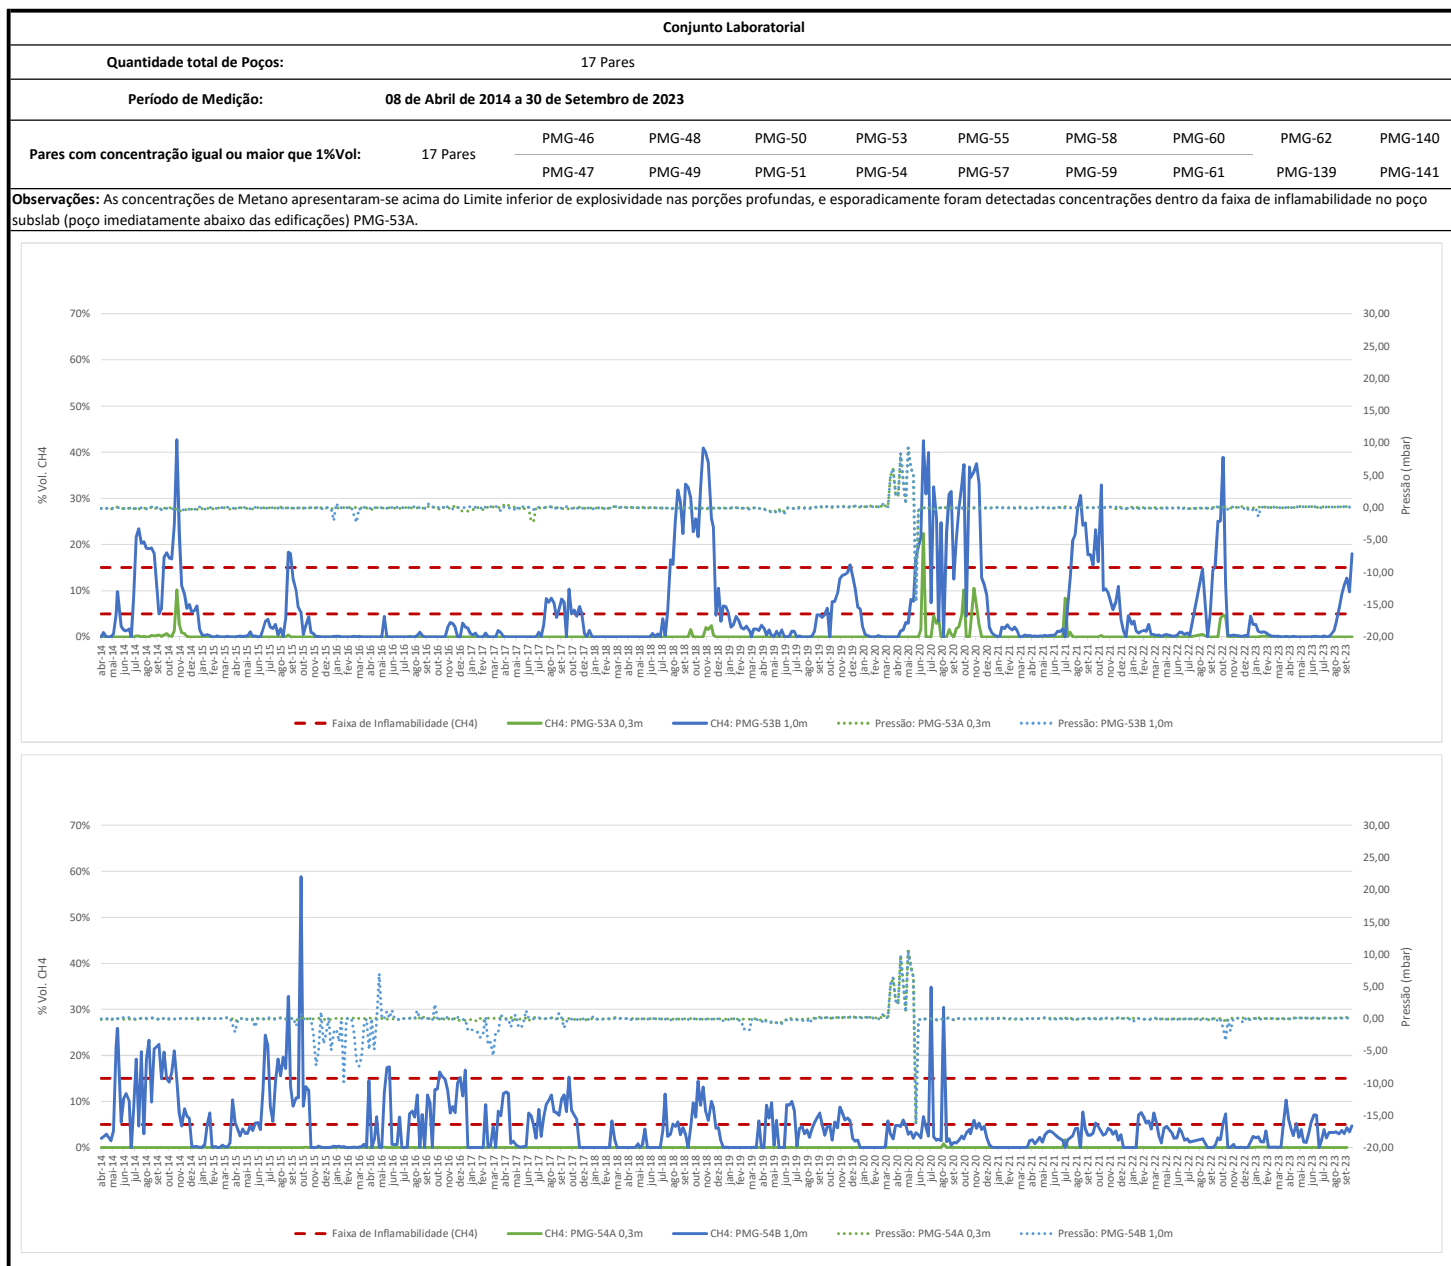


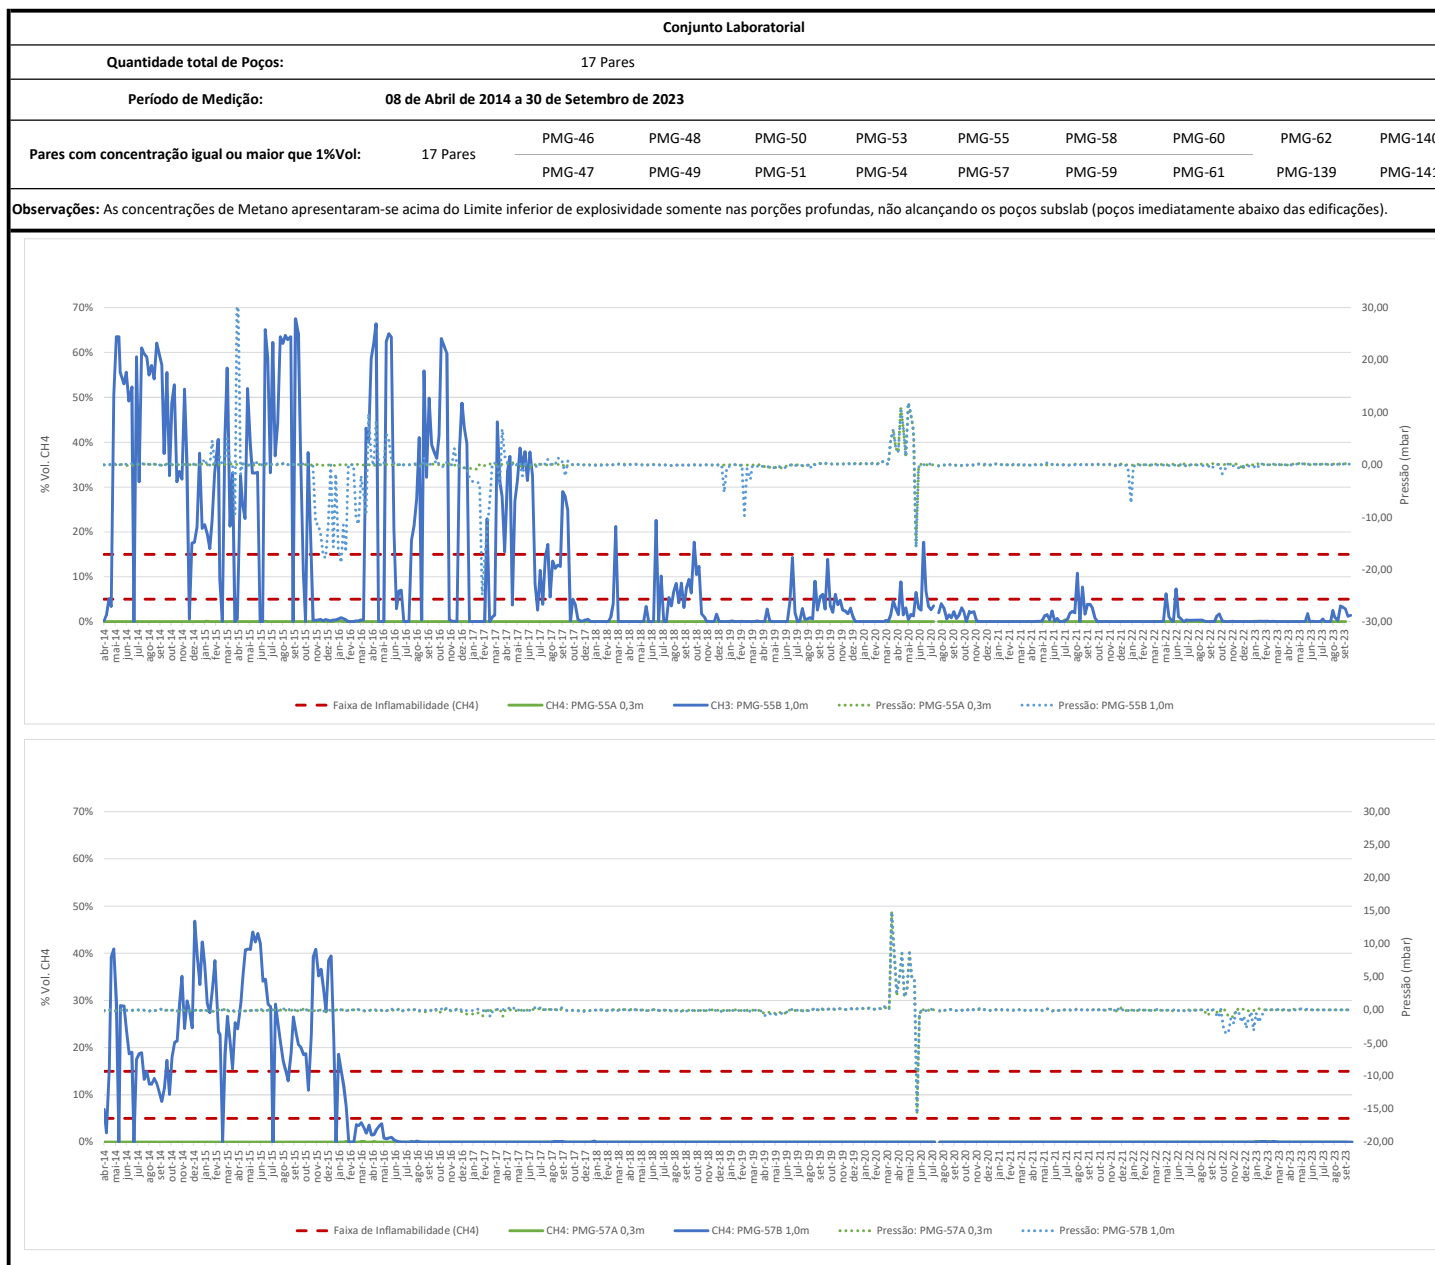



Conjunto Laboratorial										
Quantidade total de Poços:		17 Pares								
Período de Medição:		08 de Abril de 2014 a 30 de Setembro de 2023								
Pares com concentração igual ou maior que 1%Vol:	17 Pares	PMG-46	PMG-48	PMG-50	PMG-53	PMG-55	PMG-58	PMG-60	PMG-62	PMG-140
		PMG-47	PMG-49	PMG-51	PMG-54	PMG-57	PMG-59	PMG-61	PMG-139	PMG-141


Observações: As concentrações de Metano apresentaram-se acima do Limite inferior de explosividade somente nas porções profundas, não alcançando os poços subslab (poços imediatamente abaixo das edificações).

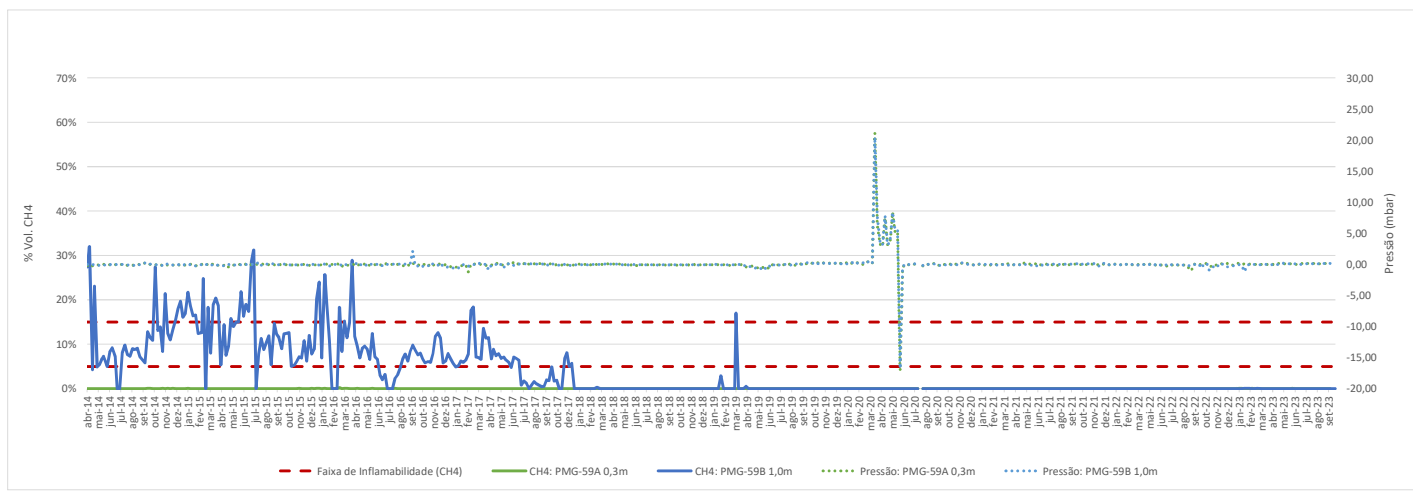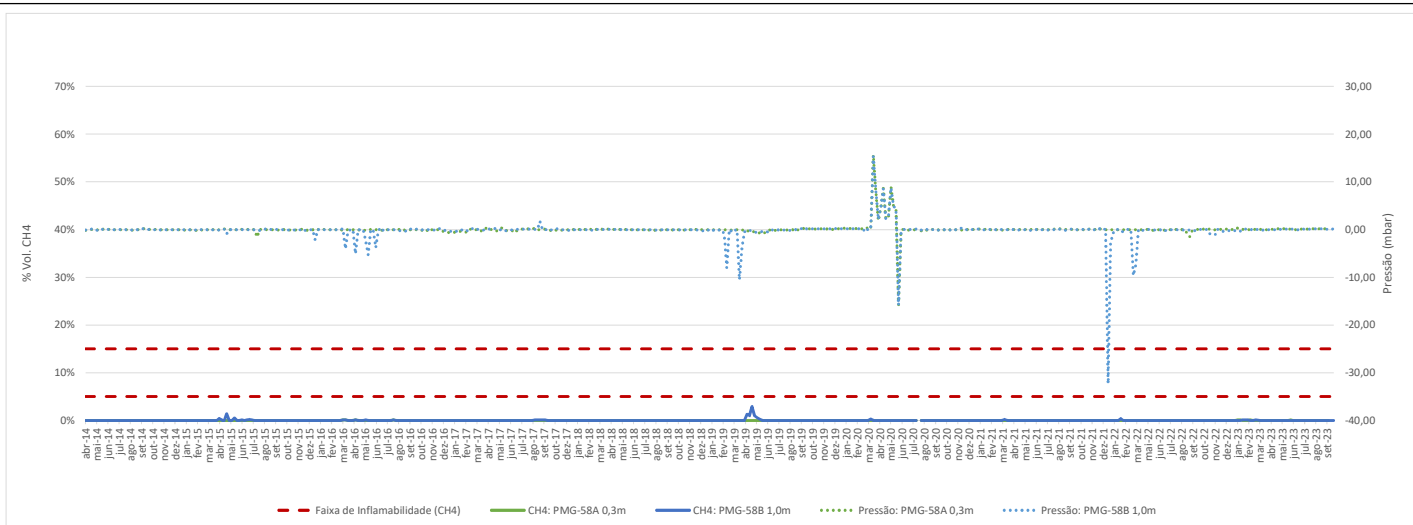

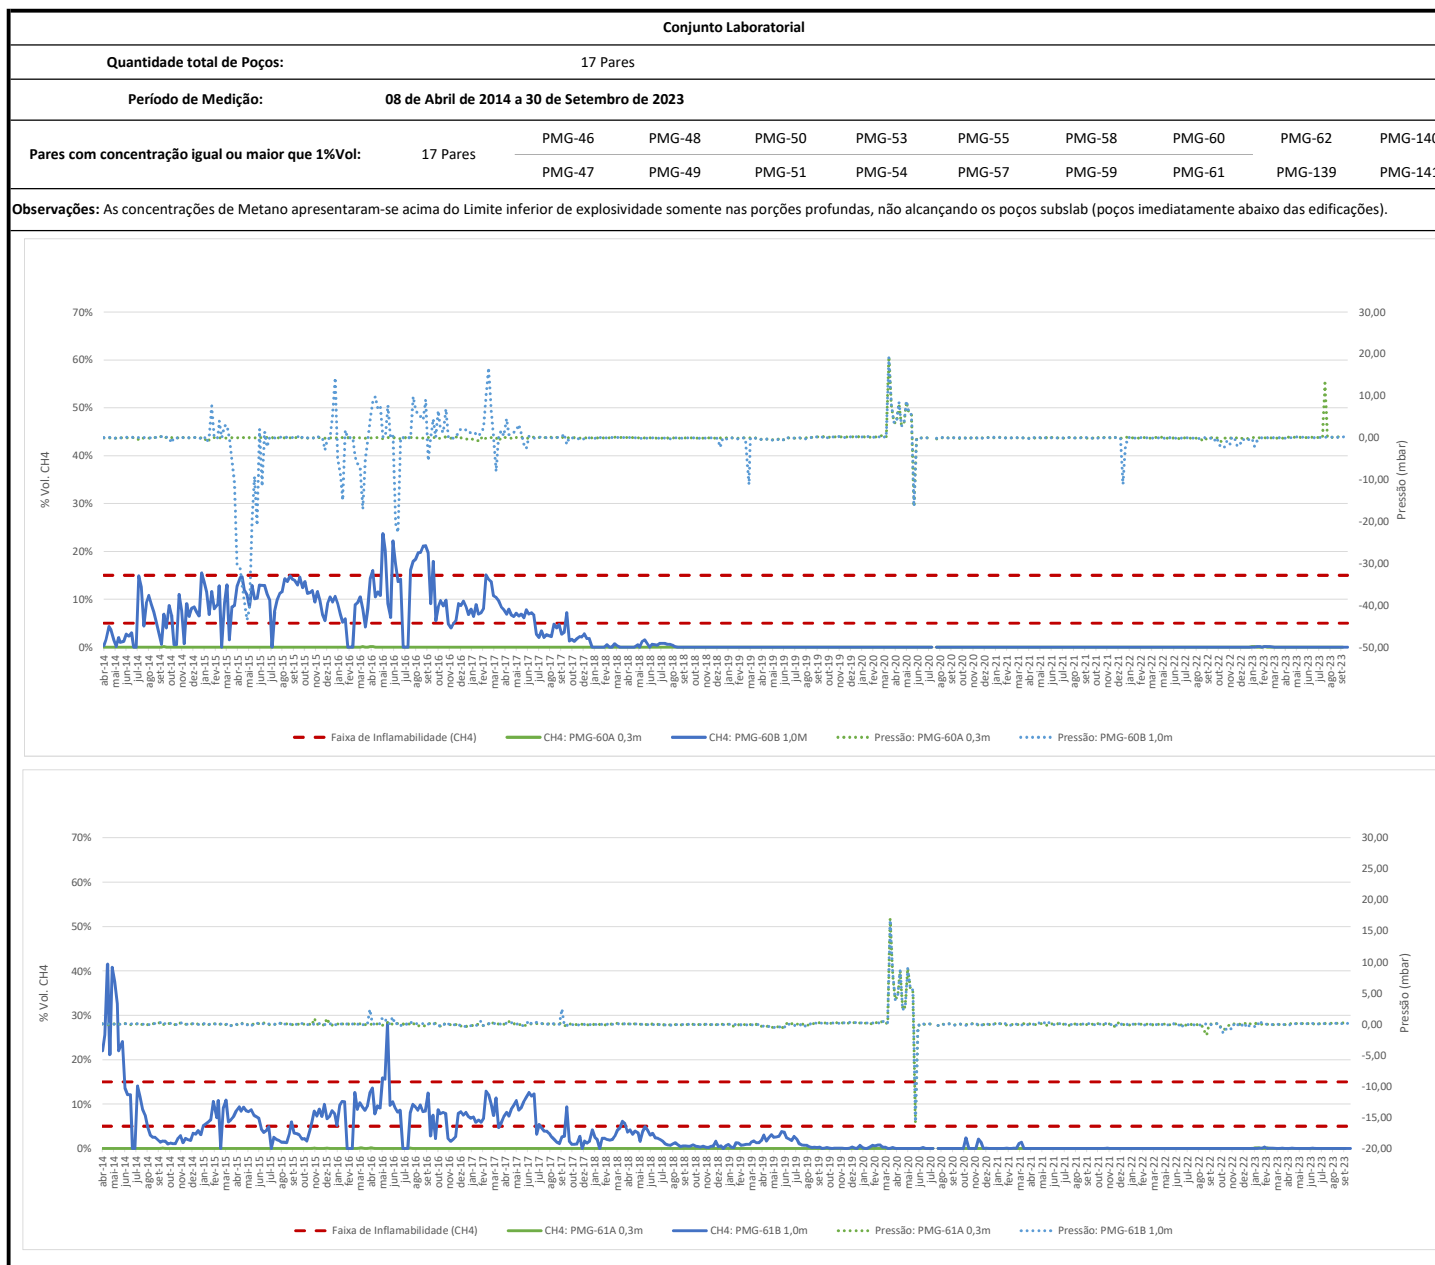


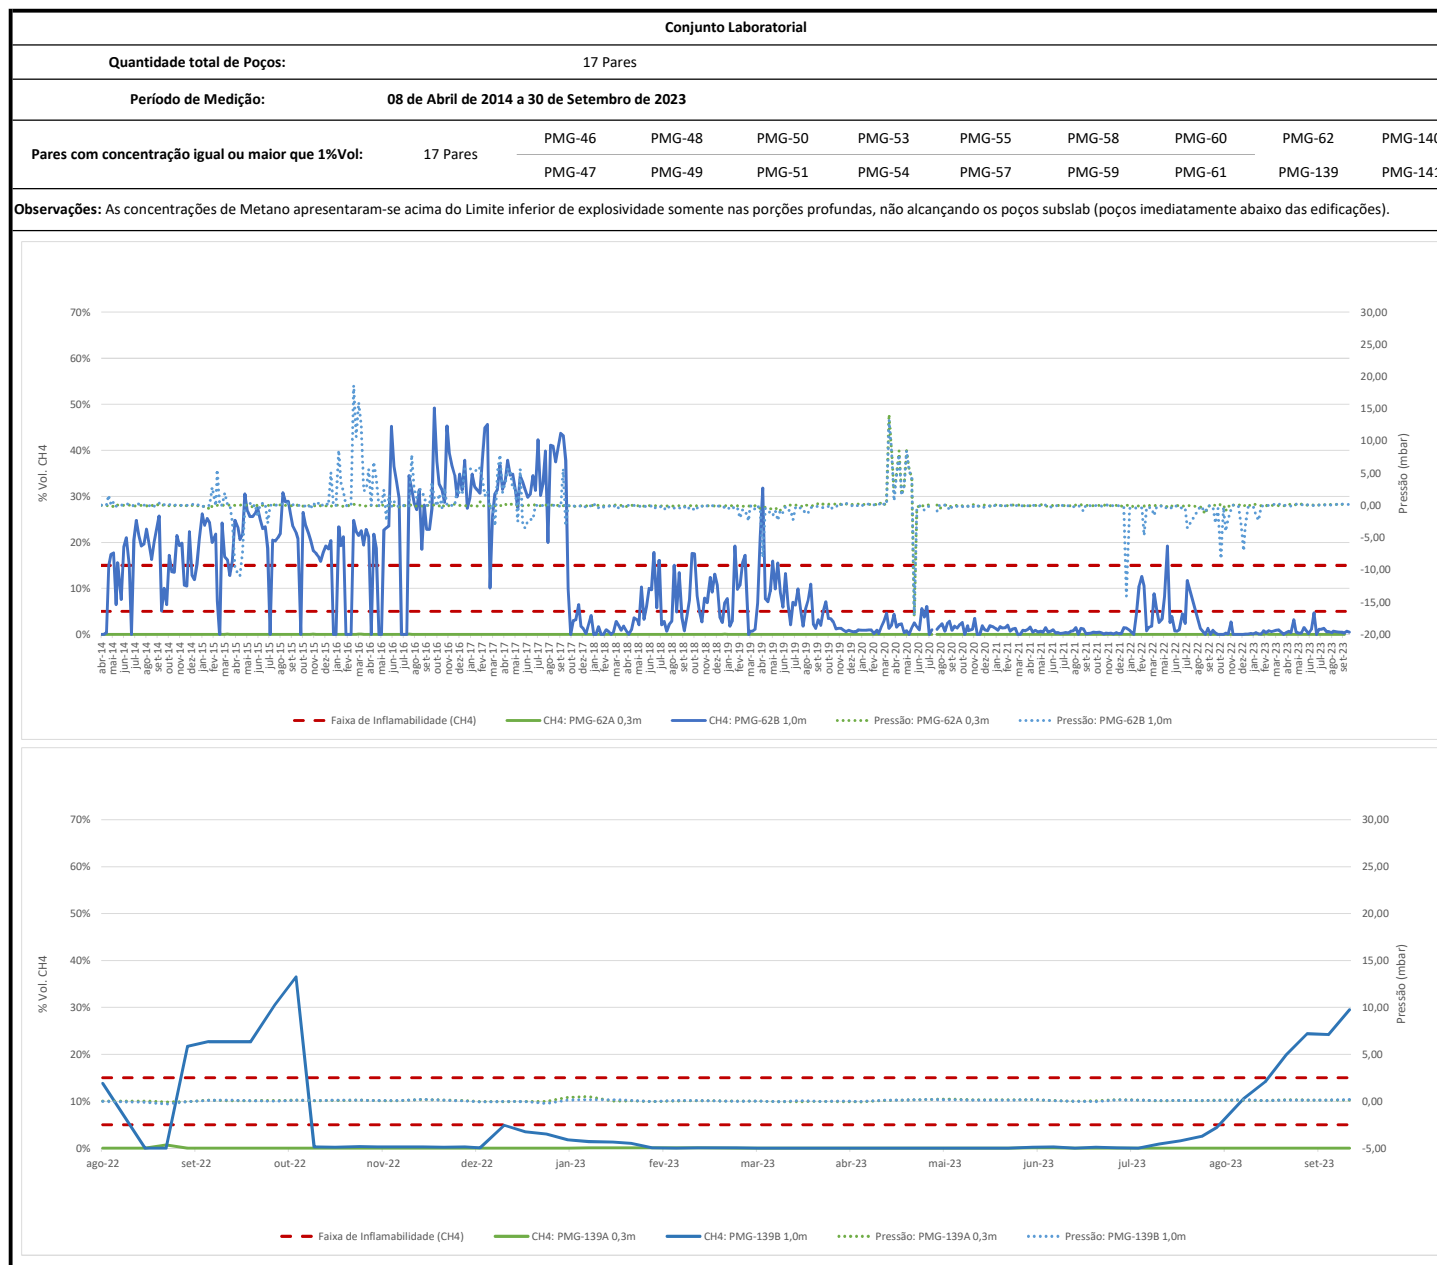


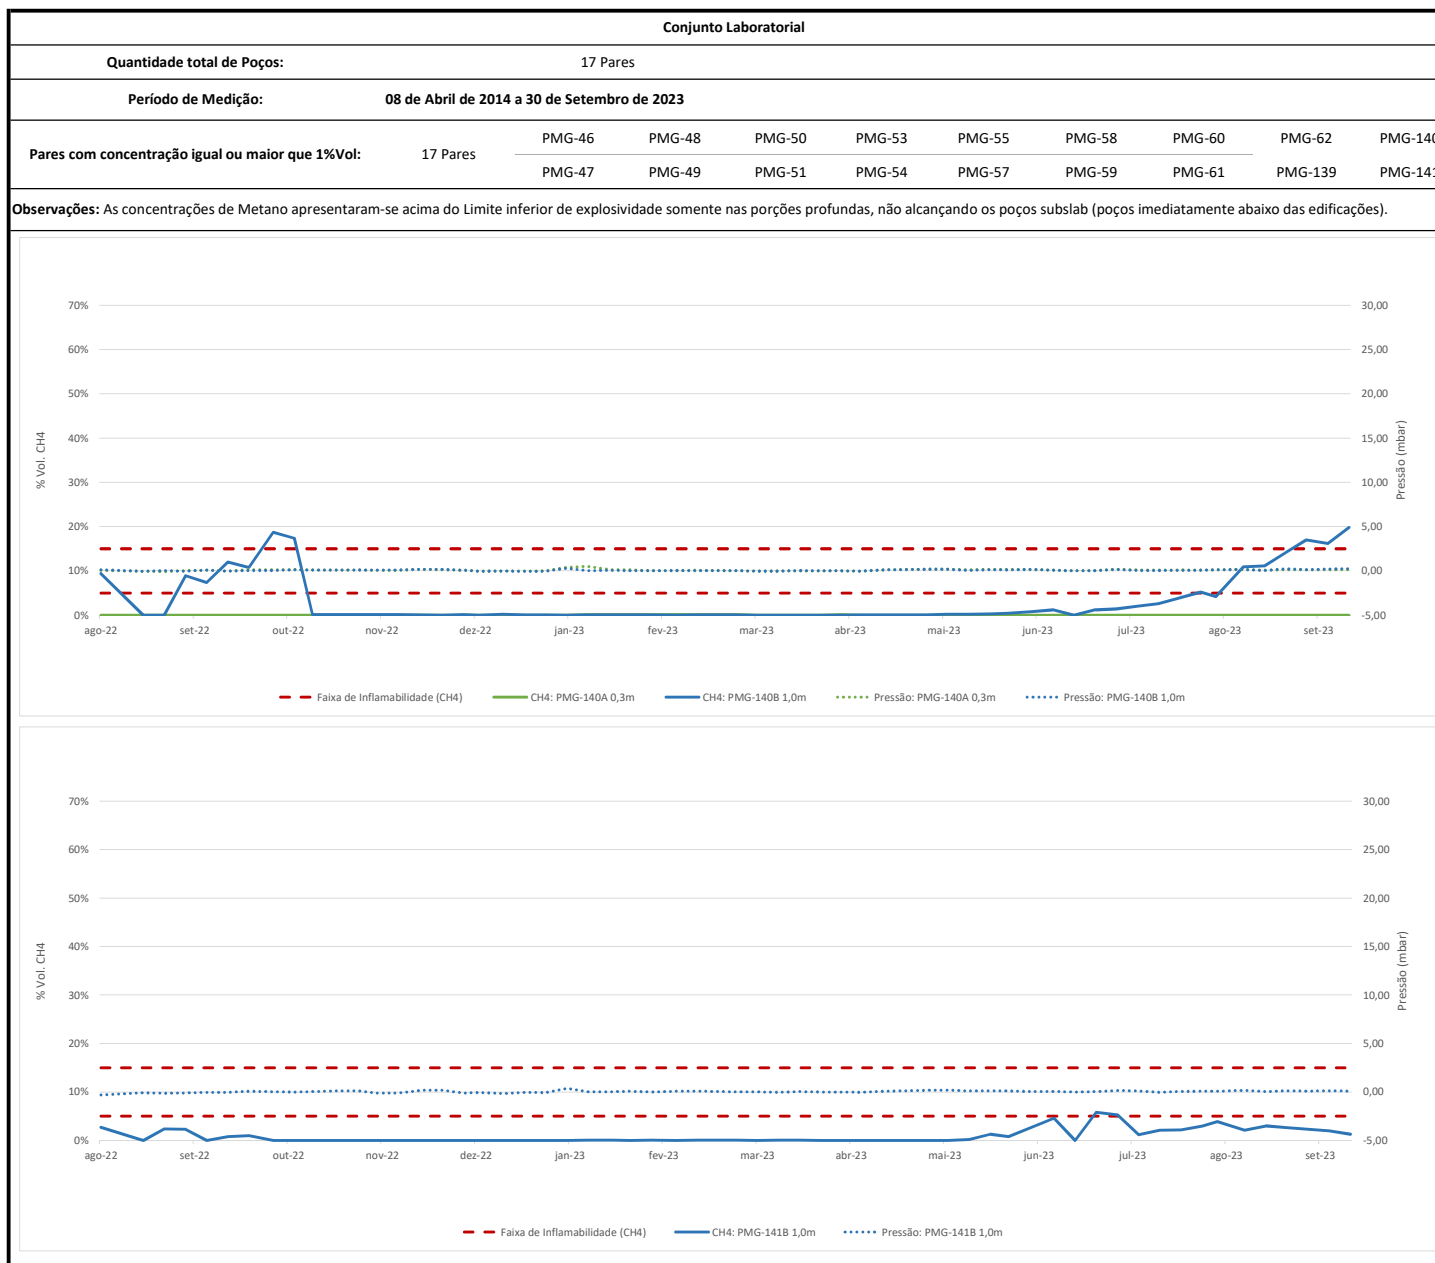


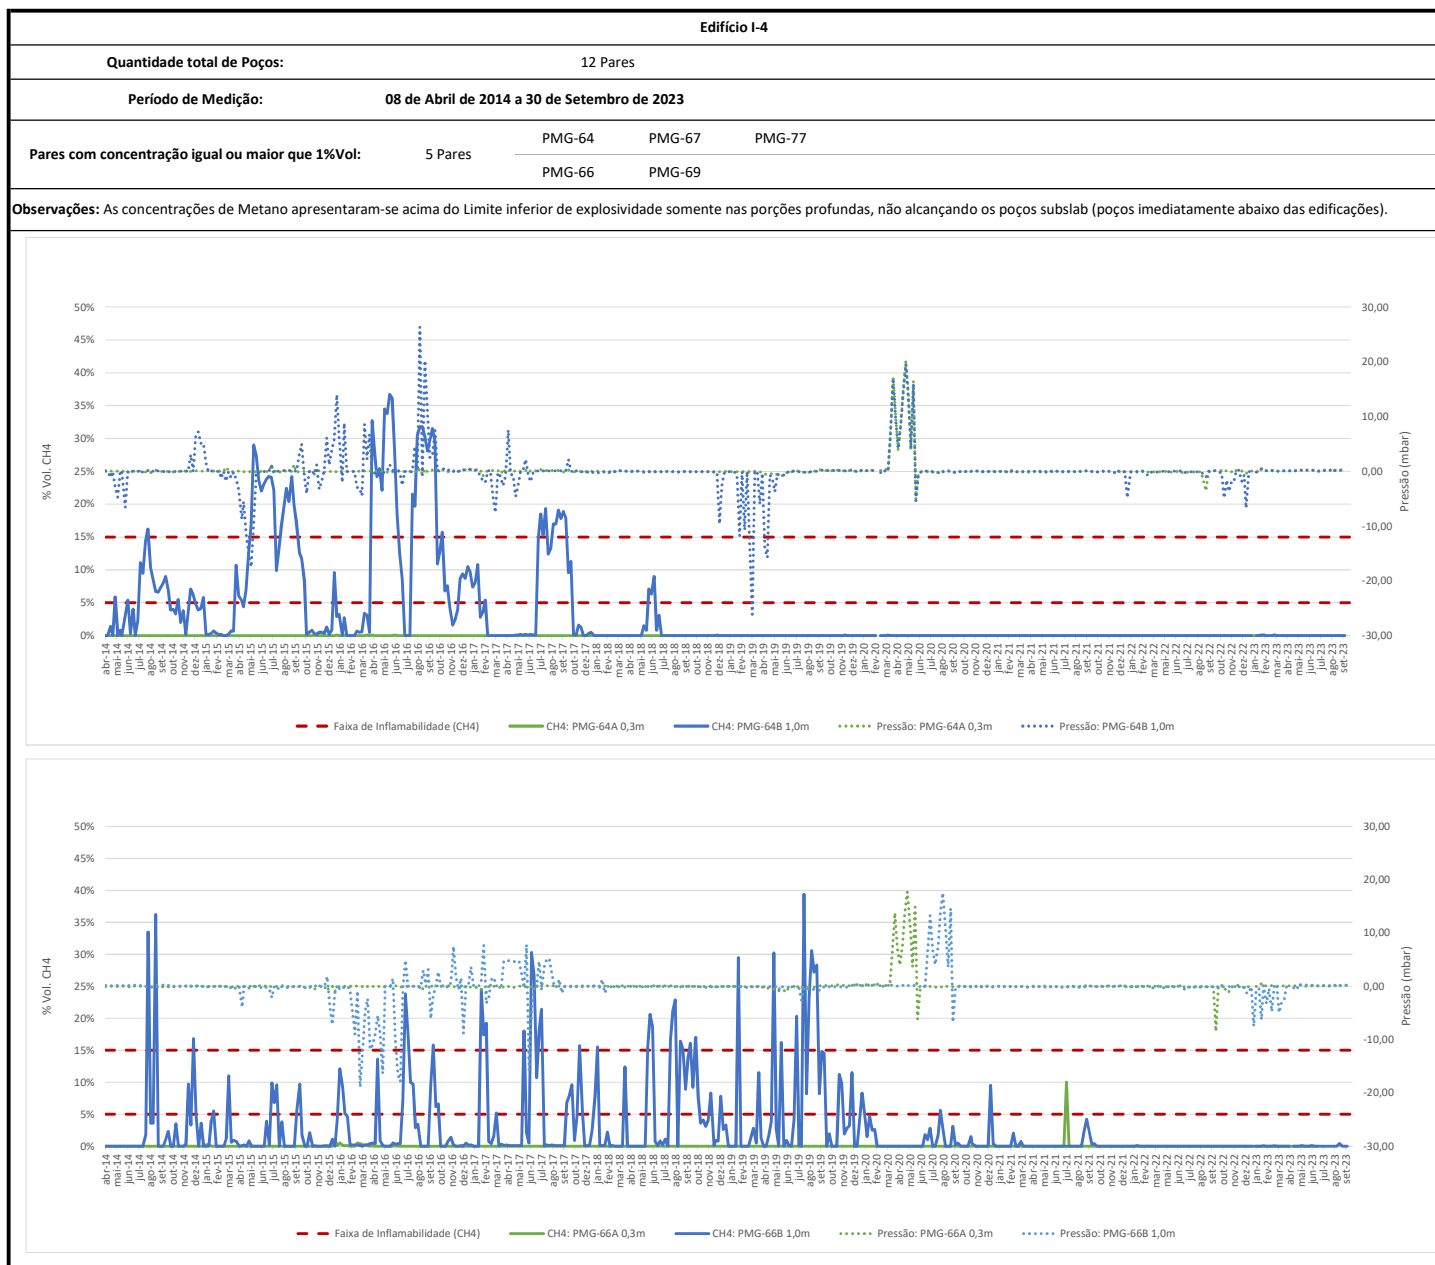



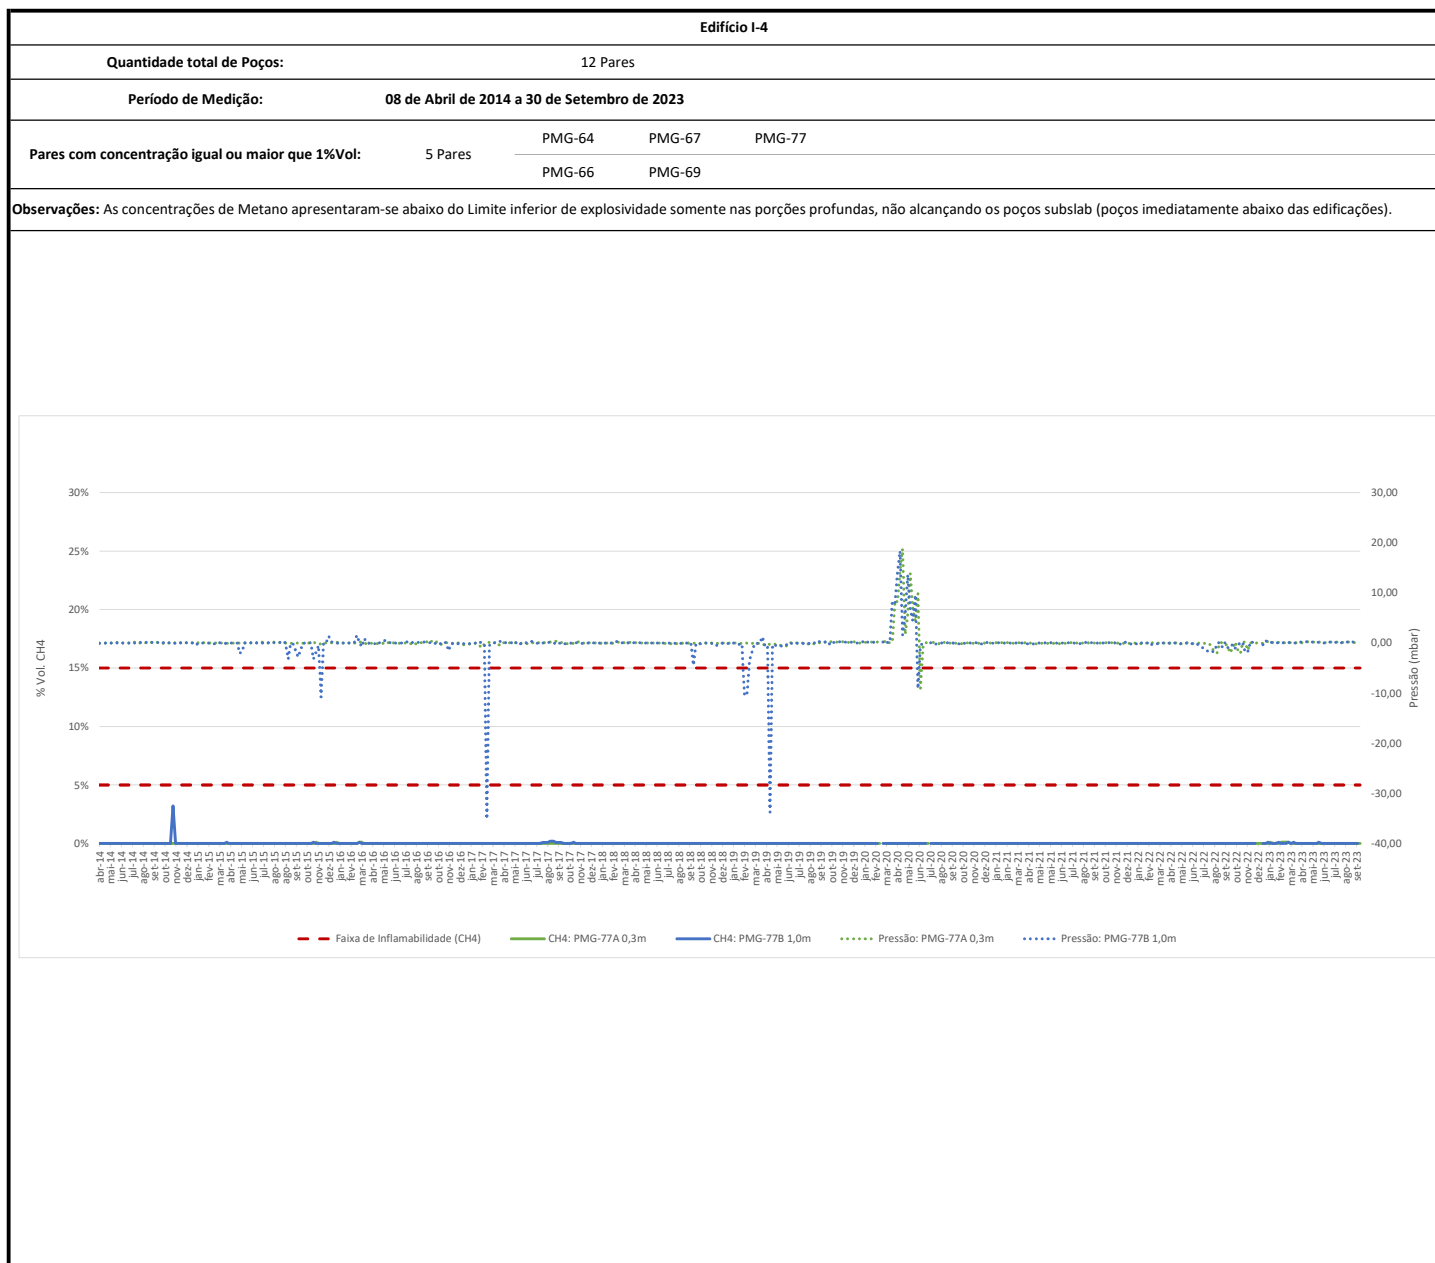

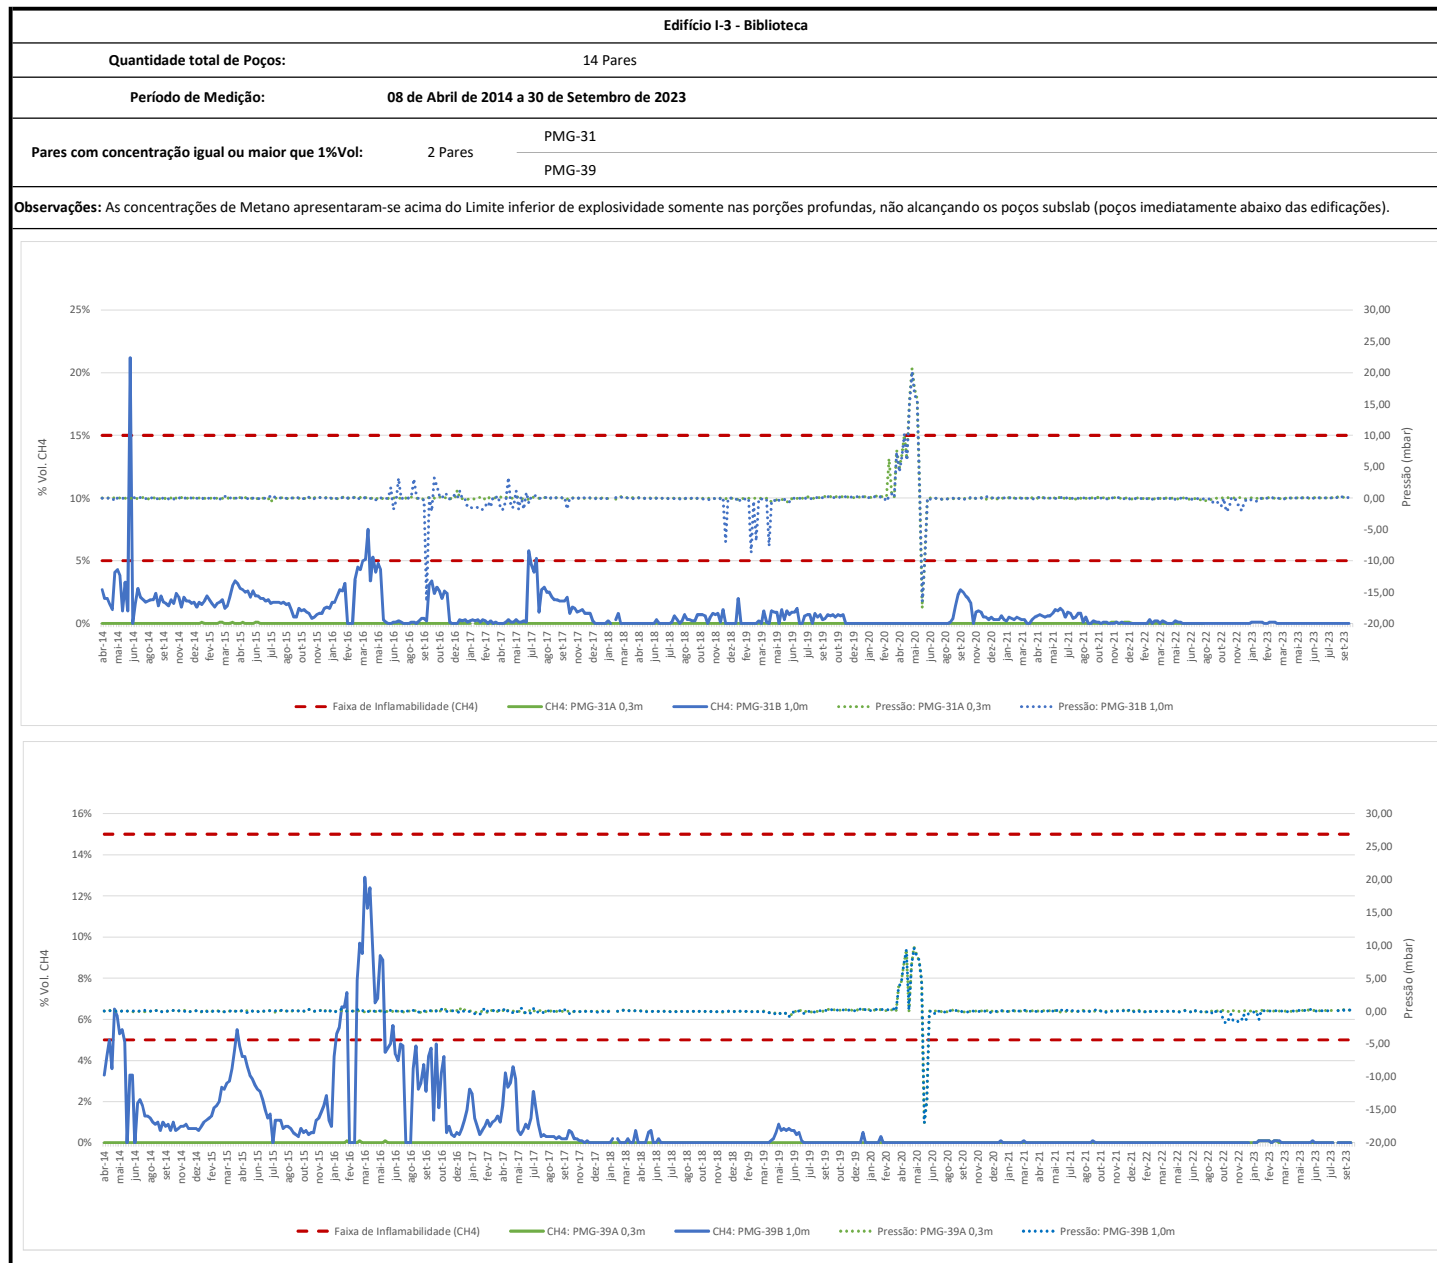

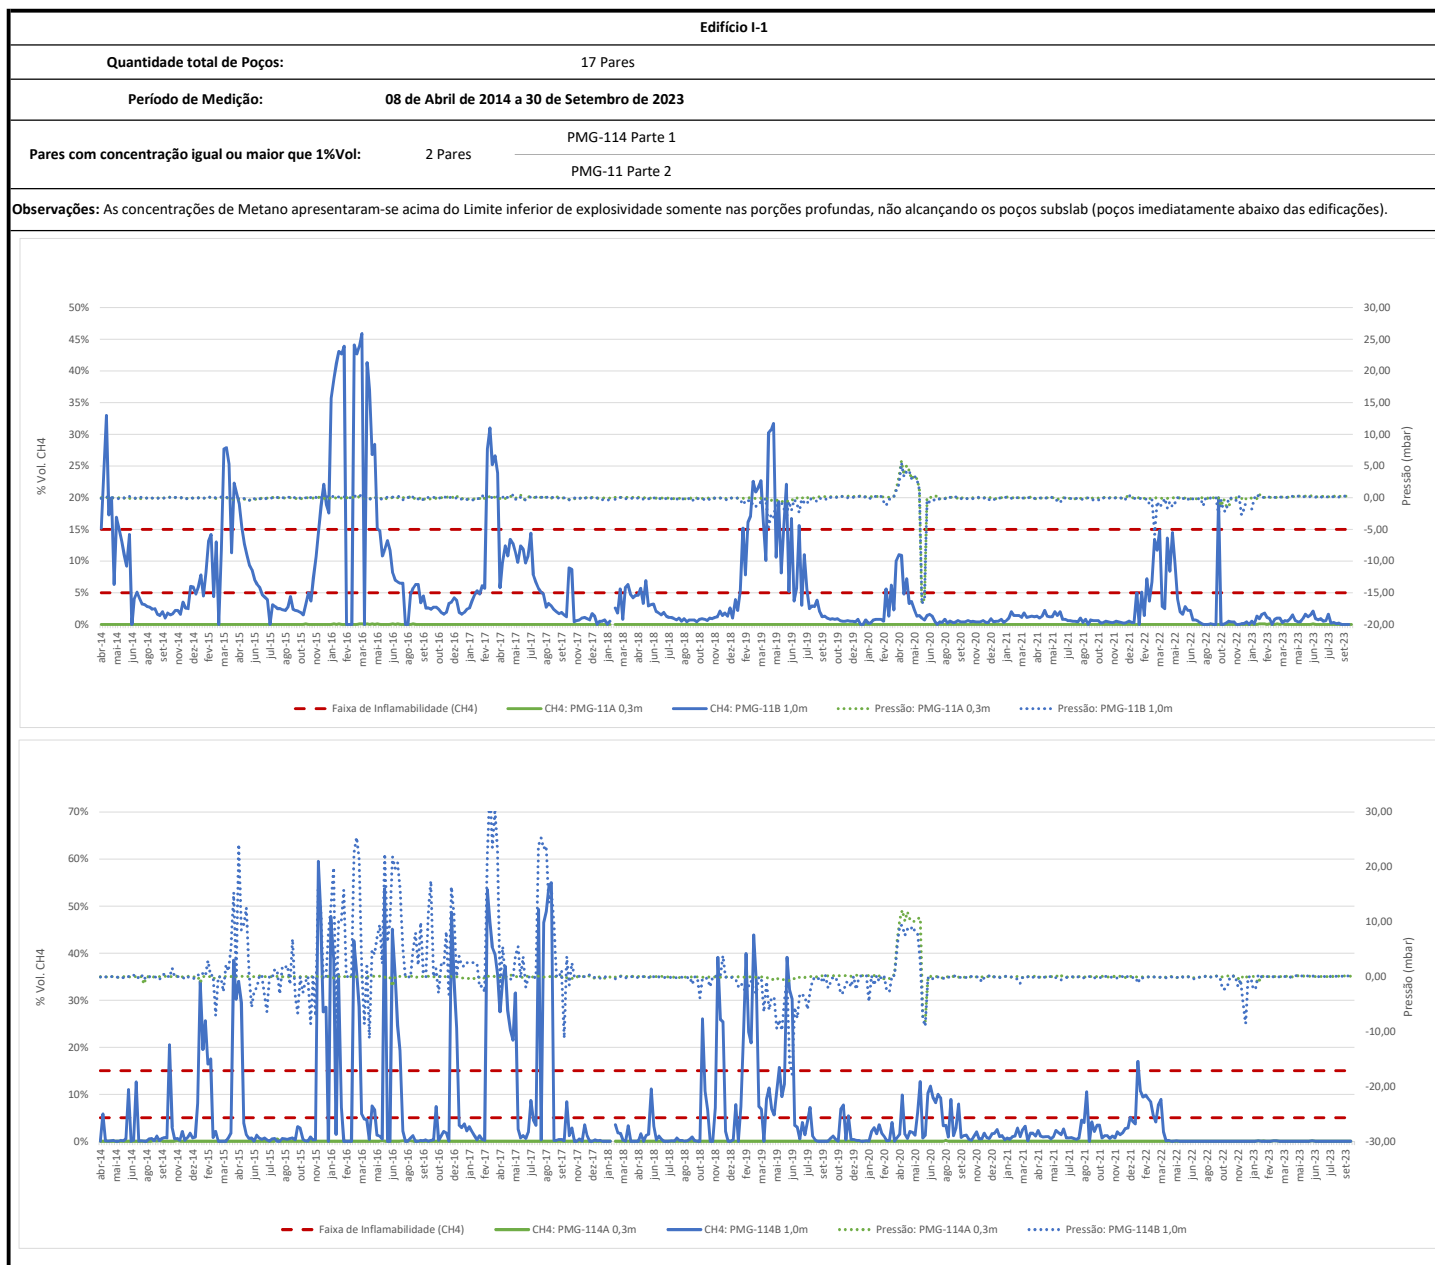

ANEXO 6

TABELA DE MEDIÇÕES SEMANAIS NOS EXAUSTORES

SISTEMA DE VENTILAÇÃO DE GASES								
Identificação do Exaustor	Semana	Operação	Vácuo da célula (mmHg)		PiD (mBar)	%LEL (5%Vol.)	Pressão (mBar)	Observação
Exaustor I1	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,65	
Exaustor I1 (2)	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,96	
Exaustor I5 Auditório	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,22	
Exaustor Biblioteca	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,09	
Exaustor Portaria 3	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,38	
Exaustor Ginásio	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,72	
Exaustor Enfermaria	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,73	
Exaustor CAT1	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,27	
Exaustor CAT2	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,28	
Exaustor Transportes	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,11	
Exaustor MI (B1)	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,82	
Exaustor MI (B2)	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,81	
Exaustor MI (B3)	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,52	
Exaustor Auditório 1	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,66	
Exaustor Auditório 2	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,26	
Exaustor Cantina	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,35	
Exaustor Corredor	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,49	
Exaustor Conj. Lab (A1)	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,49	
Exaustor Conj. Lab (A2)	07/07/2023	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,20	
Exaustor Conj. Lab (A3)	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,34	
Exaustor I4	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,86	
Exaustor Guarda	07/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,67	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,20	
Exaustor I1 (2)	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,25	
Exaustor I5 Auditório	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,11	
Exaustor Biblioteca	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,94	
Exaustor Portaria 3	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,17	
Exaustor Ginásio	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,68	
Exaustor Enfermaria	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,66	
Exaustor CAT1	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,44	
Exaustor CAT2	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,63	
Exaustor Transportes	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,28	
Exaustor MI (B1)	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,61	
Exaustor MI (B2)	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,54	
Exaustor MI (B3)	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,15	
Exaustor Auditório 1	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,91	
Exaustor Auditório 2	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,11	
Exaustor Cantina	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,49	
Exaustor Corredor	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,45	
Exaustor Conj. Lab (A1)	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,85	
Exaustor Conj. Lab (A2)	14/07/2023	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,07	
Exaustor Conj. Lab (A3)	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,09	
Exaustor I4	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,93	
Exaustor Guarda	14/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,38	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,18	
Exaustor I1 (2)	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,36	
Exaustor I5 Auditório	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,98	
Exaustor Biblioteca	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,99	
Exaustor Portaria 3	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,72	
Exaustor Ginásio	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,67	
Exaustor Enfermaria	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,94	
Exaustor CAT1	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,69	
Exaustor CAT2	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,80	
Exaustor Transportes	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,06	
Exaustor MI (B1)	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,65	
Exaustor MI (B2)	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,28	
Exaustor MI (B3)	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,44	
Exaustor Auditório 1	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,43	
Exaustor Auditório 2	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,44	
Exaustor Cantina	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,12	
Exaustor Corredor	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,70	
Exaustor Conj. Lab (A1)	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,83	
Exaustor Conj. Lab (A2)	21/07/2023	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,43	
Exaustor Conj. Lab (A3)	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,42	
Exaustor I4	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,28	
Exaustor Guarda	21/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,97	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,17	
Exaustor I1 (2)	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,51	
Exaustor I5 Auditório	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,69	
Exaustor Biblioteca	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,73	
Exaustor Portaria 3	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,83	
Exaustor Ginásio	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,67	
Exaustor Enfermaria	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,21	
Exaustor CAT1	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,32	
Exaustor CAT2	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,18	
Exaustor Transportes	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,66	
Exaustor MI (B1)	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,71	
Exaustor MI (B2)	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,17	
Exaustor MI (B3)	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,58	
Exaustor Auditório 1	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,61	
Exaustor Auditório 2	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,28	
Exaustor Cantina	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,35	
Exaustor Corredor	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,58	
Exaustor Conj. Lab (A1)	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,50	
Exaustor Conj. Lab (A2)	28/07/2023	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-4,53	
Exaustor Conj. Lab (A3)	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,80	
Exaustor I4	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,32	
Exaustor Guarda	28/07/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,40	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,10	
Exaustor I1 (2)	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,53	
Exaustor I5 Auditório	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,01	
Exaustor Biblioteca	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,94	
Exaustor Portaria 3	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,25	
Exaustor Ginásio	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,23	
Exaustor Enfermaria	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,12	
Exaustor CAT1	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,49	
Exaustor CAT2	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,44	
Exaustor Transportes	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,14	
Exaustor MI (B1)	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,65	
Exaustor MI (B2)	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,35	
Exaustor MI (B3)	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,43	
Exaustor Auditório 1	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,93	
Exaustor Auditório 2	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,62	
Exaustor Cantina	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,45	
Exaustor Corredor	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,16	
Exaustor Conj. Lab (A1)	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,49	
Exaustor Conj. Lab (A2)	04/08/2023	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,04	
Exaustor Conj. Lab (A3)	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,20	
Exaustor I4	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,52	
Exaustor Guarda	04/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,75	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								

Identificação do Exaustor	Semana	Operação	Vácuo da célula		PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	Pressão (mBar)	Observação
			(mmHg)	(mBar)				
Exaustor I1	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,14	
Exaustor I1 (2)	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,34	
Exaustor IS Auditório	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,71	
Exaustor Biblioteca	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,93	
Exaustor Portaria 3	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,77	
Exaustor Ginásio	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,50	
Exaustor Enfermaria	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,74	
Exaustor CAT1	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,60	
Exaustor CAT2	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,46	
Exaustor Transportes	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,22	
Exaustor MI (B1)	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,39	
Exaustor MI (B2)	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,06	
Exaustor MI (B3)	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,19	
Exaustor Auditório 1	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,97	
Exaustor Auditório 2	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,41	
Exaustor Cantina	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,12	
Exaustor Corredor	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,65	
Exaustor Conj. Lab (A1)	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,08	
Exaustor Conj. Lab (A2)	11/08/2023	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-4,78	
Exaustor Conj. Lab (A3)	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,94	
Exaustor I4	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,32	
Exaustor Guarda	11/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,28	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,10	
Exaustor I1 (2)	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,05	
Exaustor IS Auditório	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,99	
Exaustor Biblioteca	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,94	
Exaustor Portaria 3	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,26	
Exaustor Ginásio	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,43	
Exaustor Enfermaria	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,59	
Exaustor CAT1	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,70	
Exaustor CAT2	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,67	
Exaustor Transportes	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,98	
Exaustor MI (B1)	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,81	
Exaustor MI (B2)	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,28	
Exaustor MI (B3)	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,39	
Exaustor Auditório 1	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,10	
Exaustor Auditório 2	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,61	
Exaustor Cantina	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,81	
Exaustor Corredor	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,33	
Exaustor Conj. Lab (A1)	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,83	
Exaustor Conj. Lab (A2)	18/08/2023	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-4,77	
Exaustor Conj. Lab (A3)	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,05	
Exaustor I4	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,95	
Exaustor Guarda	18/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,63	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,06	
Exaustor I1 (2)	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,83	
Exaustor IS Auditório	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,75	
Exaustor Biblioteca	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,55	
Exaustor Portaria 3	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,55	
Exaustor Ginásio	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,35	
Exaustor Enfermaria	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,98	
Exaustor CAT1	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,87	
Exaustor CAT2	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,80	
Exaustor Transportes	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,79	
Exaustor MI (B1)	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,97	
Exaustor MI (B2)	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,46	
Exaustor MI (B3)	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,43	
Exaustor Auditório 1	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,50	
Exaustor Auditório 2	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,32	
Exaustor Cantina	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,42	
Exaustor Corredor	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,40	
Exaustor Conj. Lab (A1)	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,63	
Exaustor Conj. Lab (A2)	25/08/2023	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-4,49	
Exaustor Conj. Lab (A3)	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,93	
Exaustor I4	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,25	
Exaustor Guarda	25/08/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,10	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,29	
Exaustor I1 (2)	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,24	
Exaustor IS Auditório	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,74	
Exaustor Biblioteca	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,00	
Exaustor Portaria 3	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,18	
Exaustor Ginásio	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,82	
Exaustor Enfermaria	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,29	
Exaustor CAT1	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,05	
Exaustor CAT2	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,85	
Exaustor Transportes	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,13	
Exaustor MI (B1)	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,02	
Exaustor MI (B2)	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,08	
Exaustor MI (B3)	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,26	
Exaustor Auditório 1	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,54	
Exaustor Auditório 2	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,31	
Exaustor Cantina	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,56	
Exaustor Corredor	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,40	
Exaustor Conj. Lab (A1)	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,10	
Exaustor Conj. Lab (A2)	01/09/2023	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,21	
Exaustor Conj. Lab (A3)	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,55	
Exaustor I4	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,32	
Exaustor Guarda	01/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,12	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,84	
Exaustor I1 (2)	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,36	
Exaustor IS Auditório	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,59	
Exaustor Biblioteca	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,88	
Exaustor Portaria 3	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,67	
Exaustor Ginásio	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,49	
Exaustor Enfermaria	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,79	
Exaustor CAT1	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,51	
Exaustor CAT2	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,68	
Exaustor Transportes	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,96	
Exaustor MI (B1)	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,91	
Exaustor MI (B2)	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,02	
Exaustor MI (B3)	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,25	
Exaustor Auditório 1	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,14	
Exaustor Auditório 2	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,42	
Exaustor Cantina	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,86	
Exaustor Corredor	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,07	
Exaustor Conj. Lab (A1)	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,02	
Exaustor Conj. Lab (A2)	04/09/2023	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-4,49	
Exaustor Conj. Lab (A3)	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,63	
Exaustor I4	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,80	
Exaustor Guarda	04/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,44	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								

Identificação do Exaustor	Semana	Operação	Vácuo da célula (mmHg)	(mBar)	PID (ppm)	%LEL (5%Vol.)	Pressão (mBar)	Observação
Exaustor I1	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,24	
Exaustor I1 (2)	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,30	
Exaustor I5 Auditório	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,64	
Exaustor Biblioteca	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,86	
Exaustor Portaria 3	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,18	
Exaustor Ginásio	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,47	
Exaustor Enfermaria	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,25	
Exaustor CAT1	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,51	
Exaustor CAT2	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,51	
Exaustor Transportes	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,26	
Exaustor MI (B1)	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,84	
Exaustor MI (B2)	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,56	
Exaustor MI (B3)	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,07	
Exaustor Auditório 1	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,39	
Exaustor Auditório 2	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,33	
Exaustor Cantina	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,77	
Exaustor Corredor	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,17	
Exaustor Conj. Lab (A1)	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,23	
Exaustor Conj. Lab (A2)	15/09/2023	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,26	
Exaustor Conj. Lab (A3)	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,32	
Exaustor I4	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,42	
Exaustor Guarda	15/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,29	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,73	
Exaustor I1 (2)	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,35	
Exaustor I5 Auditório	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,64	
Exaustor Biblioteca	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,87	
Exaustor Portaria 3	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,54	
Exaustor Ginásio	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,28	
Exaustor Enfermaria	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,89	
Exaustor CAT1	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,62	
Exaustor CAT2	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,01	
Exaustor Transportes	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,67	
Exaustor MI (B1)	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,23	
Exaustor MI (B2)	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,92	
Exaustor MI (B3)	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,98	
Exaustor Auditório 1	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,70	
Exaustor Auditório 2	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,32	
Exaustor Cantina	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,97	
Exaustor Corredor	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,33	
Exaustor Conj. Lab (A1)	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,85	
Exaustor Conj. Lab (A2)	22/09/2023	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-4,72	
Exaustor Conj. Lab (A3)	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,97	
Exaustor I4	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,82	
Exaustor Guarda	22/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,00	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,13	
Exaustor I1 (2)	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,51	
Exaustor I5 Auditório	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,06	
Exaustor Biblioteca	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,19	
Exaustor Portaria 3	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,02	
Exaustor Ginásio	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,23	
Exaustor Enfermaria	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,83	
Exaustor CAT1	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,28	
Exaustor CAT2	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,85	
Exaustor Transportes	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,78	
Exaustor MI (B1)	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,53	
Exaustor MI (B2)	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,24	
Exaustor MI (B3)	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,43	
Exaustor Auditório 1	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,78	
Exaustor Auditório 2	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,34	
Exaustor Cantina	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,38	
Exaustor Corredor	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,87	
Exaustor Conj. Lab (A1)	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,31	
Exaustor Conj. Lab (A2)	29/09/2023	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,09	
Exaustor Conj. Lab (A3)	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,60	
Exaustor I4	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,38	
Exaustor Guarda	29/09/2023	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,31	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								

ANEXO 7

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

_____, cujo CPF _____, em conjunto com Felipe Martins Chufi, cujo CPF 326.774.078-92, declaram, sob as penas da lei e de responsabilização administrativa, civil e penal, que todas as informações prestadas à CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no Relatório Técnico “Monitoramento de Intrusão de Gases em Ambientes Fechados – USP Leste – Relatório de Evolução 3º Trimestre/2023”, realizado na AI-1 da USP Leste, localizada na Rua Arlindo Béttio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP, de junho de 2023, são verdadeiras e contemplam integralmente as exigências estabelecidas pela CETESB e se encontram em consonância com o que determinam o regulamento da Lei nº 13.577/2009, aprovado pelo Decreto nº 59.263/2013, e os Procedimentos para Proteção da Qualidade do Solo e Gerenciamento de Áreas Contaminadas aprovado em Decisão de Diretoria da CETESB, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 10/02/2017.

Declaram, ainda estar cientes de que os documentos e laudos que subsidiam as informações prestadas à CETESB poderão ser requisitados a qualquer momento, durante ou após a implementação do procedimento previsto no documento Procedimentos para Proteção da Qualidade do Solo e Gerenciamento de Áreas Contaminadas, para fins de auditoria.

São Paulo, 20 de outubro de 2023.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – CAMPUS LESTE

CNPJ: 63.025.530/0062-26

Nome do Responsável Legal:

RG:

CPF:



ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA

CNPJ 23.559.934/0001-63

Nome do Responsável Técnico: Felipe Martins Chufi

RG: 29.447.243-5

CPF: 326.774.078-92

1 O artigo 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece: “Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.

§ 2º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa”.

ANEXO 8

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230221208991

1. Responsável Técnico

FELIPE MARTINS CHUFI

Título Profissional: Engenheiro Ambiental

RNP: 2608845975

Registro: 5063256720-SP

Empresa Contratada: ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA

Registro: 2031192-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CPF/CNPJ: 63.025.530/0114-91

Endereço: Rua ARLINDO BETTIO

Nº: 1000

Complemento: Saída do km 17,5 da Rodovia Ayrton Senna

Bairro: VILA GUARACIABA

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 03828-000

Contrato: 0000001/2022 - PUSP-CL

Celebrado em: 01/08/2022

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ 144.000,00

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua ARLINDO BETTIO

Nº: 1000

Complemento: Saída do km 17,5 da Rodovia Ayrton Senna

Bairro: VILA GUARACIABA

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 03828-000

Data de Início: 03/08/2022

Previsão de Término: 02/08/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Ambiental

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Execução

1

Quantidade

Unidade

Execução

Qualidade Ambiental

1,00000

ano

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

AVALIAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL: Operação, Manutenção e Monitoramento de Poços de Gás, Pontos na Estrutura e de Sistemas de Ventilação de Gases □ EACH - USP Leste

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Paulo 03 de Agosto de 2022

Local

data

Felipe Martins Chufi

FELIPE MARTINS CHUFI - CPF: 326.774.078-92

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CPF/CNPJ: 63.025.530/0114-91

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessarlink@creasp.org.br Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 233,94

Registrada em: 02/08/2022

Valor Pago R\$ 233,94

Nosso Número: 28027230221208991

Versão do sistema

Impresso em: 03/08/2022 04:42:58

