

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – ÁREA
CAPITAL LESTE (PUSP-LESTE)

EVOLUÇÃO DO MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES E
DA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

1º TRIMESTRE/2024 (JANEIRO A MARÇO)

RUA ARLINDO BÉTTIO, 1.000,
ERMELINO MATARAZZO, SÃO PAULO, SP

Contrato nº 0000001/2022 – PUSP – CL
Processo Administrativo: 22.1.18.95.7

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – ÁREA
CAPITAL LESTE (PUSP-LESTE)**

**EVOLUÇÃO DO MONITORAMENTO DE INTRUSÃO DE GASES E
DA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO**

1º TRIMESTRE/2024 (JANEIRO A MARÇO)

**RUA ARLINDO BÉTTIO, 1.000,
ERMELINO MATARAZZO, SÃO PAULO, SP**

São Paulo, 13 de maio de 2024

RESUMO EXECUTIVO

A ENGESOLVE Soluções Ambientais Ltda. foi contratada pela Prefeitura da Universidade de São Paulo – Área Capital Leste (PUSP-LESTE) para a operação, manutenção dos sistemas de ventilação de gases no solo, bem como o monitoramento de poços de gás e pontos na infraestrutura instalados em edificações da EACH na USP Leste, localizada na Rua Arlindo Béttio, 1.000 – Ermelino Matarazzo, São Paulo/SP, conforme o Processo Administrativo 22.1.18.95.7, Pregão Eletrônico nº 00002/2022 – PUSP – CL e Contrato nº 0000001/2022 – PUSP – CL.

O objetivo da operação dos sistemas de ventilação é impedir o acúmulo de gases sob a laje dos edifícios, aliado ao monitoramento preventivo de intrusão de gases nos ambientes por meio da execução de medições de gases em todos os poços de monitoramentos, pontos de infraestrutura e espaços com pouca circulação de ar.

Com base nos resultados obtidos no 1º trimestre de 2024, foram detectadas concentrações significativas de Metano (acima de 1%Vol CH₄) na porção profunda em 5 dos 289 poços de gases monitorados. Nos demais poços profundos, não foram detectadas concentrações significativas. Para os poços nas porções rasas, não foram detectadas concentrações de metano acima de 1% VolCH₄.

Os resultados obtidos nas medições realizadas nos pontos de infraestrutura ao longo do trimestre avaliado (ralos e caixa de passagem) em todas as edificações, bem como em ambientes com pouca circulação de ar, não detectaram concentrações de Metano e nem de VOC. Os sistemas de ventilação operaram 24 horas por dia, 30 dias por mês, durante todo o período do trimestre. Estes demonstraram-se eficientes, não permitindo que os gases existentes no solo se acumulassem no tapete de brita ou diretamente sob a laje (poços a 0,30 m), bem como diminuindo eventualmente até mesmo as concentrações no solo abaixo do tapete de brita (poços a 1,00 m), por influência da ventilação.

Sendo assim, diante dos resultados obtidos a partir do monitoramento do 1º trimestre de 2024, e considerando a série histórica de monitoramento ao longo dos 10 anos (abril/2014 a março/2024), verifica-se que não há a intrusão e/ou acúmulo de gases nos ambientes fechados, uma vez que as concentrações de Metano existentes no solo, mesmo com a presença de pressão positiva, não alcançam o tapete de brita (sob a laje) ou, quando alcançam esporadicamente, são arrastadas pelo sistema de ventilação.

Portanto, recomenda-se a continuidade da operação dos sistemas de exaustão, bem como a realização dos monitoramentos semanais e quinzenais nos poços de monitoramento e nos pontos de infraestrutura, respectivamente.

EQUIPE TÉCNICA

Integrante	Função	Formação	Tempo de Experiência
Daniel Barel Filho	Operacional	Geólogo	Maior que 25 anos
Felipe Martins Chufi	Operacional	Engenheiro Ambiental	Maior que 15 anos
Gilson Rodrigues Figueirôa	Operacional	Químico	Maior que 15 anos
Letícia Francischeti	Operacional	Engenheira Civil	Maior que 5 anos
Amanda Cristina Garcia	Operacional	Engenheiro Ambiental	Maior que 5 anos
André Sammartano	Operacional	Engenheiro Ambiental	Maior que 5 anos

INFORMAÇÕES INICIAIS

Responsável legal

Nome:

RG:

CPF:

Endereço:

Telefone:

Responsável Técnico

Nome: Felipe Martins Chufi

RG: 29.447.243-5

CPF: 326.774.078-92

Endereço: Avenida Paulista, 2.064, 14º Andar, CEP: 01310-928, Bela Vista, São Paulo, SP

Telefone: 11-2844-4386

Contratante

Prefeitura da Universidade de São Paulo – Área Capital Leste (PUSP-LESTE)

CNPJ: 63.025.530/0062-26

Endereço: Rua Arlindo Bértio, 1.000, CEP: 03828-000, Ermelino Matarazzo, São Paulo, SP

Informações do Contrato

Contrato: 00000001/2022 – PUSP - CL

Processo Administrativo: 22.1.00018.95.7

Pregão Eletrônico: 00002/2022 – PUSP - CL

Escopo: Operação, manutenção e monitoramento de poços de gás, pontos na estrutura e de sistemas de ventilação de gases – EACH – USP Leste.

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO E OBJETIVOS	9
2.	CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO	10
2.1.	LOCALIZAÇÃO DA ÁREA.....	10
2.2.	SOBRE A PRESENÇA DE GASES	10
2.3.	SOBRE O SISTEMA DE VENTILAÇÃO DOS GASES	10
3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO.....	12
3.1.	POÇOS DE MONITORAMENTO	12
3.2.	INFRAESTRUTURA	13
4.	METODOLOGIA DO MONITORAMENTO DE GASES.....	14
4.1.	SOBRE O BIOGÁS E O GÁS METANO	15
4.2.	PLANO DE AÇÃO	17
5.	RESUMO E TENDÊNCIA EM 10 ANOS DE OPERAÇÃO/MONITORAMENTO (ABRIL DE 2014-MARÇO DE 2024).....	18
6.	RESULTADOS OBTIDOS NO 4º TRIMESTRE	41
6.1.	RESULTADOS DO MONITORAMENTO EM POÇOS E NA INFRAESTRUTURA.....	41
6.2.	RESULTADOS OBTIDOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO.....	43
7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES.....	48
8.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	50

FIGURAS

- 2.1. Localização da Área de Interesse (adaptado de *Google Maps*, 2023)
- 2.3.1. Conceito do Sistema de Circulação de Gases USP Leste
- 3.1.1. Localização dos Poços de Monitoramento de Gás e Abrigos de Exaustores
- 3.2.1. Localização dos Pontos Monitoramento de Gases na Infraestrutura dos Edifícios
- 6.1.1. Resultado da Distribuição das Concentrações de Metano Detectadas >1%Vol
- 6.1.2. Pluma de Isoconcentração de Metano no Solo no Horizonte B (aproximadamente de 1,0 m – 1,3 m de profundidade) no período de Janeiro à Março de 2024

TABELAS

- 3.1.1. Distribuição dos Poços de Monitoramento dos Gases nas Edificações
- 3.2.1. Distribuição dos Pontos de Monitoramento de Infraestrutura nas Edificações
- 6.1.1. Resultados dos poços com concentração igual ou maior que 1%VolCH₄
- 6.2.1. Localização dos Exaustores dos Sistemas de Ventilação
- 6.2.2. Comparativo de Pressão de Sucção de Projeto x Medição no 1º Trimestre/2024

ANEXOS

1. Certificados de Calibração dos Equipamentos
2. Plano de Ação
3. Tabelas de Medições Semanais em PMG
4. Tabelas de Medições Quinzenais na Infraestrutura
5. Evolução das concentrações de Metano x Pressão (Abril/2014 a Março/2024)
6. Tabelas de Medições Semanais nos Exaustores
7. Declaração de Responsabilidade
8. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

A ENGESOLVE Soluções Ambientais Ltda. foi contratada pela Prefeitura da Universidade de São Paulo Área Capital Leste (PUSP-LESTE) para a operação, manutenção dos sistemas de ventilação de gases no solo, bem como o monitoramento de poços de gás e pontos na infraestrutura instalados em edificações da EACH na USP Leste, localizada na Rua Arlindo Bértio, 1.000 – Ermelino Matarazzo, São Paulo/SP.

A contratação dos serviços ocorreu por meio do Processo Administrativo 22.1.18.95.7, Pregão Eletrônico nº 00002/2022 – PUSP – CL e Contrato nº 0000001/2022 – PUSP – CL, que teve por objetivo prosseguir com o acompanhamento das atividades de operação, manutenção e monitoramento dos poços de gás, pontos na estrutura e de sistemas de ventilação de gases instalados.

Assim sendo, o presente relatório técnico possui como objetivo avaliar a evolução dos resultados de monitoramento de gases no subsolo e a operação do sistema de ventilação ao longo do primeiro trimestre de 2024 (janeiro a março de 2024), além de compará-los com os resultados obtidos desde o início dos trabalhos desenvolvidos na área (março/2014) para uma análise histórica.

Este monitoramento preventivo da intrusão de gases possibilita a elaboração de um diagnóstico contínuo para avaliação da situação da área e, caso necessário, indica ações subsequentes que garantam um uso seguro do local.

Para tanto, foi seguido o resumido escopo de atividades apresentado a seguir:

- Operação e manutenção dos 22 (vinte e dois) Sistemas de Ventilação;
- Monitoramento periódico dos sistemas e monitoramento de gases e explosividade em pontos de estrutura, poços de monitoramento e na entrada dos sistemas de ventilação;
- Compilação dos resultados das medições e tratamento dos dados;
- Elaboração de relatório técnico contendo a descrição dos trabalhos executados e a interpretação dos resultados obtidos, além das conclusões e recomendações pertinentes.

Os trabalhos de campo foram conduzidos em conformidade com as seguintes referências técnicas, além das demais normas e referências pertinentes:

- ABNT NBR 16.209, de setembro de 2013 – Avaliação de risco a saúde humana para fins de gerenciamento de áreas contaminadas;
- CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 2017 – Decisão de Diretoria Nº 038/2017, de 07 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a aprovação do “Procedimento para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas”.

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

2.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

A área objeto de estudo pertence à Universidade de São Paulo Campus Área Capital Leste (PUSP-LESTE) e está inserida no município de São Paulo, Subprefeitura Penha, no bairro Ermelino Matarazzo, registrada na Rua Arlindo Bértio, 1.000 (Portaria P2). As coordenadas em UTM Sirgas 2000 do centro da área de estudo são zona 23K, 7402266.51 m S e 346771.93 m E.

O local de estudo (USP Leste) possui aproximadamente 220.000 m² e conta com três portarias principais, a P1 situada na Rodovia Parque (na margem da Rodovia Ayrton Senna), a P2 situada na Rua Arlindo Bértio e a P3 com acesso pela Estação da CPTM USP Leste. A **Figura 2.1.** apresenta a localização da área de interesse.

2.2. SOBRE A PRESENÇA DE GASES

Estudos anteriores realizados no local comprovaram que a ocorrência de gás Metano identificada na Gleba I da USP Leste é proveniente da matéria orgânica advinda das camadas de origem antrópica oriundas da dragagem do Rio Tietê e também das camadas naturais pertencentes aos depósitos aluviais quaternários associados ao Rio Tietê.


O monitoramento dos poços de gás com medições realizado em campo indica que o composto de interesse predominante na atmosfera gasosa dos poros do solo na área de estudo é o gás Metano.

Pela ocorrência destes gases, foi projetado e instalado um sistema de ventilação com objetivo de impedir a intrusão de gases dos edifícios presentes no local.


2.3. SOBRE O SISTEMA DE VENTILAÇÃO DOS GASES

Na área de estudo há um sistema de ventilação (circulação de ar) composto por tapetes de brita inseridos logo abaixo da laje dos prédios, que permite a circulação dos gases, os quais são extraídos por meio de compressores ou exaustores.

O processo de circulação funciona da seguinte maneira: os eventuais gases formados a partir da matéria orgânica são drenados pelo tapete de brita instalado sob a laje das edificações e então arrastados em um fluxo contínuo de ar limpo promovido por um exaustor para ventilação forçada, conduzidos a um sistema de dispersão na atmosfera.

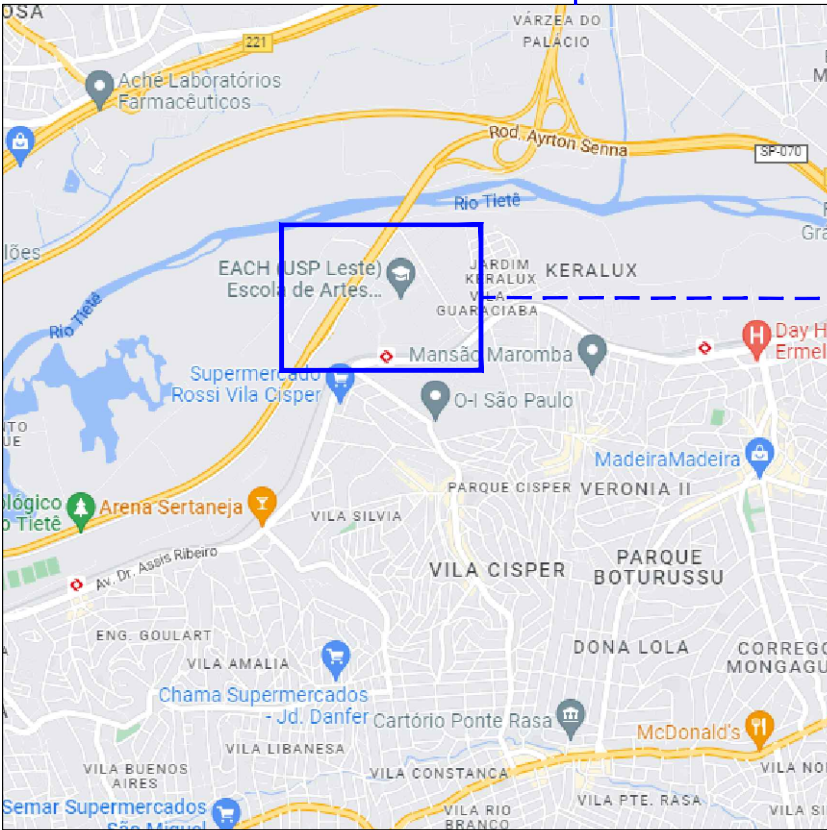

2023, data: 22/05/2023 (Fonte: GOOGLE EARTH)



LEGENDA:

 Área de Interesse


CLIENTE: Universidade de São Paulo - USP Leste		
PROJETO: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação		
ENDEREÇO: Rua Arlindo Bétio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP		
TÍTULO: Localização da Área de Interesse (Adaptado de Google Earth, 2023)		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Chufi	FIGURA Nº: 2.1	DATA: MAR/2024

Dessa forma, mantendo-se a ventilação do tapete de brita, garante-se que os gases que eventualmente emanem do subsolo não atinjam o edifício pela sua laje.

Previamente e como forma de contingência emergencial, os exaustores foram conectados às tubulações drenantes existentes nos edifícios. Durante os meses de março a julho de 2014, os sistemas de ventilação passaram pela etapa de reajuste às características de cada edificação, para que os exaustores fossem conectados à sua situação definitiva.

A eficiência do sistema de ventilação de gases é monitorada por meio de medições das concentrações de Metano (CH_4), Compostos Orgânicos Voláteis (VOC), Gás Carbônico (CO_2), Monóxido de Carbono (CO), Oxigênio (O_2), Sulfeto de Hidrogênio (H_2S) e pressão em poços de monitoramento em duas profundidades distintas.

A **Figura 2.3.1** ilustra o conceito de funcionamento do sistema de circulação de gases instalado na USP Leste.

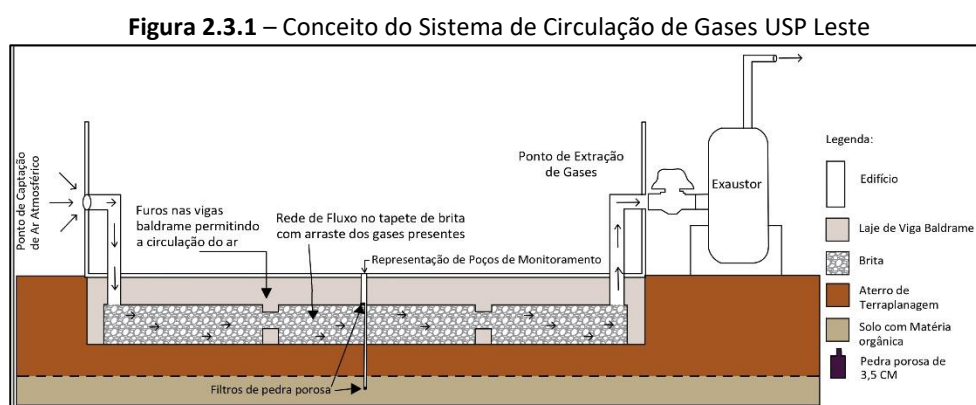

Fonte: Adaptado de Relatório de Instalação de Sistemas (Weber, 2022), Atualizado por Engesolve, 2023.

3. DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO

O monitoramento de intrusão de gases/vapores no solo em ambientes fechados é realizado de forma sistemática e programada, com o objetivo de afastar o risco eventual de explosividade nas edificações da USP Leste.

Os pontos de monitoramento se subdividem em Poços de Monitoramento e Infraestrutura.

3.1. POÇOS DE MONITORAMENTO

Atualmente estão instalados na área de estudo 117 (cento e dezessete) conjuntos de poços de monitoramento de gases e 08 (oito) poços de monitoramento de gases, distribuídos nos Edifícios I-1, I-3 (Auditório I-5 e Biblioteca), I-4 (Serviços), Conjunto Laboratorial, Bloco Inicial (Conjunto Didático), Enfermaria, CAT, Incubadora, Ginásio, Guarda Universitária, Portaria P3 e Transportes. Os 03 conjuntos de poços existentes no Edifício Laranjinha foram encerrados com a demolição do prédio.

Entre agosto e novembro de 2013 foram instalados 107 (cento e sete) pares de poços de monitoramento de gases, com duas profundidades distintas, e 08 (oito) poços de monitoramento de gases rasos, sendo intitulados PMG-00 A (~0,30 m – sob as lajes/no tapete de brita) e PMG-00 B (~1,00 m – no solo).

Em março/2014 os poços A e B encontravam-se conectados em uma mesma mangueira. No início do mês de abril/2014, foram inseridas válvulas de individualização dos poços, as quais os mantêm fechados, sendo abertos somente no momento da medição após a conexão da mangueira do equipamento, o que permite a leitura da pressão e das concentrações de uma profundidade sem a interferência da outra, ou da atmosfera.

Em julho/2015 foram instalados mais 09 (nove) conjuntos de poços de monitoramento nos edifícios da Guarda Universitária, Portaria P3 e Transportes. O monitoramento nesses poços se iniciou em Agosto/2015.

Nos edifícios Guarda Universitária e Transportes, na porção rasa foi instalado o poço de monitoramento sob a laje tipo Vapor Pin (A) e na porção profunda, com o mesmo perfil construtivo dos já existentes (B). No edifício Portaria P3, foi detectada uma segunda laje sob o piso, sendo assim, os poços de monitoramento neste edifício foram instalados em três profundidades: Sob a primeira laje – A (~0,30 m), sob a segunda laje, no tapete de brita – B (~0,50 m) e no solo – C (~1,30 m).

Entre junho/2019 e junho/2020, o sistema de ventilação no edifício da Guarda Universitária foi desligado e o monitoramento interrompido devido à uma reforma ocorrida entre Julho a novembro/2019. Em dezembro/2019, 07 (sete) novos pares de poços de monitoramento foram

instalados, com o mesmo tipo de construção de 2015, bem como foram instaladas novas tubulações do sistema de ventilação.

Em outubro/2021 foram instalados 34 (trinta e quatro) conjuntos de poços de monitoramento de gases, com profundidades distintas sendo PMG-00 B e C (~0,50 m e ~1,20m) e 11 (onze) poços de monitoramento de gases rasos, sendo PMG-00 A (~0,30 m). Ainda neste período foram reinstalados 07 (sete) poços A sob a laje na Guarda Universitária, totalizando em 52 os poços instalados neste período.

A **Tabela 3.1.1** demonstra o quantitativo de poços distribuídos nos edifícios, totalizando 289 poços de monitoramento em solo/laje. A **Figura 3.1.1** ilustra a localização destes poços de monitoramento.

3.2. INFRAESTRUTURA

Além dos poços de monitoramento, foi realizado o levantamento dos ralos, tomadas e grelhas existentes nos edifícios, para incluí-los nas medições e avaliar a intrusão dos gases nas construções. Foi definido o monitoramento em ralos e caixas de passagem numerados e cadastrados em cada prédio.

Em junho de 2021, foram incluídos sete pontos de infraestrutura na Guarda Universitária, retomando o monitoramento da infraestrutura, a qual estava interrompida desde a reforma do prédio de 2020.

Durante a construção dos edifícios, a presença de gás foi detectada e, por isso, como forma de prevenção, o sistema elétrico foi instalado em tubulações aéreas, chegando às salas via canaletas, fazendo com que as tomadas das edificações não possuam contato direto com o solo.

Foram definidos também espaços que possuem pouca circulação de ar para serem monitorados, a partir de vistoria em toda a área de estudo.

Em março de 2023 foi realizado o levantamento detalhado e atualização de todos os pontos de infraestrutura, na ocasião foi verificado que o ponto 177 se encontrava identificado erroneamente como 171, o ponto 176 identificado como 177 e o ponto 171 (posicionado dentro do box) se encontrava sem identificação. Os pontos identificados foram remarcados corretamente, o **Anexo 7** apresenta Relatório Fotográfico referente ao levantamento e atualização.

A **Tabela 3.2.1.** e a **Figura 3.2.1.** apresentam a distribuição e a localização dos pontos de infraestrutura distribuídos nos edifícios (totalizando 180 pontos de medição na infraestrutura), respectivamente.

Tabela 3.1.1 – Distribuição dos Poços de Monitoramento dos Gases nas Edificações

Relação de Poços x Edificações																															
Poços				Poços				Poços				Poços				Poços				Poços				Poços				Poços			
Edifício I-1 Parte 1	PMG-16	A	37 POÇOS	Edifício I-3 Auditórios (I-5)	PMG-25	A	47 POÇOS	Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	41 POÇOS	Bloco Inicial (Conjunto Didático)	PMG-01	A	35 POÇOS	Edifício I-4	PMG-63	A	32 POÇOS	Ginásio Poliesportivo	PMG-102	18 POÇOS									
	PMG-16	B			PMG-25	B			PMG-46	B			PMG-01	B			PMG-63	B			PMG-103										
	PMG-17	A			PMG-26	A			PMG-47	A			PMG-02	A			PMG-64	A			PMG-104										
	PMG-17	B			PMG-26	B			PMG-47	B			PMG-02	B			PMG-64	B			PMG-105										
	PMG-18	A			PMG-27	A			PMG-48	A			PMG-03	A			PMG-65	A			PMG-106										
	PMG-18	B			PMG-27	B			PMG-48	B			PMG-03	B			PMG-65	B			PMG-107										
	PMG-20	A			PMG-28	A			PMG-49	A			PMG-04	A			PMG-66	A			PMG-108										
	PMG-20	B			PMG-28	B			PMG-49	B			PMG-04	B			PMG-66	B			PMG-109		A								
	PMG-22	A			PMG-29	A			PMG-50	A			PMG-05	A			PMG-67	A			PMG-109		B								
	PMG-22	B			PMG-29	B			PMG-50	B			PMG-05	B			PMG-67	B			PMG-110		A								
	PMG-23	A			PMG-44	A			PMG-51	A			PMG-06	A			PMG-68	A			PMG-110		B								
	PMG-23	B			PMG-44	B			PMG-51	B			PMG-06	B			PMG-68	B			PMG-111		A								
	PMG-113	A			PMG-45	A			PMG-52	A			PMG-07	A			PMG-69	A			PMG-111		B								
	PMG-113	B			PMG-45	B			PMG-52	B			PMG-07	B			PMG-69	B			PMG-112										
	PMG-114	A			PMG-132	A			PMG-53	A			PMG-08	A			PMG-77	A			PMG-162		A								
	PMG-114	B			PMG-132	B			PMG-53	B			PMG-08	B			PMG-77	B			PMG-162		B								
	PMG-115	A			PMG-133	A			PMG-54	A			PMG-09	A			PMG-78	A			PMG-166		A								
	PMG-115	B			PMG-133	B			PMG-54	B			PMG-09	B			PMG-78	B			PMG-166		B								
	PMG-135	A			PMG-134	B			PMG-55	A			PMG-10	A			PMG-79	A			18 POÇOS										
	PMG-135	B			PMG-30	A			PMG-55	B			PMG-10	B			PMG-79	B													
PMG-136	B	PMG-30	B	PMG-56	A	PMG-84		A	PMG-80	A																					
Edifício I-1 Parte 2	PMG-14	A	37 POÇOS	Edifício I-3 Biblioteca	PMG-31	A		Conjunto Laboratorial	PMG-56	B		PMG-84	B	35 POÇOS		Edifício I-4	PMG-80	B		32 POÇOS		Ginásio Poliesportivo	PMG-119	A	09 poços						
	PMG-14	B			PMG-31	B			PMG-57	A		PMG-85	A				PMG-81	A					PMG-119	B							
	PMG-21	A			PMG-32	A			PMG-57	B		PMG-85	B				PMG-81	B					PMG-120	A							
	PMG-21	B			PMG-32	B			PMG-58	A		PMG-86	A				PMG-144	B					PMG-120	B							
	PMG-15	A			PMG-33	A			PMG-58	B		PMG-86	B				PMG-145	B					PMG-163	C							
	PMG-15	B			PMG-33	B			PMG-59	A		PMG-87	A				PMG-146	B					PMG-164	B							
	PMG-13	A			PMG-34	A			PMG-59	B		PMG-87	B				PMG-147	B					PMG-164	C							
	PMG-13	B			PMG-34	B			PMG-60	A		PMG-152	A				PMG-148	B					Transportes	PMG-121		A	10 poços				
	PMG-19	A			PMG-35	A			PMG-60	B		PMG-152	B				PMG-149	B						PMG-121		B					
	PMG-19	B			PMG-35	B			PMG-61	A		PMG-153	B				PMG-150	B						PMG-122	A						
	PMG-11	A			PMG-36	A			PMG-61	B		PMG-154	B				PMG-151	B						PMG-122	B						
	PMG-11	B			PMG-36	B			PMG-62	A		PMG-155	B				PMG-88	A	PMG-123					A							
	PMG-12	A			PMG-37	A			PMG-62	B		PMG-156	B				PMG-88	B	PMG-123				B	Guarda Universitária	PMG-124	A	14 POÇOS				
	PMG-12	B			PMG-37	B			PMG-137	B		PMG-157	B				PMG-89	A	PMG-124				B		PMG-158	B					
	PMG-24	A			PMG-38	A			PMG-138	B		CAT	PMG-82		A		PMG-89	B	PMG-158				B								
	PMG-24	B			PMG-38	B			PMG-139	A			PMG-82		B		PMG-90	A	PMG-159		B										
					PMG-39	A			PMG-139	B			PMG-83		A		PMG-90	B	PMG-125		A										
					PMG-39	B			PMG-140	A			PMG-83		B		PMG-91	A	PMG-125		B										
		PMG-40	A	PMG-140	B	PMG-94		A	PMG-91	B			PMG-126	A																	
		PMG-40	B	PMG-141	B	PMG-94		B	PMG-92	A			PMG-126	B																	
		PMG-41	A	PMG-70	A	PMG-95		A	PMG-92	B	PMG-127		A																		
		PMG-41	B	PMG-70	B	PMG-95		B	PMG-93	A	PMG-127		B																		
		PMG-42	A	PMG-71	A	PMG-96		A	PMG-93	B	PMG-128		A																		
		PMG-42	B	PMG-71	B	PMG-96		B	PMG-96	A	PMG-128		B																		
		PMG-43	A	PMG-72	A	PMG-97		A	PMG-97	B	PMG-129		A																		
		PMG-43	B	PMG-72	B	PMG-97		B	PMG-98	A	PMG-129		B																		
				PMG-73	A	PMG-98	A	PMG-98	B	PMG-130	A																				
				PMG-73	B	PMG-160	A	PMG-160	B	PMG-130	B																				
				PMG-74	A	PMG-160	B	PMG-161	A	PMG-131	A																				
				PMG-74	B	PMG-161	A			PMG-131	B																				
				PMG-75	A																										
				PMG-75	B																										
				PMG-76	A																										
				PMG-76	B																										
				PMG-165	A																										
				PMG-165	B																										

Fonte: Dados de Campo, Engesolve, 2024.



LEGENDA:

- Taludes
- Poço de monitoramento de gás
- Abrigo para equipamento
- Quantidades de exaustores nos abrigos
- Cerca de divisa
- Guia e Estacionamento
- Edificações

0 31,5 63 94,5 126m

Escala Gráfica:

CLIENTE: Universidade de São Paulo - USP Leste		 SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS
PROJETO: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação		
ENDEREÇO: Rua Arlindo Bétio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP		
TÍTULO: Localização dos Poços de Monitoramento de Gás e Abrigos de Exaustores		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Chufi	FIGURA Nº: 3.1.1	DATA: MAR/2024

Tabela 3.2.1 – Distribuição dos Pontos de Monitoramento de Infraestrutura nas Edificações

Relação de Pontos da Infraestrutura x Edificações																	
Pontos						Pontos						Pontos					
Edifício I-1 Parte 1	Ralos	12	Edifício I-3 Auditórios	Ralos	160	Edifício I-4	Ralos	95	Conjunto Laboratorial	Ralos	34	Bloco Inicial	Ralos	74			
		17			159			97			36			75			
		16			162			99			53			76			
		14			165			106			69			77			
		15			164			96			70			78			
		18			176			104			71			79			
		19			177			307			67			80			
		20			174			122			66			81			
		13			171			111			64			82			
		25			148			117			65			83			
		22	149	100	63			84									
		21	150	101	62			85									
		32	147	105	56			86									
		30	139	91	60			Enfermaria			Ralos	124					
		31	140	102	58							125					
		28	141	88	55							126					
		26	151	108	54			CAT			Ralos	127					
		24	145	107	57							136					
		27	144	94	42							137					
		23	143	92	44							138					
Edifício I-1 Parte 2	Ralos	01	142	90	43			P3	Ralos	187							
		05	146	89	41					186							
		04		87	38			Incubadora	Ralos	132							
		03		123	32					133							
		09		121	61					134							
		08		120	37			Guarda Universitaria	Ralos	135							
		07		119	45					188							
		06		114	46					189							
		02		113	40					190							
				112	47					191							
		109	48	192													
		110	49	193													
			50	194													

Pontos				
Caixas de Passagem	Enfermaria	53	Biblioteca	59
	Enfermaria	55	Biblioteca	57
	Laboratórios	40	Biblioteca	60
	Laboratórios	38	Biblioteca	67
	Laboratórios	24	Biblioteca	58
	Laboratórios	15	Auditório	72
	Laboratórios	13	Auditório	73
	Laboratórios	28	Auditório	74
	Laboratórios	33		
	Laboratórios	37		
	Laboratórios	16		
	Laboratórios	18		
	Laboratórios	21		
	Laboratórios	29		

Pontos		
Espaços com pouca circulação de ar	1	Depósito Auditório Vermelho
	2	Depósito Auditório Verde
	3	Depósito Edifício I-3
	4	Depósito Enfermaria
	5	Arquivo Enfermaria
	6	Caixa de inspeção da Caixa d'água
	7	Depósito interior Almoarifado
	8	Depósito exterior Almoarifado
	9	Casa de Máquinas (Hidrante)

Fonte: Dados de Campo, Engesolve, 2024.

4. METODOLOGIA DO MONITORAMENTO DE GASES

O monitoramento de intrusão de vapores/gases do solo em ambientes fechados e espaços com pouca circulação de ar do pavimento térreo, ou seja, que tem contato direto com o solo, é realizado de forma sistemática e programada, visando afastar o risco eventual de explosividade nas edificações da USP Leste.

As leituras são realizadas em poços de monitoramento situados sob a laje (no tapete de brita – 0,30 m) e no solo (à profundidade aproximada de 0,50 m e 1,30 m), bem como em ralos e caixas de passagem distribuídos e numerados nas edificações (conforme descrito nos itens **3.1** e **3.2**).

A sistemática adotada segue abaixo especificada:

- **Poços de Monitoramento:** medições semanais com o equipamento GEM 5000 para avaliação da concentração de Metano ($\text{CH}_4\%$ vol), CO_2 (%vol), CO (ppm), H_2S (ppm), O_2 (%vol), e nível de pressão (bar), explosividade (%LEL) e presença de outros VOCs (Compostos Orgânicos Voláteis) com o equipamento MX6/Gas Alert Micro 5 (BW), totalizando 289 poços de monitoramento em solo/laje;
- **Infraestrutura:** medições quinzenais, com equipamento MX6/ Gas Alert Micro 5 (BW), para medição do nível de explosividade (%LEL) que a possível presença de Metano e/ou outros voláteis podem conferir ao ambiente, totalizando 180 pontos de medição na infraestrutura; e
- **Exaustores:** monitoramento sistemático nos exaustores de cada sistema de ventilação dos edifícios, realizando-se medições semanais de Metano e pressão com o equipamento GEM 5000 e VOCs com o equipamento MX6/ Gas Alert Micro 5 (BW), bem como leitura da pressão na célula de vácuo, totalizando 22 pontos de medição em exaustores.

O monitoramento é realizado por técnicos de campo da ENGESOLVE, treinados, capacitados, e supervisionados por Geólogo e Engenheiro Ambiental. As leituras são realizadas por meio de equipamentos calibrados e certificados da marca Industrial Scientific, modelo MX6 iBrid, Gas Alert Micro 5, Modelo BW, e da marca Landtec, modelo GEM 5000. No **Anexo 1** apresentam-se os certificados de calibração dos equipamentos utilizados.

Os equipamentos MX6 iBrid/Gas Alert Micro 5 (BW) são instrumentos portáteis utilizados em avaliações de passivos para detectar compostos voláteis e incluem até cinco sensores simultâneos. As unidades utilizadas neste projeto estão configuradas com um sensor PID 10,6eV para medição de VOC em ppm e de um sensor catalítico para medição de LEL (*Low Explosivity Level* ou Limite Inferior de Inflamabilidade – LII) em porcentagem.

O MX6/BW tem calibração com validade de até 2 anos, mas as unidades utilizadas na USP são calibradas trimestralmente visando a garantia dos dados, considerando a presença frequente de Metano (Equipamento USP Nº de Série: SK317-003329 e/ou SK317-003332).

O equipamento GEM 5000 é um equipamento portátil especificamente utilizado para monitoramento da migração de gases, como por exemplo em aterros. Ele é composto de uma célula infravermelha de comprimento de onda duplo com canal de referência para leitura de Metano (CH_4) em % volume, Dióxido Carbônico (CO_2) em % volume, de uma célula eletroquímica para medição de Sulfeto de Hidrogênio (H_2S), Monóxido de Carbono (CO), Oxigênio (O_2) em parte por milhão (ppm) e transdutor para medição de BAL (pressão diferencial) e Nível de Pressão.

O GEM 5000 tem uma calibração anual, porém a unidade utilizada na USP é calibrada semestralmente para garantia da qualidade dos dados, considerando a presença frequente de Metano. Além disso, diariamente é realizada uma verificação com ar ambiente antes do início das medições (Equipamento USP Nº de Série: G500491).

4.1. SOBRE O BIOGÁS E O GÁS METANO

Inicialmente, o termo Biogás estava associado aos diversos nomes atribuídos a ele, como: gás dos pântanos, gás de aterro, gás de digestor e gás de fermentação, entre outros e atualmente, o termo refere-se, de forma geral, aquele gás formado a partir da degradação anaeróbia (ausência de oxigênio gasoso) da matéria orgânica, através da ação de determinadas espécies de bactérias. Durante a digestão anaeróbia, a energia química presente na composição é largamente conservada, principalmente, como Metano (Adaptado, CETESB, 2021).

Junto ao Metano (CH_4), estão presentes outros gases que fazem parte do meio ambiente natural, sendo gerados a partir da degradação bacteriana de matéria orgânica, neste caso, sedimentos advindos da dragagem do Rio Tietê e sedimentos quaternários naturalmente depositados na bacia de inundação do Rio Tietê, área sobre a qual a USP Leste foi instaurada, gerando o biogás. A transformação da matéria orgânica é realizada pelo metabolismo bacteriano, tendo participação de fungos e outros microrganismos. As interações entre os diversos grupos de bactérias participantes da decomposição anaeróbia tem múltiplas variáveis, que vão desde a composição dos resíduos e presença de substratos, até variáveis como temperatura, teor de água e pH do meio. Em um ambiente anaeróbio é gerada uma mistura de gases, como:

- Metano (CH_4): 50% - 70% do volume de gás produzido;
- Dióxido de carbono (gás Carbônico, CO_2): 25% - 50% do volume de gás produzido;
- E traços de outros gases como:
 - Hidrogênio (H_2): 0% - 1% do volume;
 - Gás sulfídrico ou Sulfeto de Hidrogênio (H_2S): 0% - 3% do volume;
 - Oxigênio (O_2): 0% - 2% do volume;
 - Amoníaco (NH_3): 0% - 1% do volume; e
 - Nitrogênio (N_2): 0% - 7% do volume (CETESB, 2021).

Ao longo dos mais de 10 anos de monitoramento da área de estudo, foi possível observar a presença de outros gases, como Sulfeto de Hidrogênio (H_2S) e Monóxido de Carbono (CO).


Constata-se esta possibilidade devido a produção de biogás, na qual as bactérias produzem estes compostos simultaneamente. Contudo, durante a digestão anaeróbica, eles são produzidos em diferentes proporções, onde o Metano é sempre maior do que H_2S e CO .

O gás Metano (CAS nº 74-82-8) é um gás inflamável comumente encontrado em material orgânico devido à presença de bactérias decompositoras. Ele apresenta faixa de inflamabilidade entre 5% e 15% em volume, isto é, concentrações do gás/vapor que em contato com o ar forma uma mistura inflamável (mistura ideal) na presença de uma fonte de ignição. As concentrações abaixo ou acima dessa faixa não propagam chama, uma vez que a quantidade de gás/vapor é muito pequena (mistura pobre) ou muito elevada (mistura rica) para queimar ou explodir, conforme descrito no manual de produtos químicos (CETESB, 2016).

Para que ocorra a inflamabilidade seria necessária a concentração do gás, em sua mistura ideal com oxigênio em um ambiente confinado, e um meio de ignição. Observou-se em uma vistoria que, em geral, o perfil construtivo das edificações apresenta ventilação fixa, o que dificulta o acúmulo do gás nesses ambientes.

A **Figura 3.4.1.** ilustra a faixa de inflamabilidade de gás Metano, bem como a faixa de medição do equipamento utilizado e o esquema de combustão.

Figura 3.4.1 – Faixa de Inflamabilidade do Gás Metano (CH_4) e sua combustão

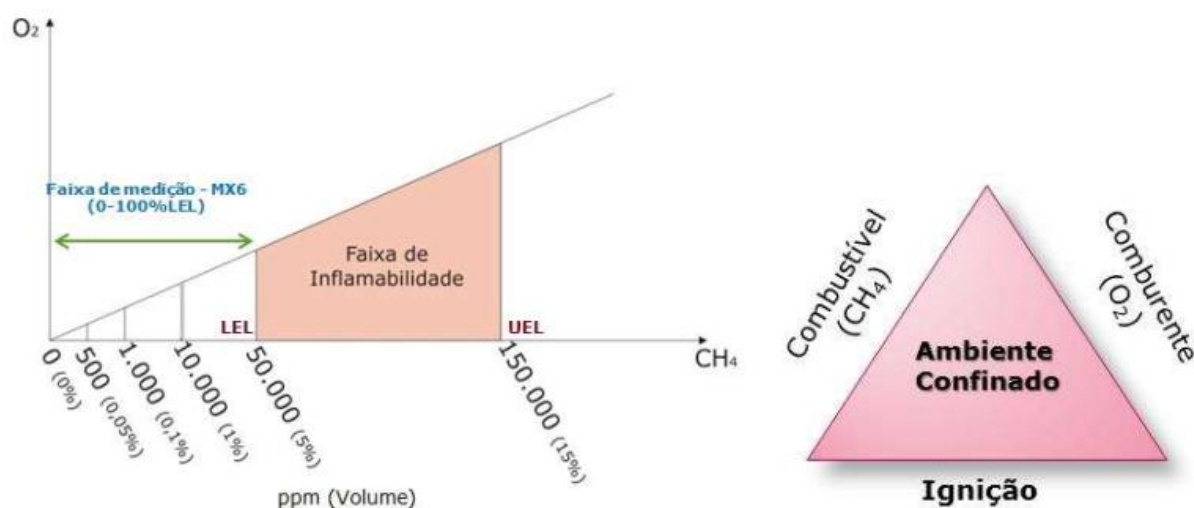

Fonte: Relatório Weber, 2022.

O Sulfeto de Hidrogênio é um gás tóxico, denso e inflamável, com odor de “ovo podre”, já o Monóxido de Carbono é um gás tóxico e inflamável, porém inodoro. Ambos podem ser prejudiciais à saúde quando inalados em ambientes confinados, a depender das concentrações e do tempo de exposição: para o H_2S é necessário concentrações acima de 8,0 ppm por 48 horas e para o CO acima de 39,0 ppm por 48 horas (Manual de Produtos Químicos, CETESB 2016).

Para existir o risco de inflamabilidade, o H_2S e o CO precisam das mesmas características que o Metano, combinando o espaço confinado, fonte de ignição e concentrações dentro da faixa de

4,3 a 45,0%vol ou 43.000 a 450.000 ppm de H₂S; e 12,0 a 75,0%vol ou 120.000 a 750.000 ppm de CO (CETESB, 2016).

4.2. PLANO DE AÇÃO

Um plano de ação foi estabelecido para garantia da segurança durante a realização dos trabalhos de monitoramento e ventilação dos gases. Sua última atualização foi realizada em setembro/2022. O plano completo pode ser visualizado no **Anexo 2**, e a seguir são apresentadas as principais ações relacionadas às concentrações de Metano obtidas:

Sistema Inoperante: Verificar possíveis falhas, solucioná-las e retomar a operação, além de monitorar os poços de monitoramento sob influência do sistema até o reinício da operação;

Ponto de Alerta (PMG-B com concentração de Metano acima de 5%vol): Acompanhar o monitoramento dos poços de profundidade rasa (PMG-A) para verificar se há movimentação do gás no tapete de brita;

Ponto Crítico (PMG-A com concentração de Metano entre 5% e 15%vol): Ajustar o sistema de ventilação, direcionando o fluxo para o ponto em questão e monitorar a redução da concentração, além de monitorar a infraestrutura para garantir a não intrusão dos vapores do edifício afetado, até que as concentrações no ponto estejam inferiores a 5%;

Ponto Extremamente Crítico (PMG-A com concentração de Metano acima de 15%vol): Ajustar o sistema de ventilação, direcionando o fluxo para o ponto em questão, aumentar a pressão e monitorar a redução da concentração, além de monitorar a infraestrutura para garantir a não intrusão dos vapores do edifício afetado, até que as concentrações no ponto estejam inferiores a 5%;

Pontos de Infraestrutura em ambientes internos com concentração acima de 20%LEL (ou 1%volCH₄): Ventilar o ambiente, remover as pessoas do local, eliminar possíveis fontes de ignição, identificar os pontos de entrada de gás e selar;

Entrada dos Exaustores com concentração acima de 20%LEL (ou 1%volCH₄): Aumentar a frequência do compressor, afim de elevar o vácuo e o fluxo, aumentando assim a diluição do Metano na corrente de ar.

5. RESUMO E TENDÊNCIA EM 10 ANOS DE OPERAÇÃO/MONITORAMENTO (ABRIL DE 2014-MARÇO DE 2024)

O monitoramento de gases no solo e sob a laje das edificações na USP Leste teve início em março de 2014 e se mantém ativo até o presente momento, com previsão de continuidade para os próximos anos.

Avaliando os dados obtidos ao longo destes 10 anos de monitoramento (até o mês de março/2024), foi possível estabelecer uma linha de tendência da presença de Metano no solo, além de indicar a efetividade do sistema de ventilação em promover o afastamento das concentrações de Metano sob a laje dos edifícios.

As medições realizadas no período entre março e junho, indicaram que as concentrações de Metano acima de 1%Vol. estão localizadas frequentemente em pontos específicos (em até 13 dos 289 poços monitorados), não abrangendo toda a extensão dos edifícios. Também observa-se que, em sua maioria, essas concentrações estão localizadas apenas nas porções profundas (cerca de 1,00 m, com valores variáveis entre 1,10 a 10,1%VolCH₄). No ano de 2014, apenas em dois pontos foram verificadas concentrações de Metano acima de 5%VolCH₄, na profundidade imediatamente abaixo das edificações (subslabs 0,3m).

Os sistemas de ventilação foram ligados da forma como existiam em março de 2014. Neste mês, havia 08 poços com concentração de Metano na porção rasa. Em abril/2014, este número caiu para 04. Em maio/2014, havia apenas 01 e, em junho/2014, ao final da instalação/readequação dos sistemas de ventilação, não havia nenhum poço com concentração de Metano na porção rasa.

Em março/2014, os poços A e B encontravam-se conectados em uma mesma mangueira. No início do mês de abril/2014, foram inseridas válvulas de individualização dos poços. Nos meses e anos seguintes, as concentrações na porção rasa se mantiveram nulas. Quando eventualmente aparecem, o sistema de ventilação é redirecionado, rapidamente extinguindo a concentração existente.

Ao longo de março/2014 a dezembro/2021, as medições de VOC, H₂S e CO nos poços de monitoramento não detectaram concentrações significativas (abaixo de 100 ppm) em nenhum dos pontos monitorados. Tratando-se da pressão, observou-se pressões tanto negativas quanto positivas em alguns poços de monitoramento, indicando a movimentação promovida pelo sistema, além da movimentação natural do nível d'água da região.

Além das medições dos poços de monitoramento, também foram realizadas medições em ralos, caixas de passagem e espaços com pouca circulação de ar, onde não foi detectada nenhuma indicação de inflamabilidade, demonstrando que, mesmo com eventuais pressões positivas, não ocorreu intrusão de gases nos ambientes estudados. Em alguns pontos (principalmente na caixa 55 da Enfermaria) foram verificadas concentrações eventuais de VOC, ligadas ao uso de produtos de limpeza.

As linhas de tendência obtidas para o gás Metano nos 10 anos de monitoramento demonstraram que, em alguns poços, as concentrações variam de acordo com o período do ano, enquanto em outros, as concentrações mantêm-se sempre presentes.

De forma geral, nos períodos de julho a novembro, as condições climáticas regionais reportam períodos de seca, corroborando o rebaixamento do nível d'água subterrânea local. Assim, nota-se que o Metano gerado na área encontra mais poros vazios na zona não saturada do solo, conseguindo permear com mais facilidade por este meio. Diferente do que ocorre no período de chuvas, onde o nível d'água se eleva e o Metano encontra-se dissolvido junto à água nos poros da zona saturada.

Ainda durante os 10 anos de monitoramento e operação dos sistemas, diversas ações de manutenção preventiva e corretiva foram realizadas. Entre elas, a adequação da pressão de sucção imposta na célula de vácuo, a qual inicialmente era variável em cada edificação, chegando até -40mmHg, e foram gradativamente ajustadas entre setembro e novembro de 2015, até -2,0 mmHg, se aproximando da pressão prevista em projeto.

Periodicamente é realizada a manutenção preventiva nos sistemas e, quando necessário, também ocorrem ações corretivas, além da manutenção das tubulações, desenvolvida preferencialmente no último trimestre.

No último trimestre de 2016, dois pontos de captação de ar do Edifício Módulo Inicial foram reposicionados para fora da área da lanchonete. No último trimestre de 2017 foi realizado um levantamento para manutenção nas tubulações de entrada e saída dos sistemas em todos os prédios, onde fez-se necessário o ajuste nas tubulações do Bloco I, II e III do Conjunto Básico e em uma tubulação no prédio da biblioteca.

No último trimestre de 2018 foram realizados testes de estanqueidade nas tubulações de saída dos sistemas, por meio de fechamento de válvulas e aumento da pressão, com verificação dos pontos de vazamento. Os testes indicaram que as tubulações permaneciam intactas, com exceção de uma parte da tubulação do módulo inicial (B2), que foi substituída. No último trimestre de 2019 foi realizada a manutenção da tubulação quebrada na saída do sistema do Edifício I-1 parte 2. Em 2020, foram realizadas duas manutenções preventivas nos meses de fevereiro e novembro, não havendo necessidade de ações corretivas.

Observou-se também que ao longo dos 10 anos de monitoramento, em poços com histórico de concentrações de Metano, houve a presença de outros gases, sendo eles: H_2S (Sulfeto de Hidrogênio), e CO (Monóxido de Carbono). O H_2S é um gás tóxico, denso e inflamável, com odor de “ovo podre”. O CO também é tóxico e inflamável, porém leve e inodoro. Ambos podem ser prejudiciais à saúde quando inalados em ambientes confinados, a depender das concentrações e do tempo de exposição: para o H_2S é necessário concentrações acima de 8,0 ppm por 48 horas e para o CO, acima de 39,0 ppm por 48 horas (Manual de Produtos Químicos, CETESB, 2016).

O H_2S e o CO estão presentes junto ao Metano (CH_4), pois ambos fazem parte do meio ambiente natural, sendo gerados a partir da degradação bacteriana da matéria orgânica, neste caso,

advinda da dragagem do Rio Tietê. A transformação da matéria orgânica é realizada pelo metabolismo bacteriano, tendo participação de fungos e outros microorganismos. As interações entre os diversos grupos de bactérias participantes da decomposição anaeróbia tem múltiplas variáveis, que vão desde a composição dos resíduos e presença de substratos até variáveis externas como temperatura, teor de água e pH do meio. Em um ambiente anaeróbio, é gerada uma mistura de gases como Metano (CH_4), gás carbônico (CO_2), e em menor quantidade, hidrogênio (H_2), nitrogênio (N_2), sulfeto de hidrogênio (H_2S), monóxido de carbono (CO), amônia (NH_3) e oxigênio (O_2) (Adaptado, CETESB, 2021).

Para existir risco de inflamabilidade, o CH_4 , o H_2S e o CO precisam das mesmas características: espaço confinado, fonte de ignição e concentrações dentro da faixa de 5,0 a 15,0% de VolCH_4 ; 4,3 a 45% ou 43.000 a 450.000 ppm de H_2S ; e 12,0 a 75,0% ou 120.000 a 750.000 ppm de CO (Manual de Produtos Químicos, CETESB, 2016).

Os gráficos gerados a partir do monitoramento histórico da área indicam que a produção de Metano é maior do que a de H_2S e CO , sendo eles independentes uns dos outros e sem quaisquer correlações, pois as bactérias decompõem a matéria orgânica gerando estes compostos simultaneamente, porém em diferentes proporções. Nota-se que todas as concentrações de H_2S e CO encontradas ao longo dos 10 anos de monitoramento, estiveram abaixo do limite de inflamabilidade, apresentando um pico máximo de 12,0 ppm e 7,0 ppm respectivamente, apenas no mês de abril de 2014, sendo que posteriormente a isso, ambos permaneceram em uma média abaixo de 3,5 ppm.

No ano de 2021 e 2022, o monitoramento ocorreu de forma efetiva, de acordo com a sistemática programada nos poços de monitoramento e nos pontos da infraestrutura.


Nos primeiros trimestres de 2023, as concentrações variaram de forma constante. No 3º trimestre de 2023 foi observada concentração atípica no ponto 66A (0,50%Vol CH_4), no dia 09 de agosto de 2023, sendo então colocado em prática o Plano de ação, cujo consiste na medição diária do ponto, entretanto, as medições demonstraram que a concentração foi *outline*, visto que em nenhuma das demais medições apresentaram quaisquer concentrações, mantendo-se nulas.

No 4º trimestre de 2023, foi observada concentração atípica nos pontos PMG-53A (pico de 36,10%Vol CH_4 em 09 de outubro de 2023) e no PMG-139A (pico de 7,90%Vol CH_4 em 09 de outubro de 2023), sendo então colocado em prática o Plano de ação. Foi realizada a medição diária do ponto. As medições demonstraram que a concentração em ambos os pontos até meados de outubro, voltando a se apresentar nulas após esse período.

No 1º trimestre de 2024, as concentrações não apresentaram concentrações atípicas, sendo somente o PMG-05 com concentrações dentro da faixa de inflamabilidade. A seguir, descrevem-se as observações em cada edifício, ao longo dos 10 anos de monitoramento, para as concentrações de Metano, H_2S e CO .

EDIFÍCIO I-1:

- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2024
Poços existentes: 17 pares (09 na parte 1 e 08 na Parte 2)
Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma
Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

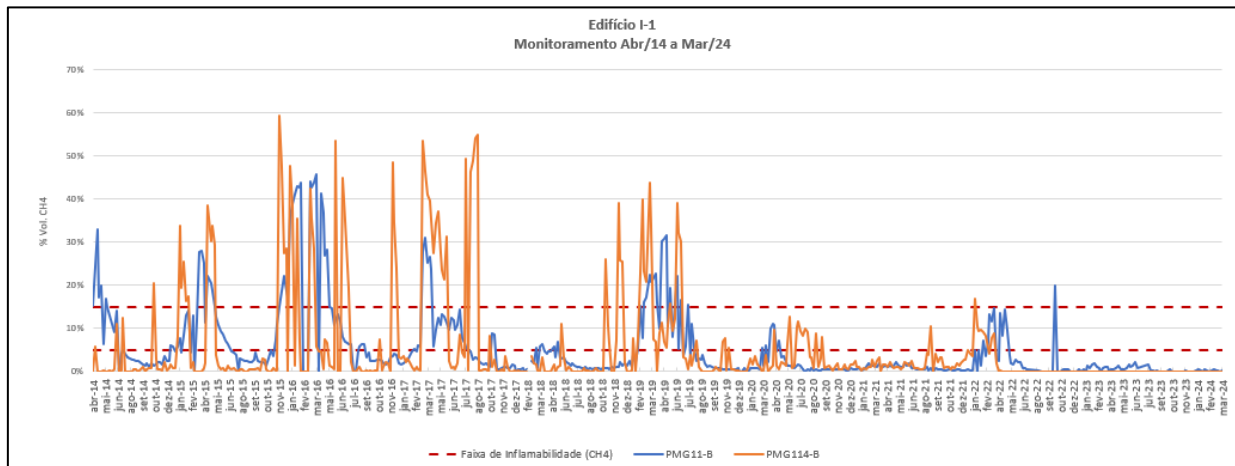

De abril de 2014 a dezembro de 2022 não foram detectadas concentrações de Metano sob a laje do edifício. Percebe-se que, com o início da operação do sistema de ventilação (Jul/2014), houve uma diminuição imediata das concentrações de Metano na porção profunda, porém estas mantiveram-se presentes e variando durante os anos de monitoramento nos poços PMG-11B e PMG 114B. É possível notar que no mês de fevereiro/2018 houve uma redução bem perceptível das concentrações nos dois poços em questão, porém voltaram a se elevar em 2019.


No ano de 2020, nota-se que houve uma diminuição das concentrações, que permaneceram dentro da faixa de inflamabilidade no início do ano, atingindo no máximo 13,0%VolCH₄. Em março, o PMG-11B apresentou concentrações abaixo de 5%, e o mesmo aconteceu com o PMG-114B em outubro do mesmo ano, onde ambos chegaram próximos a concentrações nulas. Este cenário de concentrações abaixo de 5% se manteve durante o ano de 2021, com exceção do mês de agosto e dezembro, onde as concentrações estiveram dentro da faixa de inflamabilidade, atingindo valor máximo de 14,50%VolCH₄ no PMG-114B.

No ano de 2022, ambos os poços seguem variando, ora com concentrações abaixo de 5%, ora com concentrações dentro da faixa de inflamabilidade. No primeiro trimestre de 2023, as concentrações do PMG-114B se encontravam abaixo de 5% apresentando valores entre nulo e 0,1%. No PMG-11B, as concentrações variaram de 0,06% a 1,80%, sendo o valor de pico obtido em 7 de fevereiro, no entanto os valores se mantiveram abaixo de 5%.

No segundo trimestre, apenas o PMG-11B apresentou concentração acima de 1,0%VolCH₄, variando entre 1,20% a 2,10%, sendo o valor de pico obtido em 20 de junho, no entanto os valores se mantiveram abaixo de 5%. No terceiro trimestre, o PMG-11B apresentou

concentração acima de 1%VolCH₄, no entanto abaixo de 5%. No 4º trimestre de 2023 e 1º trimestre de 2024, nenhum dos poços apresentou concentração acima de 1%VolCH₄.


➤ Análise de H₂S e CO no período de Abril de 2014 a Março de 2024

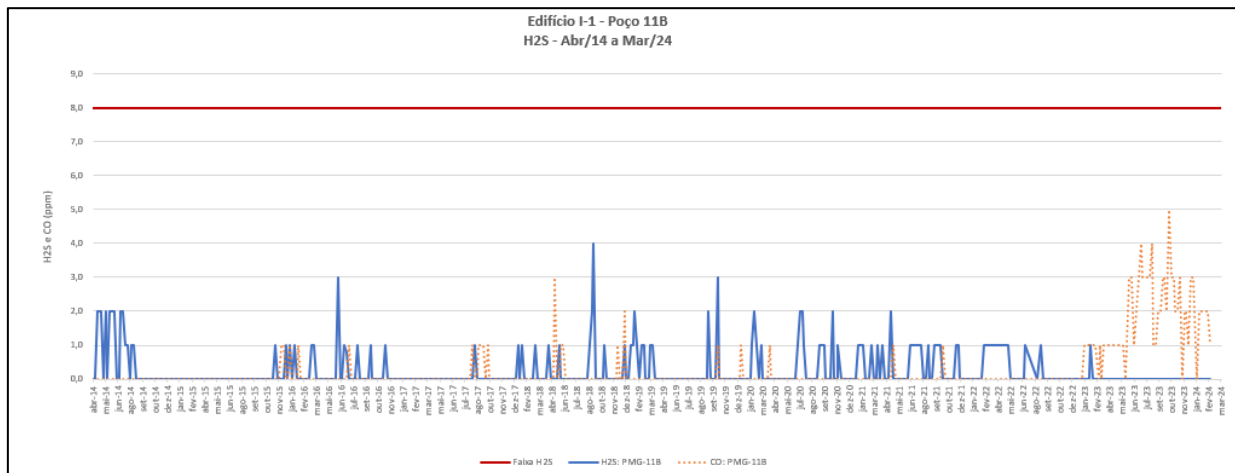

Os gráficos de H₂S e CO demonstram que houve uma variação entre 1,0 e 4,0 ppm para H₂S e entre 1,0 e 5,0 ppm para CO durante os 10 anos de monitoramento, estando ambos abaixo do índice de inflamabilidade. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido à degradação da matéria orgânica, porém a proporção é muito menor quando comparado ao CH₄.

EDIFÍCIO I-3 BIBLIOTECA E I-5 AUDITÓRIO:

- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2024
Poços existentes: 21 pares (14 na Biblioteca e 07 no Auditório)
Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma
Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

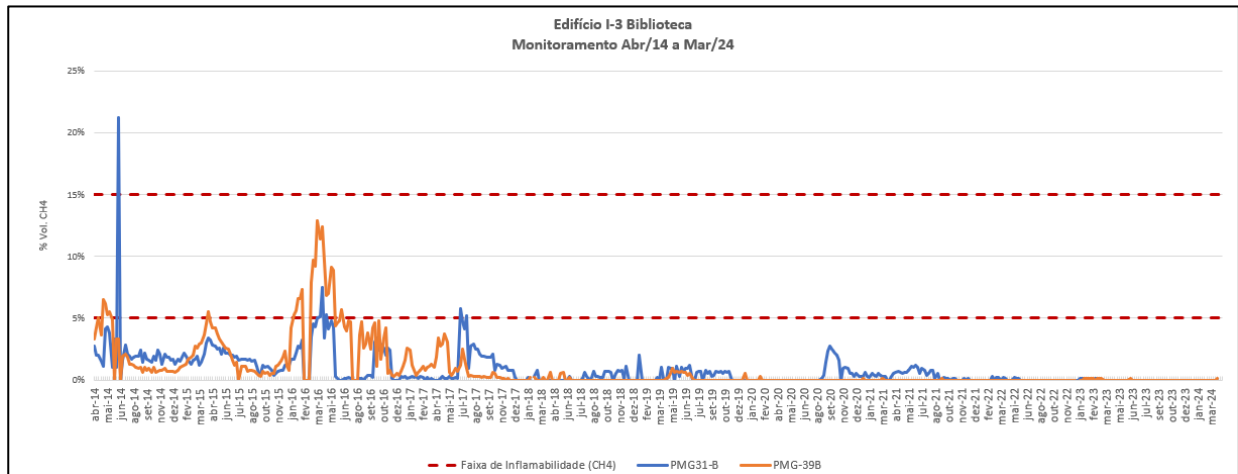

Durante os 10 anos de monitoramento não foram detectadas concentrações de Metano sob a laje do edifício. Nota-se que com o início da operação do sistema de ventilação em julho/2014, houve uma diminuição imediata das concentrações de Metano da porção profunda. Contudo, apesar da diminuição, elas se mantiveram presentes e variando durante todos estes anos nos poços PMG-31B e PMG-39B.

No ano de 2016 houve um aumento significativo das concentrações. Porém, em 2017 observa-se que as concentrações começaram a diminuir, permanecendo abaixo dos 5%VolCH₄, sendo que no ano de 2022 foram quase nulas.

No primeiro trimestre de 2023, as concentrações de ambos os poços PMG-31B e PMG-39B se mantiveram entre nulo e 0,1%. Nos segundos, terceiro e quarto trimestre de 2023, nenhum poço apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄.

No 1º trimestre de 2024, nenhum poço apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄.


EDIFÍCIO I-4:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2024

Poços existentes: 12 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma

Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

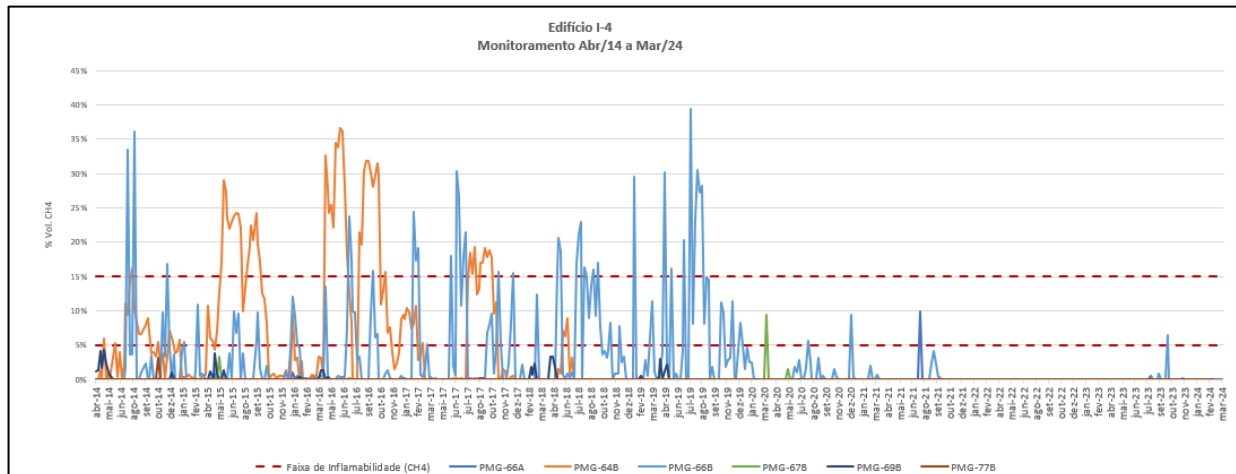

Em Janeiro de 2016, foi detectada concentração de Metano sob a laje do edifício, no poço de monitoramento PMG-66A, sob a concentração de 1,1%. Na porção profunda observa-se a persistência de concentrações de Metano no PMG-66B, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (julho/2014).

Em outros três poços também foram detectadas concentrações de Metano no solo, porém sem continuidade ou com valores fora da faixa de inflamabilidade, sendo eles: PMG-64B (de abril/14 até julho/18), PMG-67B (1x em maio/15), PMG-69B (eventualmente, sempre próximo ao mês de abril de cada ano e abaixo de 5%).

O PMG-77B havia apresentado concentração de Metano abaixo de 5%, somente uma vez, em outubro de 2014. Porém, em março de 2020, voltou a demonstrar concentrações do referido gás, desta vez com concentração de 10,0% VolCH₄, tendo logo depois se estabilizado com concentrações nulas.



No ano de 2021, o PMG-66A atingiu concentração de 10,0% VolCH₄, pontualmente em julho. Nos demais meses as concentrações do poço citado apresentaram-se abaixo de 5%, e nos demais poços obteve-se concentrações nulas. Em 2022, todos os poços apresentaram concentrações nulas.

No primeiro trimestre de 2023 as concentrações dos poços se encontravam nulas. No entanto, foram identificadas concentrações de 1% nos poços PMG-146B, PMG-147B, PMG-148B, PMG-149B, PMG-150B e PM-151B. O poço PMG-150B apresentou medição anômala, acima de 5% em apenas um dia.

No segundo trimestre de 2023, apenas o poço PMG-150B apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄, sendo observado de forma anômala, concentração acima de 5%VolCH₄ durante um dia (31 de maio de 2023). No terceiro trimestre de 2023, apenas o poço 66B apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄, e em apenas uma medição acima de 5%VolCH₄ dentro da faixa de inflamabilidade. Apesar de ter apresentado concentração de forma atípica, o PM 66A apresentou concentração de 0,50%VolCH₄, cuja concentração foi monitorada, e foi considerada outline por não apresentar concentração nas demais medições. Os demais pontos se mantiveram com concentrações nulas ou abaixo de 1%VolCH₄.

No 4^a trimestre de 2023 e 1^o trimestre de 2024, todos os pontos se mantiveram com concentrações nulas ou abaixo de 1%VolCH₄

➤ Análise de H₂S e CO no período de Abril de 2014 a Março de 2024

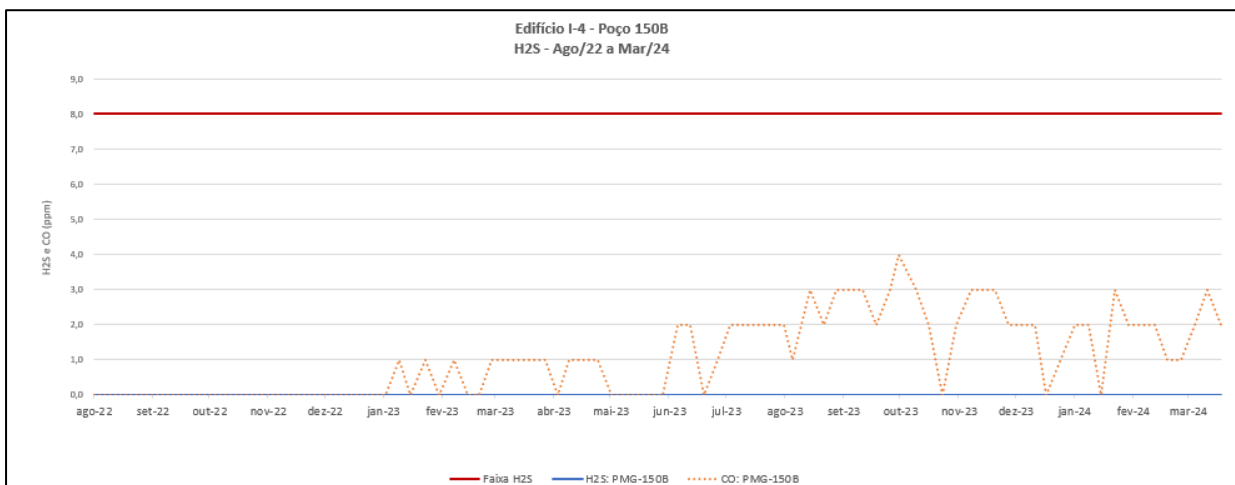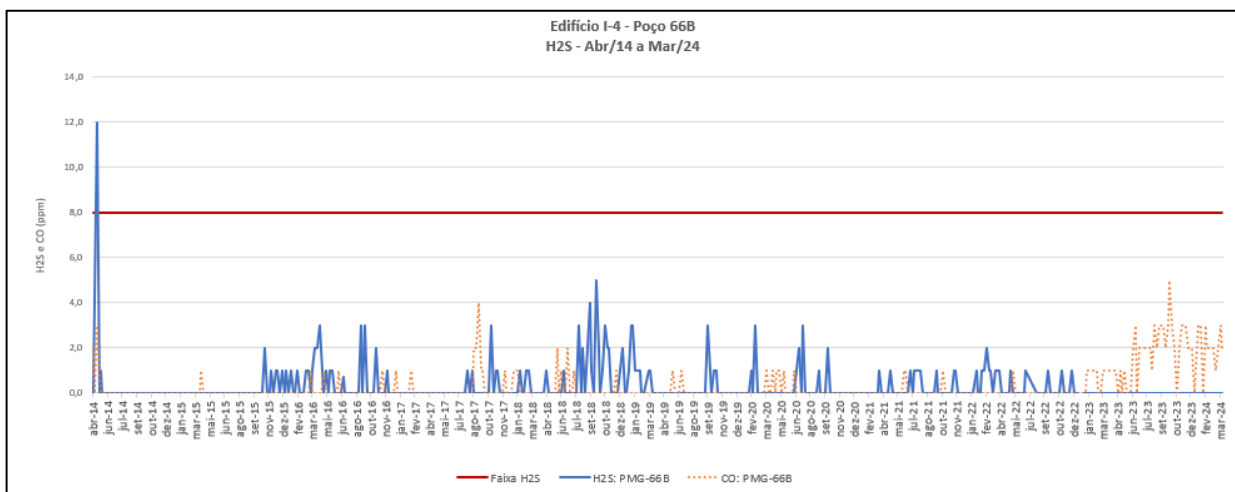

Os gráficos de H₂S e CO demonstraram uma variação entre 1,0 e 5,0 ppm para o H₂S e entre 1,0 e 5,0 para o CO no PMG-66B, ambos abaixo do índice de inflamabilidade. No PMG-150B, anteriormente os valores se apresentavam nulos, a partir de janeiro de 2023 os valores

variaram de 0 a 4,0 ppm. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica, porém a proporção é muito menor quando comparado ao CH₄.




CONJUNTO LABORATORIAL:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2024

Poços existentes: 17 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: 12 A1; (PMG-49B, PMG-51B, PMG-54B)

Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

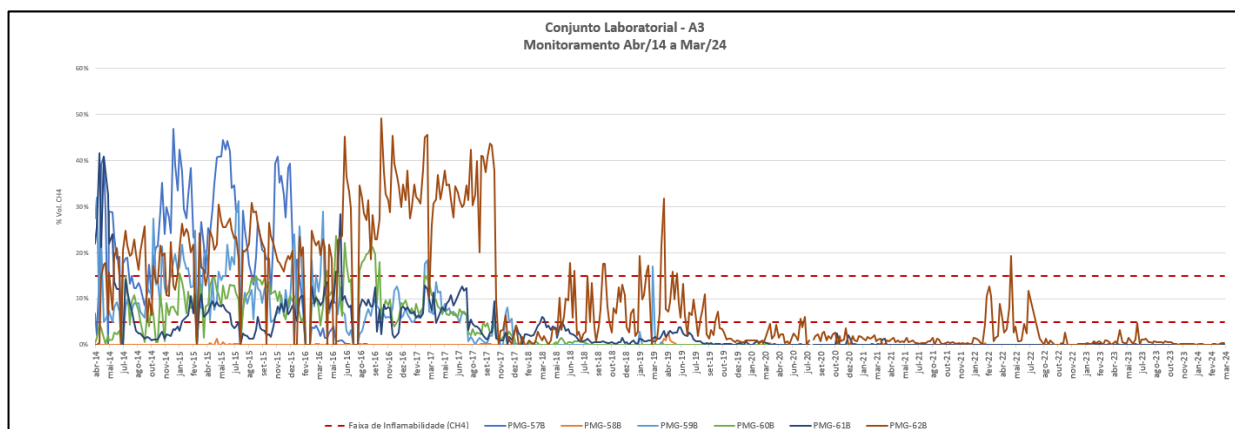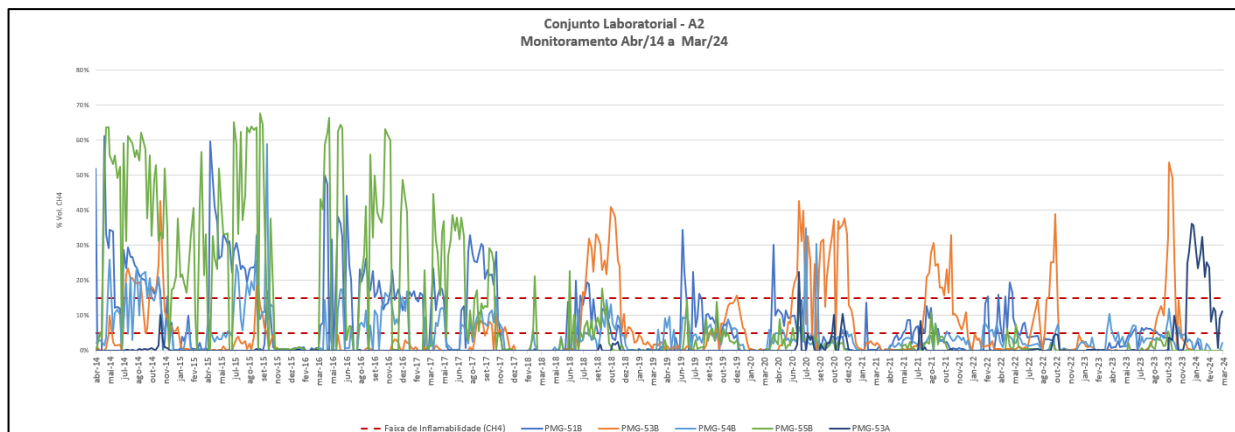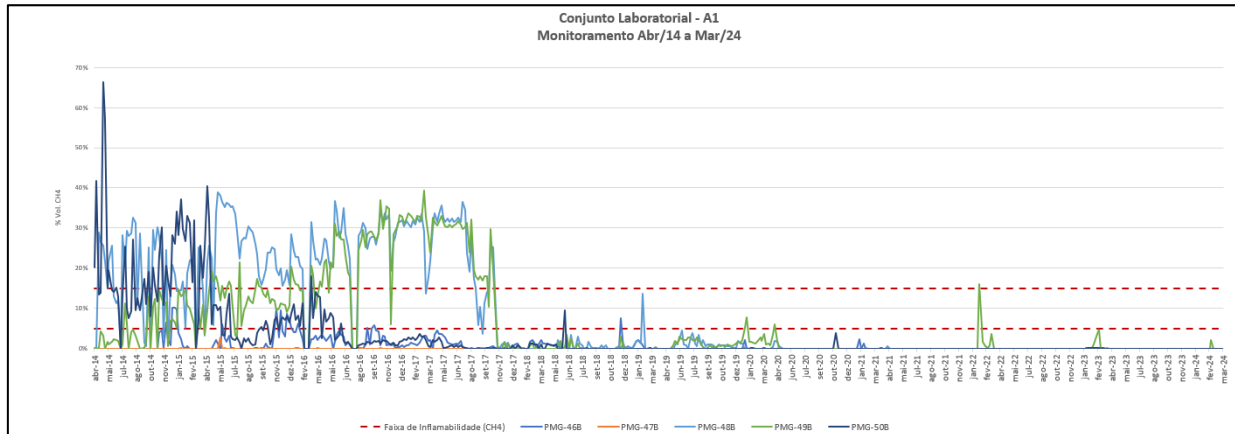

De forma geral, nota-se que os poços dos conjuntos laboratoriais A1 e A3 apresentaram concentrações acima da faixa de inflamabilidade de 2014 a 2017, passando a ficar abaixo de 5% desde então, com exceção do PMG-62B, que em 2019 apresentou concentrações de 5,0 a 30,0% VolCH₄.

No ano de 2021, observa-se que o conjunto laboratorial A2 apresentou um aumento em suas concentrações, passando a demonstrar valores acima da faixa de inflamabilidade nos poços PMG-51B, PMG-53A/B, PMG-54B e PMG-55B de até 32,90 % VolCH₄. Os poços PMG-46B, PMG-52B, PMG-61B e PMG-62B, durante todo referido ano demonstraram concentrações abaixo de 5%, chegando próximo a concentrações nulas.

Em 2022 nota-se um aumento nas concentrações dos três conjuntos laboratoriais (A1, A2 e A3), apresentando concentrações acima da faixa de inflamabilidade nos poços PMG-49B, PMG-51B, PMG-53-B, PMG-54B, PMG-55B e PMG-62B. No último trimestre os valores se mantiveram abaixo dos níveis de inflamabilidade.

Detectou-se concentração de Metano sob a laje do edifício Conjunto Laboratorial A2, no poço PMG-53A, em concentrações variáveis de 1,0 a 39,6% VolCH₄, em períodos pontuais. Este mesmo poço também apresentou concentrações nulas ou abaixo de 1% em outros períodos. Na porção profunda (PMG-53B) nota-se a persistência das concentrações, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (julho/2014), em valores variados, muitas vezes acima da faixa de inflamabilidade. No último trimestre de 2022, os valores se apresentaram abaixo do limite da faixa de inflamabilidade.

Nos meses de novembro de 2014, outubro de 2018 e junho a dezembro de 2021, foram detectadas concentrações de Metano acima de 1% no PMG-53A. Durante tal período os pontos de infraestrutura foram medidos com maior frequência e não foram detectadas concentrações de Metano na infraestrutura, indicando que a via de intrusão de vapores não se completou.

Observando os gráficos específicos das duas profundidades do conjunto monitorado (PMG-53 A e B) durante a linha do tempo de 2014 a 2021, percebe-se que tal situação é comum a este poço nesta época do ano, tendendo à diminuição das concentrações nos meses seguintes.

Também é possível notar que quando as concentrações na porção profunda (PMG-53B) superam valores a cerca de 25% VolCH₄ (junho a novembro/2014, julho a novembro/2018, junho a dezembro/2021), são detectadas concentrações na porção rasa (PMG-53A) iguais ou superiores a 1% VolCH₄. Nos mesmos meses citados, nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, houve aumento nas concentrações da porção profunda, porém em valores menores que 20% VolCH₄, e então na porção rasa verificou-se pequena influência destas concentrações, demonstrando valores sempre abaixo de 1% VolCH₄.

Nos anos de 2020 a 2021, o sistema de ventilação que opera para a área do A2 foi ajustado e teve sua pressão aumentada, variando de -2,0 a 20,0 mmHg, conforme o aumento das concentrações no poço PMG-53B, diminuindo assim a interferência na porção rasa (PMG-53A). Nos dois primeiros trimestres de 2022, as concentrações de Metano no PMG-53B se estiveram

acima do limite da faixa de inflamabilidade de 10% de VolCH₄ e as concentrações no PMG-53A abaixo da faixa de inflamabilidade de 5%.

No primeiro trimestre de 2023, nota-se estabilidade dos valores de CH₄, se mantendo abaixo do nível de inflamabilidade de 5% para a porção rasa (PMG-53A), na porção mais profunda verificaram-se níveis acima do 1% VolCH₄, no entanto ainda abaixo da faixa de inflamabilidade.

No segundo trimestre de 2023, o PMG-53 apresentou concentrações abaixo de 1%VolCH₄ e portanto abaixo da faixa de inflamabilidade tanto da faixa rasa quanto a profunda.

No terceiro trimestre de 2023, o PMG-53 apresentou concentrações dentro da faixa de inflamabilidade no mês de agosto e setembro acima da faixa de inflamabilidade, no mês de julho no entanto os valores se encontravam abaixo de 5%VolCH₄. No fim do trimestre, as concentrações ultrapassaram a faixa de inflamabilidade (>15%VolCH₄) e acionado o plano de ação, como se tratava de medição no último dia do trimestre, as ações serão tomadas no próximo trimestre.

Detectou-se concentração de Metano sob a laje do edifício Conjunto Laboratorial A2, na porção profunda do poço PMG-54, em concentrações variáveis de 1,0 a 58,8% VolCH₄, em períodos pontuais. Este mesmo poço também apresentou concentrações nulas ou abaixo de 1% em outros períodos. Nota-se a persistência das concentrações, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (julho/2014), em valores variados, muitas vezes acima da faixa de inflamabilidade. Os valores identificados na porção profunda (PMG-54B) estiveram acima da faixa de inflamabilidade até o ano de 2020, quando os níveis de mantiveram dentro e abaixo da mesma.

No último trimestre de 2022, os valores se apresentaram abaixo do limite da faixa de inflamabilidade. O primeiro semestre de 2023, apresentaram concentrações acima de 1% VolCH₄ e acima de 5% VolCH₄, ou seja, acima da faixa de inflamabilidade por alguns períodos. A porção rasa do PMG-54 não apresentou concentrações acima de 1% VolCH₄ durante todo o período de avaliação.

No segundo trimestre de 2023, o PMG-54 apresentou concentrações acima de 5%VolCH₄ (dentro da faixa de inflamabilidade), sendo obtido o valor de pico de concentração de 7,10%VolCH₄ em 14 de junho de 2023. A porção rasa não apresentou concentrações. No terceiro trimestre, o PMG-54A/B apresentou concentrações abaixo da concentração de 5%VolCH₄.



Durante o segundo trimestre de 2023, o PMG-139 não apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄. Os PMG-51B, PMG-62B, PMG-140 B e PMG-141B apesar de apresentarem concentrações acima de 1%Vol CH₄, os valores se mantiveram abaixo de 5%VolCH₄ e portanto abaixo da faixa de Inflamabilidade.


No terceiro trimestre de 2023, o PMG-139B apresentou concentrações dentro e acima da faixa de inflamabilidade, bem como o PMG-140B. O PMG-141B apresentou apenas uma medição dentro a faixa de inflamabilidade.

No quarto trimestre de 2023, os poços PMG-51, PMG-54, PMG-55, PMG-140 e PMG-141 apresentaram concentrações acima de 5%VolCH₄ (dentro da faixa de inflamabilidade) nas porções profundas, com concentração de pico de 70%VolCH₄ em 18 de outubro de 2023 no PMG-139B. Os poços PMG-53 e PMG-139 apresentaram concentrações nas porções rasas e profundas (horizontes A e B), estas indicaram a necessidade de empregar o plano de ação, que consiste na medição desses poços em variados períodos do dia durante os 20 dias, e em meados de outubro as concentrações apresentaram-se nulas.

No 1º trimestre de 2024, os poços PMG-49, PMG-51 e PMG-54 apresentaram concentrações acima de 1%VolCH₄, porém abaixo da faixa de inflamabilidade nas porções mais profundas, no entanto, apenas o PMG-54 apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄ no mês de março/24.

➤ Análise de H₂S e CO no período de Abril de 2014 a Março de 2024

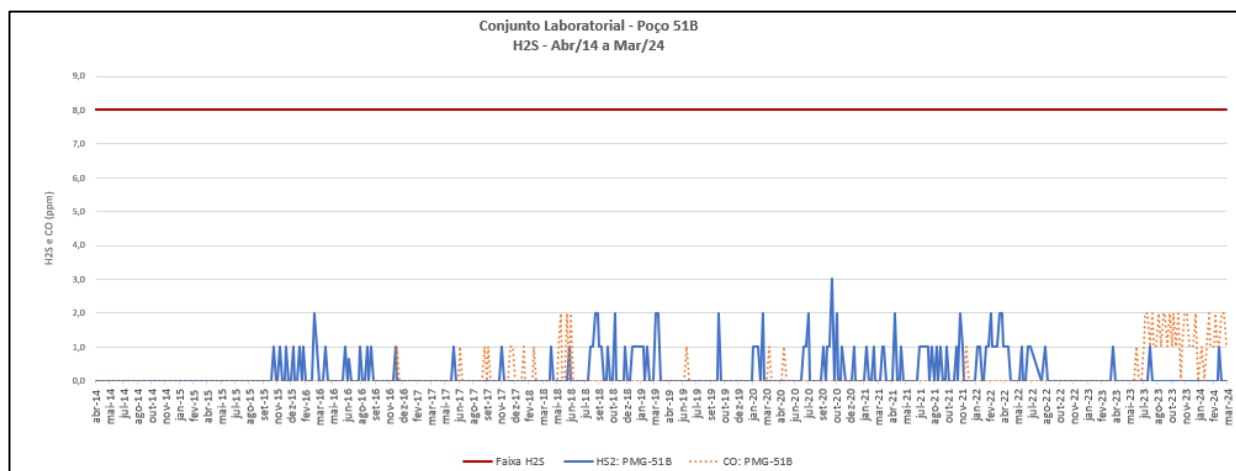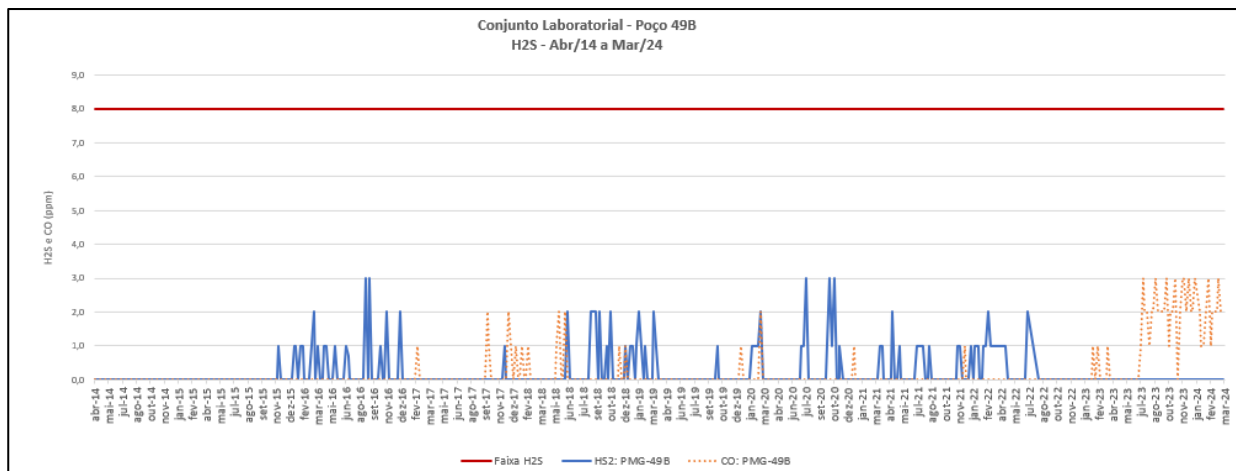

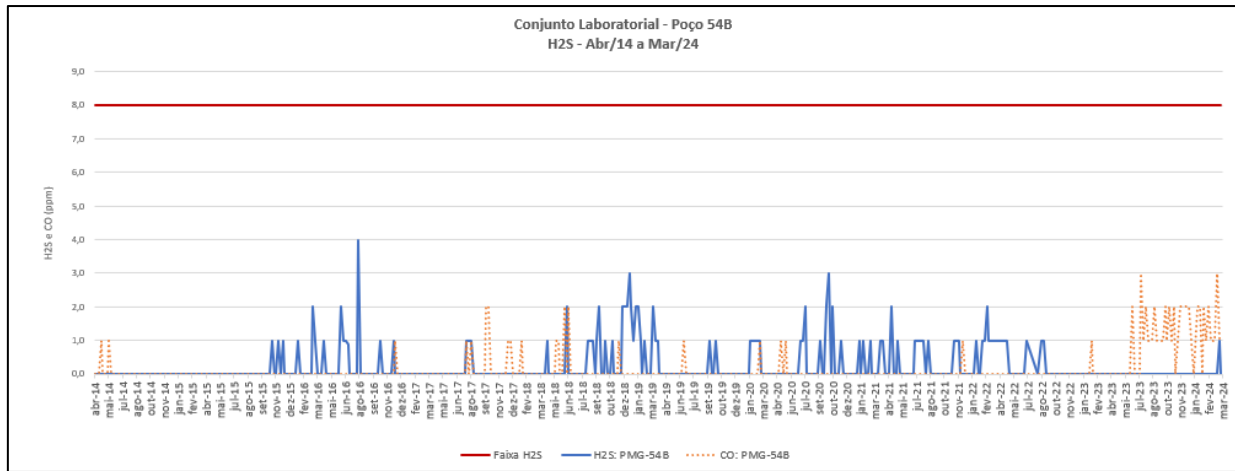

Os gráficos de H₂S e CO demonstram que houve uma variação para H₂S e CO, ambos abaixo do índice de inflamabilidade. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica, porém a proporção é muito menor quando comparado ao CH₄.




BLOCO INICIAL:


➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2024

Poços existentes: 14 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: 1 (PMG-05B)

Deteccção (>1%) sob a laje: Nenhuma

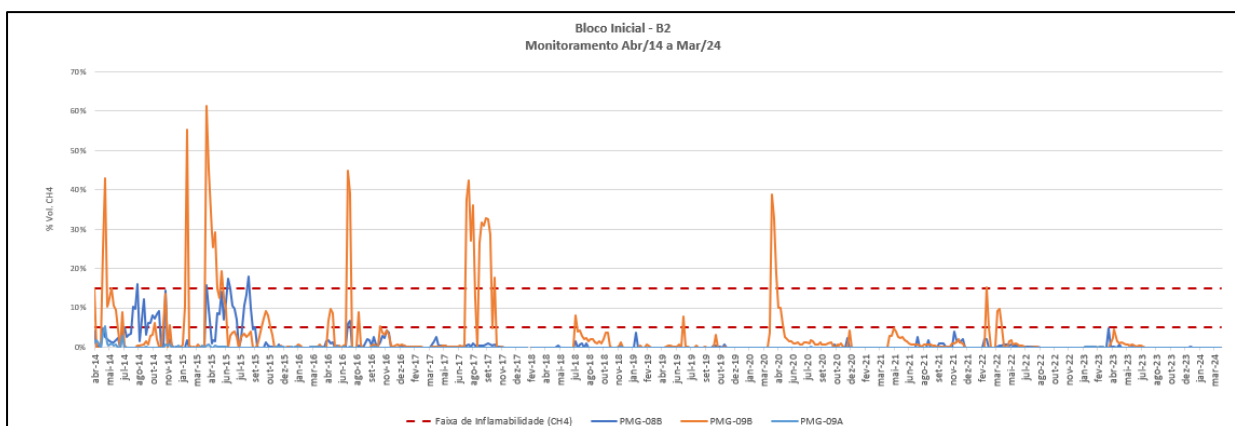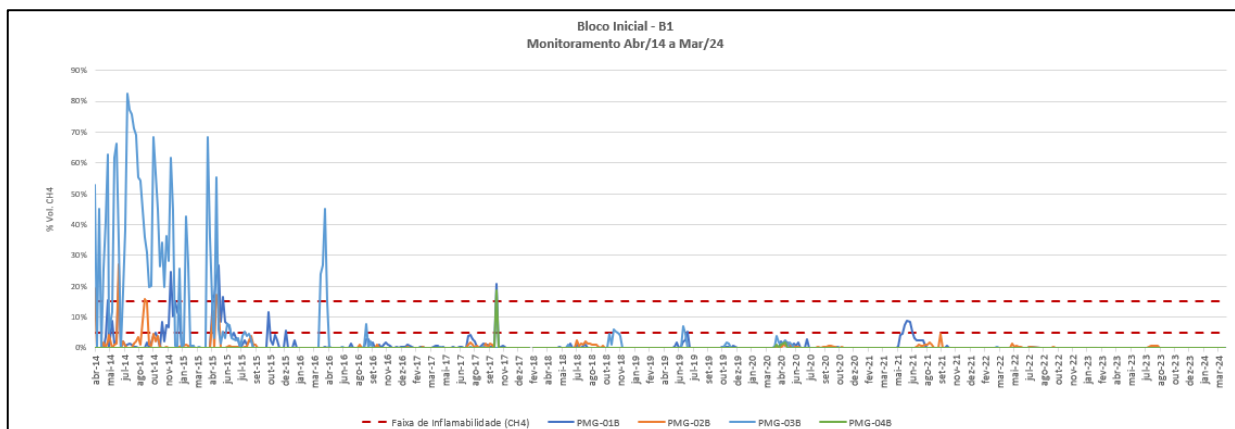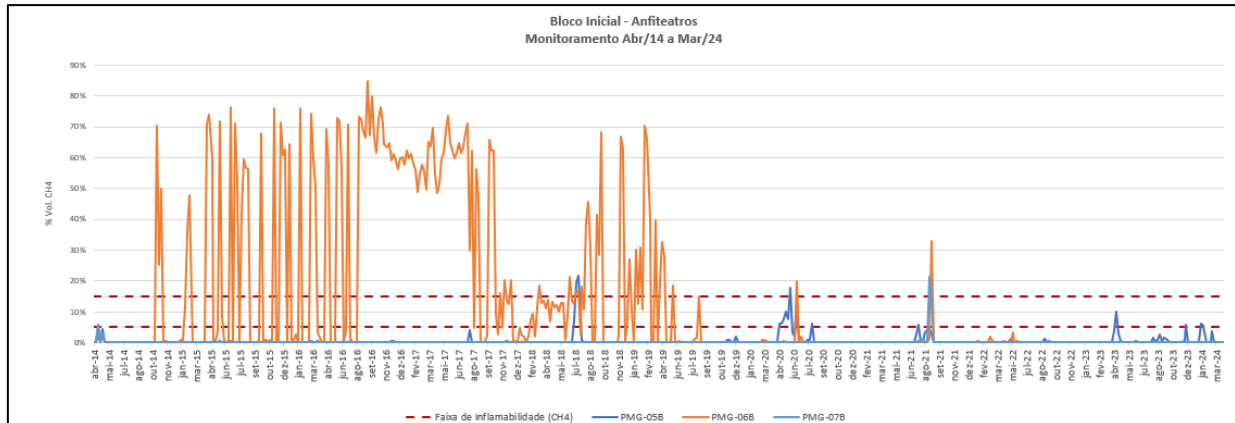

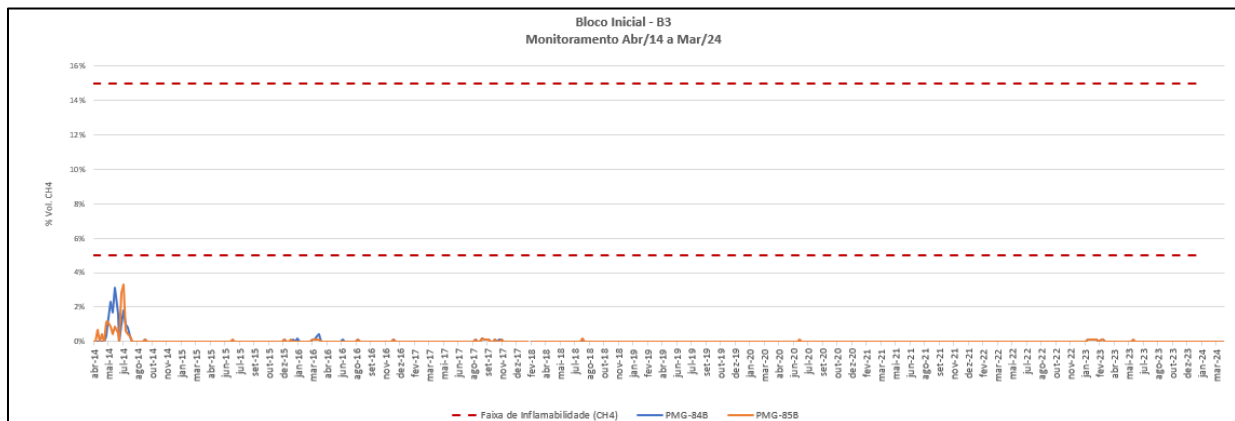

No Bloco dos Anfiteatros, o PMG-06B apresentou persistência das concentrações de Metano durante os anos de monitoramento, alcançando valores de 15 até 80% VolCH₄. Os poços PMG-05B e PMG-07B demonstraram concentrações eventuais de Metano no solo, porém sem persistência. Em 2022 somente o PMG-05B e o PMG-06B apresentaram concentrações de Metano, sendo estas inferiores a 5%, no último semestre se apresentando nulos.

No primeiro trimestre de 2023, as concentrações de todos os poços se mantiveram abaixo do nível de inflamabilidade, e não apresentaram valores acima de 1% VolCH₄. No segundo trimestre de 2023, somente o PMG-05B e apresentou concentração dentro da faixa de inflamabilidade em apenas uma das medições (17 de abril de 2023, considerado anômalo) as demais medições se mantiveram abaixo de 5%VolCH₄. No terceiro trimestre, o PMG-05 apresentou concentrações abaixo de 5%VolCH₄. No quarto trimestre de 2023, o PMG-05 apresentou concentrações dentro da faixa de inflamabilidade, no entanto considerado *outline*, já que a concentração não se repetiu.

No 1º trimestre de 2024, o PMG-05 apresentou concentrações dentro da faixa de inflamabilidade (maior que 5%VolCH₄ e menor que 15%VolCH₄) para as poções mais profundas. No entanto, foram identificados em apenas dois dias, e acima de 1%VolCH₄ em outro dia, após esses, não foram identificados acima dessa concentração.


No Bloco B1, os PMG-01B e PMG-02B apresentaram persistência das concentrações de Metano durante os anos monitorados, alcançando valores maiores de 15% até o ano de 2015 e, a partir de 2016, demonstrando valores menores, abaixo de 5%. O PMG-01B em 2021 apresentou concentrações dentro da faixa de inflamabilidade, atingindo valores de até 8,9% VolCH₄.

O PMG-03B demonstra comportamento semelhante, alcançando valores de até 80% em 2014 e decaindo para 5% em novembro/2018. Em 2021, o PMG-03B apresentou somente concentrações esporádicas abaixo de 1%. No PMG-04B detectou-se concentração de Metano no solo, porém sem continuidade (uma vez em outubro/2017). Em 2022 somente o PMG-02B apresentou concentrações, sendo estas abaixo de 5%, no último trimestre apresentaram concentrações nulas. Em 2023 e 1º trimestre de 2024, as concentrações no Bloco B1 se encontravam nulas, bem como nos últimos trimestres analisados.

No Bloco B2, foram identificadas concentrações de metano acima do nível de inflamabilidade (15% VolCH₄) no período de abril de 2014 a março de 2022. Em maio de 2022, as concentrações se mantiveram abaixo da faixa de inflamabilidade em todos os poços de monitoramento. No primeiro trimestre de 2023, as concentrações do Bloco B2 se apresentaram nulas, exceto pelo ponto PMG-08B que apresentou concentração acima de 1% VolCH₄ em apenas uma medição realizada no mês de março. No segundo trimestre, somente o PMG-09B apresentou concentração acima de 1%VolCH₄, no entanto abaixo da faixa de inflamabilidade. No 4º trimestre de 2023 e 1º trimestre de 2024 não foram apresentadas concentrações acima de 1% VolCH₄.

No Bloco B3, os PMG-84B e PMG-85B apresentaram concentrações de Metano no período de abril a outubro de 2014. Posteriormente à isso, as concentrações se mantiveram nulas ou abaixo de 1%.

➤ Análise de H₂S e CO no período de Abril de 2014 a Março de 2024

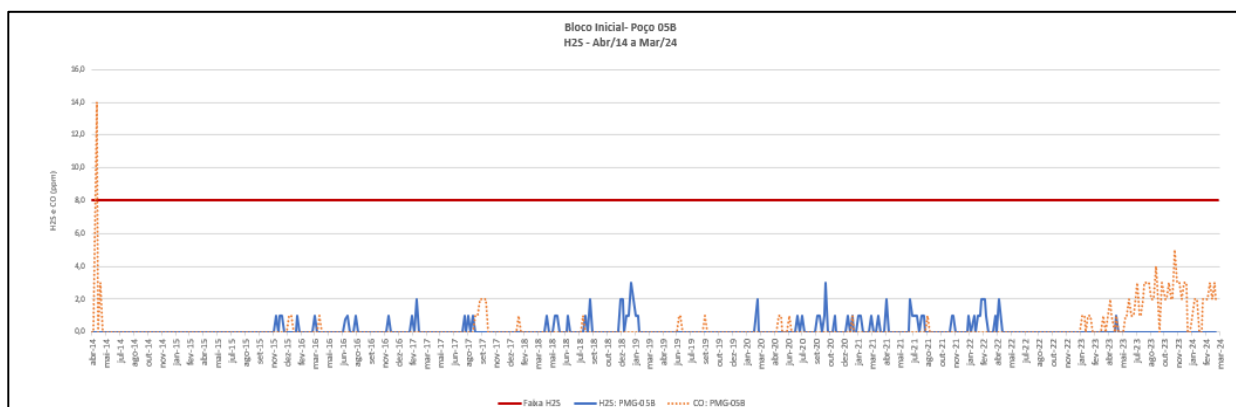

O gráfico de H₂S e CO demonstra que houve uma variação entre 1,0 e 3,0 ppm para H₂S e 1,0 e 6,0 para CO, ambos abaixo do índice de inflamabilidade. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica, porém a proporção é muito menor quando comparado ao CH₄. No último semestre de 2022, as concentrações se apresentaram nulas. No primeiro trimestre de 2023, as concentrações de CO apresentaram variações de concentração de 0 a 1,0 ppm. No terceiro trimestre de 2023, as concentrações de CO apresentaram pico de 4,0 ppm, enquanto as medições de H₂S estiveram nulas. No quarto trimestre de 2023, as concentrações de H₂S estiveram nulas, e as concentrações de CO apresentaram pico de 5,0 ppm.

O 1º trimestre de 2024, as concentrações de H₂S estiveram nulas, e as concentrações de CO apresentaram concentrações de pico 3,0 ppm.


ENFERMARIA:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2024

Poços existentes: 07 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: 01 (PMG-74B)

Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

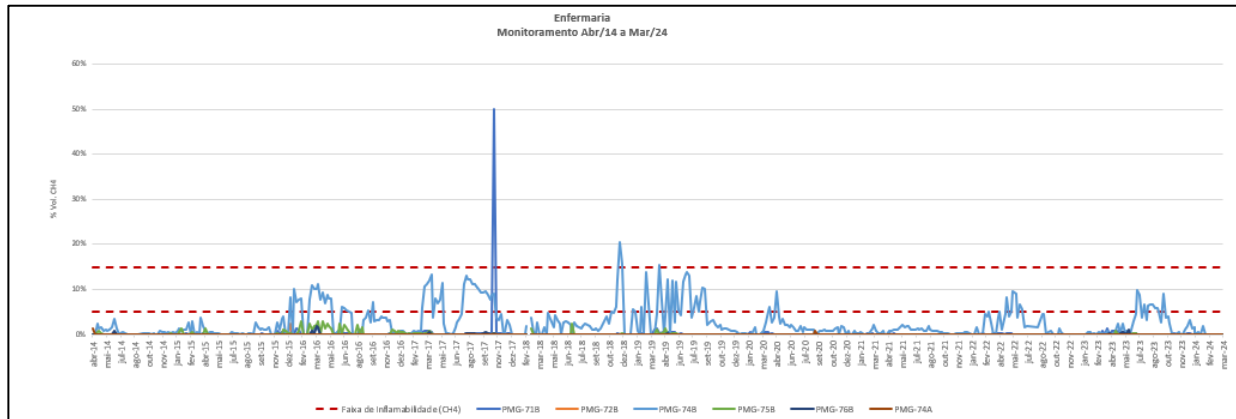

Durante os 10 anos de monitoramento foi detectada somente uma vez a concentração de Metano sob a laje do edifício, no poço PMG-74A, com concentração de 1,4% em abril de 2014. Nos poços da porção profunda observa-se a persistência das concentrações, principalmente no PMG-74B, mesmo após o início da operação do sistema de ventilação (julho/2014), prevalecendo até o monitoramento atual (2023).

Em outros quatro poços também foram detectadas concentrações de Metano no solo, porém sem continuidade ou com valores abaixo da faixa de inflamabilidade, sendo eles: PMG-71B (de 1,1 a 1,6% entre janeiro e agosto/16 e 50% 1 vez em outubro/17); PMG-72B (2,5% em janeiro/16); PMG-75B (valores eventuais entre 1,0 e 3,0 %) e PMG-76B (cerca de 1% entre mar e abril/16). Em 2022, os valores permaneceram nulos ou abaixo de 1%, exceto o PMG-74B que apresentou valores nulos apenas em dezembro de 2022.

No primeiro trimestre de 2023, os valores permaneceram nulos ou abaixo de 1%, exceto pelo PMG-71B, que apresentou valores acima de 1% VolCH₄ em uma medição, no entanto abaixo da faixa de inflamabilidade de 5% VolCH₄ no mês de março de 2023.


No segundo trimestre de 2023, o PMG-74B apresentou concentrações acima de 5%VolCH₄, sendo a concentração mais alta de 9,80%VolCH₄. O PMG-76B apresentou concentração acima de 1%VolCH₄ durante apenas uma das medições, considerado anômalo.

No terceiro trimestre de 2023, o PMG-74B e PMG-165B apresentaram concentrações acima de 5%VolCH₄, dentro da faixa de inflamabilidade. No quarto trimestre, somente o PMG-74B apresentou concentrações acima de 1%, porém abaixo da faixa de inflamabilidade (5%VolCH₄).

O 1º trimestre de 2024, o PMG-74B apresentou concentrações acima de 1%VolCH₄, no entanto, abaixo da faixa de inflamabilidade.

CAT-1 E INCUBADORA (CAT-2):

- Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2024
Poços existentes: 13 pares (07 no CAT-1 e 06 no CAT-2)
Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma
Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

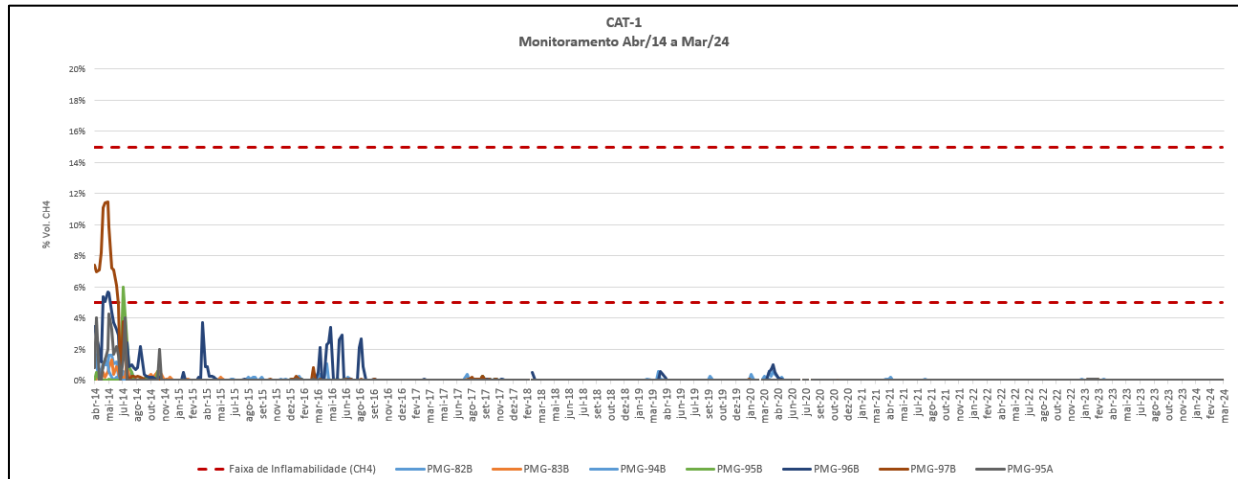

Ao longo de 10 anos de monitoramento foi detectada concentração de Metano sob a laje do edifício Enfermaria apenas no PMG-95A, com concentrações variáveis entre 1,0 a 4,0% VoCH₄, que perduraram de abril a novembro de 2014. Posteriormente, as leituras neste ponto permaneceram nulas ou abaixo de 1%.

Nos poços da porção profunda nota-se a redução das concentrações em todos os poços, após o início da operação do sistema de ventilação em julho/2014, sendo que após isso estas se mantiveram abaixo de 5% de CH₄ ou nulas.

No primeiro trimestre de 2023, as concentrações em todos os poços se apresentaram nulas ou abaixo de 1% VolCH₄.

No segundo, terceiro e quarto trimestre de 2023, as concentrações em todos os poços se mantiveram nulas ou abaixo de 1% VolCH₄. O 1º trimestre de 2024, as concentrações estiveram abaixo de 1%VolCH₄ ou nulas.


GINÁSIO:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2024

Poços existentes: 3 pares + 08 poços

Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma

Deteccão (>1%) sob a laje: Nenhuma

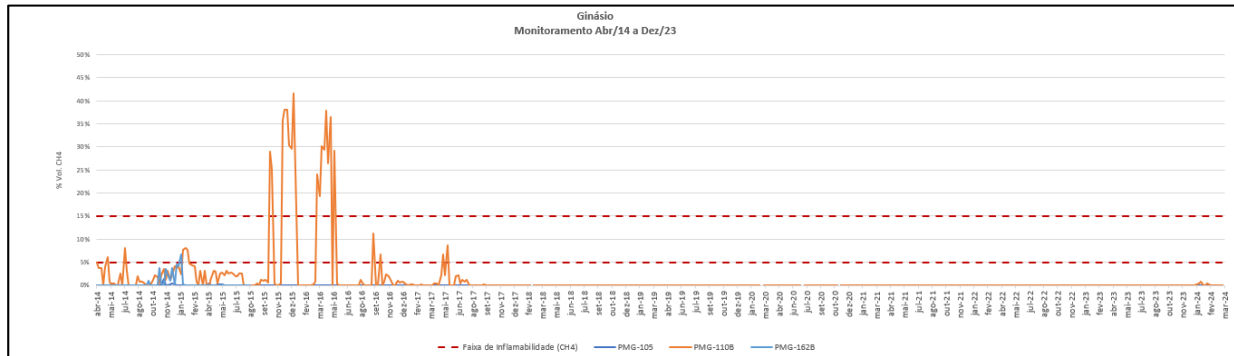

Ao longo dos anos de monitoramento não foram detectadas concentrações de Metano sob a laje do edifício. Percebe-se que com o início da operação do sistema de ventilação (setembro/15) houve um aumento inicial das concentrações no PMG-110B, mas que a partir de julho/2017 os valores das concentrações foram reduzidos para abaixo de 1% ou nulos, permanecendo dessa forma até então.

O PMG-162B, porção rasa do poço de monitoramento apresentou concentrações de nulas a inferior a 1% VolCH₄ até janeiro de 2023. Após esse período as concentrações variam acima de 1% até o valor nulo, no entanto abaixo do nível de inflamabilidade de 5% VolCH₄.

No segundo trimestre de 2023, o PMG-162 apresentou concentração acima de 1%VolCH₄ durante o mês de abril de 2023, e acima de 5%VolCH₄ em maio de 2023, durante o mês de junho de 2023, os valores voltaram a se apresentar nulos ou abaixo de 1%.

No terceiro e quarto trimestre de 2023, os valores de todos os poços apresentaram valores nulos. No 1º trimestre de 2024, os valores se apresentaram nulos ou abaixo de 1%.

GUARDA UNIVERSITÁRIA:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2024

Poços existentes: 3 pares

Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhum

Detecção (>1%) sob a laje: Nenhuma

O sistema de ventilação foi iniciado em julho de 2014 e os poços de monitoramento da guarda universitária foram instalados em julho de 2015. Nenhum par apresentou concentrações significativas de Metano (>1%VolCH₄) durante todo o período de monitoramento.

O sistema de ventilação no edifício da guarda universitária foi desligado e o monitoramento foi interrompido em maio/2019 devido à reforma do prédio. Em junho de 2020 a obra foi finalizada e constatou-se que os poços instalados na área foram tamponados, portanto, foi realizada a reinstalação destes pontos. O monitoramento foi retomado e as concentrações se mantiveram nulas.

Em 2021 foi possível observar pontualmente no mês de outubro, concentrações de até 1,30% de Metano no PMG-126B. Contudo, nos demais poços foram verificados valores abaixo de 1% ou nulos.

Em 2022 e 2023, todos os poços se mantiveram nulos. No primeiro trimestre de 2024, os poços estiveram nulos ou abaixo de 1%.


PORTARIA P3:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2024

Poços existentes: 2 Trios

Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma

Deteção (>1%) sob a laje: Nenhuma

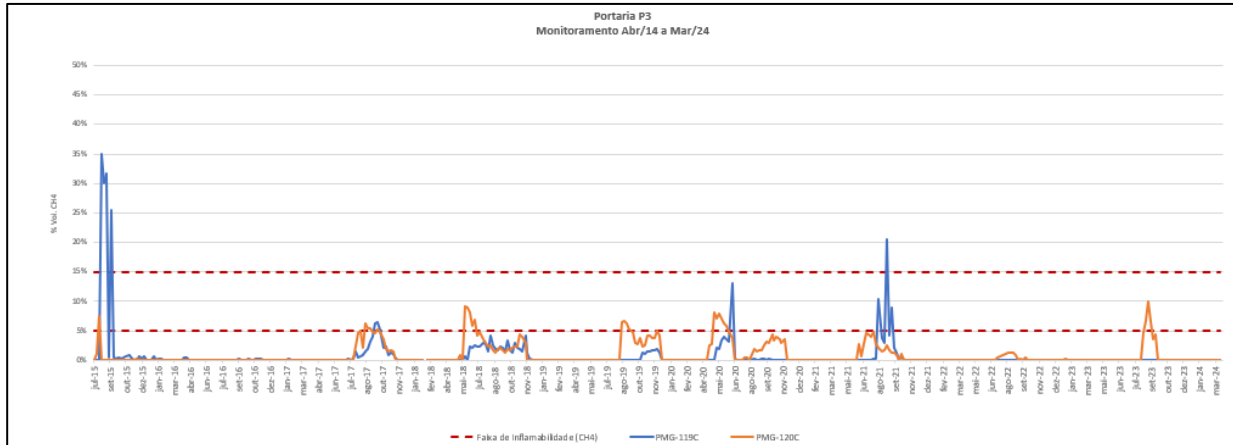

Na Portaria P3, foi detectada uma segunda laje sob o piso. Sendo assim, os poços de monitoramento neste edifício foram instalados em três profundidades: A (sob a primeira laje ~0,30m); B (sob a segunda laje, no tapete de brita ~1,00m); e C (no solo ~1,30m). Neste edifício o sistema de ventilação foi iniciado em junho/2014 e os poços de monitoramento instalados em julho/2015.

Ao longo do monitoramento, entre ago/2015 e dez/2020, não foram detectadas concentrações de Metano sob as lajes do edifício (0,30 a 0,50m). Nota-se que os meses seguintes à instalação dos poços de monitoramento (agosto e setembro/2015) foram detectadas as concentrações mais elevadas nos poços profundos e, posteriormente estas concentrações mantiveram-se nulas ou abaixo de 1%VolCH₄.

Nos anos de 2020 e 2021, os poços PMG-119C e PMG-120C apresentaram concentrações de até 20,60%Vol CH₄. É possível observar que o aumento das concentrações sempre acontece no segundo semestre do ano.

Em 2022, as concentrações de Metano no PMG-119C se mantiveram nulas e a do PMG-120C esteve inferior a 5% VolCH₄, apresentando valor nulo ao fim do trimestre. Em 2023, as concentrações de metano se mantiveram nulas ou em valor inferior a 1% VolCH₄ em ambos os poços de monitoramento de gás.

No segundo trimestre de 2023, as concentrações se mantiveram nulas ou em valor inferior a 1%VolCH₄. No terceiro trimestre, o poço PMG-120C apresentaram concentrações dentro da faixa de inflamabilidade, atingindo o valor de até 9,90%VolCH₄.

No 4º trimestre de 2023, e 1º trimestre de 2024, todas as concentrações se mantiveram nulas ou abaixo de 1%VolCH₄.


TRANSPORTES:

➤ Análise de Metano no período de Abril de 2014 a Março de 2024

Poços existentes: 4 Pares

Poços que apresentaram concentração >1%: Nenhuma

Deteccção (>1%) sob a laje: Nenhuma

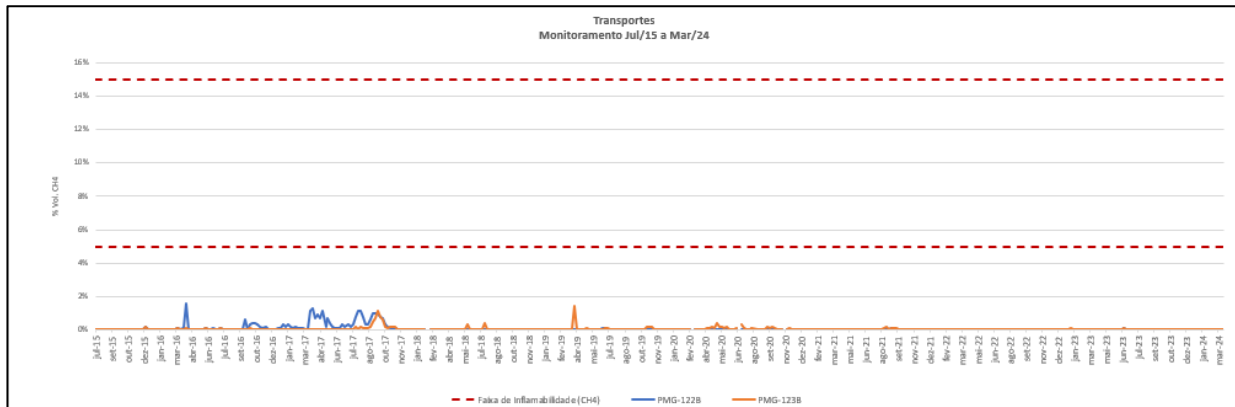

Neste edifício o sistema de ventilação foi iniciado em junho/2014 e os poços de monitoramento instalados em julho/2015.

Ao longo do monitoramento até o presente momento, não foram detectadas concentrações de Metano sob a laje do edifício. Eventualmente, na porção profunda, ocorrem detecções de metano variando entre 1,1 a 1,6%VolCH₄. Desde o final de 2021 as concentrações encontram-se nulas.

Em 2023, as concentrações foram identificadas nulas ou abaixo de 1% VolCH₄. O mesmo se repete no 1º trimestre de 2024.

6. RESULTADOS OBTIDOS NO 1º TRIMESTRE DE 2024

As medições no 1º trimestre de 2024 (janeiro a março/2024) ocorreram de forma efetiva nos poços de monitoramento e infraestrutura. Os sistemas de ventilação operaram normalmente.

Porém, durante o 1º trimestre de 2024, não houveram interrupções das medições. Ainda salienta-se que a operação dos sistemas de ventilação se manteve inalterada, operando por todo o período 24 horas por dia, 30 dias por mês.

Durante este trimestre, foram utilizados para medição dos gases os equipamentos BW nº de série SK317-003329, BW nº de série SK317-003332 e o GEM 5000 nº de série G500491.

Os resultados do monitoramento e operação foram compilados neste relatório trimestral de forma a abordar uma visão geral sobre a variação das concentrações de Metano na área de estudo, e principalmente avaliar a ocorrência de intrusão em ambientes fechados.

A seguir são apresentados os dados compilados de monitoramento (**Item 6.1**) e de operação dos sistemas (**Item 6.2**).

6.1. RESULTADOS DO MONITORAMENTO EM POÇOS E NA INFRAESTRUTURA

As medições realizadas nos poços de monitoramento indicaram que as concentrações de Metano acima de 1%Vol estão localizadas em pontos específicos da área de estudo e não abrangem toda a extensão dos edifícios, além de estarem localizadas nas porções mais profundas (cerca de 1,0m).

Os poços nas porções profundas que demonstraram concentrações acima de 1%VolCH₄ neste trimestre foram: PMG-05B, PMG-49B, PMG-51B, PMG-54B e PMG-74B.

Não foram detectadas concentração nos poços nas porções rasas.

Os demais poços rasos e profundos não demonstraram concentrações significativas (>1%Vol) de Metano.

Quanto às medições de H₂S e CO nos poços de monitoramento, foram obtidas concentrações de 4,0 e 1,0, respectivamente. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica. Para VOC, não foram constatadas concentrações no trimestre em questão.

Sobre as medidas de pressão, os valores entre -0,2 a 0,2 mBar são considerados como faixa de variação do equipamento. Sendo assim, foi observada pressão em alguns poços de monitoramento, positiva de até 5,04 e negativa de até -2,27 mBar. Essa variação de pressão pode relacionar-se com a operação dos sistemas e/ou com a variação do nível d'água local.

As medições na infraestrutura, que contemplaram ralos e caixas de passagem em todas as edificações, bem como os ambientes com pouca circulação de ar, detectaram concentrações nulas de Metano e de VOC, o que indica que, apesar das duas ocorrências de concentração de Metano em poços sob a laje, não houve a intrusão dos gases nos edifícios ou em ambientes fechados.

Os **Anexos 3 e 4** apresentam as planilhas de monitoramento semanal dos poços e quinzenal dos pontos de infraestrutura.

Visando facilitar a observação dos resultados obtidos, foram destacados na **Tabela 6.1.1** e na **Figura 6.1.1**, os poços que apresentaram concentração de Metano ao menos uma vez acima de 1%Vol durante o trimestre analisado, a fim de avaliar a distribuição dos poços com concentrações próximas ou na faixa de inflamabilidade de Metano.

A **Figura 6.1.2**, apresenta as plumas de isoconcentrações de Metano do 1º trimestre de 2024.


Os gráficos de concentrações a seguir exibem a variação da concentração semanal de Metano nos poços de monitoramento que demonstraram ao menos uma vez a presença de Metano acima de 1%Vol, a fim de acompanhar a concentração recorrente de Metano nos Poços, mesmo que abaixo da faixa de inflamabilidade.

O **Anexo 5** apresenta a evolução das concentrações e pressões obtidas desde o início do monitoramento em abril/14 até março/24.

Tabela 6.1.1 – Resultados dos poços com concentração igual ou maior que 1%VolCH₄ (Janeiro a Março/2024)

Distribuição dos Gases nos Edifícios (1º Trimestre/2024)													
EDIFÍCIOS	Total de Poços	jan/24				fev/24				mar/24			
		Poços ≥ 1%VolCH ₄	Posição	≥ Faixa 5-15%	Poços ≥ 1%VolCH ₄	Posição	≥ Faixa 5-15%	Poços ≥ 1%VolCH ₄	Posição	≥ Faixa 5-15%			
Edifício I-1	17 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum			
Edifício I-3 e I-5	21 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum			
Edifício I-4	12 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum			
Conjunto Laboratorial	17 Pares	2	-	-	-	2	PMG-49B	Profundo (1,00 m)	Não	1	-	-	-
			PMG-51B	Profundo (1,00 m)	Não		-	-	-		-	-	
			-	-	-		-	-	-		-	-	
			PMG-54B	Profundo (1,00 m)	Não		PMG-54B	Profundo (1,00 m)	Não		PMG-54B	Profundo (1,00 m)	Não
			-	-	-		-	-	-		-	-	
			-	-	-		-	-	-		-	-	
			-	-	-		-	-	-		-	-	
			-	-	-		-	-	-		-	-	
			-	-	-		-	-	-		-	-	
Bloco Inicial	14 Pares	1	PMG-05B	Profundo (1,00 m)	SIM	1	PMG-05B	Profundo (1,00 m)	Não	Nenhum			
			-	-	-		-	-					
Enfermaria	7 Pares	1	PMG-74B	Profundo (1,00 m)	Não	Nenhum			1	PMG-74B	Profundo (1,00 m)	Não	
			-	-	-					-	-		
CAT	7 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum			
Incubadora	6 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum			
Ginásio	11 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum			
Guarda Universitária	7 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum			
Portaria P3	2 Trios	Nenhum				Nenhum				Nenhum			
Transportes	4 Pares	Nenhum				Nenhum				Nenhum			

Fonte: Dados de Campo, Engesolve, 2024.

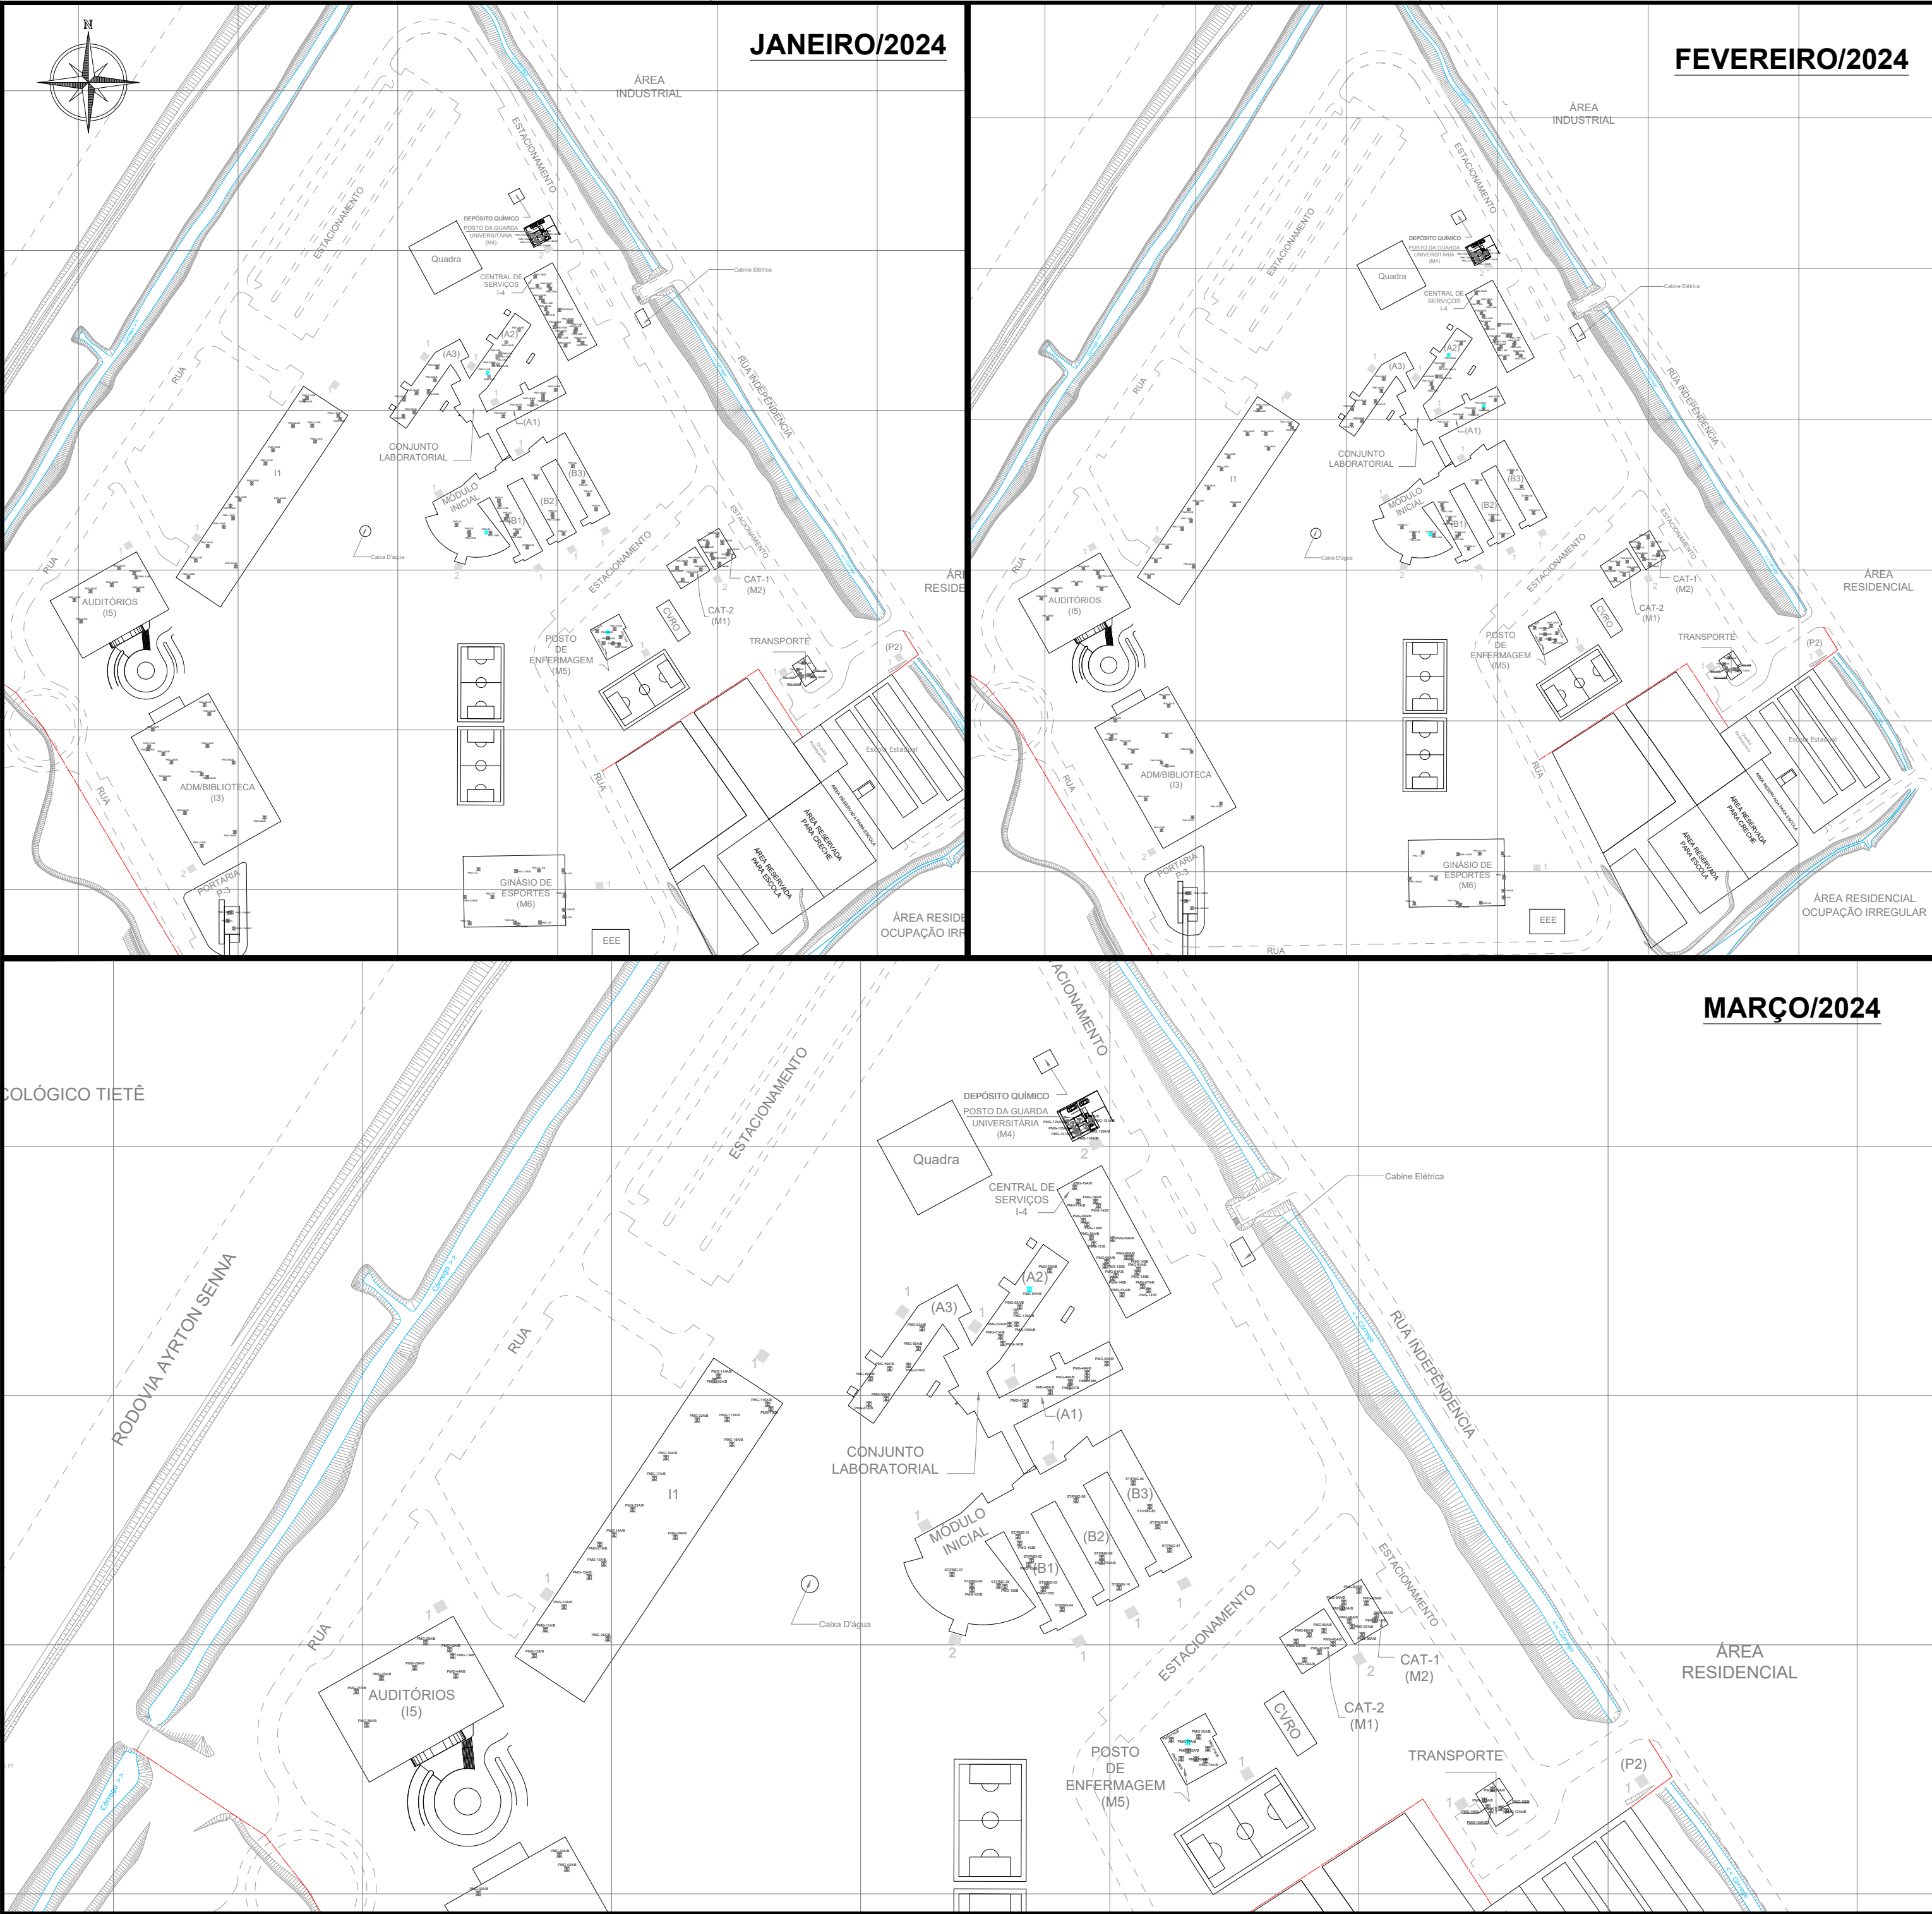

LEGENDA:

Taludes

Abrigo para equipamento

Quantidades de exaustores nos abrigos

Cerca de divisa

Guia e Estacionamento

Edificações

Poço de monitoramento de gás

Poço com concentração de CH4 >1% na porção rasa (subslab – 0,30 m)

Poço com concentração de CH4 > 1% na porção profunda (1,00 m)

031,56394,5126m

Escala Gráfica:

CLIENTE:

Universidade de São Paulo - USP Leste

PROJETO:

Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação

ENDEREÇO:

Rua Arlindo Bétio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP

TÍTULO:

Resultado da Distribuição das Concentrações de Metano Detectadas >1%Vol (Janeiro a Março/2024)

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Felipe Chufi

FIGURA Nº:

6.1.1



DATA:

MAR/2024

Engesolve

SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS

FORMATO: A2

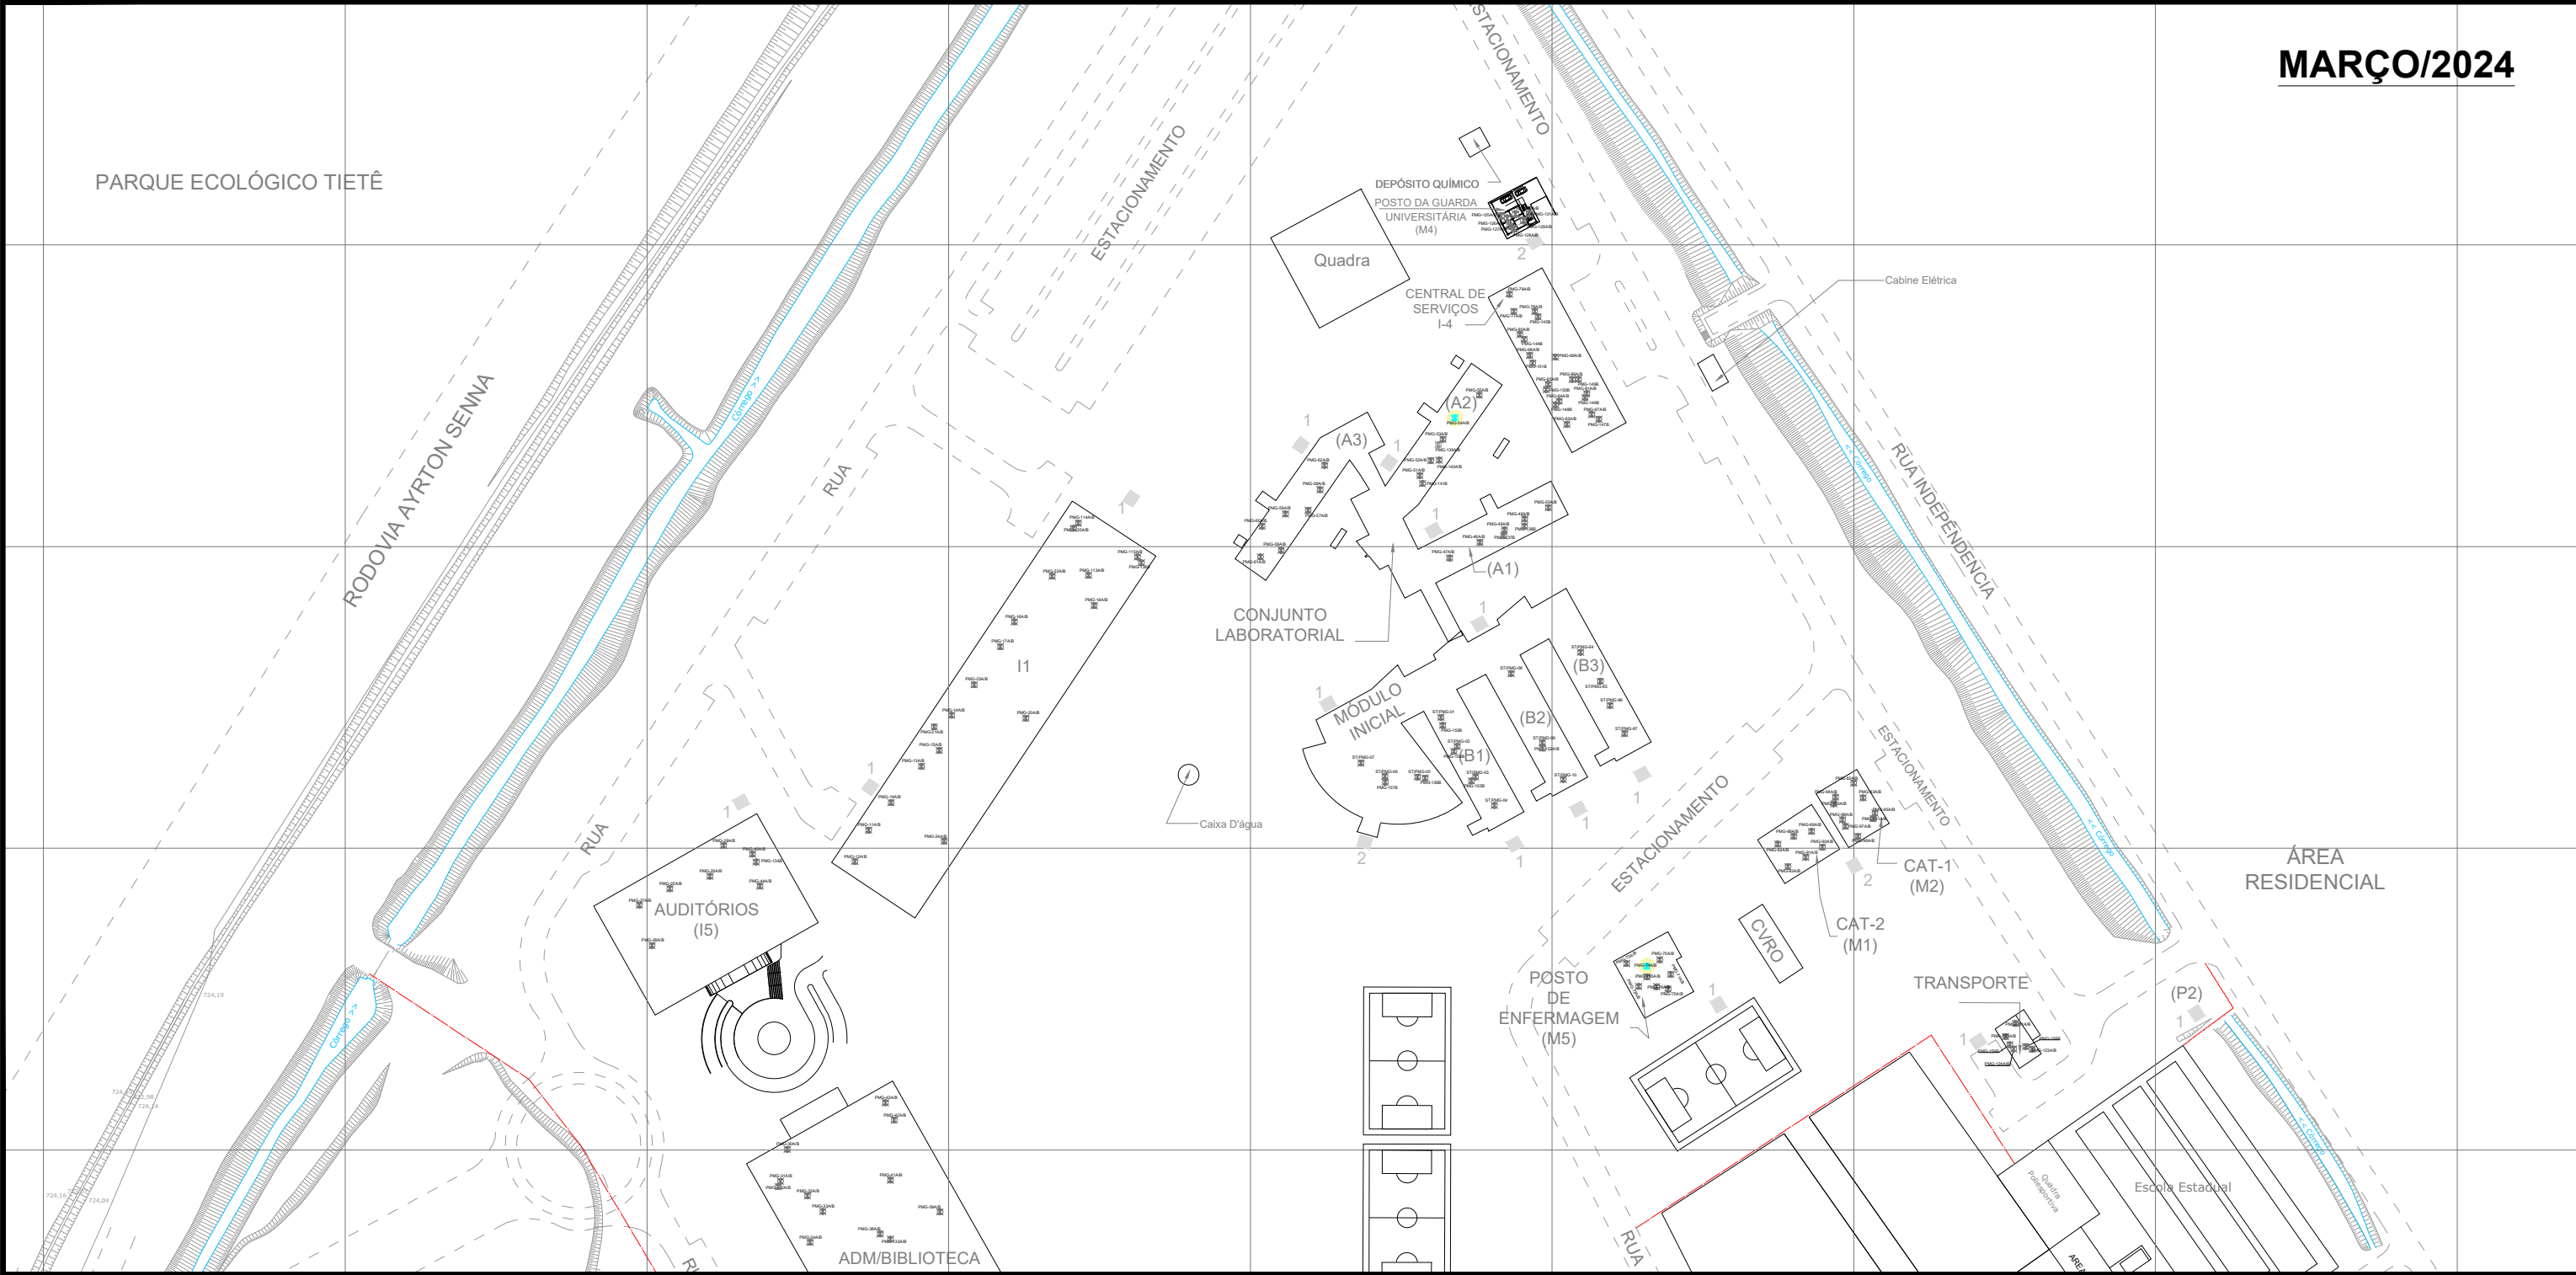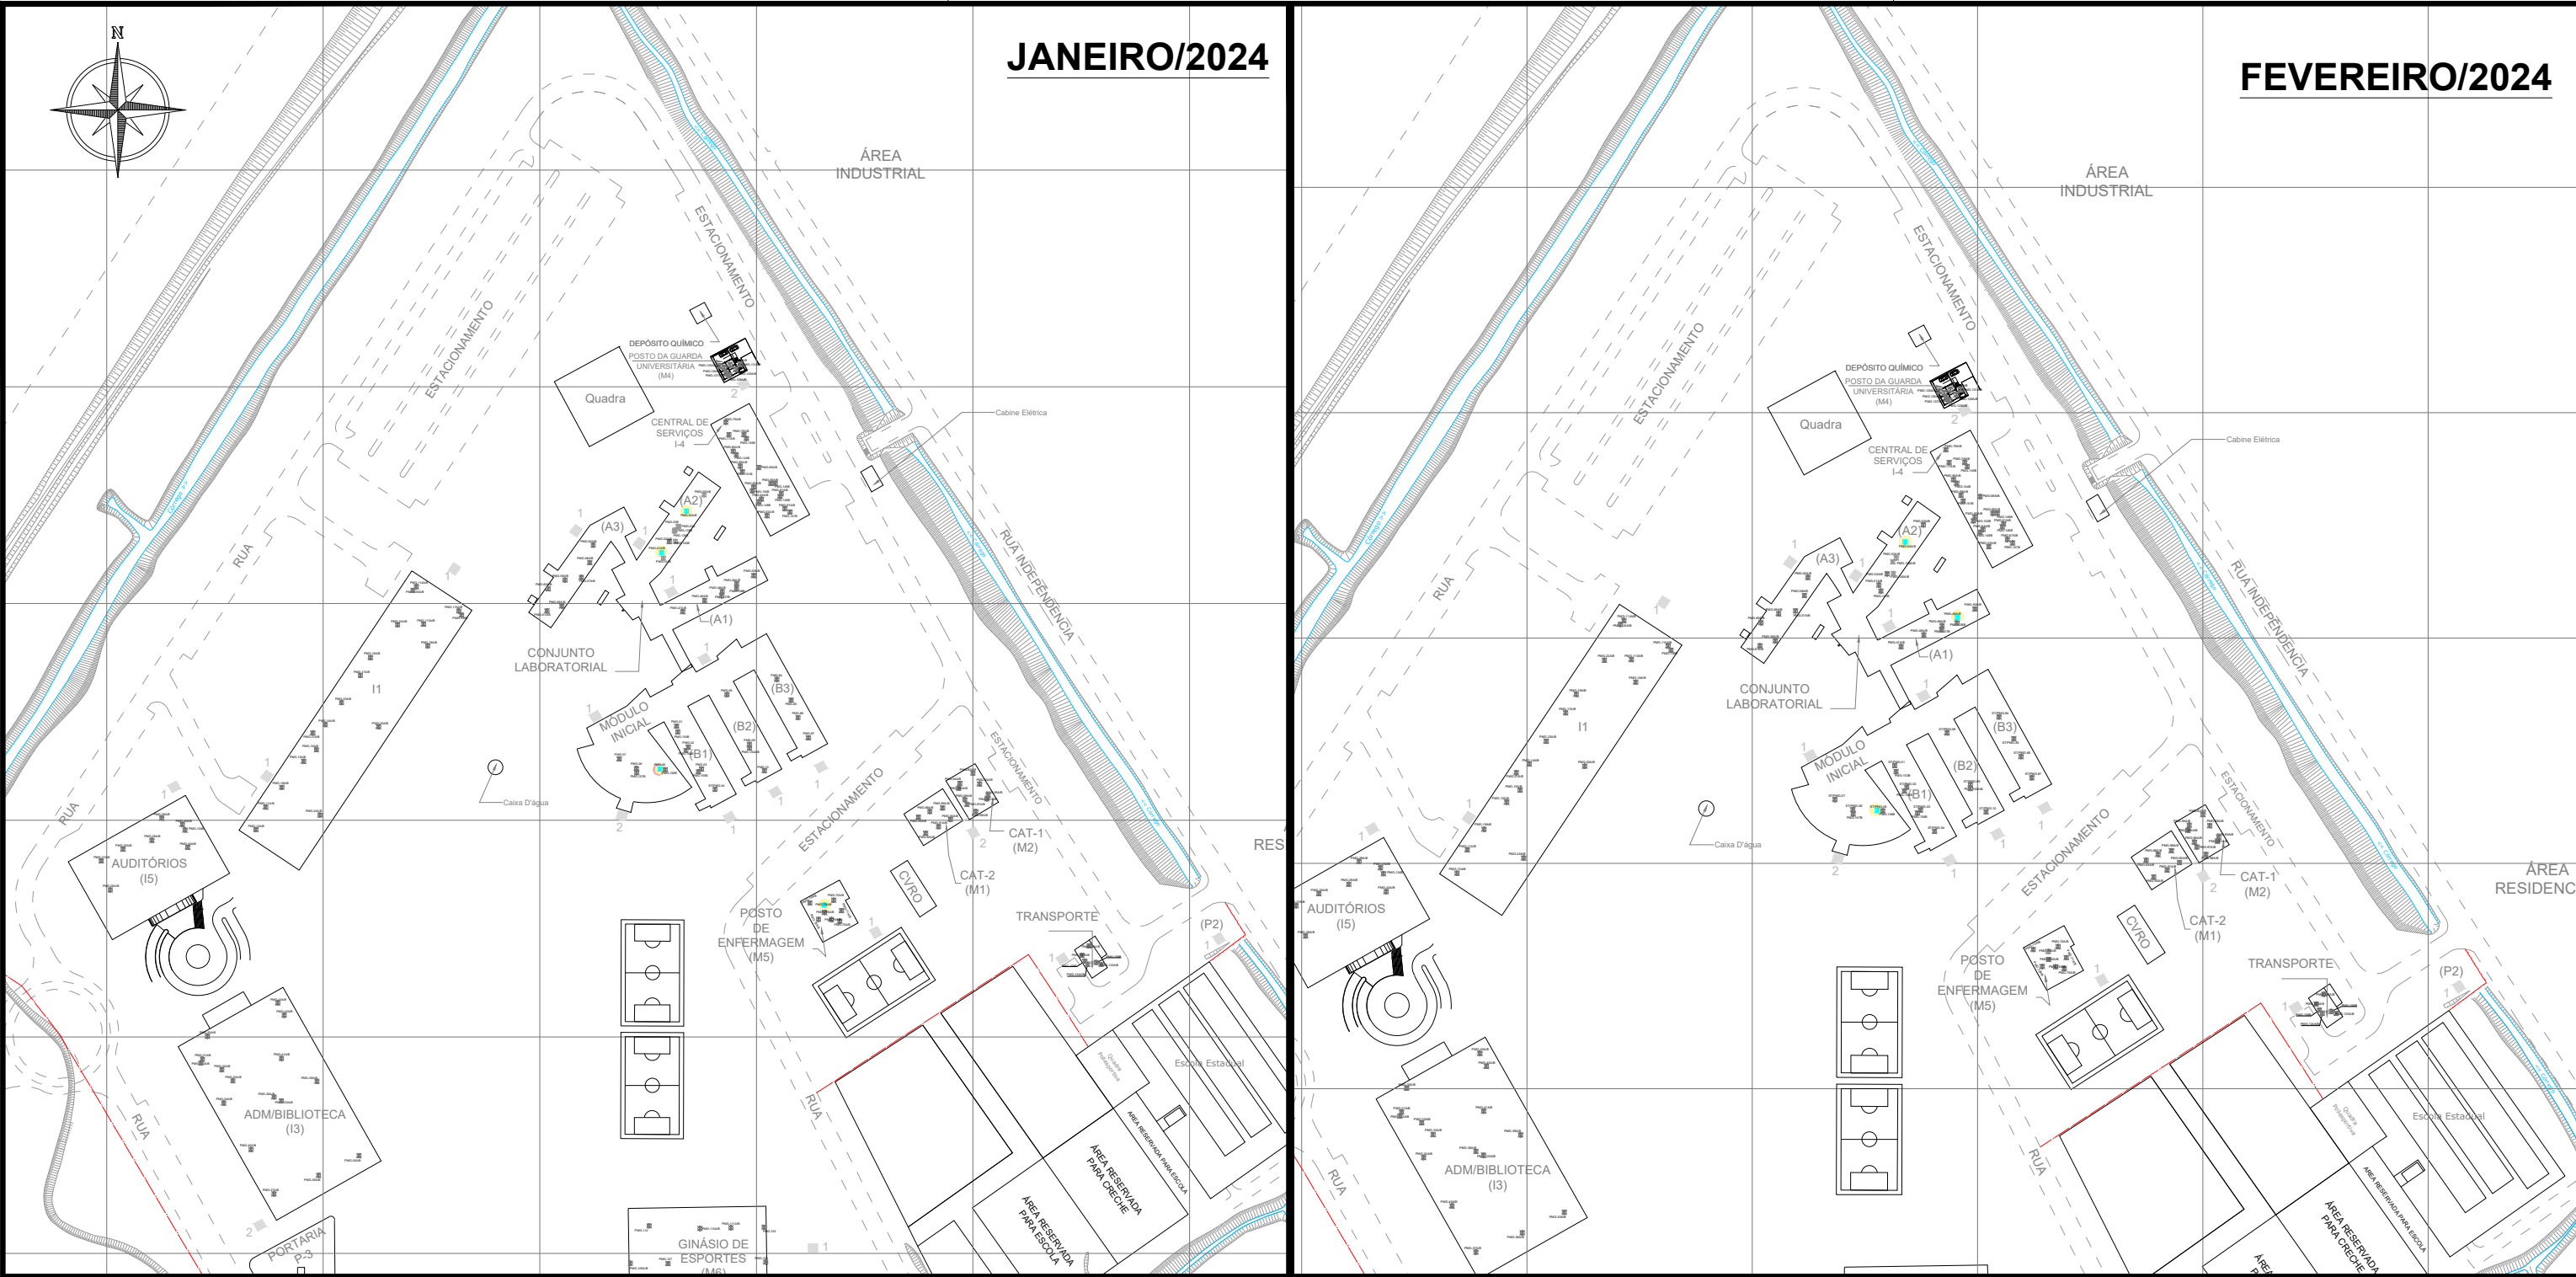

LEGENDA:

- Taludes
- Abrigo para equipamento
- Quantidades de exaustores nos abrigos
- Cerca de divisa
- Guia e Estacionamento
- Edificações
- Poço de monitoramento de gás
- Poço com concentração de CH₄ > 1% na porção profunda (1,00 m)



Escala de cores de Isoconcentração de Metano (%Vol.CH₄)

> 50,0
15,0 - 50,0
5,0 - 15,0
1,0 - 4,9
0,0 - 0,9


Escala Gráfica:






0 31,5 63 94,5 126m




CLIENTE: Universidade de São Paulo - USP Leste	 Engesolve SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS	
PROJETO: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação		
ENDEREÇO: Rua Arlindo Bettio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP		
TÍTULO: Pluma de Isoconcentração de Metano no Solo no Horizonte B (1 metro de Profundidade) no período de Janeiro a Março de 2024		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Chufi	FIGURA Nº: 6.1.2	DATA: MAR/2024

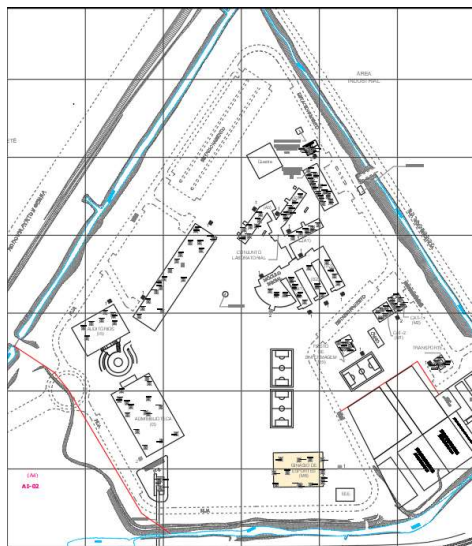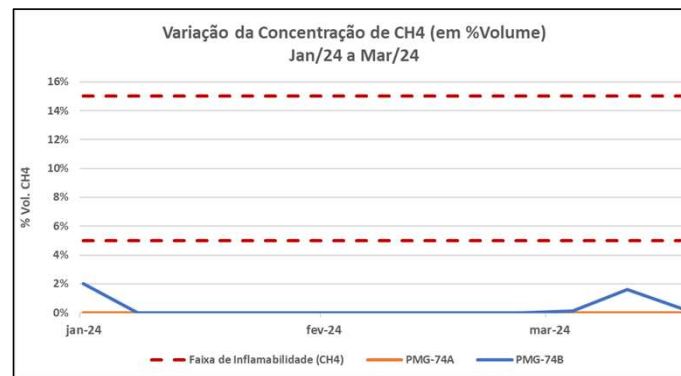

POSTO
DE
ENFERMAGEM
(M5)

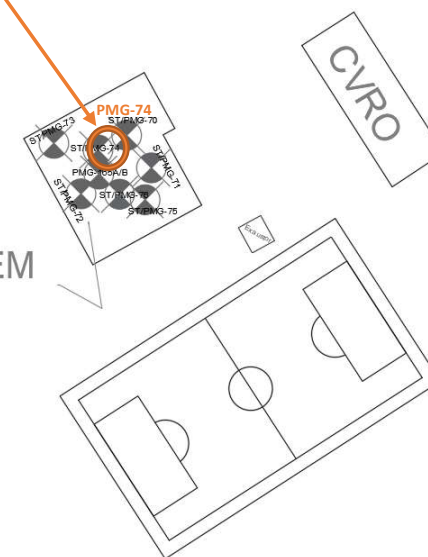

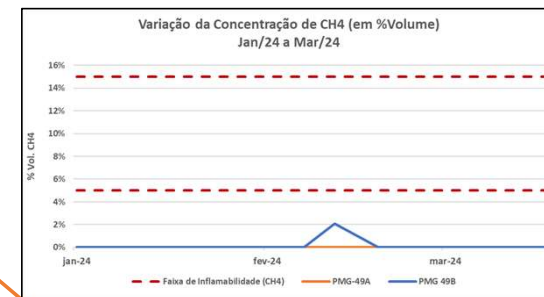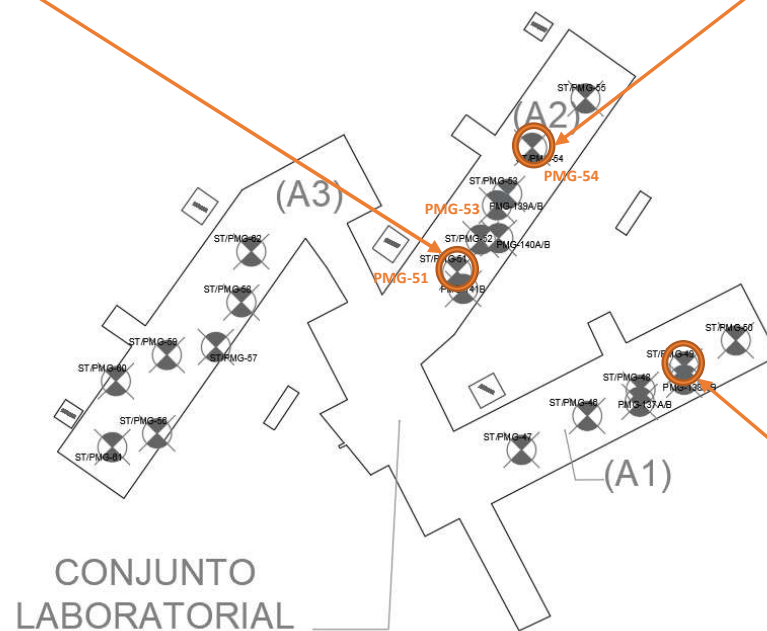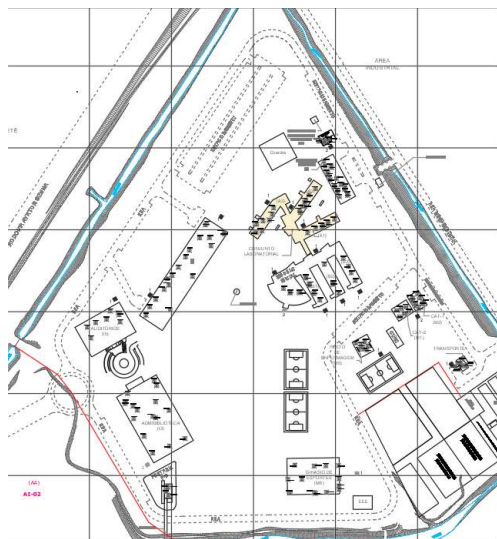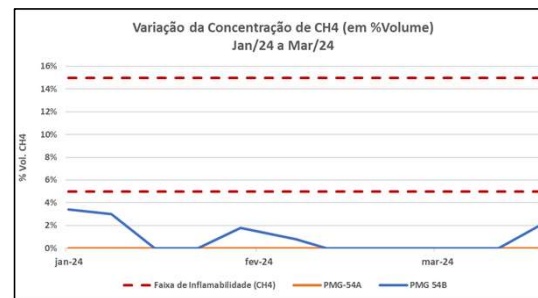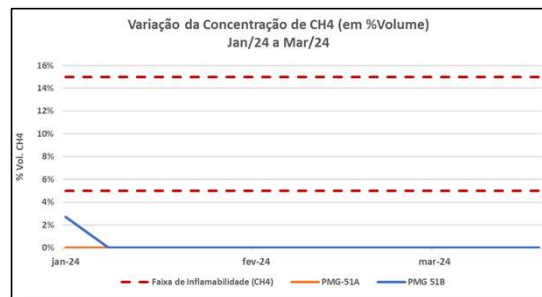

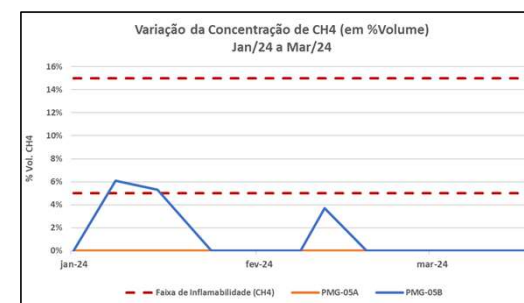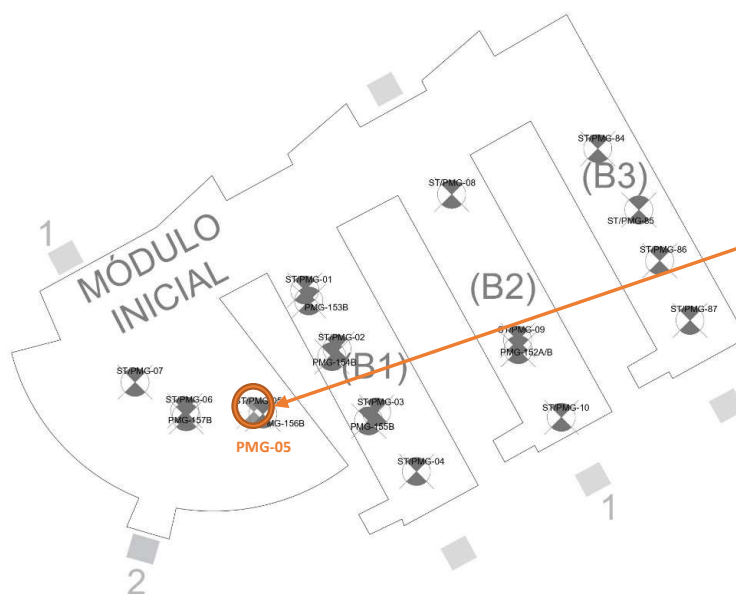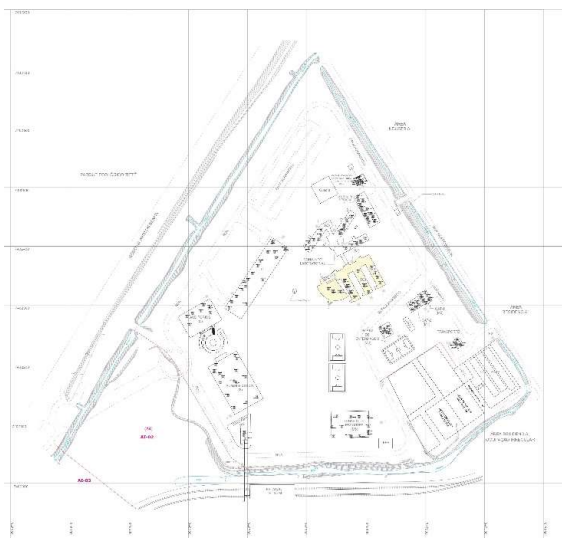

6.2. RESULTADOS OBTIDOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO

A avaliação da eficiência dos sistemas de ventilação (circulação de ar nos tapetes de brita, logo abaixo da laje das edificações) é realizada pela análise dos resultados de monitoramento das concentrações de Metano e da variação de pressão nos poços de monitoramento nas duas profundidades distintas, bem como pela operação ininterrupta dos sistemas (24h por dia, 30 dias por mês).

O sistema de ventilação é individual e específico para cada edificação. De forma geral, ele é composto por elementos de subsuperfície (colchão de brita, pontos de captação de ar atmosférico e de extração de gases e/ou tubulação geomecânica), por elementos de superfície (tubulação de interconexão dos pontos de extração de gases) e por exaustores (montados com compressor, célula de vácuo e painel elétrico).

No total, há 24 exaustores para realização de ventilação forçada, sendo que estão em utilização 22 unidades e 02 são adicionais, servindo como reservas para serem utilizadas em caso de necessidade de substituição de equipamentos quando algum exaustor precisar ser encaminhado para manutenção corretiva.

Os exaustores estão distribuídos em 18 abrigos, pois em alguns abrigos foi possível posicionar dois exaustores, enquanto em outros, somente um. A distribuição dos exaustores e abrigos está apresentada na **Tabela 6.2.1.**

Os sistemas se mostram eficientes no seu propósito de promover a circulação do ar no tapete de brita, evitando o acúmulo e confinamento de gases sob a laje dos edifícios. Essa eficiência se confirma pela ausência de Metano nos poços instalados no tapete de brita. Além disso, também é possível observar na análise histórica do monitoramento que houve uma diminuição das concentrações de Metano até mesmo nos poços de monitoramento instalados na profundidade do solo.

Observa-se que os sistemas de extração instalados com a metodologia de furos na laje (ex. Módulo Inicial) têm atuação diferente daquela que manteve a ventilação via dutos enterrados, como no Conjunto Laboratorial. Ambos os tipos de sistema são eficientes e capazes de eliminar as concentrações no tapete de brita logo abaixo da laje, porém os dados indicam que o primeiro é capaz de diminuir as concentrações também em solo, logo após a camada de brita.

Em fevereiro/2016 iniciou-se o monitoramento sistemático nos exaustores de cada sistema de ventilação dos edifícios, realizando-se medições semanais de Metano e pressão com o equipamento GEM 5000 e VOCs com o equipamento BW/MX6, bem como a leitura de pressão na célula de vácuo.

No trimestre englobado por esse relatório (outubro a dezembro/2023), os exaustores operaram com pressão na célula de vácuo de -2,0 mmHg (-2,66mBar) com variação do equipamento entre -0,2 e 0,2 mBar.

Tabela 6.2.1 – Localização dos Exaustores dos Sistemas de Ventilação

Identificação do Exaustor	Edifício ao qual está conectado	Identificação do Abrigo
Exaustor I-1 (1)	Edifício I-1 Parte 1	Abrigo I-1 (1)
Exaustor I-1 (2)	Edifício I-1 Parte 2	Abrigo I-1 (2)
Exaustor I-5 Auditórios	Edifício I-5 Auditórios	Abrigo I-5 Auditórios
Exaustor Biblioteca	Edifício I-3 Biblioteca	Abrigo I-3 Biblioteca
Exaustor Portaria 3	Portaria P3	Abrigo I-3 Biblioteca
Exaustor Ginásio	Ginásio	Abrigo Ginásio
Exaustor Enfermaria	Enfermaria	Abrigo Enfermaria
Exaustor CAT 1	CAT 1	Abrigo Incubadora
Exaustor CAT 2	Incubadora (CAT 2)	Abrigo Incubadora
Exaustor Transportes	Transportes	Abrigo Transportes
Exaustor MI (B1)	Módulo Inicial - Bloco 1	Abrigo Módulo Inicial (B1)
Exaustor MI (B2)	Módulo Inicial - Bloco 2	Abrigo Módulo Inicial (B2)
Exaustor MI (B3)	Módulo Inicial - Bloco 3	Abrigo Módulo Inicial (B3)
Exaustor Auditório 1	Módulo Inicial - Auditórios 1	Abrigo Auditórios
Exaustor Auditório 2	Módulo Inicial - Auditórios 2	Abrigo Auditórios
Exaustor Cantina	Módulo Inicial - Cantina	Abrigo Cantina
Exaustor Corredor	Módulo Inicial - Corredor	Abrigo Módulo Inicial (Corredor)
Exaustor Conj. Lab. (A1)	Conjunto Laboratorial Edifício A1	Abrigo Conjunto Laboratorial (A1)
Exaustor Conj. Lab. (A2)	Conjunto Laboratorial Edifício A2	Abrigo Conjunto Laboratorial (A2)
Exaustor Conj. Lab. (A3)	Conjunto Laboratorial Edifício A3	Abrigo Conjunto Laboratorial (A3)
Exaustor I-4	Edifício I-4	Abrigo I-4
Exaustor Guarda	Guarda Universitária	Abrigo I-5
Exaustor Reserva 1	Reserva 1 (sala E-02 Edifício I-1)	
Exaustor Reserva 2	Reserva 2 (sala E-02 Edifício I-1)	

Fonte: Dados de Campo, Engesolve, 2024.

Na entrada de cada exaustor não foram detectadas concentrações para VOC e nem para Metano. O vácuo é variável para cada edifício e, eventualmente há picos de pressão negativa. No momento em que os picos são observados, realiza-se a drenagem da tubulação nos pontos de inspeção e em sua extensão, retirando-se a água acumulada e voltando a pressão média.

Sobre a pressão de sucção de operação do sistema, a pressão medida na entrada do exaustor, quando comparada aos modelos matemáticos de projeto, devem atender à necessidade estabelecida, considerando as perdas de carga no sistema. Ao longo do monitoramento do 2º trimestre de 2023, tais pressões se mantiveram em valores superiores aos de projeto, demonstrando que o arraste previsto ocorreu. A **Tabela 6.2.2.** apresenta este comparativo.

Nos gráficos a seguir demonstra-se a variação da pressão na célula de vácuo em comparação com a entrada nos exaustores. O **Anexo 6** apresenta as planilhas de monitoramento semanal de cada exaustor.

Cabe mencionar que entre o término do processo licitatório da antiga empresa que operava na USP Leste e o início da operação pela ENGESOLVE, houve um período em que as medições dos poços de monitoramento e pontos de infraestrutura tiveram suas frequências alteradas, com um maior espaçamento em determinadas medições e priorização em outras, mas a operação dos sistemas de ventilação se manteve inalterada por todo o período (24 horas por dia, 30 dias por mês).

A limpeza dos abrigos é realizada a cada 3 ou 4 meses, devido ao acúmulo de pó, grama advinda da capinagem e aranhas.

Tabela 6.2.2. –Comparativo de pressão de sucção de projeto x medição no 1º trimestre/2024









Detalhes de Projeto dos Sistemas (obtidos por meio de simulações - IPT)						Dados Obtidos entre Janeiro e Março de 2024										
SISTEMA		Pressão de Sucção	Vazão total de exaustão	Velocidade principal de escoamento do ar no tapete de brita	Taxa de renovação do ar no tapete de brita	Exaustor (Capacidade de Aplicação de Pressão)	Identificação do Exaustor		Pressão Mínima obtida na entrada do exaustor neste período			Pressão Máxima obtida na entrada do exaustor neste período				
Edifício I-1		153Pa nos pontos de extração	34,8 m³/h	≥10 ⁻⁴ m/s	0,15 renov/h ou 3,7 renov/dia	194,8Pa (153 Pa Rede fluxo + 41,8 Pa Perdas Carga)	Exaustor I-1 (1)		-1,81	mBar	-181,0	Pa	-5,4	mBar	-540,0	Pa
							Exaustor I-1 (2)		-3,87	mBar	-387,0	Pa	-5,64	mBar	-564,0	Pa
Biblioteca I-3		153Pa nos pontos de extração	15,5 m³/h	≥10 ⁻³ m/s	0,05 renov/h ou 1,3 renov/dia	154,9Pa (153 Pa Rede fluxo + 1,9 Pa Perdas Carga)	Exaustor Biblioteca		-1,84	mBar	-184,0	Pa	-2,47	mBar	-247,0	Pa
Auditórios I-5		-	-	-	-	-	Exaustor I-5 Auditórios		-1,89	mBar	-189,0	Pa	-2,96	mBar	-296,0	Pa
Portaria P3		63Pa nos pontos de extração	3,2 m³/h	≥10 ⁻⁵ m/s	1,5 renov/h ou 36 renov/dia	67,4Pa (63 Pa Rede fluxo + 4,5 Pa Perdas Carga)	Exaustor Portaria P3		-3,01	mBar	-301,0	Pa	-3,82	mBar	-382,0	Pa
Ginásio de Esportes		43,1Pa no ponto de aplicação e 13Pa na extremidade oposta	12,6 m³/h	≥10 ⁻⁴ m/s	0,1 renov/h ou 2,4 renov/dia	59,4Pa (43,1 Pa Rede fluxo + 16,3 Pa Perdas Carga)	Exaustor Ginásio		-2,47	mBar	-247,0	Pa	-4,11	mBar	-411,0	Pa
Enfermaria		38Pa nos pontos de extração	46,3 m³/h	≥10 ⁻⁴ m/s	3,6 renov/h ou 86,4 renov/dia	44Pa (38 Pa Rede fluxo + 6 Pa Perdas Carga)	Exaustor Enfermaria		-4,1	mBar	-410,0	Pa	-5,62	mBar	-562,0	Pa
CAT 1		27Pa nos pontos de extração de ar atmosférico	12,6 m³/h	≥10 ⁻⁵ m/s	0,7 renov/h ou 16,8 renov/dia	117Pa (27 Pa Rede fluxo + 87 Pa Perdas Carga)	Exaustor CAT 1		-2,41	mBar	-241,0	Pa	-4,08	mBar	-408,0	Pa
CAT 2 (Incubadora)		11Pa nos pontos de extração de ar atmosférico	4,0 m³/h Tubo 1 8,0 m³/h Tubo 2 4,5 m³/h Tubo 3	≥10 ⁻⁵ m/s	1,3 renov/h ou 31,2 renov/dia	46,3Pa (13,5 Pa Rede fluxo + 30,5 Pa Perdas Carga)	Exaustor CAT 2		-1,94	mBar	-194,0	Pa	-2,75	mBar	-275,0	Pa
Transportes		-	-	-	-	-	Exaustor Transportes		-2,16	mBar	-216,0	Pa	-3,34	mBar	-334,0	Pa
Módulo Inicial	Blocos Padrões	16,5Pa no ponto de aplicação e 2 Pa no ponto mais distante do exaustor	49,5 m³/h	?	?	16,5 Pa	Exaustor MI (B1)		-2,54	mBar	-254,0	Pa	-3,41	mBar	-341,0	Pa
							Exaustor MI (B2)		-2,03	mBar	-203,0	Pa	-3,4	mBar	-340,0	Pa
							Exaustor MI (B3)		-3,28	mBar	-328,0	Pa	-4,85	mBar	-485,0	Pa
	Auditórios	49Pa e 97Pa nos pontos de aplicação (esquerdo e direito, respectivamente) e 2Pa no ponto mais distante do exaustor	73 m³/h	?	?	97Pa	Exaustor Auditório 1		-3,22	mBar	-322,0	Pa	-3,78	mBar	-378,0	Pa
							Exaustor Auditório 2		-1,98	mBar	-198,0	Pa	-2,5	mBar	-250,0	Pa
	Corredor de Serviços	162 Pa no ponto de aplicação e 2 Pa no ponto mais distante do exaustor	122 m³/h	?	?	162 Pa	Exaustor Cantina		-2,39	mBar	-239,0	Pa	-4,5	mBar	-450,0	Pa
Exaustor Corredor							-2,5	mBar	-250,0	Pa	-4,36	mBar	-436,0	Pa		
Conjunto Laboratorial		-	3,2 m²/h	?	0,5 renov/h ou 12 renov/dia	?	Exaustor Conj. Lab. (A1)		-4,44	mBar	-444,0	Pa	-5,5	mBar	-550,0	Pa
							Exaustor Conj. Lab. (A2)		-5,09	mBar	-509,0	Pa	-7,51	mBar	-751,0	Pa
							Exaustor Conj. Lab. (A3)		-3,34	mBar	-334,0	Pa	-5,28	mBar	-528,0	Pa
Edifício I-4		23,7Pa no ponto de aplicação e 13 Pa na extremidade oposta	10,7 m³/h	≥10 ⁻⁴ m/s	0,2 renov/h ou 4,8 renov/dia	34,6Pa (23,7 Pa Rede fluxo + 10,9 Pa Perdas carga)	Exaustor I-4		-2,15	mBar	-215,0	Pa	-3,02	mBar	-302,0	Pa
Posto Guarda Universitária		-	-	-	-	-	Exaustor Guarda		-1,91	mBar	-191,0	Pa	-3,36	mBar	-336,0	Pa

Legenda: (-) não há projeto; (?) não há dados disponíveis.









Fonte: Baseado nos relatórios IPT: Mar, Jun e Jul/2013

(1Pa = 0,01mBar)

Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores I1 (1), I5 (Auditórios, Biblioteca, Portaria P3, Ginásio, Enfermaria e CAT1

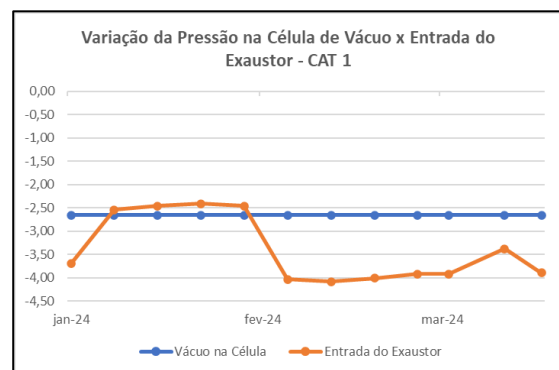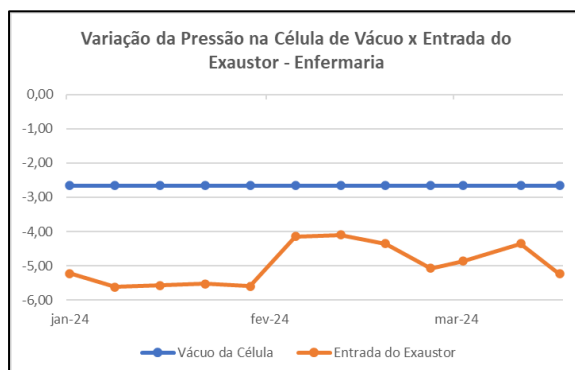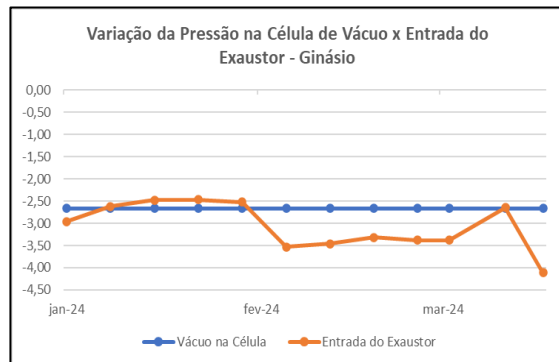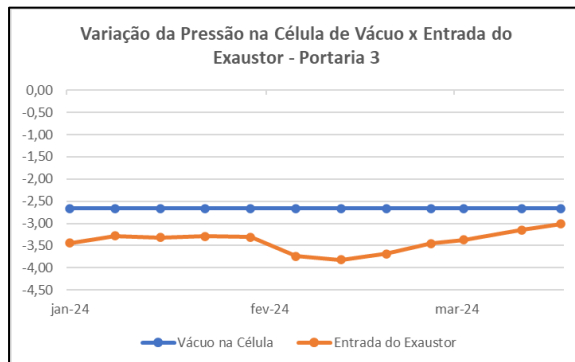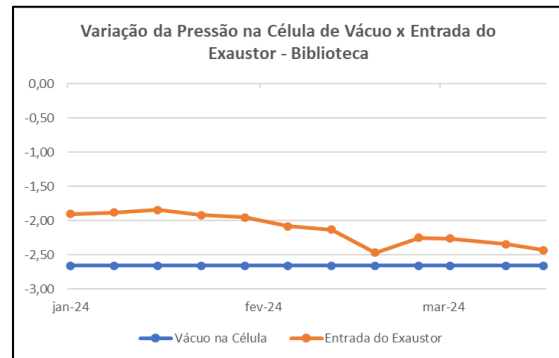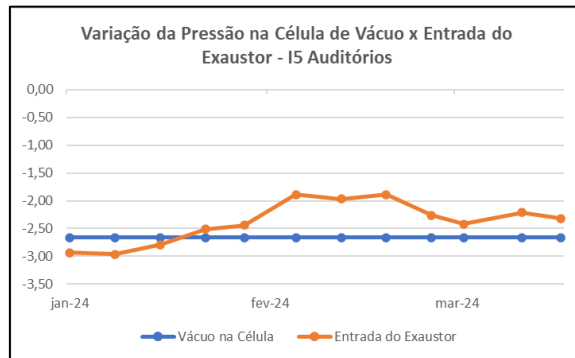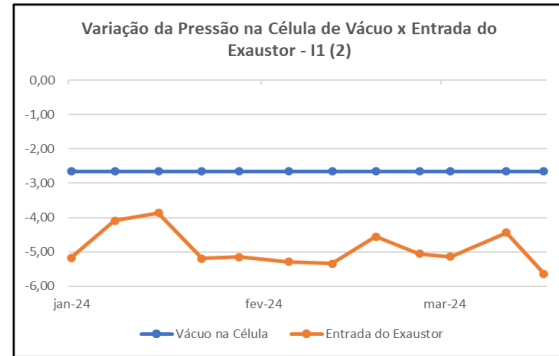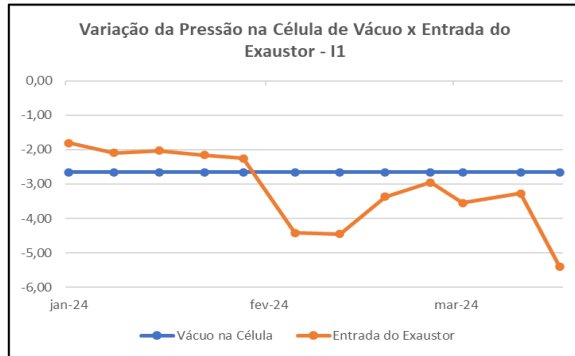

Gráficos de Variação da Pressão Célula de Vácuo x Entrada dos Exaustores CAT2, Transportes, MI (B1), MI (B2), MI (B3), Auditório 1, Auditório 2 e Cantina

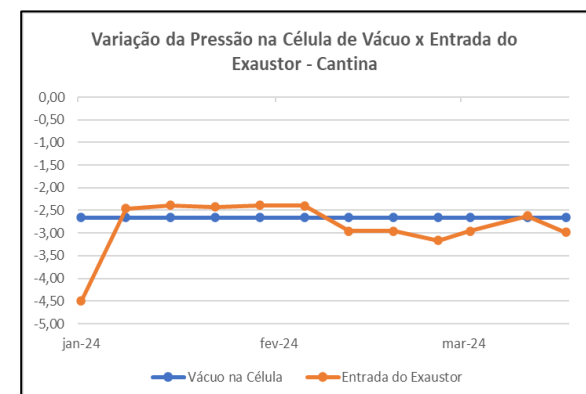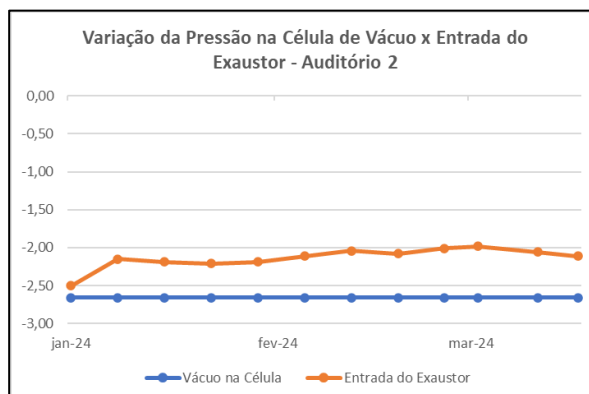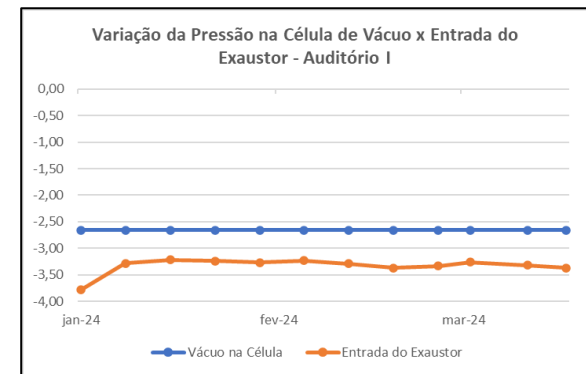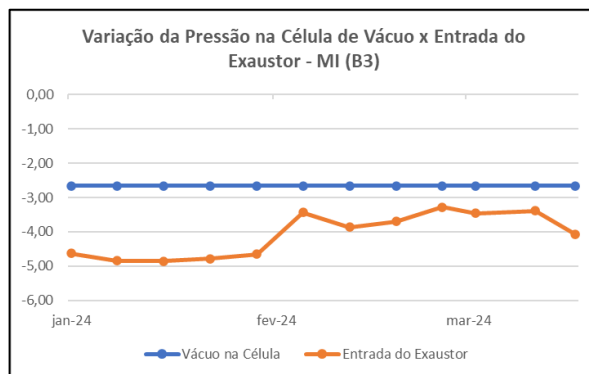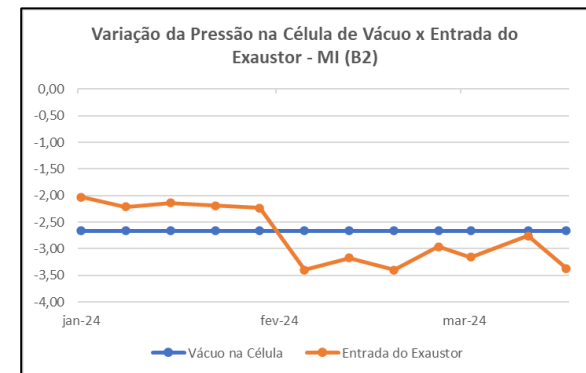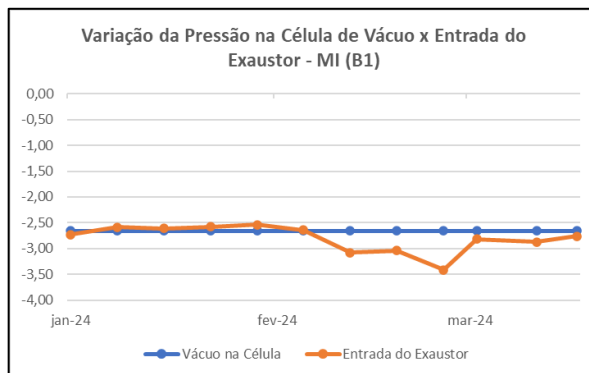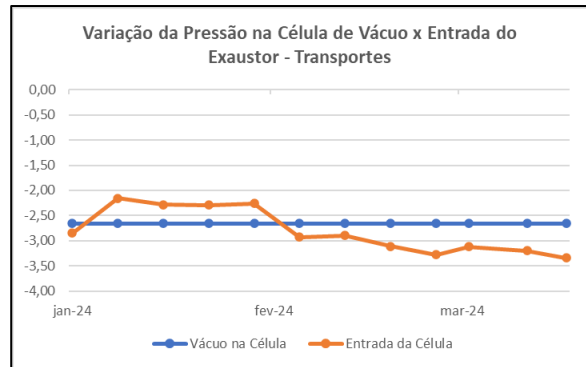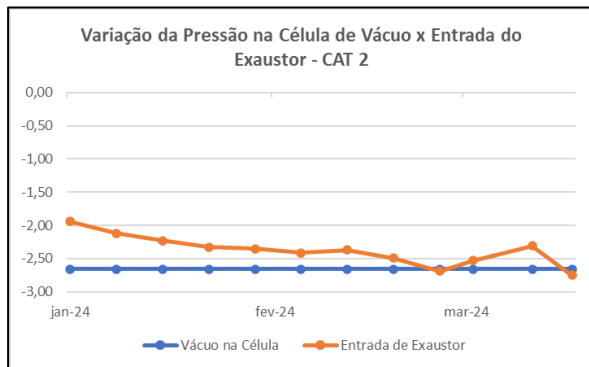

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

A ENGESOLVE Soluções Ambientais Ltda. foi contratada pela Prefeitura da Universidade de São Paulo Área Capital Leste (PUSP-LESTE) para a operação, manutenção dos sistemas de ventilação de gases no solo bem como o monitoramento de poços de gás e pontos na infraestrutura instalados em edificações da EACH na USP Leste, localizada na Rua Arlindo Bétio, 1.000 – Ermelino Matarazzo, São Paulo/SP, conforme do Processo Administrativo 22.1.18.95.7, Pregão Eletrônico nº 00002/2022 – PUSP – CL e Contrato nº 0000001/2022 – PUSP – CL.

O objetivo da operação dos sistemas de ventilação é impedir o acúmulo de gases sub a laje dos edifícios, aliado ao monitoramento preventivo de intrusão de gases nos ambientes por meio da execução de medições de gases em todos os poços de monitoramento, pontos de infraestrutura e espaços com pouca circulação de ar.

Com base nos resultados obtidos no 1º trimestre de 2024, foram detectadas concentrações significativas de Metano (acima de 1%Vol CH₄) na porção profunda em 5 dos 289 poços de gases monitorados. Nos demais poços profundos, não foram detectadas concentrações significativas.

Para os poços nas porções rasas, não foram detectadas concentrações de metano acima de 1% VolCH₄.

Essas concentrações podem ser consideradas esperadas, uma vez que estes poços estão instalados sobre a fonte de geração do gás Metano (camada de matéria orgânica). Porém, tais concentrações estão localizadas em pontos específicos e não abrangem toda a extensão dos edifícios. É importante ressaltar que as concentrações nulas nos pontos de infraestrutura ratificam a ausência do risco de inflamabilidade ou ocorrência de intrusão de gases.

As concentrações obtidas ao longo deste 1º trimestre/2024 se mostraram coerentes com a linha de tendência obtida durante os 10 anos de monitoramento da área de estudo. Observa-se que nos períodos de seca há um singelo das concentrações medidas por meio dos poços profundos.

Quanto às medições de H₂S e CO nos poços de monitoramento, foram obtidas concentrações de 4,0 e 1,0, respectivamente. Essas concentrações indicam que há a produção destes compostos devido a degradação da matéria orgânica. Para VOC, não foram constatadas concentrações.

Os resultados obtidos nas medições realizadas nos demais pontos de infraestrutura ao longo deste trimestre (ralos e caixa de passagem) nas demais as edificações, bem como em ambientes com pouca circulação de ar, não detectaram concentrações de Metano e nem de VOC.

Os sistemas de ventilação operaram 24 horas por dia, 30 dias por mês, durante todo o período do trimestre. Estes demonstraram-se eficientes, não permitindo que os gases existentes no solo se acumulassem no tapete de brita (poços a 0,30 m) ou diretamente sob a laje (vapor pin), bem

como diminuindo eventualmente até mesmo as concentrações no solo abaixo do tapete de brita (poços a 1,00 m), por influência da ventilação.

O nível d'água raso existente na área tende a dificultar a migração vertical do gás, bem como as medidas já adotadas ao longo do tempo, como as construções com ventilação fixa, colchão de brita em subsuperfície, drenos geomecânicos, que colaboram com a mitigação da possibilidade de intrusão e gases.

Sendo assim, diante dos resultados obtidos a partir do monitoramento do primeiro trimestre de 2024 e considerando a série histórica de monitoramento ao longo dos 10 anos (abril/2014 a março/2024), verifica-se que não há a intrusão de gases nos ambientes fechados, uma vez que as concentrações de Metano existentes no solo, mesmo com a presença de pressão positiva, não alcançam o tapete de brita (sob a laje) ou, quando alcançam esporadicamente, são arrastadas pelo sistema de ventilação. Além disso, não há presença de Metano em nenhum dos pontos de infraestrutura.

Portanto, recomenda-se a continuidade da operação dos sistemas de exaustão, bem como a realização dos monitoramentos semanais e quinzenais nos poços de monitoramento e nos pontos de infraestrutura, respectivamente.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 16.209, de setembro de 2013 – Avaliação de risco a saúde humana para fins de gerenciamento de áreas contaminadas;

AVATZ AMBIENTAL. Relatório Técnico – Instalação de Poços de Monitoramento de Gases e de Monitoramento dos Poços Instalados – R047/21-PR014/21. São Paulo: AVATZ AMBIENTAL, Outubro/2021.

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 2021 – Biogás. Disponível em: <<https://cetesb.sp.gov.br/biogas/>>. Acesso em: out 2022.

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 2017 – Decisão de Diretoria Nº 038/2017, de 07 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a aprovação do “Procedimento para a Proteção da Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas”, da revisão do “Procedimento para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas” e estabelece “Diretrizes para Gerenciamento de Áreas Contaminadas no Âmbito do Licenciamento Ambiental”, e dá outras providências;

CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), 2016 – Manual de Produtos Químicos. Constituído de um Guia Técnico e 96 Fichas de Informação de Produtos Químicos.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 4º Trimestre /2023. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Janeiro/2024.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 3º Trimestre /2023. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Outubro/2023.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 2º Trimestre /2023. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Junho/2023.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 1º Trimestre /2023. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Abril/2023.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 4º Trimestre /2022. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Janeiro/2023.

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS. Relatório Técnico. Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 3º Trimestre /2022. USP Leste. São Paulo: ENGESOLVE, Outubro/2022.

IPT. Relatório Técnico 92353-205 – Avaliação e sugestões de aperfeiçoamento para alguns dos sistemas de ventilação de gás e vapor do subsolo de edifícios do campus da USP Leste – resultados preliminares. São Paulo: IPT, 02 de abril de 2007.

SERVMAR. Relatório de Investigação Detalhada, Avaliação de Risco à Saúde Humana e Plano de Intervenção na AI-01 e Investigação Detalhada de Gases – MA/12936/14BLS. São Paulo: SERVMAR, Fevereiro/2014.

WEBER AMBIENTAL. Relatório Técnico: Evolução do Monitoramento de Intrusão de Gases e da Operação do Sistema de Ventilação – 2º Trimestre/2022. USP Leste. São Paulo: WEBER, Julho/2022.

WEBER AMBIENTAL. Relatório Técnico: As-Built completo dos sistemas de ventilação de gases instalados na USP Leste – vs.07. Projeto 311.1264.14EGS.VS07 – USP Leste. São Paulo: WEBER, Julho/2021.

WEBER AMBIENTAL. Relatório Técnico: Instalação de novos poços de monitoramento e amostragem de gases – vs.02. Projeto 311.1265.14-IAG.VS02 – USP Leste. São Paulo: WEBER, Janeiro/2016.

WEBER AMBIENTAL. Relatório Técnico: Instalação do Sistema de Exaustão de Gases no Solo sob os Edifícios – Ago/14. Projeto 311.1205.14 – USP Leste. São Paulo: WEBER, Agosto/2014.

ANEXO 1
CERTIFICADOS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº 1638-2024

Dados do Cliente:

Nome: Engesolve Soluções Ambientais Integradas Ltda
Endereço: Av. Paulista 2064, 2086 14 Andar
Bairro: Bela Vista
Cidade: São Paulo
CEP: 01.310-928

UF: SP
Contato: 11 9308-4713



Interessado: O mesmo

Identificação do Item:

Item: Detector de Gás com Indicação Direta
Marca: BW Technologies
Modelo: GasAlert Micro5 PID
N.º de Série: SK317-003332

Dados da Calibração:

Data da Calibração: 4-abr-24
N.º do Processo: 497 Item: 1
Procedimento de Calibração: PC-10 REV. 14

Condições Ambientais:

Temperatura: 25,5 °C
Umidade Relativa: 68,5 %

Método de Medição:

Os resultados são obtidos através da aplicação de material de referência certificado (MRC) de gás sobre o sensor do instrumento sob teste.

Material de Referência Certificado Utilizado:

MRC	Código	Certificado	Emitente	Validade
Mistura Padrão de Metano	CIL-LEL	567023	Coregas	abril-24

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

N° 1638-2024

Resultado Obtido:

Gás	V.M	V.R	R.M	Erro	Unidade	Fator k	Incerteza
CH4	46	49,0	50	1,0	% LEL	2,00	1,2

Legenda:

V.M= Valor de uma medição realizada no sensor sob teste isento de ajustes.

V.R=Valor de referência da MRC.

R.M= Resultado da medição. (média de 3 leituras realizadas após ajuste de SPAN).

Observações:

- *Este certificado de calibração é válido apenas para o instrumento e sensores especificados , não sendo extensivo a quaisquer outros instrumentos ainda que similares.*
- *Não é autorizada a reprodução parcial deste documento sem autorização da ALMONT DO BRASIL. As informações fornecidas neste certificado são de responsabilidade da Almont.*
- *A incerteza expandida estimada relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível de confiança de aproximadamente 95 %.*
- *Manutenções, Ajustes e Configurações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.*
- *Esta calibração não isenta o usuário de realizar o teste de resposta conforme NR-33.*
- *Calibração realizada nas instalações permanentes do laboratório Almont do Brasil.*
- *Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.*
- *Calibração inválida se o lacre for rompido.*
- *A versão original deste certificado é um arquivo PDF.*

Técnico Executor:

Vinícius Archilha
Técnico Instrumentista

Data de Emissão: 04/04/2024

Signatário Autorizado

Vinícius Archilha
Técnico Instrumentista

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

Fim do certificado de Calibração

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

N° 6611-2023

Dados do Cliente:

Nome: Engesolve Soluções Ambientais Integradas Ltda
Endereço: Av. Paulista 2064, 2086
Bairro: Bela Vista
Cidade: São Paulo
CEP: 01.310-928

UF: SP

Interessado: O mesmo

Identificação do Item:

Item: Detector de Gás com Indicação Direta
Marca: Landtec
Modelo: GEM5000
N.º de Série: G500491

Dados da Calibração:

Data da Calibração: 4-dez-23 Validade solicitada pelo Cliente: 4-dez-24
N.º do Processo: 2300 Item: 1
Procedimento de Calibração: PC-10-R REV. 2

Condições Ambientais:

Temperatura: 25 °C
Umidade Relativa: 41 %

Método de Medição:

Os resultados são obtidos através da aplicação da mistura de gás padrão sobre o sensor do instrumento sob teste.

Padrões e Instrumentação Utilizados:

Padrão	Código	Certificado	Emitente	Validade
Mistura Padrão de CO ₂	CIL-CO ₂	WO263065	Calgaz Ltd	julho-25

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO**Nº 6611-2023****Resultado Obtido:**

Gás	V.M	V.R	R.M	Desvio	Unidade	Fator k	Incerteza
CO2	5,2	5,0	5,0	0,0	%	2,00	0,6

Legenda:

V.M= Valor de uma medição realizada no sensor sob teste isento de ajustes.

V.R=Valor de referência do padrão

R.M= Resultado da medição. (média de 3 leituras realizadas após ajuste de SPAN).

s/ref. = Sem referência

Observações:

- *Este certificado de calibração é válido apenas para o instrumento e sensores especificados , não sendo extensivo a quaisquer outros instrumentos ainda que similares.*
- *Não é autorizada a reprodução parcial deste documento sem autorização da ALMONT DO BRASIL.*
- *A incerteza expandida estimada relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para nível de confiança de aproximadamente 95 %.*
- *Manutenções, Ajustes e Configurações não fazem parte do escopo do laboratório.*
- *Esta calibração não isenta o usuário de realizar o teste de resposta conforme NR-33.*
- *Calibração realizada nas instalações do laboratório Almont Lab.*
- *A versão original deste certificado é um arquivo PDF.*

Técnico Executor:Vinícius Archilha
Técnico Instrumentista

Responsável Técnico
Ailson Ricardo Vichino
Gerente Laboratório*Fim do certificado de Calibração*

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

N° 6774-2023



Dados do Cliente:

Nome: Engesolve Soluções Ambientais Integradas Ltda
Endereço: Av. Paulista 2064, 2086 14 Andar
Bairro: Bela Vista
Cidade: São Paulo
CEP: 01.310-928

UF: SP
Contato: 11 9308-4713

Interessado: O mesmo

Identificação do Item:

Item: Detector de Gás com Indicação Direta
Marca: BW Technologies
Modelo: GasAlert Micro5 PID
N.º de Série: SK317-003332

Dados da Calibração:

Data da Calibração: 11-dez-23
N.º do Processo: 2300 Item: 2
Procedimento de Calibração: PC-10 REV. 14

Condições Ambientais:

Temperatura: 25 °C
Umidade Relativa: 68,4 %

Método de Medição:

Os resultados são obtidos através da aplicação de material de referência certificado (MRC) de gás sobre o sensor do instrumento sob teste.

Material de Referência Certificado Utilizado:

MRC	Código	Certificado	Emitente	Validade
Mistura Padrão de Metano	CIL-LEL	567023	Coregas	abril-24
Mistura Padrão de Isobutileno	CIL-PID	683633	Coregas	março-27

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº 6774-2023

Resultado Obtido:

Gás	V.M	V.R	R.M	Erro	Unidade	Fator k	Incerteza
CH4	53	49,0	50	1,0	% LEL	2,00	1,2
C4H8	86	100,4	101	0,6	PPM	2,00	2,1

Legenda:

V.M= Valor de uma medição realizada no sensor sob teste isento de ajustes.

V.R=Valor de referência da MRC.

R.M= Resultado da medição. (média de 3 leituras realizadas após ajuste de SPAN).

Observações:

- Este certificado de calibração é válido apenas para o instrumento e sensores especificados , não sendo extensivo a quaisquer outros instrumentos ainda que similares.
- Não é autorizada a reprodução parcial deste documento sem autorização da ALMONT DO BRASIL. As informações fornecidas neste certificado são de responsabilidade da Almont.
- A incerteza expandida estimada relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível de confiança de aproximadamente 95 %.
- Manutenções, Ajustes e Configurações não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.
- Esta calibração não isenta o usuário de realizar o teste de resposta conforme NR-33.
- Calibração realizada nas instalações permanentes do laboratório Almont do Brasil.
- Este certificado atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
- Calibração inválida se o lacre for rompido.
- A versão original deste certificado é um arquivo PDF.

Técnico Executor:

Vinicius Archilha
Técnico Instrumentista

Signatário Autorizado

Anderson Fusari de Andrade
Gerente Técnico Subst.

Data de Emissão: 11/12/2023

Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre, de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o número 407

Fim do certificado de Calibração

ANEXO 2
PLANO DE AÇÃO

ANEXO 3
TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS EM PMG

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
Edifício I 1	PMG-16 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	2,40	18,10	0,00	2,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	4,50	16,80	0,00	2,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	19,10	0,00	2,00	79,50	-0,35		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	1,90	18,50	0,00	2,00	79,60	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	1,00	80,80	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	2,20	17,80	0,00	1,00	80,00	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,50	0,00	1,00	80,20	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	1,00	80,40	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	2,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,80	0,00	2,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	0,00	80,40	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,70	0,00	1,00	80,30	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,10	0,00	0,00	80,20	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,20	0,00	1,00	80,40	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	0,00	80,40	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,30	0,00	1,00	80,10	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	1,00	80,40	-0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,80	0,00	2,00	79,40	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 B		09/01/2024	0,50%	0,50%	2,30	18,10	0,00	2,00	79,10	0,03		0,00	32,00	
Edifício I 1	PMG-12 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	3,20	17,20	0,00	3,00	79,50	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,80	0,00	2,00	79,50	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,10	0,00	2,00	79,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	2,00	18,50	0,00	2,00	79,60	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	2,60	17,60	0,00	2,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	4,20	16,60	0,00	2,00	79,20	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	2,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,70	0,00	2,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	19,50	0,00	2,00	79,30	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	19,10	0,00	2,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	2,40	18,60	0,00	3,00	79,00	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	1,90	18,60	0,00	3,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,30	0,00	2,00	80,30	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,30	0,00	2,00	80,20	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	1,00	80,40	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	1,00	80,40	-0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 A		08/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	19,20	0,00	2,00	79,40	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 B		08/01/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,70	0,00	1,00	79,70	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 A		08/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,70	0,00	1,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 B		08/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,90	0,00	2,00	80,10	-0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 A		08/01/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,50	0,00	2,00	79,60	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 B		08/01/2024	0,00%	0,00%	2,90	17,60	0,00	2,00	79,50	-0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 A		08/01/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,10	0,00	1,00	80,30	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 B		08/01/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,70	0,00	1,00	79,70	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 A		08/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,80	0,00	2,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 B		08/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,30	0,00	2,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 A		08/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,70	0,00	2,00	79,60	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 B		08/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,60	0,00	2,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 A		08/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,20	0,00	2,00	79,90	0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
I-5 Auditórios	PMG-45	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	2,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	2,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	2,00	79,70	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	19,10	0,00	1,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,40	0,00	2,00	79,90	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,00	0,00	2,00	80,00	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,60	0,00	1,00	80,00	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	3,10	17,20	0,00	1,00	79,70	-0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,80	0,00	2,00	79,60	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	19,10	0,00	2,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,40	0,00	1,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,80	0,00	1,00	80,20	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,40	0,00	1,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	3,10	17,10	0,00	1,00	79,80	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	1,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,80	0,00	1,00	80,00	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,20	0,00	1,00	80,50	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,00	0,00	1,00	80,60	-0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,80	0,00	1,00	81,10	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	11,70	11,80	0,00	1,00	76,50	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	1,00	80,40	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,20	0,00	2,00	80,50	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	2,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	2,00	79,90	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,10	0,00	1,00	79,80	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	7,60	15,10	0,00	2,00	77,40	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,30	0,00	2,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	2,00	80,20	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	08/01/2024	0,10%	0,10%	0,50	19,30	0,00	2,00	80,10	0,07		0,00	5,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,30	0,00	1,00	80,00	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,60	0,00	1,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	10/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	3,00	80,00	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	10/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	3,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	10/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	10/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,40	0,00	2,00	80,40	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	10/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,60	0,00	3,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	10/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	3,00	80,00	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	10/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	10/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	3,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	10/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,40	0,00	2,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	10/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,70	0,00	2,00	80,00	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	10/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,00	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	10/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,00	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	10/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	3,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	10/01/2024	0,00%	0,00%	1,90	18,10	0,00	3,00	79,90	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	10/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	10/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,60	0,00	3,00	79,70	0,05		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Edifício I-4	PMG-78 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	2,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,90	0,00	2,00	79,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	3,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	79,90	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,50	0,00	2,00	79,90	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,60	0,00	2,00	80,00	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,10	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	2,00	79,90	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,20	0,00	2,00	80,00	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	5,10	15,30	0,00	2,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,80	0,00	2,00	79,90	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	2,00	80,00	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,30	0,00	2,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,20	0,00	2,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	1,70	19,00	0,00	2,00	79,30	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	6,60	15,30	0,00	2,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,30	0,00	2,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	3,80	17,30	0,00	2,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,80	0,00	2,00	80,40	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 B		10/01/2024	2,70%	2,70%	0,90	18,30	0,00	1,00	78,10	0,05		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	1,00	80,30	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	1,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,30	0,00	1,00	80,10	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	1,90	17,20	0,00	2,00	80,90	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,20	0,00	2,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 B		10/01/2024	3,40%	3,40%	3,90	14,90	0,00	2,00	77,80	0,02		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,40	0,00	2,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	4,50	16,00	0,00	2,00	79,40	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,50	0,00	2,00	79,90	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	19,20	0,00	2,00	79,60	0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 A		08/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	1,00	80,20	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 B		08/01/2024	0,00%	0,00%	2,00	18,40	0,00	1,00	79,70	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 A		08/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,50	0,00	1,00	79,80	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B		08/01/2024	0,00%	0,00%	2,50	18,00	0,00	1,00	79,50	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	3,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	80,00	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,90	0,00	2,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	2,00	17,50	0,00	2,00	80,40	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	10,40	11,50	0,00	2,00	78,00	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,80	0,00	2,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	5,90	16,00	0,00	2,00	78,10	0,06		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	2,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B		10/01/2024	0,30%	0,30%	5,60	12,80	0,00	2,00	81,30	0,02		0,00	7,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	195,00	0,00	2,00	80,40	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B		10/01/2024	0,10%	0,10%	0,40	18,80	0,00	2,00	80,70	-0,02		0,00	6,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B		10/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	1,00	80,30	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A		08/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,50	0,00	1,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B		08/01/2024	0,20%	0,70%	0,20	19,70	0,00	2,00	79,90	0,11		0,00	5,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	2,00	79,80	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	2,00	79,80	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	1,00	79,80	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	79,90	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	2,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	1,00	79,80	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,80	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B		09/01/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	2,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,80	-0,18		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,80	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,30	0,00	1,00	79,70	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	4,50	15,70	0,00	1,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	2,60	18,70	0,00	2,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	20,00	0,00	2,00	79,40	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	80,00	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	2,00	79,70	-0,14		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,60	0,00	2,00	79,70	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	5,90	15,40	0,00	3,00	78,80	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,90	0,00	1,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	2,10	18,50	0,00	1,00	79,40	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,30	0,00	2,00	79,50	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,30	0,00	2,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	3,20	16,50	0,00	1,00	80,40	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	3,70	16,60	0,00	2,00	79,70	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	2,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	1,00	79,80	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	1,00	79,80	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	2,00	79,80	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	1,00	79,80	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	2,00	79,80	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157 B		09/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,80	0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 A		11/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,20	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 B		11/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 A		11/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	2,00	80,20	0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 B		11/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,01		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 A		11/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 B		11/01/2024	0,00%	0,00%	2,20	17,30	0,00	3,00	80,50	0,00		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 A		11/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	2,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 B		11/01/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,40	0,00	2,00	80,10	0,11		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Enfermaria	PMG-74	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,70	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	11/01/2024	2,00%	2,00%	0,90	12,00	0,00	2,00	85,10	0,07		0,00	63,00	
Enfermaria	PMG-75	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,60	0,00	3,00	80,00	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	3,10	14,10	0,00	2,00	82,80	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,60	0,00	3,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	3,60	15,60	0,00	2,00	80,70	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,60	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	3,00	80,20	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	2,70	17,50	0,00	2,00	79,80	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	12,20	12,90	0,00	2,00	74,90	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	5,90	16,10	0,00	1,00	78,00	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	6,70	15,00	0,00	1,00	78,30	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,40	-0,11		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	1,00	80,40	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,80	0,00	1,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	2,80	18,50	0,00	1,00	78,70	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,90	0,00	2,00	79,90	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	7,60	12,30	0,00	2,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,60	0,00	2,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	3,90	16,10	0,00	2,00	79,90	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,20	0,00	2,00	80,00	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,50	0,00	2,00	80,20	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,40	-0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	3,80	16,40	0,00	1,00	79,80	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	2,70	17,90	0,00	2,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	4,90	16,00	0,00	2,00	79,10	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	12/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	2,00	80,00	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	12/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	3,00	80,00	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	12/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,70	0,00	2,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	12/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,10	0,00	2,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	12/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	2,00	79,80	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	12/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,50	0,00	2,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	12/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	3,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	12/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,80	0,00	2,00	79,90	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	12/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	2,00	79,70	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	12/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,30	0,00	2,00	79,80	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	12/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	2,00	79,70	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	12/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,40	0,00	3,00	79,80	-0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		08/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		08/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,40	0,00	2,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		08/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,50	0,00	2,00	79,90	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		08/01/2024	0,00%	0,00%	3,10	18,00	0,00	2,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		08/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,20	0,00	2,00	79,70	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		08/01/2024	0,00%	0,00%	2,50	16,70	0,00	2,00	80,80	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		08/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	2,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,30	0,00	2,00	79,80	-0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,30	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	08/01/2024	0,40%	0,40%	0,90	18,30	0,00	2,00	80,40	0,06		0,00	19,00	Atípico encontrar metano neste poço.
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,20	0,07		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	1,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		08/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	1,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	2,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	4,90	14,80	0,00	2,00	80,40	-0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	1,70	16,70	0,00	2,00	81,60	-0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,40	0,00	3,00	79,70	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	3,00	80,20	0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	3,00	80,20	0,10		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,00	0,04		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,00		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	3,00	80,10	-0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	3,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	-0,01		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	08/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	12/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	2,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	12/01/2024	0,00%	0,00%	2,50	17,20	0,00	3,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	12/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	12/01/2024	0,00%	0,00%	6,70	14,10	0,00	3,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	12/01/2024	0,00%	0,00%	2,30	18,20	0,00	2,00	79,40	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	12/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,70	0,00	2,00	79,80	-0,02		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	12/01/2024	0,00%	0,00%	2,00	17,70	0,00	2,00	80,30	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	12/01/2024	0,00%	0,00%	3,80	16,60	0,00	2,00	79,60	0,01		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	12/01/2024	0,00%	0,00%	1,50	19,10	0,00	3,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	12/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	3,00	80,00	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,10	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	5,00	15,30	0,00	3,00	79,70	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,60	0,00	3,00	79,70	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	3,40	17,10	0,00	3,00	79,50	0,15		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,40	0,00	3,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	3,20	17,60	0,00	3,00	79,30	0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,60	0,00	2,00	79,80	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	4,70	16,20	0,00	3,00	79,10	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,40	0,00	3,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	3,60	17,30	0,00	3,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	5,20	16,40	0,00	3,00	78,40	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,30	0,00	3,00	79,60	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	11/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,10	0,00	2,00	80,20	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	11/01/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,60	0,00	2,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	16/01/2024	0,00%	0,00%	2,30	18,10	0,00	3,00	79,60	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	16/01/2024	0,00%	0,00%	3,60	17,20	0,00	3,00	79,20	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	16/01/2024	0,00%	0,00%	4,10	18,40	0,00	3,00	77,50	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	16/01/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,90	0,00	3,00	79,60	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	3,00	79,70	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	16/01/2024	0,00%	0,00%	2,00	18,40	0,00	2,00	79,50	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,70	0,00	2,00	79,80	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,50	0,00	3,00	80,20	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,80	0,00	3,00	79,50	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	16/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,60	0,00	2,00	80,10	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	1,00	79,70	-0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-23 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,90	0,00	1,00	79,40	-0,07			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,80	0,00	1,00	79,60	-0,01			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	2,30	18,30	0,00	1,00	79,40	-0,05			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	1,00	80,20	0,00			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	1,00	80,30	-0,08			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,60	0,00	1,00	79,80	-0,01			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,80	0,00	1,00	79,90	0,02			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,90	0,00	2,00	79,40	0,11			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 B	16/01/2024	0,30%	0,30%	1,20	19,00	0,00	2,00	79,50	0,08			0,00	11,00	
Edifício I 1	PMG-12 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	2,90	17,50	0,00	3,00	79,50	0,14			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,70	0,00	3,00	79,50	0,18			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,80	0,00	2,00	80,20	0,08			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,00	0,00	2,00	80,30	0,04			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	3,10	17,30	0,00	3,00	79,60	0,12			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	4,70	15,90	0,00	3,00	79,40	-0,02			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,09			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,10	0,08			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	19,40	0,00	3,00	79,20	0,09			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	19,20	0,00	3,00	79,50	0,12			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,90	0,00	3,00	79,90	0,13			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,50	0,00	3,00	79,60	0,10			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,50	0,00	2,00	80,00	0,07			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,30	0,00	3,00	80,00	0,01			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	1,00	80,10	-0,02			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	1,00	80,20	0,01			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,50	0,00	1,00	79,80	-0,02			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	2,00	79,80	0,08			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 B	15/01/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,60	0,00	2,00	79,60	0,11			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,50	0,00	2,00	79,60	0,06			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 B	15/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,70	0,00	3,00	80,00	0,05			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 A	15/01/2024	0,00%	0,00%	2,00	18,00	0,00	2,00	80,00	0,07			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 B	15/01/2024	0,00%	0,00%	4,30	16,10	0,00	2,00	79,60	0,03			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 A	15/01/2024	0,00%	0,00%	2,00	17,40	0,00	2,00	80,60	0,06			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 B	15/01/2024	0,00%	0,00%	1,90	18,60	0,00	2,00	79,50	0,00			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,80	0,00	2,00	79,50	0,05			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 B	15/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	19,10	0,00	2,00	79,70	0,08			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,50	0,00	3,00	79,60	0,04			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 B	15/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	19,10	0,00	2,00	79,50	0,07			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 A	15/01/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,30	0,00	2,00	80,20	0,10			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 B	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	2,00	79,70	0,06			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134 B	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,80	0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	1,00	79,90	0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 B	15/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,90	0,00	2,00	79,80	0,01			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,60	0,00	2,00	80,10	-0,04			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 B	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	1,00	1,00	80,10	-0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,60	0,00	1,00	79,70	0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 B	15/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,20	0,00	1,00	79,80	0,02			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	1,00	79,90	0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 B	15/01/2024	0,00%	0,00%	4,20	16,40	0,00	1,00	79,40	0,00			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	2,00	80,20	0,02			0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	19,00	0,00	1,00	79,60	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,60	0,00	2,00	79,80	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,90	0,00	2,00	80,00	-0,27		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	2,00	80,00	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	3,40	17,10	0,00	2,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	19,00	0,00	2,00	79,70	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,30	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	2,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	11,90	12,10	0,00	2,00	76,00	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,10	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,60	0,00	2,00	80,10	-0,20		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,50	0,00	2,00	79,40	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	1,00	80,00	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	19,00	0,00	2,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	8,30	14,70	0,00	2,00	77,00	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,70	0,00	2,00	79,90	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,20	0,00	1,00	79,90	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	1,00	80,20	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,30	0,00	2,00	80,20	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,80	0,00	2,00	79,40	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,30	0,00	2,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,20	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	2,00	80,20	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,20	0,00	2,00	80,40	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	3,00	80,20	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	1,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	1,00	80,20	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,20	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	1,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,30	0,00	2,00	80,40	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	2,00	80,10	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,09		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Edifício I-4	PMG-147	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,20	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,20	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,50	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	4,40	16,50	0,00	2,00	79,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,90	0,00	2,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	1,90	18,90	0,00	1,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,80	0,00	1,00	79,70	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	2,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	7,70	14,70	0,00	1,00	77,70	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,50	0,00	1,00	79,60	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	4,00	17,30	0,00	2,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,10	0,00	0,00	80,50	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	0,00	80,50	-0,12		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	0,00	80,50	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	0,00	80,50	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	1,90	18,00	0,00	0,00	80,10	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	17,80	0,00	1,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,00	0,00	2,00	80,00	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	17/01/2024	3,00%	3,00%	3,70	15,00	0,00	2,00	78,30	0,05		0,00	100,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,40	0,00	2,00	79,80	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,20	0,00	2,00	80,20	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	0,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	3,00	18,20	0,00	1,00	78,90	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,60	0,00	1,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	2,00	18,30	0,00	1,00	79,70	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,50	0,00	1,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,90	0,00	1,00	79,40	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,30	0,00	1,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,30	0,00	2,00	79,90	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	1,90	18,20	0,00	1,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,50	0,00	1,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	1,00	80,40	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	9,60	11,40	0,00	1,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	9,20	14,60	0,00	2,00	76,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	1,00	80,50	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	17/01/2024	0,20%	0,20%	5,60	12,70	0,00	1,00	81,60	-0,03		0,00	5,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	1,00	80,50	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	0,00	80,40	0,29		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	0,00	80,60	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	17/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,30	0,00	0,00	80,20	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	17/01/2024	0,20%	0,70%	0,20	19,40	0,00	1,00	80,20	0,05		0,00	4,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	1,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	1,00	80,10	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,00		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	1,00	80,10	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,10	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B	16/01/2024	6,10%	8,50%	2,50	18,00	0,00	2,00	73,40	0,61			0,00	100,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,90	0,00	1,00	80,20	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	2,00	80,20	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	19,20	0,00	1,00	79,70	0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,70	0,00	1,00	79,90	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,50	0,00	2,00	80,20	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	2,00	80,20	0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	2,00	80,30	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	5,20	16,20	0,00	1,00	78,60	-0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,70	0,00	1,00	80,00	-0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	2,80	18,00	0,00	1,00	79,50	-0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,90	0,00	1,00	79,90	0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,90	0,00	1,00	80,20	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	2,70	16,50	0,00	1,00	80,70	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	3,60	17,00	0,00	1,00	79,30	-0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	2,00	79,90	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157 B	16/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,08			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	1,00	80,40	0,07			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,10	0,00	2,00	80,60	0,07			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,40	0,00	2,00	80,30	0,06			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 B	18/01/2024	0,10%	0,10%	1,20	9,50	0,00	2,00	89,10	0,03			0,00	3,00	
Enfermaria	PMG-72 A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	2,00	80,40	0,03			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 B	18/01/2024	0,00%	0,00%	2,50	17,10	0,00	2,00	80,40	-0,08			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,90	0,00	2,00	80,40	0,09			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 B	18/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,80	0,00	2,00	80,10	0,06			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,90	0,00	1,00	80,60	0,05			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 B	18/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	12,70	0,00	1,00	86,00	0,03			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75 A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,50	0,00	1,00	79,90	0,08			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75 B	18/01/2024	0,00%	0,00%	3,00	14,10	0,00	2,00	82,90	0,00			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 A	18/01/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,60	0,00	2,00	79,80	0,08			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 B	18/01/2024	0,00%	0,00%	4,10	12,30	0,00	1,00	83,60	0,03			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,40	0,00	1,00	80,90	0,06			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	1,00	80,40	0,00			0,00	0,00	
CAT	PMG-82 A	18/01/2024	0,00%	0,00%	2,10	17,80	0,00	1,00	80,10	0,02			0,00	0,00	
CAT	PMG-82 B	18/01/2024	0,00%	0,00%	5,30	15,30	0,00	1,00	79,40	-0,02			0,00	0,00	
CAT	PMG-83 A	18/01/2024	0,00%	0,00%	5,50	16,20	0,00	1,00	78,40	0,03			0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
CAT	PMG-83	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	6,70	14,90	0,00	1,00	78,40	-0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,40	0,00	1,00	80,40	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,20	0,00	1,00	80,50	-0,21		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,00	0,00	1,00	80,30	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,60	0,00	1,00	79,70	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,10	0,00	1,00	80,30	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	4,90	16,20	0,00	1,00	78,90	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,00	0,00	1,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	4,30	16,80	0,00	1,00	78,90	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,30	0,00	1,00	80,40	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,10	0,00	2,00	80,20	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,10	0,00	1,00	80,30	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	4,20	16,50	0,00	1,00	79,20	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	2,70	18,00	0,00	1,00	79,30	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	4,20	16,70	0,00	1,00	79,10	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,60	0,00	4,00	80,00	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	4,00	80,10	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	4,00	80,20	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,30	0,00	4,00	80,20	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	3,00	80,00	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	4,00	80,20	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	4,00	80,00	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,60	0,00	3,00	80,00	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	3,00	79,80	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,20	0,00	4,00	80,20	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,70	0,00	4,00	79,90	0,16		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,40	0,00	4,00	80,10	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		15/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	3,00	80,30	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		15/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,40	0,00	3,00	80,10	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		15/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,50	0,00	3,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		15/01/2024	0,00%	0,00%	3,20	17,80	0,00	3,00	79,00	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		15/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,20	0,00	3,00	80,00	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		15/01/2024	0,00%	0,00%	2,30	16,80	0,00	3,00	81,00	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		15/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	2,00	80,20	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	3,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,00	0,00	3,00	79,80	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	3,00	80,30	0,15		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	15/01/2024	0,70%	0,70%	1,30	17,60	0,00	3,00	80,50	0,02		0,00	34,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	3,00	80,30	0,12		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	3,00	80,30	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		15/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	3,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,30	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	5,30	15,10	0,00	3,00	79,70	0,10		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	3,00	80,30	0,11		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	1,50	16,80	0,00	3,00	81,70	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	3,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	3,00	80,00	0,05		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Portaria P3	PMG-120	C	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,20		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	15/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	3,00	80,20	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	5,40	13,90	0,00	3,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	3,00	80,00	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	3,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,10	0,00	3,00	79,80	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	3,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,00	0,00	3,00	80,40	0,09		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,20	0,00	3,00	80,00	-0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	3,00	80,10	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	3,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,50	0,00	2,00	80,00	0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	2,00	79,80	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	19,00	0,00	2,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	3,00	80,30	0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	3,00	80,30	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,30	0,00	2,00	79,80	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	2,00	80,20	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	18/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	2,00	80,30	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	18/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,80	0,00	2,00	79,90	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	2,00	18,90	0,00	2,00	79,10	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	3,30	17,80	0,00	2,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,90	0,00	2,00	79,30	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	2,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	1,00	79,40	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	1,80	19,20	0,00	1,00	79,00	-0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	2,00	79,30	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,20	0,00	2,00	79,60	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	20,20	0,00	2,00	79,00	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	2,30	18,90	0,00	1,00	78,80	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	1,00	80,10	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,40	0,00	1,00	79,90	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	1,00	1,00	80,20	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,50	1,00	1,00	80,10	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	1,00	80,00	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	1,00	80,00	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,40	0,00	1,00	79,80	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	1,00	80,00	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	19,40	0,00	1,00	79,20	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	23/01/2024	0,10%	0,10%	0,80	19,90	0,00	1,00	79,20	0,00		0,00	5,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	3,50	17,40	0,00	1,00	79,10	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,70	0,00	2,00	79,30	-0,01		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Edifício I 1	PMG-13 A		23/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,60	0,00	2,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 B		23/01/2024	0,00%	0,00%	1,90	18,60	0,00	2,00	79,50	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 A		23/01/2024	0,00%	0,00%	2,90	18,20	0,00	1,00	78,90	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 B		23/01/2024	0,00%	0,00%	4,10	17,00	0,00	1,00	78,90	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 A		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	2,00	79,50	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 B		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,60	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 A		23/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	19,80	0,00	1,00	78,80	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 B		23/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,80	0,00	1,00	79,00	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 A		23/01/2024	0,00%	0,00%	2,60	19,10	0,00	1,00	78,30	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 B		23/01/2024	0,00%	0,00%	2,20	18,90	0,00	1,00	78,80	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 A		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	1,00	79,30	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 B		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	20,10	0,00	1,00	79,30	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 A		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 B		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	1,00	80,00	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136 B		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	1,00	80,10	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 A		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	2,00	79,60	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	2,00	79,80	-0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 A		22/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	19,40	0,00	2,00	79,20	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,20	0,00	1,00	79,70	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 A		22/01/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,30	0,00	2,00	80,00	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	3,60	16,40	0,00	2,00	80,00	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 A		22/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	19,10	0,00	2,00	79,50	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	20,00	0,00	2,00	79,30	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 A		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,80	0,00	2,00	79,30	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,70	0,00	1,00	79,50	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 A		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	2,00	79,60	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,70	0,00	1,00	79,40	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 A		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,20	0,00	2,00	79,90	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	20,10	0,00	2,00	79,60	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	2,00	79,60	-0,16		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 A		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	0,00	79,50	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,10	0,00	0,00	80,30	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 A		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	20,30	0,00	0,00	79,30	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,80	0,00	0,00	78,20	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 A		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	0,00	79,50	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	19,50	0,00	0,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 A		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	20,10	0,00	0,00	79,30	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	0,00	79,70	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 A		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,80	0,00	0,00	79,60	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	2,10	18,70	0,00	0,00	79,40	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 A		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,80	0,00	0,00	78,30	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	1,90	19,00	0,00	0,00	79,30	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 A		22/01/2024	0,00%	0,00%	9,20	11,30	0,00	0,00	79,70	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,20	0,00	0,00	78,70	-0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 A		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,60	0,00	0,00	78,40	-0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	2,30	19,40	0,00	0,00	78,50	-0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38 A		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	20,90	0,00	0,00	78,90	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	20,20	0,00	0,00	79,30	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 A		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	21,30	0,00	0,00	78,60	-0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 B		22/01/2024	0,00%	0,00%	18,40	1,80	0,00	0,00	80,10	-0,12		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	0,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,80	0,00	0,00	79,60	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	1,00	79,30	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	0,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	22/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,90	0,00	0,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	22/01/2024	0,00%	0,00%	7,10	12,90	0,00	0,00	80,00	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	22/01/2024	0,00%	0,00%	1,50	19,30	0,00	0,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	22/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	19,30	0,00	0,00	79,40	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	20,90	0,00	0,00	78,90	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	22/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	19,00	0,00	0,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	20,60	0,00	0,00	79,20	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	20,30	0,00	0,00	79,20	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,50	0,00	0,00	78,50	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	1,00	79,60	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,60	0,00	0,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,50	0,00	0,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,60	0,00	0,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	2,00	18,80	0,00	0,00	79,20	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,50	0,00	0,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	1,50	19,70	0,00	0,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,50	0,00	0,00	78,50	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	20,10	0,00	0,00	79,10	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	21,60	0,00	0,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	2,00	19,20	0,00	0,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,60	0,00	0,00	78,50	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	20,20	0,00	0,00	79,20	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	12,60	0,00	0,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	20,50	0,00	0,00	78,90	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	21,70	0,00	0,00	78,50	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,80	0,00	0,00	79,00	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	21,60	0,00	0,00	78,60	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,90	0,00	0,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	21,60	0,00	0,00	78,60	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	19,70	0,00	0,00	78,90	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	21,50	0,00	0,00	78,60	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	2,40	18,60	0,00	0,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,40	0,00	0,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	19,60	0,00	0,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	2,60	18,10	0,00	0,00	79,20	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	0,00	79,80	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	5,10	15,70	0,00	0,00	79,10	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	2,70	18,70	0,00	0,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	2,00	19,20	0,00	0,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,70	0,00	0,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	1,00	79,80	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	2,80	17,90	0,00	1,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	2,00	79,70	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	0,00	79,70	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	1,00	79,80	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	1,00	79,80	0,00		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Conjunto Laboratorial	PMG-49 A		24/01/2024	0,00%	0,00%	1,90	19,20	0,00	1,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	10,80	13,10	0,00	1,00	76,10	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 A		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,00	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	3,80	17,80	0,00	1,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 A		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	1,00	80,20	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	1,00	80,20	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 A		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	1,00	80,20	-0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	1,00	80,20	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 A		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	1,00	80,20	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,20	0,00	1,00	80,40	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 A		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,60	0,00	1,00	80,10	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	0,00	80,10	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 A		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	1,00	80,10	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	1,00	80,10	-0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 A		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,70	0,00	0,00	79,40	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	3,40	19,30	0,00	0,00	77,60	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 A		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,40	0,00	0,00	78,60	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	0,00	79,30	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 A		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,70	0,00	0,00	78,30	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	20,40	0,00	0,00	79,10	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,60	0,00	0,00	78,50	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	4,40	16,50	0,00	0,00	79,40	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,50	0,00	0,00	78,50	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	20,50	0,00	0,00	79,00	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	21,20	0,00	0,00	78,70	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	13,60	4,50	0,00	0,00	82,20	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	2,00	79,50	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	2,40	16,90	0,00	1,00	80,70	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	1,00	80,20	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	1,00	80,20	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	1,00	80,20	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	1,00	80,20	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	1,00	80,10	-0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	1,00	79,20	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B		24/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	1,00	79,10	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,70	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,70	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	2,00	79,70	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	2,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B		23/01/2024	5,30%	7,50%	2,10	18,80	0,00	2,00	73,80	0,07		0,00	100,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,60	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,60	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	2,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B		23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,50	-0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A		23/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	19,60	0,00	2,00	79,10	0,02		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	2,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	2,00	79,60	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	1,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	2,00	79,70	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	1,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,80	0,00	2,00	79,60	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	3,20	18,00	0,00	1,00	78,90	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	2,00	19,20	0,00	2,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,90	0,00	1,00	79,40	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	1,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,70	0,00	1,00	79,80	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	2,30	18,30	0,00	1,00	79,50	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	3,00	18,10	0,00	2,00	78,90	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	2,00	79,70	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,70	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	1,00	79,70	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	2,00	79,50	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	2,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	2,00	79,60	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	2,20	18,40	0,00	2,00	79,50	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	2,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	19,30	0,00	2,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	3,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,30	0,00	2,00	79,60	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	1,00	2,00	79,90	0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	1,90	18,40	0,00	2,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	3,00	79,80	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	19,10	0,00	2,00	79,60	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	80,00	-0,01		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	1,90	18,60	0,00	2,00	79,60	0,01		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,60	0,00	3,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,20	0,00	2,00	79,90	0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	3,00	18,00	0,00	3,00	78,90	-0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	4,00	16,80	0,00	2,00	79,20	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	2,50	18,60	0,00	2,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	9,30	14,80	0,00	2,00	75,90	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	6,00	16,80	0,00	2,00	77,20	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	8,10	14,50	0,00	2,00	77,40	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,20	0,00	1,00	79,70	-0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	2,00	79,70	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	1,90	19,00	0,00	2,00	79,10	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	2,40	19,40	0,00	2,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	19,50	0,00	1,00	79,30	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	2,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	2,50	18,50	0,00	2,00	78,90	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,60	0,00	2,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,80	0,00	1,00	79,70	0,00		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
CAT	PMG-160	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	2,00	79,90	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	3,40	18,00	0,00	2,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	2,50	19,00	0,00	1,00	78,50	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	3,80	18,10	0,00	2,00	78,00	0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	2,00	79,60	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	2,00	79,80	0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	2,00	79,70	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,80	0,00	2,00	79,60	0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	2,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	2,00	79,80	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	1,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	19,10	0,00	2,00	79,50	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,70	-0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,80	0,00	2,00	79,40	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	2,00	79,50	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	24/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	2,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,30	0,00	1,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		22/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,40	0,00	1,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		22/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,80	0,00	1,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		22/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	19,10	0,00	1,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		22/01/2024	0,00%	0,00%	1,80	17,80	0,00	2,00	80,40	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,60	0,00	1,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	1,00	80,10	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	22/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,30	0,00	1,00	79,70	0,00		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	1,00	80,20	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	2,00	80,20	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		22/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	2,00	79,90	-0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,30	0,00	2,00	80,20	0,00		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	2,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	22/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	17,70	0,00	2,00	81,00	0,07		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,60	0,90		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,50	0,90		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,60	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,70	0,11		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	2,00	79,70	0,12		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,30	0,00	3,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	3,00	79,70	0,10		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	22/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	3,00	79,70	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	20,40	0,00	2,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,20	0,02		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,20	0,01		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	20,00	0,00	2,00	79,50	-0,01		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	2,00	79,30	0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	20,20	0,00	2,00	79,20	0,06		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Transportes	PMG-124	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,60	0,00	2,00	79,20	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,60	0,00	2,00	79,30	0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	23/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	0,00	79,70	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	25/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,70	0,00	0,00	78,40	-0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	25/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,30	0,00	0,00	78,50	0,00		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	25/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	21,10	0,00	0,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	25/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,00	0,00	0,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	25/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	21,80	0,00	0,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	25/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	21,20	0,00	0,00	78,80	0,00		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	25/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	21,80	0,00	0,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	25/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	21,60	0,00	0,00	78,30	-0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	25/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,80	0,00	0,00	78,30	-0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	25/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,40	0,00	0,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	25/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,80	0,00	0,00	78,30	-0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	25/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	21,50	0,00	0,00	78,40	-0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	25/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	21,30	0,00	0,00	78,50	-0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	25/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	20,20	0,00	0,00	79,10	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	3,80	17,70	0,00	3,00	78,50	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	1,20	19,40	0,00	3,00	79,30	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,20	0,00	3,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	4,50	17,00	0,00	3,00	78,50	0,70		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,60	0,00	3,00	79,30	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,10	0,00	3,00	79,70	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	3,00	80,00	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	3,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	3,00	79,50	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	1,60	19,20	0,00	3,00	79,20	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,70	0,00	3,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,20	0,00	3,00	79,90	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	20,00	0,00	3,00	79,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,10	0,00	3,00	80,10	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	3,00	79,90	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,50	0,00	3,00	79,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	3,00	79,70	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	19,10	0,00	3,00	79,50	0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	30/01/2024	0,40%	0,40%	1,90	18,50	0,00	3,00	79,20	0,13		0,00	11,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,50	0,00	3,00	80,20	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	2,60	18,50	0,00	3,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,30	0,00	3,00	80,20	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,30	0,00	3,00	80,30	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	5,20	16,31	0,00	3,00	78,60	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	5,10	15,90	0,00	3,00	78,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	3,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,60	0,00	3,00	79,30	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,40	0,00	3,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	2,00	18,50	0,00	3,00	79,50	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	2,10	18,40	0,00	3,00	49,50	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,30	0,00	3,00	79,90	0,02		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-24	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,20	0,00	3,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	3,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,30	0,00	3,00	79,80	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,50	0,00	3,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,00	0,00	3,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,40	0,00	3,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	3,70	16,40	0,00	3,00	79,90	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,60	0,00	3,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	3,00	79,50	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,80	0,00	3,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,40	0,00	3,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,90	0,00	2,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,70	0,00	3,00	79,70	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,60	0,00	3,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	3,00	79,60	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	3,00	79,60	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	0,00	79,80	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	0,00	79,80	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,20	1,00	1,00	80,40	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	2,00	80,30	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	1,00	2,00	80,30	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,00	0,00	2,00	80,30	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	1,50	19,00	0,00	2,00	79,50	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	3,30	17,40	0,00	2,00	79,30	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,20	0,00	2,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,10	0,00	3,00	79,80	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,60	0,00	3,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,40	0,00	3,00	79,90	-0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	3,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	2,70	17,70	0,00	3,00	79,60	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,50	0,00	3,00	80,00	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	2,00	79,90	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,60	0,00	3,00	80,00	-0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,70	0,00	2,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	11,40	12,50	0,00	3,00	76,10	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	3,00	79,80	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	2,00	79,60	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,20	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,00	0,00	3,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	6,70	15,30	0,00	3,00	78,00	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,90	0,00	3,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	1,80	17,90	0,00	3,00	80,20	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,00	0,00	2,00	80,60	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,00	0,00	2,00	80,50	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	2,10	18,40	0,00	2,00	79,60	0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,70	0,00	3,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	80,00	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	80,00	-0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	80,00	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	3,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	3,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	2,00	79,90	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	79,90	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	80,00	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	80,00	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	79,90	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	2,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	2,00	79,90	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	1,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	79,90	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	2,00	80,00	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,20	0,00	3,00	79,70	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	8,10	13,70	0,00	2,00	78,20	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	3,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	3,40	17,60	0,00	2,00	79,00	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	2,00	80,40	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,30	-0,16		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	1,00	80,40	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,40	0,00	1,00	80,30	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,20	0,00	1,00	80,50	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	31/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,50	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Conjunto Laboratorial	PMG-54 B		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 A		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	1,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 B		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	1,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 A		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,50	0,00	0,00	79,50	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 B		31/01/2024	0,00%	0,00%	3,30	19,40	0,00	0,00	77,60	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 A		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,30	0,00	0,00	78,70	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 B		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	20,50	0,00	0,00	79,00	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 A		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,50	0,00	0,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B		31/01/2024	0,00%	0,00%	1,70	19,70	0,00	0,00	78,60	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,10	0,00	0,00	78,90	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B		31/01/2024	0,00%	0,00%	5,70	15,00	0,00	0,00	79,60	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,10	0,00	0,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	20,20	0,00	0,00	78,90	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	21,20	0,00	0,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B		31/01/2024	0,00%	0,00%	13,30	4,60	0,00	0,00	82,40	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	2,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B		31/01/2024	0,00%	0,00%	1,50	19,10	0,00	2,00	79,50	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,30	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	1,00	80,30	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B		31/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A		30/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	1,00	80,20	-0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B		30/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,20	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A		30/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	79,90	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B		30/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A		30/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	2,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B		30/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A		30/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,40	0,00	2,00	79,70	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B		30/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	2,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A		01/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,50	0,00	0,00	78,50	-0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B		01/02/2024	0,00%	0,00%	3,30	17,80	0,00	0,00	78,80	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A		01/02/2024	0,00%	0,00%	2,10	19,70	0,00	0,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B		01/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	0,00	79,10	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A		01/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,50	0,00	0,00	78,40	-0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B		01/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	20,80	0,00	0,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A		01/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	21,20	0,00	0,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B		01/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	0,00	79,10	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A		01/02/2024	0,00%	0,00%	2,80	19,30	0,00	0,00	78,20	-0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B		01/02/2024	0,00%	0,00%	2,70	18,70	0,00	0,00	78,50	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A		01/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	20,70	0,00	0,00	78,90	-0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B		01/02/2024	0,00%	0,00%	2,00	19,20	0,00	0,00	78,70	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A		30/01/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,40	1,00	1,00	80,40	-0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B		30/01/2024	0,00%	0,00%	3,60	17,50	0,00	1,00	78,90	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A		30/01/2024	0,00%	0,00%	2,10	18,60	0,00	1,00	79,20	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B		30/01/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,90	0,00	1,00	79,40	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A		30/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,20	0,00	2,00	79,90	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B		30/01/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,80	0,00	1,00	80,30	-0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	20,70	0,00	0,00	78,90	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,90	0,00	0,00	79,00	-0,09			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,50	0,00	0,00	78,60	-0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 B	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,90	0,00	0,00	79,10	-0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153 B	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,40	0,00	1,00	80,20	0,00			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154 B	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155 B	30/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,09			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,90	0,00	2,00	78,80	-0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	21,20	0,00	0,00	78,40	-0,07			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,10	0,06			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,00	-0,03			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,04			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,00	-0,03			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,70	0,00	3,00	79,90	0,09			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	3,00	16,20	0,00	2,00	80,80	0,03			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,06			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,90	0,00	2,00	79,60	0,02			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,50	0,00	2,00	80,00	0,03			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	15,10	0,00	2,00	83,80	0,03			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,20	0,00	2,00	79,90	0,07			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	1,20	17,90	0,00	2,00	80,90	0,05			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,60	0,00	2,00	79,60	0,03			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	1,40	17,70	0,00	2,00	81,00	0,03			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,03			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,01			0,00	0,00	
CAT	PMG-82 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,70	0,00	1,00	79,90	-0,04			0,00	0,00	
CAT	PMG-82 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	8,00	14,70	0,00	1,00	77,30	-0,10			0,00	0,00	
CAT	PMG-83 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	4,80	16,90	0,00	1,00	78,30	-0,03			0,00	0,00	
CAT	PMG-83 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	6,90	15,00	0,00	2,00	78,10	-0,06			0,00	0,00	
CAT	PMG-94 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,50	0,00	1,00	80,30	-0,08			0,00	0,00	
CAT	PMG-94 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	1,00	80,30	-0,07			0,00	0,00	
CAT	PMG-95 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,30	0,00	1,00	80,00	-0,07			0,00	0,00	
CAT	PMG-95 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,90	0,00	1,00	79,30	-0,03			0,00	0,00	
CAT	PMG-96 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,90	0,00	1,00	79,90	-0,03			0,00	0,00	
CAT	PMG-96 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	3,20	17,70	0,00	1,00	79,10	-0,12			0,00	0,00	
CAT	PMG-97 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,10	0,00	1,00	80,00	-0,03			0,00	0,00	
CAT	PMG-97 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	2,90	17,70	0,00	2,00	79,30	-0,01			0,00	0,00	
CAT	PMG-98 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,30	0,00	1,00	80,00	0,01			0,00	0,00	
CAT	PMG-98 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,20	0,00	1,00	80,20	-0,03			0,00	0,00	
CAT	PMG-160 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	1,00	80,50	-0,07			0,00	0,00	
CAT	PMG-160 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	3,90	16,90	0,00	1,00	79,30	-0,10			0,00	0,00	
CAT	PMG-161 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	2,30	18,60	0,00	1,00	79,10	-0,05			0,00	0,00	
CAT	PMG-161 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	3,60	17,70	0,00	1,00	78,70	-0,05			0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	80,00	0,07			0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	2,00	80,10	0,02			0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,60	0,00	2,00	79,70	0,03			0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,40	0,00	1,00	79,90	0,08			0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	1,00	80,10	0,05			0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90 B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,50	0,00	2,00	80,20	0,00			0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91 A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	2,00	80,10	0,02			0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Incubadora	PMG-91	B	01/02/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,60	0,00	2,00	79,80	0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,60	0,00	2,00	80,10	-0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,20	0,00	2,00	80,20	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,60	0,00	1,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,20	0,00	2,00	80,20	-0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		29/01/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	3,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		29/01/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,90	0,00	2,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		29/01/2024	0,00%	0,00%	2,40	18,70	0,00	2,00	78,90	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		29/01/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,80	0,00	3,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		29/01/2024	0,00%	0,00%	1,80	17,70	0,00	3,00	80,50	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		29/01/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	2,00	79,60	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	3,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	2,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	80,00	-0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	3,00	79,60	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	3,00	79,70	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	2,90	17,20	0,00	2,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	1,40	17,40	0,00	2,00	81,20	0,01		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,07		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,02		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	29/01/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	3,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	79,90	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,30	0,00	3,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	3,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	79,90	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	3,00	80,00	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,60	0,00	0,00	78,50	-0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	20,70	0,00	0,00	78,70	0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,50	0,00	0,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	20,70	0,00	0,00	78,80	0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,60	0,00	0,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	20,80	0,00	0,00	78,70	-0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,60	0,00	0,00	78,40	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,00	0,00	0,00	78,70	0,00		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,20	0,00	0,00	78,70	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	21,10	0,00	0,00	78,80	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,00	0,00	0,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	21,20	0,00	0,00	78,70	-0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	01/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,80	0,00	0,00	79,60	-0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	01/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,60	0,00	0,00	79,70	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	2,10	18,50	0,00	2,00	79,40	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	3,40	17,60	0,00	2,00	79,00	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,60	0,00	2,00	79,70	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,60	0,00	2,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,50	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	1,90	18,20	1,00	2,00	79,90	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,40	0,00	2,00	80,10	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,40	0,00	2,00	80,30	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	1,00	79,80	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,90	0,00	2,00	79,40	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,30	0,00	1,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,80	0,00	2,00	80,20	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,10	0,00	2,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,50	0,00	2,00	80,30	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,90	0,00	2,00	80,30	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,50	0,00	2,00	80,30	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	2,00	80,30	-0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,30	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,80	0,00	2,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	06/02/2024	0,20%	0,20%	1,10	19,10	0,00	3,00	79,60	0,00		0,00	7,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	3,30	17,00	0,00	2,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,60	0,00	2,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,90	0,00	2,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	2,00	18,30	0,00	2,00	79,70	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	3,50	17,00	0,00	2,00	79,60	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	5,30	15,60	0,00	2,00	79,10	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,70	0,00	2,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	2,00	80,00	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,30	0,00	1,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	2,60	18,50	0,00	1,00	78,90	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	2,00	18,50	0,00	2,00	79,40	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,40	0,00	2,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,30	0,00	2,00	80,00	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,50	0,00	2,00	79,90	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,60	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,30	0,00	2,00	80,00	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	1,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	1,40	19,00	0,00	1,00	79,60	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,80	0,00	2,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,50	0,00	2,00	79,90	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	2,10	17,90	0,00	1,00	79,90	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	4,00	16,00	0,00	1,00	80,00	-0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,10	0,00	1,00	79,80	0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-5 Auditórios	PMG-28	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,70	0,00	2,00	79,60	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,40	0,00	2,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,30	0,00	2,00	79,80	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,30	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,10	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,90	0,00	2,00	80,30	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	2,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	2,00	79,90	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,60	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,40	0,00	3,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	2,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,70	0,00	1,00	79,90	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,30	1,00	1,00	79,90	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,60	1,00	1,00	79,80	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	3,50	17,30	0,00	2,00	79,10	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,50	0,00	1,00	79,60	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	1,30	19,10	0,00	1,00	79,60	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,20	0,00	1,00	79,90	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,10	0,00	1,00	80,10	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,50	0,00	2,00	79,90	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	2,70	17,90	0,00	2,00	79,40	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,20	0,00	1,00	79,70	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,60	0,00	1,00	79,90	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,30	0,00	1,00	80,10	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,00	0,00	1,00	79,90	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	10,00	13,60	0,00	1,00	76,50	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,60	0,00	1,00	79,90	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	2,00	80,10	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	1,00	79,90	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,60	0,00	1,00	80,10	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,20	0,00	1,00	79,80	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	7,00	15,50	1,00	1,00	77,50	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	1,00	80,00	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,60	1,00	1,00	80,00	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,30	0,00	2,00	80,40	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,50	0,00	2,00	80,20	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	2,30	18,20	0,00	1,00	79,50	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,20	0,00	1,00	79,70	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	1,00	80,20	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,60	0,00	2,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,50	0,00	2,00	80,20	-0,10		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-68 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,60	0,00	2,00	81,00	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,00	0,00	2,00	80,70	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	1,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,00	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	3,00	80,30	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	2,00	80,10	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,10	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	1,00	80,20	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	80,00	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	2,00	80,10	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	2,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	1,30	19,00	0,00	2,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	6,00	15,20	0,00	3,00	78,70	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,50	0,00	2,00	80,00	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	3,80	17,30	0,00	2,00	78,90	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	1,00	80,30	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	1,00	80,40	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	1,00	80,40	-0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	2,00	80,40	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	3,00	15,90	0,00	1,00	81,10	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	1,00	80,30	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 B		07/02/2024	1,80%	1,80%	3,00	15,70	0,00	1,00	79,50	-0,05		0,00	46,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,70	0,00	2,00	80,50	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	2,00	80,30	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,60	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,70	0,00	1,00	79,90	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,50	0,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	2,00	80,30	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,30	0,00	1,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,20	0,00	2,00	80,30	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B		07/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,40	0,00	2,00	80,20	0,04		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A	07/02/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,90	0,00	2,00	79,60	0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	2,00	80,00	-0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,80	0,00	1,00	80,40	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B	07/02/2024	0,00%	0,00%	11,00	11,40	0,00	2,00	77,70	0,00			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	2,00	79,90	0,02			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B	07/02/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,80	0,00	2,00	79,70	0,07			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,40	-0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	-0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,40	0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	1,00	2,00	80,30	-0,06			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,60	0,00	2,00	80,10	0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B	07/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,80	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	-0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,80	-0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,30	0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	79,90	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,90	0,00			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B	06/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	Água no momento de medição
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	79,90	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	-0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	79,90	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A	06/02/2024	0,00%	0,00%	1,40	19,10	0,00	2,00	79,50	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	2,00	80,00	0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,50	0,00	2,00	80,10	0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	2,00	79,80	0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,50	0,00	2,00	80,20	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	2,00	79,90	0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,40	0,00	2,00	80,30	0,00			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	3,30	17,80	0,00	2,00	78,90	0,00			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A	06/02/2024	0,00%	0,00%	2,30	18,70	0,00	1,00	79,10	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	1,40	19,20	0,00	2,00	79,40	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,40	0,00	2,00	79,90	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,70	0,00	2,00	80,40	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A	06/02/2024	0,00%	0,00%	1,70	17,90	0,00	1,00	80,30	0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	2,70	17,60	0,00	1,00	79,70	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,90	-0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,80	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,80	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157 B	06/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,06			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,00	0,00	0,00	79,00	-0,01			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,50	0,00	0,00	80,10	-2,27			0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Enfermaria	PMG-71	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,90	0,00	0,00	79,20	0,00		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	3,70	0,00	0,00	95,60	0,00		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,30	0,00	0,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	7,20	10,00	0,00	0,00	83,10	0,00		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	21,20	0,00	0,00	78,70	-0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	2,50	19,20	0,00	0,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	20,30	0,00	0,00	79,50	0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	2,50	6,20	0,00	0,00	91,60	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	20,50	0,00	0,00	79,30	0,00		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	6,30	4,10	0,00	0,00	89,90	-0,14		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,10	0,00	0,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	5,20	6,40	0,00	0,00	88,70	0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,30	0,00	0,00	78,70	0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	05/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição
CAT	PMG-82	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	5,40	17,00	0,00	0,00	77,90	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	12,70	9,00	0,00	0,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	5,90	15,60	0,00	0,00	78,80	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	12,30	9,40	0,00	0,00	78,60	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,30	0,00	0,00	78,70	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	20,60	0,00	0,00	79,00	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	6,40	18,10	0,00	0,00	75,80	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	5,10	19,10	0,00	0,00	76,10	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	21,30	0,00	0,00	78,60	-0,12		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	9,60	10,60	0,00	0,00	80,10	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,30	0,00	0,00	78,70	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	6,80	13,60	0,00	0,00	79,90	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,60	0,00	0,00	78,50	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	20,40	0,00	0,00	79,00	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,20	0,00	0,00	78,80	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	6,40	14,10	0,00	0,00	79,80	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,90	0,00	0,00	79,40	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	7,10	16,00	0,00	0,00	77,20	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	21,20	0,00	0,00	78,60	-0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	21,30	0,00	0,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	21,30	0,00	0,00	78,30	-0,20		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	20,20	0,00	0,00	79,20	-0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,70	0,00	0,00	78,40	-0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	20,10	0,00	0,00	79,30	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,70	0,00	0,00	78,40	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	3,00	18,20	0,00	0,00	79,10	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,50	0,00	0,00	78,60	0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	1,20	19,30	0,00	0,00	79,80	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	05/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	21,30	0,00	0,00	78,50	-0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	05/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,60	0,00	0,00	79,70	0,00		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,40	0,00	2,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,60	0,00	2,00	79,80	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		05/02/2024	0,00%	0,00%	2,70	18,20	0,00	2,00	79,10	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		05/02/2024	0,00%	0,00%	1,80	17,60	0,00	2,00	80,60	0,06		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,70	0,00	3,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 A		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 B		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,20	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 A		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 B		05/02/2024	0,30%	0,30%	1,00	18,00	0,00	2,00	80,70	0,07		0,00	3,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 A		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 B		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	2,00	80,30	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162 A		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,40	0,00	2,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162 B		05/02/2024	0,00%	0,00%	3,60	16,00	0,00	2,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166 A		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166 B		05/02/2024	0,00%	0,00%	1,50	17,20	0,00	2,00	81,30	0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119 A		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119 B		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	-0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119 C		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,02		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120 A		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	1,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120 B		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	-0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120 C		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	-0,01		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163 B		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	1,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164 B		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164 C		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	1,00	80,10	0,00		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121 A		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,10	0,00	0,00	78,90	-0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121 B		05/02/2024	0,00%	0,00%	15,00	1,60	0,00	0,00	83,60	-0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122 A		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	21,50	0,00	0,00	78,50	-0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122 B		05/02/2024	0,00%	0,00%	12,50	6,90	0,00	0,00	80,90	1,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123 A		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	20,50	0,00	0,00	79,20	0,00		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123 B		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	21,50	0,00	0,00	78,60	-0,02		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124 A		05/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	20,60	0,00	0,00	79,20	0,02		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124 B		05/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição
Transportes	PMG-158 B		05/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição
Transportes	PMG-159 B		05/02/2024	0,00%	0,00%	13,30	1,00	0,00	0,00	85,80	0,18		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125 A		08/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,10	0,00	1,00	80,20	0,00		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125 B		08/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	1,00	80,50	-0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126 A		08/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,00	0,00	1,00	81,00	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126 B		08/02/2024	0,00%	0,00%	5,00	14,90	0,00	1,00	80,10	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127 A		08/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	1,00	81,00	0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127 B		08/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	1,00	81,00	0,00		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128 A		08/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,70	0,00	1,00	80,90	0,00		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128 B		08/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,90	0,00	1,00	81,10	-0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129 A		08/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	2,00	81,00	-0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129 B		08/02/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,10	0,00	1,00	80,60	-0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130 A		08/02/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,40	0,00	1,00	80,50	0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130 B		08/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	1,00	80,80	-0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131 A		08/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,00	0,00	1,00	80,80	0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131 B		08/02/2024	0,00%	0,00%	2,00	18,00	0,00	1,00	80,00	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16 A		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-16 B		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-17 A		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-17 B		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-18 A		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-18 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-20 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-20 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-22 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-22 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-23 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-23 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-113 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-113 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-114 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-114 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-115 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-115 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-11 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-11 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-12 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-12 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-13 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-13 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-14 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-14 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-15 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-15 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-19 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-19 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-21 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-21 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-24 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-24 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-135 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG -135 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I 1	PMG-136 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	PMG-25 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	PMG-25 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	PMG-26 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	PMG-26 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	PMG-27 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	PMG-27 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	PMG-28 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	PMG-28 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	PMG-29 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	PMG-29 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	PMG-44 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	PMG-44 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	PMG-45 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	PMG-45 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	PMG-134 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-30 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-31 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
I-3 Biblioteca	PMG-31 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-32 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-32 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-33 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-33 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-34 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-34 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-35 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-35 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-36 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-36 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-37 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-37 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-38 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-38 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-39 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-39 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-40 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-40 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-41 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-41 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-42 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-42 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-43 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-43 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-132 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-132 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-133 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	PMG-133 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-4	PMG-63 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,00	0,00	2,00	79,90	0,04			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,50	0,00	2,00	79,80	0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,10	0,00	2,00	80,00	0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	1,30	19,10	0,00	3,00	79,60	0,01			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	2,00	79,70	0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	3,00	79,90	0,04			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	2,00	80,20	0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,04			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	80,00	0,04			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,40	0,00	2,00	79,90	0,05			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,30	0,00	2,00	80,00	0,02			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	2,00	80,10	0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,90	-0,05			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	80,00	0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	2,00	79,90	0,00			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	1,40	19,40	0,00	3,00	79,20	0,05			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	3,00	79,90	-0,05			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,60	0,00	2,00	79,90	0,05			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	5,20	16,00	0,00	3,00	78,80	0,02			0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-80	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	2,50	18,80	0,00	3,00	78,70	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	2,90	18,50	0,00	2,00	78,60	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,50	0,00	2,00	79,60	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,00	0,00	2,00	80,10	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	3,00	16,50	0,00	2,00	80,40	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	3,80	17,60	0,00	2,00	78,60	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	3,00	79,90	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	2,00	79,90	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,40	0,00	3,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,40	0,00	2,00	80,10	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	2,00	79,90	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	1,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	2,00	17,60	0,00	1,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,90	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	2,00	79,80	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,50	0,00	2,00	80,10	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	1,00	79,90	-0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,20	0,00	1,00	80,10	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	2,00	79,70	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	2,00	79,70	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,10	0,00	2,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	1,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	1,00	79,60	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,10	0,00	2,00	79,60	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,20	0,00	2,00	79,70	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	1,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	2,00	79,80	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	16/02/2024	0,80%	0,80%	0,10	19,40	0,00	2,00	79,70	0,03		0,00	23,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	2,00	79,80	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,70	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,30	0,00	2,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,20	0,00	1,00	79,60	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,80	0,00	1,00	79,50	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	7,50	13,20	0,00	2,00	79,30	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	1,00	79,90	-0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	4,20	16,40	0,00	2,00	79,30	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	1,10	19,20	0,00	2,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	1,20	19,50	0,00	1,00	79,30	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,50	0,00	2,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	4,20	13,70	0,00	2,00	82,00	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,40	0,00	1,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,00	1,00	1,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,10	0,00	1,00	80,10	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	4,60	15,10	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,20	0,00	2,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,70	0,00	2,00	79,60	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,60	0,00	1,00	80,10	0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	2,90	17,60	0,00	2,00	79,40	-0,05			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,50	0,00	2,00	80,00	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	1,00	79,80	-0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,80	-0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,30	0,00	1,00	79,70	0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	20,00	0,00	2,00	79,60	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	1,00	79,50	-0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,50	0,00	1,00	79,50	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	1,00	80,10	-0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	1,00	80,00	0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	1,00	79,90	0,00			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	1,00	79,80	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	2,00	79,60	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,40	0,00	1,00	79,60	0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	1,00	79,90	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	1,00	79,90	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	1,00	79,90	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,90	-0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,20	0,00	1,00	79,80	0,09			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	2,00	79,80	0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	6,00	13,60	0,00	1,00	80,30	-0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,70	0,00	2,00	80,00	-0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	1,00	79,60	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,90	0,00	2,00	79,30	-0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,30	0,00	1,00	79,50	0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,90	0,00	2,00	79,60	-0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	9,40	11,30	0,00	1,00	79,30	-0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	20,10	0,00	2,00	79,20	-0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	2,80	18,30	0,00	2,00	79,00	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	1,00	79,40	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,50	0,00	1,00	79,40	0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	20,40	0,00	1,00	79,20	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,30	0,00	1,00	79,40	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157 B	16/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,90	0,00	1,00	79,30	0,09			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	2,00	79,70	0,02			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 B	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	2,00	79,70	0,05			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	1,00	79,80	0,06			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 B	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	2,00	80,00	0,04			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	1,00	79,90	0,02			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 B	15/02/2024	0,00%	0,00%	3,90	15,80	0,00	2,00	80,30	0,03			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,02			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 B	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	1,00	79,80	0,04			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 A	15/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,30	0,00	1,00	80,70	0,04			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 B	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	1,00	79,80	0,01			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75 A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	2,00	79,70	0,03			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75 B	15/02/2024	0,00%	0,00%	2,30	16,00	0,00	2,00	81,70	0,06			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,90	0,00	2,00	79,50	0,09			0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Enfermaria	PMG-76	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,70	0,00	2,00	79,60	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	2,00	79,80	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	1,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	4,20	17,50	0,00	2,00	78,30	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	8,00	13,70	0,00	2,00	78,30	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	5,50	16,80	0,00	2,00	77,60	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	6,80	14,90	0,00	1,00	78,20	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	1,30	19,00	0,00	2,00	79,60	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	4,70	15,80	0,00	2,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	2,10	18,40	0,00	2,00	79,50	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	2,70	18,70	0,00	1,00	78,60	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,90	0,00	1,00	79,70	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	4,90	14,50	0,00	2,00	80,60	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,40	0,00	2,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	3,00	17,10	0,00	2,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,20	0,00	2,00	80,00	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,20	0,00	2,00	80,20	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	1,00	80,40	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	5,80	14,80	0,00	2,00	79,40	-0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	2,40	18,60	0,00	2,00	79,00	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	3,80	17,20	0,00	1,00	79,00	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,70	0,00	2,00	79,90	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	3,00	80,00	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	2,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,40	0,00	3,00	79,90	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	2,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,60	0,00	2,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	3,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,10	0,00	2,00	80,00	0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,80	0,00	3,00	79,70	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,20	0,00	2,00	80,10	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,50	0,00	3,00	79,60	-0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	3,00	79,80	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	2,00	79,70	-0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	20,00	0,00	2,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		15/02/2024	0,00%	0,00%	2,10	18,50	0,00	2,00	79,40	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	2,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		15/02/2024	0,00%	0,00%	1,90	17,80	0,00	3,00	80,30	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	3,00	79,80	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,60	0,00	2,00	79,90	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	3,00	79,80	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,10	0,00	2,00	80,20	0,00		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,80	0,00		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	3,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,20	0,00	3,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,10	0,00	2,00	79,80	0,01		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Ginásio Poliesportivo	PMG-166 B		15/02/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,60	0,00	2,00	80,20	0,04		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119 A		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Portaria P3	PMG-119 B		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Portaria P3	PMG-119 C		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Portaria P3	PMG-120 A		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Portaria P3	PMG-120 B		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Portaria P3	PMG-120 C		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Portaria P3	PMG-163 B		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Portaria P3	PMG-164 B		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Portaria P3	PMG-164 C		-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Transportes	PMG-121 A		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	3,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121 B		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,70	0,00	2,00	79,80	0,01		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122 A		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	3,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122 B		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,20	0,00	3,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123 A		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	2,00	79,80	0,01		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123 B		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,50	0,00	3,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124 A		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,90	0,00	3,00	79,80	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124 B		15/02/2024	0,00%	0,00%	2,10	18,00	0,00	3,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158 B		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,80	0,00	3,00	79,90	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159 B		15/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,90	0,00	2,00	80,10	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125 A		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125 B		15/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-126 A		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	2,00	79,90	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126 B		15/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-127 A		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,10	0,00	2,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127 B		15/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-128 A		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	2,00	80,20	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128 B		15/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-129 A		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129 B		15/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-130 A		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,40	0,00	2,00	79,60	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130 B		15/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-131 A		15/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	2,00	79,80	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131 B		15/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Edifício I 1	PMG-16 A		20/02/2024	0,00%	0,00%	2,20	18,10	0,00	3,00	79,70	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16 B		20/02/2024	0,00%	0,00%	3,30	17,30	0,00	2,00	79,30	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17 A		20/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,30	0,00	2,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17 B		20/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,10	0,00	2,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 A		20/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	1,00	81,00	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 B		20/02/2024	0,00%	0,00%	2,10	17,60	0,00	1,00	80,20	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 A		20/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,30	0,00	2,00	80,30	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 B		20/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	2,00	80,50	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 A		20/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 B		20/02/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,30	0,00	2,00	79,90	-0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 A		20/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,10	0,00	2,00	80,70	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 B		20/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,80	0,00	1,00	80,50	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 A		20/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,80	0,00	1,00	80,60	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 B		20/02/2024	0,00%	0,00%	1,70	17,90	0,00	1,00	80,40	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 A		20/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	1,00	80,60	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 B		20/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	1,00	80,60	-0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-115 A	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,10	0,00	1,00	80,40	0,02			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,60	-0,01			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 A	20/02/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,50	0,00	3,00	80,00	0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 B	20/02/2024	0,30%	0,30%	1,00	19,10	0,00	2,00	79,60	0,04			0,00	11,00	
Edifício I 1	PMG-12 A	20/02/2024	0,00%	0,00%	3,60	16,50	0,00	2,00	79,80	0,07			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,30	0,00	2,00	79,90	0,03			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 A	20/02/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,60	0,00	2,00	79,90	0,07			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 B	20/02/2024	0,00%	0,00%	2,20	18,00	0,00	2,00	79,80	-0,01			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 A	20/02/2024	0,00%	0,00%	3,00	17,50	0,00	2,00	79,50	0,02			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 B	20/02/2024	0,00%	0,00%	4,50	16,30	0,00	2,00	79,10	-0,06			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 A	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,60	0,00	2,00	80,10	0,04			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,10	-0,02			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 A	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,30	0,00	2,00	80,10	0,07			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,10	0,00	2,00	80,10	-0,05			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 A	20/02/2024	0,00%	0,00%	2,50	18,50	0,00	2,00	79,00	0,02			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 B	20/02/2024	0,00%	0,00%	1,90	18,50	0,00	2,00	79,60	-0,04			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 A	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	2,00	80,20	0,06			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,40	0,00	2,00	80,10	0,06			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 A	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	1,00	80,60	0,01			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	1,00	80,60	-0,04			0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136 B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	2,00	80,70	-0,04			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,40	0,00	1,00	80,20	-0,02			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 B	19/02/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,60	0,00	1,00	80,10	-0,03			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 A	19/02/2024	0,00%	0,00%	1,30	19,00	0,00	1,00	79,70	0,01			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 B	19/02/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,20	0,00	1,00	80,10	0,01			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 A	19/02/2024	0,00%	0,00%	2,20	17,60	0,00	1,00	80,20	0,01			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 B	19/02/2024	0,00%	0,00%	4,80	15,70	0,00	1,00	79,50	-0,03			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 A	19/02/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,10	0,00	1,00	80,10	0,00			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,20	0,00	2,00	80,10	-0,02			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,20	0,00	1,00	80,00	0,02			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 B	19/02/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,60	0,00	1,00	80,10	0,00			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,10	0,00	1,00	80,20	-0,01			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,00	0,00	1,00	80,10	-0,03			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,40	0,00	1,00	80,70	0,01			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	1,00	80,10	0,00			0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134 B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	1,00	80,20	-0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,30	0,00	1,00	80,40	-0,01			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 B	19/02/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,20	0,00	0,00	80,10	-0,01			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,50	0,00	0,00	81,00	-0,05			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,90	1,00	0,00	80,90	-0,07			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	1,00	80,90	-0,04			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 B	19/02/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,30	0,00	0,00	80,50	-0,04			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 A	19/02/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,70	0,00	0,00	80,20	-0,05			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	17,00	0,00	0,00	82,20	-0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,10	0,00	1,00	80,60	-0,02			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,80	0,00	1,00	80,30	0,00			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,40	0,00	2,00	80,00	0,06			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,00	0,00	2,00	80,10	0,01			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	2,00	80,00	0,06			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 B	19/02/2024	0,00%	0,00%	2,50	17,80	0,00	2,00	79,70	-0,04			0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,80	0,00	2,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	1,20	19,10	0,00	2,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	19/02/2024	0,00%	0,00%	2,20	18,50	0,00	2,00	79,30	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,60	0,00	2,00	79,60	-0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,90	0,00	2,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	13,40	11,80	0,00	2,00	74,80	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,80	0,00	2,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,60	0,00	2,00	80,00	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	20,00	0,00	2,00	79,80	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	20,00	0,00	2,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	19/02/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,50	0,00	0,00	80,20	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	8,10	14,50	0,00	0,00	77,30	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,30	0,00	1,00	80,30	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,90	0,00	1,00	80,40	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,20	0,00	0,00	81,40	-0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,50	1,00	0,00	81,00	-0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,70	0,00	2,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,40	0,00	2,00	79,80	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	3,00	80,90	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,00	0,00	2,00	80,90	0,00		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,00	0,00	2,00	81,00	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,00	0,00	2,00	80,90	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,20	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	2,00	80,90	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,00	0,00	2,00	81,00	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	3,00	80,40	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,40	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,40	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	20,00	0,00	3,00	80,00	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	3,00	80,10	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,40	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,40	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,40	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,40	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,00	0,00	2,00	81,00	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	3,00	80,30	0,10		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	2,00	80,30	0,05			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,30	-0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	1,00	80,30	0,08			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	3,00	80,30	0,05			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	2,00	80,30	0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,30	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,70	0,00	2,00	80,00	0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 B	21/02/2024	2,10%	2,10%	7,90	13,50	0,00	2,00	76,50	0,08			0,00	53,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	2,00	80,40	0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	3,70	17,20	0,00	2,00	79,10	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,80	0,00	1,00	80,90	-0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	2,00	80,90	-0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	1,00	80,80	-0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	1,00	80,80	-0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,90	0,00	1,00	80,80	-0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,00	0,00	1,00	81,10	-0,02			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,90	0,00	1,00	80,60	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 B	21/02/2024	0,00%	0,20%	0,10	19,20	0,00	1,00	80,70	0,00			0,00	4,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	2,00	80,70	0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	1,00	80,70	-0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,50	0,05			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,60	0,00	1,00	79,60	-0,02			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,10	0,00	2,00	80,20	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,40	0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	1,00	80,40	0,06			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,40	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,10	0,00	2,00	80,00	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,20	0,00	2,00	80,20	0,02			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,20	0,00	2,00	80,30	0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,30	0,00	2,00	80,40	-0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,60	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	8,30	11,70	0,00	2,00	80,00	-0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,30	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,70	0,00	2,00	79,80	0,07			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	1,00	80,80	-0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	1,00	80,70	-0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	1,00	80,80	-0,02			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	1,00	80,80	0,10			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	1,00	80,90	-0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A	21/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	1,00	80,60	0,00			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B	21/02/2024	0,10%	0,10%	0,10	19,30	0,00	1,00	80,50	0,43			0,00	4,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,00	-0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,00	0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,20	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	3,00	80,10	-0,02			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	2,00	80,20	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,90	0,00	2,00	80,10	0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,10	0,03			0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	20/02/2024	3,70%	5,50%	1,40	18,80	0,00	2,00	76,10	0,67		0,00	18,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	3,00	80,20	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,30	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	20/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,70	0,00	2,00	80,20	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	20/02/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,60	0,00	2,00	79,70	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,40	0,00	2,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	20/02/2024	0,00%	0,00%	1,20	19,10	0,00	2,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	2,00	80,10	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,10	0,00	2,00	80,70	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	20/02/2024	0,00%	0,00%	3,90	16,80	0,00	2,00	79,30	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,00	0,00	1,00	80,30	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,10	0,00	2,00	79,90	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,30	0,00	2,00	80,10	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,10	0,00	1,00	80,30	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	20/02/2024	0,00%	0,00%	2,60	17,00	0,00	2,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	20/02/2024	0,00%	0,00%	2,30	17,80	0,00	2,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	2,00	80,20	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	3,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,90	0,00	2,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	20/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,50	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,40	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	3,00	80,70	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,30	0,00	3,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	3,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	3,00	80,70	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	3,00	80,70	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,00	0,00	3,00	80,90	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	3,00	80,40	0,10		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,30	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	3,00	80,30	0,13		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	3,00	80,50	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	3,00	80,30	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	2,40	17,80	0,00	2,00	79,80	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	22/02/2024	0,00%	0,00%	10,90	13,10	0,00	3,00	76,10	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	5,90	16,00	0,00	3,00	78,00	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	22/02/2024	0,00%	0,00%	5,90	15,30	0,00	3,00	78,80	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,20	0,00	3,00	80,30	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	22/02/2024	0,00%	0,00%	4,10	17,10	0,00	3,00	78,80	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,00	0,00	3,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	22/02/2024	0,00%	0,00%	2,40	18,80	0,00	3,00	78,80	0,11		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
CAT	PMG-96	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,90	0,00	3,00	80,10	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	3,00	80,40	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	3,00	80,50	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	22/02/2024	0,00%	0,00%	3,30	17,10	0,00	2,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,10	0,00	3,00	80,20	0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,10	0,00	3,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	3,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	22/02/2024	0,00%	0,00%	5,10	16,00	0,00	3,00	78,80	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	2,50	18,10	0,00	3,00	79,40	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	22/02/2024	0,00%	0,00%	3,40	17,90	0,00	3,00	78,80	0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,30	0,00	2,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	3,00	80,40	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,20	0,00	2,00	80,50	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,90	0,00	3,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,20	0,00	3,00	80,20	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,10	0,00	2,00	80,50	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,30	0,00	3,00	80,40	0,11		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	23/02/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,20	0,00	3,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,20	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,70	0,00	2,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,80	0,00	3,00	80,30	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,70	0,00	2,00	80,40	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		19/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,30	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		19/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,30	0,00	3,00	80,10	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		19/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,40	0,00	2,00	79,80	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		19/02/2024	0,00%	0,00%	2,90	18,00	0,00	2,00	79,10	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		19/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,50	0,00	2,00	80,20	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		19/02/2024	0,00%	0,00%	2,60	16,40	0,00	2,00	81,00	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		19/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,30	0,00	2,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,90	0,00	2,00	80,20	-0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	3,00	80,30	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,30	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	3,00	80,40	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		19/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	4,40	15,30	0,00	2,00	80,30	0,00		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,30	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	1,60	16,80	0,00	2,00	81,60	0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,40	0,01		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,00		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,40	0,01		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,01		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	-0,02		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	19/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,30	0,01		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	3,00	80,80	0,18		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Transportes	PMG-121	B	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,60	0,09		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	3,00	80,70	0,15		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	3,00	80,80	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	3,00	80,90	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	3,00	80,70	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,80	0,00	3,00	81,10	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	3,00	80,80	0,12		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	23/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,70	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,40	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	22/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	22/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,50	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	22/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	22/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	22/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	3,00	80,30	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	22/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	22/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,80	0,00	3,00	80,90	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	22/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Edifício I 1	PMG-16	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	2,40	17,40	0,00	3,00	80,10	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	3,90	16,50	0,00	2,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,10	0,00	3,00	80,10	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,20	0,00	2,00	80,60	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,90	1,00	2,00	81,10	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	2,20	17,50	0,00	1,00	80,30	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	2,00	81,00	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,50	0,00	2,00	79,70	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,80	1,00	1,00	80,90	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,40	0,00	2,00	80,60	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,60	0,00	1,00	80,90	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	1,80	17,70	0,00	1,00	80,50	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,00	0,00	2,00	80,90	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,00	0,00	2,00	80,90	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,80	0,00	1,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,60	0,00	2,00	80,80	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,40	0,00	2,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	27/02/2024	0,40%	0,40%	1,10	18,80	0,00	2,00	79,70	0,02		0,00	9,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	4,80	14,90	0,00	2,00	80,30	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,10	0,00	2,00	79,90	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	2,00	18,20	0,00	2,00	79,80	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	2,40	17,80	0,00	2,00	79,70	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	3,60	16,90	0,00	2,00	79,50	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	5,20	15,90	0,00	2,00	78,80	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,40	0,00	1,00	80,20	0,06		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-15	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,30	-0,12		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,10	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,90	0,00	2,00	80,30	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	2,80	18,20	0,00	2,00	79,00	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	2,20	18,20	0,00	2,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	2,00	80,50	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,20	0,00	2,00	80,30	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	2,00	80,90	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	1,00	80,90	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	27/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,80	0,00	2,00	80,80	-0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,30	0,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	2,10	18,10	0,00	2,00	79,80	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	1,90	18,20	0,00	3,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,10	0,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	3,00	17,30	0,00	2,00	79,80	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	11,20	12,10	0,00	3,00	76,70	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	2,00	17,80	0,00	3,00	80,20	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,80	0,00	2,00	79,90	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,40	0,00	2,00	80,10	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,60	0,00	2,00	80,10	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,00	0,00	2,00	80,00	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,60	0,00	3,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	1,60	17,00	0,00	2,00	81,40	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,50	0,00	2,00	80,10	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	2,00	80,20	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,40	0,00	2,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	01/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,80	0,00	2,00	80,00	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,80	1,00	1,00	80,80	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,10	0,00	1,00	80,80	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	2,00	80,20	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,80	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	2,00	80,80	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	4,20	15,70	0,00	2,00	80,10	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,10	0,00	2,00	80,30	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,70	0,00	2,00	80,10	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,90	0,00	2,00	80,00	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,70	0,00	2,00	80,20	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,30	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	7,00	14,60	0,00	2,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	2,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,30	0,00	2,00	80,00	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,30	0,00	1,00	79,90	-0,87		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,60	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,10	0,00	2,00	80,60	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	24,30	8,80	0,00	1,00	66,90	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,10	0,00	2,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,90	0,00	2,00	80,60	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,50	0,00	1,00	80,40	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,20	0,00	2,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	01/03/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,80	0,00	2,00	79,90	0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	01/03/2024	0,00%	0,00%	2,40	17,80	0,00	2,00	79,80	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,50	0,00	2,00	80,10	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	01/03/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,40	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,70	0,00	1,00	81,00	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,80	0,00	1,00	80,90	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,00	0,00	1,00	80,30	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,70	0,00	2,00	80,40	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,60	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,40	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,10	0,00	2,00	80,50	-0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	1,00	80,30	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,70	0,00	2,00	81,00	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,50	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,90	0,00	3,00	80,80	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,50	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,00	0,00	3,00	80,60	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	3,00	80,40	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	28/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Edifício I-4	PMG-148	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	1,00	80,40	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,50	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,60	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,10	0,00	3,00	80,60	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	28/02/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,90	0,00	2,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	2,00	80,40	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,00	0,00	2,00	80,70	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	28/02/2024	0,00%	0,00%	3,90	16,80	0,00	2,00	79,40	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	28/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,90	0,00	2,00	80,90	0,00		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Conjunto Laboratorial	PMG-51 B		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	1,00	80,80	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 A		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 B		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	2,00	80,80	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 A		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,90	0,00	2,00	80,80	0,14		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 B		28/02/2024	0,00%	0,00%	1,60	16,80	0,00	2,00	81,60	0,38		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 A		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	1,00	80,80	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 B		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	1,00	80,80	-0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 A		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,00	0,00	1,00	80,60	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 B		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	1,00	80,80	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 A		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	2,00	80,80	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 B		28/02/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,60	0,00	2,00	80,10	0,19		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 A		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	3,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 B		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 A		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,00	0,00	2,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A		28/02/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,10	0,00	2,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,00	0,00	2,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B		28/02/2024	0,00%	0,00%	14,40	8,90	0,00	2,00	76,70	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,80	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	2,00	80,80	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,80	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A		28/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,90	0,00	2,00	80,50	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B		28/02/2024	0,20%	0,70%	0,20	19,10	0,00	2,00	80,60	0,13		0,00	5,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,40	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	3,00	80,50	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,40	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,50	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,40	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A		27/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,00	0,00	2,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,40	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,80	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,00	0,00	2,00	80,80	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A		27/02/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,00	0,00	2,00	80,60	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,10	0,00	2,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A		27/02/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,50	0,00	3,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	2,00	80,40	0,03		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	3,00	80,50	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	3,70	17,40	0,00	3,00	78,80	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A		27/02/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,90	0,00	2,00	79,80	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,90	0,00	3,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,10	0,00	1,00	80,70	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,30	0,00	1,00	80,70	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A		27/02/2024	0,00%	0,00%	3,00	16,20	0,00	2,00	80,80	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	3,20	17,40	0,00	3,00	79,40	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,60	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,40	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157 B		27/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 A		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,00	0,00	2,00	80,30	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 B		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,50	-0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 A		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 B		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	2,00	80,70	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 A		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,60	0,00	2,00	80,80	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 B		29/02/2024	0,00%	0,00%	3,30	15,60	0,00	2,00	81,10	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 A		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,00	0,00	2,00	80,60	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 B		29/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,40	0,00	2,00	80,60	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 A		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,80	0,00	2,00	80,60	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 B		29/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	14,30	0,00	2,00	84,70	-0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75 A		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,60	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75 B		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,00	0,00	2,00	81,50	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 A		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,00	0,00	2,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 B		29/02/2024	0,00%	0,00%	2,20	15,30	0,00	3,00	82,40	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 A		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,20	0,00	2,00	80,60	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 B		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-82 A		29/02/2024	0,00%	0,00%	3,60	17,30	0,00	2,00	79,10	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-82 B		29/02/2024	0,00%	0,00%	11,60	13,10	0,00	1,00	75,30	-0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-83 A		29/02/2024	0,00%	0,00%	5,80	16,20	0,00	2,00	78,00	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-83 B		29/02/2024	0,00%	0,00%	6,90	14,90	0,00	2,00	78,20	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-94 A		29/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,50	0,00	1,00	80,40	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-94 B		29/02/2024	0,00%	0,00%	5,40	15,60	0,00	2,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-95 A		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,80	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-95 B		29/02/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,70	0,00	2,00	80,10	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-96 A		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,80	0,00	2,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-96 B		29/02/2024	0,00%	0,00%	3,60	16,30	0,00	2,00	80,10	-0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-97 A		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,70	0,00	2,00	80,50	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-97 B		29/02/2024	0,00%	0,00%	3,00	17,20	0,00	1,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-98 A		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,90	0,00	2,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-98 B		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,80	0,00	2,00	80,60	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-160 A		29/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,10	0,00	1,00	80,50	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-160 B		29/02/2024	0,00%	0,00%	3,90	16,50	0,00	1,00	79,50	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-161 A		29/02/2024	0,00%	0,00%	2,10	18,10	0,00	2,00	79,70	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-161 B		29/02/2024	0,00%	0,00%	3,10	17,80	0,00	1,00	79,10	-0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88 A		01/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,00	0,00	2,00	80,60	0,04		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Incubadora	PMG-88	B	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,10	0,00	2,00	80,80	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,70	0,00	1,00	80,30	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,60	0,00	1,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,90	0,00	2,00	80,80	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,60	0,00	2,00	81,00	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,00	0,00	1,00	80,80	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	01/03/2024	0,00%	0,00%	2,20	17,30	0,00	2,00	80,40	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	1,00	81,00	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	01/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,20	0,00	1,00	80,80	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,80	0,00	1,00	80,80	0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,40	0,00	1,00	80,90	0,00		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		26/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,50	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		26/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,00	0,00	2,00	80,60	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		26/02/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,20	0,00	2,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		26/02/2024	0,00%	0,00%	3,00	17,80	0,00	2,00	79,20	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		26/02/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,00	0,00	2,00	80,40	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		26/02/2024	0,00%	0,00%	2,40	16,70	0,00	1,00	80,90	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		26/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,60	0,00	2,00	80,20	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,10	0,00	2,00	79,90	-0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,50	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,20	0,00	1,00	80,70	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		26/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,40	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	3,60	16,30	0,00	2,00	80,10	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	1,00	80,50	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	2,00	16,20	0,00	2,00	81,80	-0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,00		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	26/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	3,00	80,30	0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,60	0,09		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,50	0,09		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	01/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	29/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,50	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	29/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	29/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,50	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	29/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	29/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	29/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	29/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,50	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	29/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	29/02/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	29/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	29/02/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,60	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	29/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	29/02/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,90	0,00	3,00	80,70	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	29/02/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Edifício I 1	PMG-16	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	2,50	17,60	0,00	2,00	79,90	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	2,70	17,60	0,00	2,00	79,60	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,00	0,00	2,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,30	0,00	2,00	80,50	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,50	1,00	2,00	81,40	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	2,10	17,30	1,00	2,00	80,60	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,80	0,00	2,00	80,80	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,80	0,00	1,00	81,00	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,60	0,00	3,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,70	0,00	3,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,70	0,00	2,00	81,10	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,10	0,00	2,00	81,00	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,50	0,00	2,00	81,00	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	2,00	17,40	0,00	2,00	80,60	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	2,00	81,10	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	2,00	81,10	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,60	0,00	1,00	80,80	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,90	0,00	1,00	81,00	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	1,90	18,30	0,00	2,00	79,80	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	05/03/2024	0,20%	0,20%	0,70	19,00	0,00	2,00	80,20	-0,02		0,00	20,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	2,80	17,00	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,10	0,00	3,00	80,30	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,50	0,00	2,00	80,30	0,09		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	2,40	17,60	0,00	2,00	80,00	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	3,10	17,30	0,00	3,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	4,70	16,10	0,00	3,00	79,20	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,80	0,00	3,00	80,20	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	3,00	80,20	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,20	0,00	3,00	80,30	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,70	0,00	3,00	80,40	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,80	0,00	3,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,50	0,00	3,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,10	0,00	2,00	80,10	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,20	0,00	3,00	80,30	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,90	0,00	2,00	81,00	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	2,00	81,10	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,80	0,00	2,00	81,10	-0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,10	0,00	2,00	80,50	0,05		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-5 Auditórios	PMG-25	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,50	0,00	2,00	80,60	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,70	0,00	2,00	80,10	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,30	0,00	1,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	1,70	17,90	0,00	2,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	4,10	15,90	0,00	2,00	80,10	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	2,30	17,30	0,00	2,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	2,40	17,40	0,00	2,00	80,30	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,00	0,00	2,00	80,20	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	2,00	17,90	0,00	3,00	80,20	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,60	0,00	2,00	79,90	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,40	0,00	2,00	80,00	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,50	0,00	2,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	2,00	80,40	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,12		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,50	0,00	3,00	80,50	0,13		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,90	1,00	1,00	80,70	-0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	1,00	1,00	80,70	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,70	0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,60	0,00	2,00	80,50	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	1,00	80,70	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	4,10	15,90	1,00	1,00	80,00	-0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,50	1,00	1,00	80,40	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,60	0,00	1,00	80,30	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,00	0,00	2,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,40	0,00	2,00	80,80	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,00	0,00	2,00	80,60	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	3,10	17,00	0,00	2,00	79,90	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	1,00	80,70	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,50	0,00	1,00	80,40	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,00	0,00	2,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,80	0,00	1,00	80,70	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,10	0,00	1,00	80,70	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	10,10	12,90	0,00	2,00	77,00	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,20	0,00	2,00	80,60	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,00	0,00	2,00	80,70	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,10	0,00	1,00	80,50	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,20	0,00	1,00	80,70	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,60	0,00	1,00	80,30	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	6,40	15,10	0,00	2,00	78,50	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	3,00	80,40	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,00	0,00	3,00	80,50	0,06		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,80	0,00	1,00	80,80	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,00	0,00	1,00	80,70	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	04/03/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,30	0,00	1,00	80,10	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	04/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,80	1,00	2,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	1,00	80,80	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	1,00	80,80	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	1,00	80,90	0,04		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	1,00	80,90	-0,04		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-65 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	1,00	80,90	-0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	1,00	80,90	-0,02			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	1,00	80,90	-0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	1,00	80,90	-0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,60	0,01			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,00	0,00	2,00	80,70	0,04			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,04			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,07			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	0,00	80,80	-0,01			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	1,00	80,90	-0,04			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,02			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,00	0,00	2,00	80,70	0,16			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,04			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,30	0,00	2,00	80,70	0,04			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,05			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,06			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	1,00	80,80	-0,02			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	1,00	80,80	-0,07			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	2,00	80,60	0,07			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,70	0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,06			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	2,00	80,50	0,04			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,60	0,06			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,30	0,00	2,00	80,40	0,07			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	1,00	80,80	-0,04			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	1,00	80,90	0,00			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	1,00	80,90	0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,50	0,05			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,50	0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,60	0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	-0,06			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,10	0,00	2,00	80,40	0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,40	-0,10			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,00	0,00	2,00	80,10	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	5,10	17,10	0,00	2,00	77,80	0,02			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,20	0,00	2,00	80,60	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	3,60	17,10	0,00	2,00	79,30	0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,00	0,00	1,00	80,80	0,00			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 B	06/03/2024	0,00%	0,10%	0,10	18,90	1,00	1,00	80,90	-0,05			0,00	7,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	1,00	80,80	-0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	1,00	80,80	0,08			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,80	0,00	2,00	80,80	-0,05			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	1,40	17,10	0,00	2,00	81,40	-0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,50	0,00	1,00	80,60	0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	1,00	80,80	-0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,20	0,00	1,00	80,60	0,05			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	1,00	80,70	-0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,80	0,00	2,00	80,60	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,60	0,00	2,00	80,10	-0,03			0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Conjunto Laboratorial	PMG-57 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,80	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	-0,08			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	0,02			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	0,09			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,20	0,00	2,00	80,30	0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,10	0,00	2,00	80,50	0,00			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,10	0,00	2,00	80,30	0,02			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	1,90	17,00	0,00	2,00	81,10	-0,02			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	2,00	80,80	0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	8,80	11,50	0,00	2,00	79,70	-0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,00			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,00	0,00	2,00	79,90	0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	-0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	1,00	80,90	-0,04			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	1,00	80,80	0,01			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	1,00	80,80	-0,03			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	1,00	1,00	80,70	-0,07			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A	06/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	1,00	80,80	0,02			0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B	06/03/2024	0,00%	0,40%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,80	0,37			0,00	22,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,70	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,70	0,24			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	3,00	80,70	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,70	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,70	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,70	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	3,00	80,90	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,70	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,60	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,05			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,50	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,50	0,11			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,50	0,07			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,70	0,00	2,00	80,50	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	2,00	80,70	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,70	0,00	2,00	80,90	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,10	0,00	2,00	80,70	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,80	0,00	2,00	80,90	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	2,00	80,80	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,80	0,00	1,00	80,90	0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B	05/03/2024	0,00%	0,00%	4,10	16,70	0,00	2,00	79,20	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A	05/03/2024	0,00%	0,00%	1,90	18,30	0,00	2,00	79,90	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B	05/03/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,50	0,00	2,00	80,10	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,80	0,00	2,00	80,50	0,04			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B	05/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,00	0,00	2,00	80,80	0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A	05/03/2024	0,00%	0,00%	2,10	16,70	0,00	2,00	81,20	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B	05/03/2024	0,00%	0,00%	2,30	17,10	0,00	2,00	80,60	0,01			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	2,00	80,80	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,70	0,03			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153 B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,70	0,08			0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,70	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,70	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,70	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	05/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	07/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,60	0,00	2,00	80,60	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	07/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,20	0,00	2,00	80,60	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	07/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,70	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	07/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	2,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	07/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,50	0,00	2,00	81,00	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	07/03/2024	0,00%	0,00%	3,50	15,80	0,00	3,00	80,80	-0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	07/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,90	0,00	2,00	80,70	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	07/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,30	0,00	2,00	80,70	-0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	07/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,60	0,00	2,00	80,80	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	07/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	13,60	0,00	2,00	85,30	-0,01		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	A	07/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,60	0,00	2,00	80,70	0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	07/03/2024	0,00%	0,00%	1,50	15,50	0,00	3,00	83,00	0,01		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	07/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,40	0,00	2,00	81,30	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	07/03/2024	0,00%	0,00%	2,80	13,00	0,00	2,00	84,10	0,12		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	07/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,90	0,00	2,00	80,90	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	07/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	2,00	80,60	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	A	07/03/2024	0,00%	0,00%	3,90	17,00	0,00	2,00	79,20	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	07/03/2024	0,00%	0,00%	6,90	14,10	0,00	1,00	79,00	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	07/03/2024	0,00%	0,00%	2,40	17,60	0,00	2,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	07/03/2024	0,00%	0,00%	7,10	15,20	0,00	2,00	77,60	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	07/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,80	0,00	2,00	80,90	-0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	07/03/2024	0,00%	0,00%	4,80	15,30	0,00	2,00	79,80	-0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	07/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,50	0,00	1,00	80,50	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	07/03/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,30	0,00	2,00	80,00	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	07/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,70	0,00	2,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	07/03/2024	0,00%	0,00%	4,40	14,60	0,00	2,00	81,00	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	07/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,40	0,00	2,00	80,60	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	07/03/2024	0,00%	0,00%	3,30	15,90	0,00	2,00	80,80	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	07/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,60	0,00	2,00	80,70	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	07/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,50	0,00	2,00	80,90	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	07/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,10	0,00	1,00	80,80	-0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	07/03/2024	0,00%	0,00%	3,70	16,10	1,00	1,00	80,20	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	07/03/2024	0,00%	0,00%	3,50	17,30	0,00	1,00	79,20	0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	07/03/2024	0,00%	0,00%	3,60	17,20	0,00	1,00	79,30	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	08/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,10	0,00	2,00	80,40	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	08/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,20	0,00	2,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	08/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,10	0,00	2,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	08/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,90	0,00	2,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	08/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,20	0,00	2,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	08/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,00	0,00	2,00	80,70	0,02		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	08/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	2,00	80,60	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	08/03/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,10	0,00	2,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	08/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,00	0,00	2,00	80,50	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	08/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,50	0,00	2,00	80,70	-0,05		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	08/03/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,40	0,00	1,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	08/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,20	0,00	2,00	80,70	-0,16		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	2,00	80,70	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,40	0,00	2,00	81,20	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,00	0,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		04/03/2024	0,00%	0,00%	2,90	17,70	0,00	2,00	79,50	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		04/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,70	0,00	1,00	80,20	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		04/03/2024	0,00%	0,00%	2,10	17,10	0,00	2,00	80,80	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,30	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 A		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,40	-0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109 B		04/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,30	0,00	2,00	80,50	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 A		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	2,00	80,80	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110 B		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 A		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111 B		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	2,00	80,90	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	-0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162 A		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	2,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162 B		04/03/2024	0,00%	0,00%	3,70	16,00	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166 A		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	2,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166 B		04/03/2024	0,00%	0,00%	1,70	16,60	0,00	2,00	81,70	-0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119 A		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119 B		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,80	0,00	3,00	81,10	0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119 C		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	3,00	80,90	0,07		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120 A		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120 B		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,80	0,04		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120 C		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	3,00	80,80	-0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163 B		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,02		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164 B		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	2,00	80,70	-0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164 C		04/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	2,00	80,70	-0,02		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121 A		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121 B		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122 A		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122 B		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123 A		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,20	0,00	3,00	80,60	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123 B		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	3,00	80,50	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124 A		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	3,00	80,60	0,07		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124 B		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158 B		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159 B		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125 A		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	3,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125 B		07/03/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-126 A		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126 B		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127 A		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127 B		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128 A		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128 B		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129 A		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129 B		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,01		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130 A		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,60	0,09		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130 B		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131 A		07/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,80	0,00	3,00	80,80	0,09		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Posto Guarda Universitário	PMG-131 B		07/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,50	0,00	2,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	2,50	18,10	0,00	2,00	79,40	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	3,50	17,40	0,00	3,00	79,10	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,50	0,00	2,00	79,90	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,60	0,00	2,00	80,20	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,30	0,00	1,00	81,60	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	1,70	17,30	0,00	1,00	81,00	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	2,00	80,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,80	0,00	2,00	80,10	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,50	0,00	2,00	79,80	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,10	0,00	2,00	80,10	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,80	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,30	0,00	1,00	81,00	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	1,80	17,40	0,00	1,00	80,90	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,70	0,00	1,00	81,30	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,70	0,00	1,00	81,30	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,50	0,00	1,00	81,10	-0,22		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,70	0,00	1,00	81,30	-0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,60	0,00	3,00	80,20	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 B		12/03/2024	0,30%	0,30%	0,80	18,90	0,00	2,00	80,00	0,06		0,00	12,00	
Edifício I 1	PMG-12 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	3,70	16,70	0,00	2,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,10	0,00	2,00	80,00	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,40	0,00	2,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	2,10	17,80	0,00	2,00	80,10	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	2,30	17,80	0,00	2,00	79,80	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	4,10	16,50	0,00	2,00	79,40	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,00	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,80	0,00	2,00	80,30	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	2,30	18,50	0,00	2,00	79,30	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,50	0,00	2,00	79,80	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,80	0,00	2,00	81,10	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,60	0,00	2,00	81,10	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 A		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,60	0,00	1,00	81,30	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,70	0,00	1,00	81,30	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136 B		12/03/2024	0,00%	0,00%	1,50	17,70	0,00	1,00	80,80	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,10	0,00	2,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,80	0,00	2,00	80,50	-0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,40	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,80	0,00	2,00	80,50	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,10	0,00	1,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	3,70	16,10	0,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	1,70	17,50	0,00	2,00	80,70	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,60	0,00	2,00	80,40	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,10	0,00	2,00	80,30	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,70	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,10	0,00	2,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,90	0,00	2,00	80,30	0,02		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-5 Auditórios	PMG-45 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,50	0,00	2,00	80,70	0,05		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	3,00	80,30	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,40	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	3,00	80,90	0,10		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,30	0,00	2,00	80,70	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,90	0,00	1,00	80,70	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	2,00	80,70	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	1,00	80,70	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,50	0,00	1,00	80,40	-0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,30	0,00	2,00	80,10	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	3,70	16,40	0,00	1,00	79,90	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,90	0,00	2,00	80,70	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,60	0,00	3,00	80,70	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,10	0,00	2,00	80,50	0,07		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,70	0,00	2,00	80,70	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,20	0,00	2,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	2,00	17,70	0,00	2,00	80,20	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	1,00	80,60	0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,70	0,00	2,00	80,60	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	2,00	80,70	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,60	0,00	1,00	80,90	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,50	0,00	2,00	80,40	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	7,60	14,40	0,00	2,00	78,00	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,10	0,00	1,00	80,60	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,10	0,00	2,00	80,70	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,00	0,00	2,00	80,70	0,14		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,00	0,00	2,00	80,80	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,60	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	6,50	15,30	0,00	1,00	78,20	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	2,00	80,80	0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,70	0,00	2,00	80,80	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,80	1,00	1,00	80,90	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,90	1,00	1,00	80,70	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133 A		11/03/2024	0,00%	0,00%	1,80	17,90	0,00	1,00	80,20	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133 B		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,90	0,00	2,00	80,50	-0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63 A		13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,70	0,00	2,00	81,30	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63 B		13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,70	0,00	1,00	81,30	-0,01		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 A		13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	2,00	80,70	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 B		13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 A		13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 B		13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 A		13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,70	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 B		13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 A		13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,70	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 B		13/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,90	0,00	2,00	80,90	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 A		13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 B		13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 A		13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 B		13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 A		13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,09		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-77	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,80	0,00	3,00	80,90	0,27		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	2,00	80,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	17,90	0,00	2,00	80,90	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,70	0,00	1,00	81,30	0,03		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,80	0,00	2,00	81,20	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,70	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,20	0,00	2,00	80,60	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,80	0,00	2,00	80,50	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	2,00	80,70	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,50	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,10	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,90	0,00	2,00	79,90	0,09		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	5,50	16,60	0,00	3,00	77,80	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	3,70	16,90	0,00	2,00	79,40	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,80	0,00	2,00	81,10	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,90	0,00	2,00	81,00	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,00	0,00	3,00	81,00	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,90	0,00	2,00	81,00	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,90	0,00	2,00	80,90	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	1,90	16,50	0,00	2,00	81,60	-0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	3,00	80,30	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	3,00	80,30	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,90	0,00	2,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	2,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,70	0,00	2,00	80,10	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,60	0,00	2,00	80,10	-0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,10	0,00	2,00	80,40	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,90	0,00	2,00	80,80	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,10	0,00	2,00	80,40	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	17,50	0,00	2,00	81,30	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	2,00	80,80	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	8,50	11,80	0,00	2,00	79,70	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	3,00	80,30	0,09		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	1,30	19,00	0,00	2,00	79,70	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,00	0,00	2,00	80,90	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	2,00	80,90	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,00	0,00	2,00	81,00	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	2,00	81,10	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	13/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	13/03/2024	0,20%	0,80%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,30	0,12		0,00	20,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	1,00	80,80	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	2,00	80,70	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	1,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	1,00	80,70	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	1,00	80,70	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	1,00	80,70	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,10	0,00	1,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	1,00	80,60	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	1,00	80,60	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	2,00	80,60	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	1,00	80,60	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	1,00	80,60	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,00	0,00	2,00	80,70	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,90	0,00	1,00	80,80	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	1,00	80,80	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	12/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,80	0,00	2,00	80,00	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,70	0,00	2,00	79,90	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	12/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,40	0,00	1,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,00	0,00	1,00	80,70	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	12/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,00	0,00	1,00	80,00	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	3,90	17,20	0,00	1,00	78,90	-0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,00	0,00	1,00	80,20	-0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,60	0,00	1,00	79,60	-0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	12/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,50	0,00	1,00	80,30	-0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	1,40	17,90	0,00	1,00	80,70	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	12/03/2024	0,00%	0,00%	3,10	15,50	0,00	1,00	81,50	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	2,60	16,90	0,00	1,00	80,50	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	3,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	1,00	2,00	80,20	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	1,00	80,70	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	2,00	80,70	-0,03		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	2,00	80,70	0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	2,00	80,60	-0,01		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	12/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	1,00	80,60	0,05		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	3,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,00	0,00	3,00	80,80	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	14/03/2024	0,10%	0,10%	0,50	13,30	0,00	3,00	86,10	0,04		0,00	8,00	
Enfermaria	PMG-72	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	3,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	3,20	16,00	0,00	2,00	80,80	-0,15		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,60	0,00	3,00	80,70	0,09		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Enfermaria	PMG-73	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,50	0,00	3,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,50	0,00	3,00	80,60	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	14/03/2024	0,10%	0,10%	1,40	12,40	0,00	2,00	86,10	0,06		0,00	11,00	
Enfermaria	PMG-75	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,10	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	2,60	13,40	0,00	2,00	84,00	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,10	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	3,10	13,60	0,00	3,00	83,30	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,90	0,00	3,00	80,70	0,07		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	3,00	80,40	-0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	3,70	17,30	0,00	2,00	79,00	0,08		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	10,10	13,70	0,00	2,00	76,20	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	5,90	16,00	0,00	1,00	78,10	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	7,10	14,60	0,00	2,00	78,40	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,10	0,00	2,00	80,10	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	4,50	15,60	0,00	2,00	79,80	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,40	0,00	2,00	80,10	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	1,90	18,30	0,00	2,00	79,70	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,70	0,00	2,00	80,30	0,07		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	4,60	13,70	0,00	2,00	81,70	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,30	0,00	2,00	80,50	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	3,60	15,50	0,00	2,00	80,90	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,80	0,00	2,00	80,40	0,10		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,80	0,00	2,00	80,70	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,40	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	2,00	17,70	0,00	2,00	80,20	-0,09		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	2,10	18,10	0,00	2,00	79,70	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	3,50	17,00	0,00	2,00	79,50	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,80	0,00	2,00	80,70	0,10		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,90	0,00	2,00	80,90	0,07		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,60	0,00	2,00	80,70	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,30	0,00	2,00	80,90	-0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,90	0,00	2,00	80,80	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,70	0,00	2,00	81,00	0,12		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	3,00	80,90	0,09		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	15/03/2024	0,00%	0,00%	1,55	17,80	0,00	2,00	80,70	0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,80	0,00	2,00	80,90	0,06		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	15/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,10	0,00	2,00	80,90	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,80	0,00	2,00	81,00	0,08		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,00	0,00	2,00	81,30	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,10	0,00	2,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,90	0,00	2,00	81,00	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,20	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		11/03/2024	0,00%	0,00%	2,40	18,10	0,00	2,00	79,50	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,10	0,00	2,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		11/03/2024	0,00%	0,00%	2,10	17,00	0,00	2,00	80,90	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,40	0,00	2,00	80,20	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	11/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,30	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	11/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,60	0,00	2,00	80,40	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	11/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	11/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,05		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ,															
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	11/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,60	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	11/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	2,00	80,70	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		11/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	11/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	11/03/2024	0,00%	0,00%	3,20	16,50	0,00	2,00	80,30	-0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	11/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,50	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	11/03/2024	0,00%	0,00%	1,70	16,50	0,00	2,00	81,80	0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	11/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	11/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	2,00	80,60	0,01		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	11/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	11/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	11/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	-0,03		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	11/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,40	0,04		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	11/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	-0,02		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	11/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,06		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	11/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,02		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,90	0,00	3,00	80,80	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	7,70	12,10	0,00	3,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	3,00	80,80	0,11		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	8,80	12,30	0,00	3,00	78,90	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,60	0,00	3,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	3,00	80,70	-0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	14/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,20	0,00	3,00	80,60	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	1,70	17,70	0,00	3,00	80,70	0,13		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,30	0,00	3,00	80,10	0,09		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	14/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	3,00	80,80	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,70	0,00	1,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	2,00	80,90	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	2,00	81,10	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	15/03/2024	0,00%	0,00%	2,10	17,20	0,00	2,00	80,70	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,40	0,00	1,00	80,80	0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,80	0,00	2,00	81,10	0,02		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,80	0,00	3,00	81,20	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	15/03/2024	0,00%	0,00%	3,40	17,20	0,00	2,00	79,40	0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,80	0,00	2,00	81,20	0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	15/03/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,70	0,00	2,00	81,30	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	15/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,70	0,00	1,00	81,20	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	15/03/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,20	0,00	2,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	15/03/2024	0,00%	0,00%	1,80	17,60	0,00	2,00	80,60	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	1,70	17,90	0,00	2,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	3,20	16,90	0,00	2,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,80	0,00	2,00	80,50	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,70	0,00	2,00	80,80	0,06		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,90	0,00	1,00	80,80	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	2,10	17,60	0,00	1,00	80,20	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,90	0,00	2,00	81,10	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,70	0,00	2,00	81,10	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,30	0,00	2,00	80,00	0,00		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-23 A		19/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,60	0,00	2,00	81,10	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23 B		19/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,10	0,00	2,00	81,00	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 A		19/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,80	0,00	2,00	80,80	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113 B		19/03/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,00	0,00	2,00	80,50	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 A		19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	2,00	81,00	0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114 B		19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	2,00	81,00	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 A		19/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,90	0,00	2,00	81,00	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115 B		19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,00	0,00	2,00	81,00	0,00		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 A		19/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,20	0,00	2,00	80,60	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11 B		19/03/2024	0,10%	0,10%	0,50	18,90	0,00	2,00	80,50	0,01		0,00	47,00	
Edifício I 1	PMG-12 A		19/03/2024	0,00%	0,00%	4,40	15,10	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-12 B		19/03/2024	0,00%	0,00%	3,80	16,40	0,00	2,00	79,70	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 A		19/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,20	0,00	3,00	80,70	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13 B		19/03/2024	0,00%	0,00%	2,10	17,60	0,00	3,00	80,30	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 A		19/03/2024	0,00%	0,00%	3,80	16,50	0,00	2,00	79,70	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14 B		19/03/2024	0,00%	0,00%	3,70	16,90	0,00	2,00	79,40	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 A		19/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	2,00	80,70	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15 B		19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,70	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 A		19/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,70	0,00	2,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19 B		19/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,40	0,00	2,00	80,90	0,01		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 A		19/03/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,30	0,00	3,00	79,90	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21 B		19/03/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,10	0,00	3,00	80,10	0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 A		19/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,70	1,00	2,00	81,10	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24 B		19/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,50	0,00	2,00	80,90	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 A		19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	1,00	81,00	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135 B		19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,00	0,00	2,00	81,00	0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-136 B		19/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,80	0,00	2,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 A		18/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,00	0,00	2,00	80,80	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25 B		18/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,40	0,00	2,00	80,80	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 A		18/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,40	0,00	2,00	80,40	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26 B		18/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,10	0,00	2,00	80,90	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 A		18/03/2024	0,00%	0,00%	2,00	17,10	0,00	3,00	80,80	0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27 B		18/03/2024	0,00%	0,00%	4,20	15,20	0,00	2,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 A		18/03/2024	0,00%	0,00%	1,40	17,80	0,00	2,00	80,80	0,08		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28 B		18/03/2024	0,00%	0,00%	2,20	16,80	0,00	2,00	81,00	0,06		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 A		18/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,90	0,00	2,00	80,50	0,10		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29 B		18/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,30	0,00	2,00	80,60	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 A		18/03/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,20	0,00	2,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44 B		18/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,20	0,00	2,00	80,90	0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 A		18/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	17,90	0,00	2,00	81,20	0,07		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45 B		18/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,10	0,00	2,00	80,70	0,02		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134 B		18/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	3,00	80,70	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 A		18/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,70	0,00	3,00	81,20	0,08		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30 B		18/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,30	0,00	3,00	81,20	0,09		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 A		18/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,60	1,00	1,00	81,00	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31 B		18/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,90	1,00	1,00	80,90	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 A		18/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	1,00	2,00	80,90	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32 B		18/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,50	1,00	1,00	80,90	-0,11		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 A		18/03/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,30	1,00	2,00	80,30	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33 B		18/03/2024	0,00%	0,00%	4,10	15,90	1,00	1,00	80,00	0,01		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-34 A	18/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,30	0,00	1,00	80,60	0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34 B	18/03/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,10	0,00	1,00	80,50	0,08			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 A	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,70	0,00	2,00	80,70	0,06			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35 B	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,00	0,00	1,00	81,10	0,06			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 A	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,90	0,00	2,00	80,70	0,05			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36 B	18/03/2024	0,00%	0,00%	2,40	17,20	0,00	2,00	80,40	0,02			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 A	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	1,00	80,90	0,06			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37 B	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,40	0,00	2,00	80,90	0,02			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38 A	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,00	0,00	1,00	80,80	0,02			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38 B	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,50	0,00	1,00	81,00	0,01			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 A	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,80	0,00	1,00	80,50	0,02			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39 B	18/03/2024	0,00%	0,00%	7,90	13,60	1,00	2,00	78,40	0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40 A	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,90	0,00	1,00	80,80	0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40 B	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,80	0,00	2,00	81,00	0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41 A	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,80	0,00	3,00	81,10	0,08			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41 B	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,80	0,00	2,00	81,10	0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42 A	18/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,40	1,00	1,00	80,50	0,02			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42 B	18/03/2024	0,00%	0,00%	6,20	15,30	0,00	2,00	78,50	-0,02			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43 A	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,80	0,00	3,00	81,10	0,08			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43 B	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	3,00	81,00	0,09			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132 A	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,50	1,00	1,00	81,20	-0,09			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132 B	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,50	1,00	1,00	81,10	-0,07			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133 A	18/03/2024	0,00%	0,00%	2,00	17,90	0,00	2,00	80,10	0,03			0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133 B	18/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,40	0,00	1,00	80,60	0,00			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63 A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	2,00	80,70	0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63 B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,70	0,01			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	0,07			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64 B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	0,01			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,50	0,00	3,00	80,80	0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65 B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,80	0,00	3,00	81,10	0,09			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,00	0,00	2,00	80,70	0,09			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66 B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	3,00	80,80	0,15			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	2,00	80,90	0,07			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67 B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,40	0,00	2,00	81,30	0,05			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68 B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	3,00	80,90	0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69 B	20/03/2024	0,00%	0,00%	1,30	17,80	0,00	3,00	80,90	0,06			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,13			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77 B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,60	0,00	2,00	81,10	0,14			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78 B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,17			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79 B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,17			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,07			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80 B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	3,00	80,90	0,03			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,00	0,00	3,00	81,00	0,08			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81 B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,60	0,00	3,00	81,10	0,09			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144 B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,10			0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145 B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	2,00	80,80	0,09			0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I-4	PMG-146	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	2,00	80,90	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,90	0,00	2,00	80,70	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	2,00	80,70	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	20/03/2024	0,40%	0,40%	0,50	18,20	0,00	3,00	80,90	0,03		0,00	21,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	3,00	80,90	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,80	0,00	2,00	81,00	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,80	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,80	0,00	2,00	81,10	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,80	0,00	2,00	81,00	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	2,00	80,80	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,40	0,00	2,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	6,20	15,60	0,00	2,00	78,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,70	0,00	2,00	80,90	-0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	3,90	16,40	0,00	2,00	79,70	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,70	0,00	1,00	81,10	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51	B	20/03/2024	0,00%	0,20%	0,10	18,70	0,00	2,00	81,20	-0,06		0,00	58,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	2,00	81,10	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,80	0,00	1,00	81,10	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,60	0,00	2,00	81,10	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	1,50	16,80	0,00	2,00	81,70	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,80	0,00	1,00	81,00	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	1,00	1,00	81,00	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,90	0,00	1,00	81,10	-0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	2,00	81,00	-0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,30	0,00	3,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,30	0,00	2,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,90	0,00	2,00	81,10	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	2,00	81,00	0,23		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	2,00	81,10	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	2,00	81,00	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,70	0,00	2,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,30	0,00	2,00	81,20	0,29		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,90	0,00	2,00	80,70	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	1,80	16,70	0,00	2,00	81,50	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,90	0,00	2,00	81,10	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	10,10	10,90	0,00	2,00	79,00	-0,15		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	2,00	80,80	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,60	0,00	2,00	80,20	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	2,00	81,10	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	1,00	81,10	0,00		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,80	0,00	2,00	81,10	0,01		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	1,00	81,10	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141	B	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	1,00	81,10	-0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	A	20/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,70	0,00	1,00	80,90	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62	B	20/03/2024	0,30%	1,20%	0,20	18,70	0,00	2,00	80,80	0,22		0,00	100,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,80	0,00	3,00	81,20	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,00	0,00	3,00	81,00	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	3,00	80,90	0,09		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	3,00	81,10	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,80	0,00	3,00	81,10	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	1,80	16,00	0,00	3,00	82,20	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,80	0,00	3,00	81,00	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	3,00	80,80	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	3,00	80,90	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	3,00	80,80	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	3,00	80,80	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,70	0,13		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	3,00	80,80	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	3,00	80,80	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,80	0,00	2,00	81,00	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,90	0,00	2,00	80,90	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	2,10	17,80	0,00	3,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,00	0,00	2,00	80,70	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,30	0,00	2,00	80,40	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	1,30	17,90	0,00	3,00	80,80	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,80	0,00	1,00	81,00	0,04		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	3,80	16,80	0,00	2,00	79,40	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,40	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,50	0,00	2,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,70	0,00	2,00	80,80	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	17,40	0,00	2,00	81,40	0,02		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	2,90	15,60	0,00	2,00	81,40	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	3,30	16,00	0,00	2,00	80,60	0,00		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	A	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	2,00	80,90	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	3,00	81,10	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	3,00	80,90	0,07		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,90	0,00	3,00	80,90	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	3,00	80,80	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157	B	19/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	3,00	80,90	0,09		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	2,00	80,80	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,40	0,00	2,00	81,20	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,90	0,00	2,00	80,90	0,01		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,70	0,00	2,00	81,20	0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,00	0,00	2,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	2,90	16,00	0,00	2,00	81,10	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,00	0,00	2,00	80,90	0,04		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,40	0,00	2,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,90	0,00	2,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74	B	21/03/2024	1,60%	1,60%	1,00	13,10	0,00	2,00	84,30	0,01		0,00	53,00	
Enfermaria	PMG-75	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,90	0,00	2,00	80,70	0,08		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	2,60	13,90	0,00	2,00	83,40	0,06		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	17,90	0,00	2,00	81,00	0,03		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	4,10	10,90	0,00	2,00	85,10	0,00		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,80	0,00	2,00	81,00	0,02		0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	2,00	80,80	0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	2,80	16,80	0,00	1,00	80,40	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-82	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	8,80	12,80	0,00	2,00	78,30	-0,01		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
CAT	PMG-83	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	5,40	15,50	0,00	1,00	79,10	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-83	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	5,70	14,60	0,00	2,00	79,70	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,60	0,00	1,00	81,30	-0,01		0,00	0,00	
CAT	PMG-94	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	2,90	16,30	0,00	1,00	80,80	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,60	0,00	2,00	81,00	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-95	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	2,30	17,90	0,00	2,00	79,80	-0,05		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,50	0,00	2,00	80,80	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-96	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	4,50	13,00	0,00	2,00	82,50	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,50	0,00	2,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-97	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	3,80	15,00	0,00	2,00	81,20	0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,60	0,00	2,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
CAT	PMG-98	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,50	0,00	2,00	80,90	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	18,30	0,00	1,00	81,10	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	4,00	15,80	0,00	2,00	80,20	-0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	3,30	17,10	0,00	2,00	79,60	0,00		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	1,50	17,90	0,00	2,00	80,50	0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	22/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,10	0,00	2,00	80,70	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	22/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,10	0,00	1,00	80,80	0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	22/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,00	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	22/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,00	0,00	2,00	80,60	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	22/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,30	0,00	1,00	80,50	-0,01		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	22/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,90	0,00	1,00	80,70	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	22/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	1,00	80,60	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	22/03/2024	0,00%	0,00%	2,00	17,60	0,00	2,00	80,30	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	22/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,50	-0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	22/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,50	0,00	2,00	80,40	0,00		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	22/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,50	0,00	1,00	80,40	-0,04		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	22/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,80	0,00	1,00	80,40	-0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		18/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		18/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	2,00	80,80	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		18/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,90	0,00	2,00	80,70	0,06		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		18/03/2024	0,00%	0,00%	2,90	17,60	0,00	2,00	79,50	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		18/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,70	0,00	2,00	80,30	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		18/03/2024	0,00%	0,00%	2,10	16,80	0,00	2,00	81,10	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		18/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,30	0,00	2,00	80,40	0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,40	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,90	0,00	2,00	80,40	-0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	2,00	80,90	0,07		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,90	0,00	2,00	81,00	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		18/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,30	0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	2,00	80,60	-0,01		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	18/03/2024	0,00%	0,00%	4,50	14,60	0,00	2,00	80,90	-0,02		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,00	0,00	2,00	80,90	0,07		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	2,00	81,10	0,01		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,00	0,00	2,00	80,90	0,09		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	3,00	80,90	0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Portaria P3	PMG-120	B	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	3,00	80,90	0,02		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,02		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	3,00	80,90	0,08		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	18/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,20	0,00	2,00	81,30	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	6,40	13,20	0,00	3,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,70	0,00	2,00	81,20	0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	1,50	17,60	0,00	2,00	80,90	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	1,50	17,60	0,00	2,00	80,90	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,80	0,00	2,00	81,00	0,01		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	1,70	17,00	0,00	2,00	80,30	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	6,00	14,60	0,00	3,00	79,40	0,03		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,80	0,00	2,00	80,90	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	2,00	81,10	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,00	0,00	2,00	80,80	0,03		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	6,40	15,30	0,00	2,00	78,30	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	3,00	80,90	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	3,00	80,80	0,06		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	3,00	80,80	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129	B	21/03/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Posto Guarda Universitário	PMG-130	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,40	0,00	3,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	2,00	80,90	0,05		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	A	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,20	0,00	3,00	81,20	0,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131	B	21/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,10	0,00	3,00	80,70	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	2,30	16,90	0,00	1,00	80,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-16	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	3,20	16,60	0,00	2,00	80,10	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,80	0,00	1,00	80,80	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-17	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,30	0,00	1,00	80,80	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	1,00	80,80	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-18	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	2,20	17,80	0,00	1,00	80,10	-0,05		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,00	0,00	2,00	80,90	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-20	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	18,90	0,00	2,00	80,90	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,20	0,00	2,00	80,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-22	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,10	0,00	3,00	80,40	0,17		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,30	0,00	1,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-23	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,80	0,00	1,00	80,30	0,07		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,20	0,00	2,00	80,40	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-113	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	2,70	17,10	0,00	2,00	80,20	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-114	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,30	0,00	1,00	80,40	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-115	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,60	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,30	0,00	1,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-11	B	26/03/2024	0,30%	0,30%	0,80	19,00	0,00	1,00	79,90	0,08		0,00	43,00	
Edifício I 1	PMG-12	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	4,40	16,00	0,00	1,00	79,60	0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
Edifício I 1	PMG-12	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,40	0,00	2,00	80,00	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,20	0,00	1,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-13	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	2,10	18,00	0,00	2,00	79,90	0,10		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	3,30	16,80	0,00	1,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-14	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	4,60	16,00	0,00	1,00	79,40	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,20	0,00	2,00	80,50	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-15	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	1,00	80,60	0,14		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,90	0,00	3,00	80,60	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-19	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,60	0,00	3,00	80,40	0,11		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	2,00	18,30	0,00	1,00	79,80	0,13		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-21	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	2,00	18,00	0,00	2,00	80,00	0,08		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	1,00	81,10	-0,03		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-24	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,60	0,00	1,00	81,00	-0,04		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG-135	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	-0,02		0,00	0,00	
Edifício I 1	PMG -135	B	26/03/2024	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Água no momento de medição.
Edifício I 1	PMG-136	B	26/03/2024	0,10%	0,10%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,00	-0,04		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,30	0,00	2,00	80,40	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-25	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,40	0,00	1,00	79,90	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	19,10	0,00	2,00	80,00	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-26	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,40	0,00	2,00	80,20	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	1,80	18,10	0,00	2,00	80,10	-0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-27	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	4,00	16,30	0,00	2,00	79,70	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,00	0,00	2,00	80,40	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-28	B	25/03/2024	0,10%	0,10%	2,90	16,70	0,00	1,00	80,40	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,20	0,00	2,00	80,10	0,00		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-29	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,50	0,00	2,00	79,90	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,90	0,00	1,00	79,80	-0,03		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-44	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,90	0,00	2,00	80,10	-0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,50	0,00	2,00	80,60	-0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-45	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	1,00	80,30	0,01		0,00	0,00	
I-5 Auditórios	PMG-134	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,30	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,40	0,00	2,00	80,30	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-30	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,60	0,00	1,00	80,20	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,90	0,00	2,00	80,80	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-31	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	1,00	1,00	80,70	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	1,00	80,80	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-32	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,80	0,00	2,00	80,50	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,80	0,00	2,00	80,10	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-33	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	4,50	15,60	0,00	1,00	79,90	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,90	0,00	2,00	80,20	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-34	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,30	0,00	1,00	80,10	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,40	0,00	2,00	80,20	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-35	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,70	0,00	1,00	80,20	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	2,00	80,40	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-36	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	2,70	17,30	0,00	2,00	80,00	-0,05		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	1,00	80,50	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-37	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,90	0,00	2,00	80,20	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	2,00	80,40	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-38	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,00	0,00	2,00	80,50	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-39	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,30	0,00	2,00	80,30	0,00		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
I-3 Biblioteca	PMG-39	B	25/03/2024	0,10%	0,10%	3,10	1,20	0,00	1,00	79,60	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	2,00	80,40	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-40	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,20	0,00	2,00	80,50	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,40	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-41	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,40	0,00		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,70	0,00	2,00	80,30	-0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-42	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	6,50	15,30	0,00	1,00	78,20	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-43	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,60	0,00	2,00	80,30	0,01		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,80	0,00	1,00	80,80	-0,03		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-132	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,80	-0,04		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,90	0,00	2,00	80,10	-0,02		0,00	0,00	
I-3 Biblioteca	PMG-133	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,90	0,00	1,00	80,30	0,02		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	A	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-63	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	A	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-64	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,14		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	A	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-65	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	A	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,20	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-66	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	A	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	2,00	80,80	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-67	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	18,90	0,00	2,00	80,70	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	A	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-68	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	A	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-69	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	3,00	80,30	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	A	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	1,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-77	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,00	0,00	1,00	80,40	0,12		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	A	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-78	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	1,60	18,30	0,00	1,00	80,10	0,06		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	A	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	1,00	80,40	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-79	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	A	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,10		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-80	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,50	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	A	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	1,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-81	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	2,00	80,50	0,09		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-144	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-145	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,50	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-146	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	0,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-147	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	1,00	80,60	0,07		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-148	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,15		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-149	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,13		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-150	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,11		0,00	0,00	
Edifício I-4	PMG-151	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,40	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	A	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	1,00	80,40	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-46	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,70	0,00	1,00	80,30	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	A	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	1,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-47	B	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	1,00	80,30	0,40		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-48	A	27/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,30	0,00	1,00	80,30	0,08		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%;															
Conjunto Laboratorial	PMG-48 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	1,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	1,30	19,10	0,00	1,00	79,60	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-49 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	4,00	17,00	0,00	2,00	79,00	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,40	0,00	1,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-50 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	4,10	17,10	0,00	1,00	78,90	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	1,00	80,60	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-51 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	1,00	80,60	4,98		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	1,00	80,60	0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-52 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	1,00	80,50	0,88		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,00	0,00	0,00	80,70	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-53 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	1,70	17,10	0,00	2,00	81,10	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	1,00	80,50	0,02		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-54 B		27/03/2024	2,10%	2,10%	2,30	16,50	0,00	1,00	79,10	0,01		0,00	97,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	1,00	80,60	-0,04		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-55 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	1,00	80,60	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,30	0,00	1,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-56 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,80	0,00	1,00	79,90	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-57 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,92		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	3,00	80,50	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-58 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,40	0,06		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,40	0,00	1,00	80,20	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-59 B		27/03/2024	0,10%	0,10%	2,00	18,40	0,00	2,00	79,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	1,30	18,90	0,00	1,00	79,80	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-60 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	2,40	16,70	0,00	1,00	80,90	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,30	0,00	1,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-61 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	12,50	12,00	0,00	1,00	75,50	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-137 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	1,00	80,30	0,08		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-138 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,50	0,00	1,00	80,00	0,07		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	1,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-139 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	1,00	80,50	0,13		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	1,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-140 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	1,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-141 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	3,00	80,30	0,10		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,40	0,11		0,00	0,00	
Conjunto Laboratorial	PMG-62 B		27/03/2024	0,30%	1,40%	0,10	19,60	0,00	3,00	80,10	3,21		0,00	80,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 A		26/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	1,00	80,60	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-01 B		26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	1,00	80,50	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 A		26/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	1,00	80,40	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-02 B		26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 A		26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,40	0,11		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-03 B		26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 A		26/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	2,00	80,40	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-04 B		26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,30	0,09		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 A		26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,12		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-05 B		26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,40	0,06		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 A		26/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,40	0,08		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-06 B		26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,30	0,16		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 A		26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	1,00	80,40	0,10		0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-07 B		26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,40	0,13		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	C02 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15% ;															
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	2,00	80,50	0,10			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-08 B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,30	2,16			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 A	26/03/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,20	0,00	2,00	80,10	0,12			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-09 B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,40	0,00	2,00	80,20	0,10			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,00	0,00	1,00	80,50	0,09			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-10 B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	2,00	80,40	0,14			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	1,00	80,50	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-84 B	26/03/2024	0,00%	0,00%	2,50	18,20	0,00	1,00	79,30	0,06			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 A	26/03/2024	0,00%	0,00%	1,70	18,60	0,00	2,00	79,70	0,11			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-85 B	26/03/2024	0,00%	0,00%	1,50	18,80	0,00	1,00	79,80	0,12			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	19,10	0,00	1,00	80,00	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-86 B	26/03/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,60	0,00	2,00	80,00	0,10			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 A	26/03/2024	0,00%	0,00%	3,50	15,50	0,00	1,00	81,10	0,08			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-87 B	26/03/2024	0,00%	0,00%	3,30	17,10	0,00	2,00	79,60	0,11			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,20	0,00	1,00	80,30	0,09			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-152 B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	1,00	80,40	0,10			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-153 B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	2,00	80,50	0,77			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-154 B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,40	0,10			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-155 B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,40	0,10			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-156 B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	1,00	80,40	0,11			0,00	0,00	
Bloco Inicial (conjunto didático)	PMG-157 B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,00	0,12			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 A	28/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	1,00	80,30	4,76			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-70 B	28/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	0,00	80,30	2,93			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 A	28/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,60	0,00	2,00	80,30	0,07			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-71 B	28/03/2024	0,10%	0,10%	0,50	13,60	0,00	2,00	85,90	0,09			0,00	5,00	
Enfermaria	PMG-72 A	28/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,40	0,00	1,00	80,20	0,06			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-72 B	28/03/2024	0,00%	0,00%	2,80	16,70	0,00	1,00	80,50	0,08			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 A	28/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,10	0,00	1,00	80,40	0,08			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-73 B	28/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,70	0,00	2,00	80,10	0,08			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 A	28/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	18,90	0,00	2,00	80,80	0,11			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-74 B	28/03/2024	0,30%	0,30%	1,50	12,10	0,00	1,00	86,10	0,08			0,00	13,00	
Enfermaria	PMG-75 A	28/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,20	0,00	1,00	80,20	0,08			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-75 B	28/03/2024	0,00%	0,00%	3,60	12,70	0,00	1,00	83,70	0,08			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 A	28/03/2024	0,00%	0,00%	1,40	18,10	0,00	1,00	80,50	0,09			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-76 B	28/03/2024	0,00%	0,00%	4,10	11,50	0,00	2,00	84,40	0,06			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 A	28/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	1,00	80,40	0,08			0,00	0,00	
Enfermaria	PMG-165 B	28/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	1,00	80,30	0,08			0,00	0,00	
CAT	PMG-82 A	25/03/2024	0,00%	0,00%	3,50	17,50	0,00	3,00	79,00	0,03			0,00	0,00	
CAT	PMG-82 B	25/03/2024	0,00%	0,00%	10,50	13,30	0,00	2,00	76,20	0,03			0,00	0,00	
CAT	PMG-83 A	25/03/2024	0,00%	0,00%	3,80	16,90	0,00	3,00	79,30	0,04			0,00	0,00	
CAT	PMG-83 B	25/03/2024	0,00%	0,00%	7,40	13,80	0,00	3,00	78,80	0,04			0,00	0,00	
CAT	PMG-94 A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,20	0,00	3,00	80,50	0,07			0,00	0,00	
CAT	PMG-94 B	25/03/2024	0,00%	0,00%	5,30	14,90	0,00	3,00	79,80	0,08			0,00	0,00	
CAT	PMG-95 A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	3,00	80,50	0,03			0,00	0,00	
CAT	PMG-95 B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,80	0,00	2,00	80,40	0,07			0,00	0,00	
CAT	PMG-96 A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,10	0,00	3,00	80,40	0,04			0,00	0,00	
CAT	PMG-96 B	25/03/2024	0,00%	0,00%	3,20	14,90	0,00	2,00	81,90	0,03			0,00	0,00	
CAT	PMG-97 A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	19,00	0,00	3,00	80,30	0,06			0,00	0,00	
CAT	PMG-97 B	25/03/2024	0,00%	0,00%	4,30	15,00	0,00	3,00	80,70	0,01			0,00	0,00	
CAT	PMG-98 A	25/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,80	0,00	3,00	80,20	0,04			0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H2S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15%; maior que 15%,															
CAT	PMG-98	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	18,80	0,00	2,00	80,50	-0,02		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,10	0,00	2,00	80,80	0,04		0,00	0,00	
CAT	PMG-160	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,70	17,10	0,00	3,00	80,20	0,61		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	3,20	17,50	0,00	2,00	79,30	0,06		0,00	0,00	
CAT	PMG-161	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	1,90	18,20	0,00	2,00	79,90	0,03		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,20	0,00	2,00	80,40	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-88	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,30	0,00	2,00	80,50	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,30	0,00	3,00	80,30	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-89	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	18,90	0,00	3,00	80,00	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,50	0,00	2,00	80,40	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-90	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,00	0,00	3,00	80,50	0,14		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	3,00	80,40	0,15		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-91	B	26/03/2024	0,10%	0,10%	1,80	18,10	0,00	3,00	79,90	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,40	0,00	3,00	80,30	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-92	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,90	18,70	0,00	3,00	80,40	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	A	26/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,20	0,00	2,00	80,30	0,13		0,00	0,00	
Incubadora	PMG-93	B	26/03/2024	0,00%	0,00%	1,10	18,40	0,00	2,00	80,50	0,13		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-102		25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-103		25/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	2,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-104		25/03/2024	0,00%	0,00%	0,40	19,20	0,00	2,00	80,30	0,04		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-105		25/03/2024	0,00%	0,00%	2,30	18,00	0,00	2,00	79,70	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-106		25/03/2024	0,00%	0,00%	0,50	19,10	0,00	2,00	80,40	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-107		25/03/2024	0,00%	0,00%	1,80	17,30	0,00	2,00	81,00	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-108		25/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,20	0,00	3,00	80,50	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	2,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-109	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	1,00	18,50	0,00	2,00	80,50	0,14		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-110	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,50	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	3,00	80,60	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-111	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,20	0,00	3,00	80,70	0,09		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-112		25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	3,00	80,70	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	2,00	80,60	0,03		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-162	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	3,30	16,80	0,00	2,00	79,90	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	2,00	80,60	0,05		0,00	0,00	
Ginásio Poliesportivo	PMG-166	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	18,70	0,00	3,00	81,00	-0,05		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,70	0,00	2,00	81,30	-0,02		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	18,70	0,00	2,00	81,20	0,00		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-119	C	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,80	0,00	2,00	81,10	-0,02		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	A	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,90	-0,02		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,10	0,00	2,00	80,80	-0,01		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-120	C	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	2,00	80,70	0,07		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-163	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	18,90	0,00	1,00	81,10	0,01		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	B	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,30	0,00	1,00	80,70	0,01		0,00	0,00	
Portaria P3	PMG-164	C	25/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,20	0,00	1,00	80,30	0,01		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	A	28/03/2024	0,00%	0,00%	0,60	19,00	0,00	1,00	80,40	0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-121	B	28/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,50	0,00	1,00	80,40	0,05		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	A	28/03/2024	0,00%	0,00%	0,20	19,30	0,00	1,00	80,50	0,04		0,00	0,00	
Transportes	PMG-122	B	28/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	1,00	80,50	0,10		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	A	28/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,20	0,00	1,00	80,50	0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-123	B	28/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,40	0,00	1,00	80,50	0,04		0,00	0,00	

Edifício	Conjunto	Poço	Semana	CH4 (%Vol.)	Pico CH4 (%Vol.)	CO2 (%Vol.)	O2 (%Vol.)	CO (ppm)	H ₂ S (ppm)	BAL (%Vol.)	Pressão (mbar)	OBS	VOC (PPM)	LEL (%LEL)	Observação
Legenda: (-) Medição não realizada; entre 5% e 15% ; maior que 15%,															
Transportes	PMG-124 A		28/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,30	0,00	1,00	80,60	0,06		0,00	0,00	
Transportes	PMG-124 B		28/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	1,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-158 B		28/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,50	0,00	1,00	80,50	0,08		0,00	0,00	
Transportes	PMG-159 B		28/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,40	0,00	1,00	80,60	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-125 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,10		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,11		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-126 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,80	0,00	3,00	80,10	1,81		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-127 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	3,00	80,30	5,04		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,30	19,70	0,00	2,00	80,10	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-128 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,10	19,60	0,00	2,00	80,30	0,07		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,08		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-129 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,00	0,00	3,00	79,50	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,70	0,00	2,00	80,30	0,14		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-130 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,00	19,80	0,00	2,00	80,20	0,13		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131 A		27/03/2024	0,00%	0,00%	0,80	19,10	0,00	2,00	80,20	0,12		0,00	0,00	
Posto Guarda Universitário	PMG-131 B		27/03/2024	0,00%	0,00%	1,20	18,90	0,00	2,00	79,90	0,10		0,00	0,00	

ANEXO 4

TABELAS DE MEDIÇÕES SEMANAIS NA INFRAESTRUTURA

PONTOS DE INFRAESTRUTURA						
Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
				(ppm)	(50kVol.)	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	1	15/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	2	15/01/2024	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaco c/ pouca circulação de ar	3	15/01/2024	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	4	18/01/2024	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	5	18/01/2024	0	0	
Caixa d'água	Espaco c/ pouca circulação de ar	6	18/01/2024	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	7	17/01/2024	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	8	17/01/2024	0	0	
Casa de Máquinas	Espaco c/ pouca circulação de ar	9	18/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	16/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	16/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	15/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	15/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	15/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	15/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	15/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	15/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	15/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	15/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	15/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	15/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	15/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	15/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	15/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	17/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	17/01/2024	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	17/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	17/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	16/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	16/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	76	16/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	16/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	16/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	16/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	16/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	16/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	16/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	16/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	16/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	16/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	16/01/2024	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	18/01/2024	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	18/01/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	18/01/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	18/01/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	18/01/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	18/01/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	136	18/01/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	137	18/01/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	138	18/01/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	132	18/01/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	133	18/01/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	134	18/01/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	135	18/01/2024	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	15/01/2024	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	15/01/2024	0	0	
Base Guard	Ralo	188	18/01/2024	0	0	
Base Guard	Ralo	189	18/01/2024	0	0	
Base Guard	Ralo	190	18/01/2024	0	0	
Base Guard	Ralo	191	18/01/2024	0	0	
Base Guard	Ralo	192	18/01/2024	0	0	
Base Guard	Ralo	193	18/01/2024	0	0	
Base Guard	Ralo	194	18/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	1	29/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	2	29/01/2024	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaco c/ pouca circulação de ar	3	29/01/2024	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	4	01/02/2024	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	5	01/02/2024	0	0	
Caixa d'água	Espaco c/ pouca circulação de ar	6	31/01/2024	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	7	31/01/2024	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	8	31/01/2024	0	0	
Casa de Máquinas	Espaco c/ pouca circulação de ar	9	31/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	30/01/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	30/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	29/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	29/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	29/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	29/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	29/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	29/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	29/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	29/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	29/01/2024	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%EL	Observação
I-5 Auditórios	Ralo	174	29/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	29/01/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	29/01/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	29/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	31/01/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	31/01/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	31/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	30/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	30/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	76	30/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	30/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	30/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	30/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	30/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	30/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	30/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	30/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	30/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	30/01/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	30/01/2024	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	01/02/2024	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	01/02/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	01/02/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	01/02/2024	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Enfermaria	Ralo	126	01/02/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	01/02/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	136	01/02/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	137	01/02/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	138	01/02/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	132	01/02/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	133	01/02/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	134	01/02/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	135	01/02/2024	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	29/01/2024	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	29/01/2024	0	0	
Base Guardas	Ralo	188	01/02/2024	0	0	
Base Guardas	Ralo	189	01/02/2024	0	0	
Base Guardas	Ralo	190	01/02/2024	0	0	
Base Guardas	Ralo	191	01/02/2024	0	0	
Base Guardas	Ralo	192	01/02/2024	0	0	
Base Guardas	Ralo	193	01/02/2024	0	0	
Base Guardas	Ralo	194	01/02/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	1	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	2	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 Biblioteca	Espaco c/ pouca circulação de ar	3	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	4	15/02/2024	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	5	15/02/2024	0	0	
Caixa d'água	Espaco c/ pouca circulação de ar	6	15/02/2024	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	7	16/02/2024	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	8	16/02/2024	0	0	
Casa de Máquinas	Espaco c/ pouca circulação de ar	9	15/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	2	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	3	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	4	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	5	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	6	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	7	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	8	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	9	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	12	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	13	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	14	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	15	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	16	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	17	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	18	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	19	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	20	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	21	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	22	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	23	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	24	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	25	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	26	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	27	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	28	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	30	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	31	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Edifício I-1	Ralo	32	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	Ralo	159	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	Ralo	160	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	Ralo	162	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	Ralo	164	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	Ralo	165	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	Ralo	171	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	Ralo	174	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	Ralo	176	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-5 Auditórios	Ralo	177	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Central de Serviços I-4	Ralo	95	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	16/02/2024	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Central de Serviços I-4	Ralo	112	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	16/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	16/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	16/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	16/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	16/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	76	16/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	16/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	16/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	16/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	16/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	16/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	16/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	16/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	16/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	16/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	16/02/2024	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	15/02/2024	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	15/02/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	15/02/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	15/02/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	15/02/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	15/02/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	136	15/02/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	137	15/02/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	138	15/02/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	132	15/02/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	133	15/02/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	134	15/02/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	135	15/02/2024	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
Portaria 3	Ralo	187	-	-	-	Não medido devido ao feriado de carnaval.
base guarnição	Ralo	188	15/02/2024	0	0	
base guarnição	Ralo	189	15/02/2024	0	0	
base guarnição	Ralo	190	15/02/2024	0	0	
base guarnição	Ralo	191	15/02/2024	0	0	
base guarnição	Ralo	192	15/02/2024	0	0	
base guarnição	Ralo	193	15/02/2024	0	0	
base guarnição	Ralo	194	15/02/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	1	26/02/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	2	26/02/2024	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaco c/ pouca circulação de ar	3	26/02/2024	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	4	29/02/2024	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	5	29/02/2024	0	0	
Caixa d'água	Espaco c/ pouca circulação de ar	6	27/02/2024	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	7	28/02/2024	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	8	28/02/2024	0	0	
Casa de Máquinas	Espaco c/ pouca circulação de ar	9	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	27/02/2024	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%EL	Observação
Edifício I-1	Ralo	26	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	27/02/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	27/02/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	26/02/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	26/02/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	26/02/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	26/02/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	26/02/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	26/02/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	26/02/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	26/02/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	26/02/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	26/02/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	26/02/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	26/02/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	26/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	28/02/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	28/02/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	28/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	27/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	27/02/2024	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Conjunto Didático	Ralo	76	27/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	27/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	27/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	27/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	27/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	27/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	27/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	27/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	27/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	27/02/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	27/02/2024	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	29/02/2024	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	29/02/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	29/02/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	29/02/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	29/02/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	29/02/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	136	29/02/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	137	29/02/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	138	29/02/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	132	29/02/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	133	29/02/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	134	29/02/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	135	29/02/2024	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	26/02/2024	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	26/02/2024	0	0	
Base Guardado	Ralo	188	29/02/2024	0	0	
Base Guardado	Ralo	189	29/02/2024	0	0	
Base Guardado	Ralo	190	29/02/2024	0	0	
Base Guardado	Ralo	191	29/02/2024	0	0	
Base Guardado	Ralo	192	29/02/2024	0	0	
Base Guardado	Ralo	193	29/02/2024	0	0	
Base Guardado	Ralo	194	29/02/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	1	11/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	2	11/03/2024	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaco c/ pouca circulação de ar	3	11/03/2024	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	4	14/03/2024	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	5	14/03/2024	0	0	
Caixa d'água	Espaco c/ pouca circulação de ar	6	14/03/2024	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	7	13/03/2024	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	8	13/03/2024	0	0	
Casa de Máquinas	Espaco c/ pouca circulação de ar	9	14/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	9	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	12/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	12/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	11/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	11/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	11/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	11/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	11/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	11/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	11/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	11/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	11/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	11/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	11/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	11/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	11/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	13/03/2024	0	0	

Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Central de Serviços I-4	Ralo	102	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	13/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	13/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	13/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	12/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	12/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	76	12/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	12/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	12/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	12/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	12/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	12/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	12/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	12/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	12/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	12/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	12/03/2024	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	14/03/2024	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	14/03/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	14/03/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	14/03/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	14/03/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	14/03/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	136	14/03/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	137	14/03/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	138	14/03/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	132	15/03/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	133	15/03/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	134	15/03/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	135	15/03/2024	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	11/03/2024	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	11/03/2024	0	0	
base guarda	Ralo	188	15/03/2024	0	0	
base guarda	Ralo	189	15/03/2024	0	0	
base guarda	Ralo	190	15/03/2024	0	0	
base guarda	Ralo	191	15/03/2024	0	0	
base guarda	Ralo	192	15/03/2024	0	0	
base guarda	Ralo	193	15/03/2024	0	0	
base guarda	Ralo	194	15/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	1	25/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Espaco c/ pouca circulação de ar	2	25/03/2024	0	0	
I-3 Biblioteca	Espaco c/ pouca circulação de ar	3	25/03/2024	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	4	28/03/2024	0	0	
Enfermaria	Espaco c/ pouca circulação de ar	5	28/03/2024	0	0	
Caixa d'água	Espaco c/ pouca circulação de ar	6	25/03/2024	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	7	27/03/2024	0	0	
Edifício I-4	Espaco c/ pouca circulação de ar	8	27/03/2024	0	0	
Casa de Máquinas	Espaco c/ pouca circulação de ar	9	25/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	1	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	2	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	3	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	4	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	5	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	6	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	7	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	8	26/03/2024	0	0	


Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Edifício I-1	Ralo	9	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	12	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	13	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	14	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	15	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	16	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	17	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	18	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	19	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	20	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	21	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	22	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	23	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	24	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	25	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	26	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	27	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	28	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	30	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	31	26/03/2024	0	0	
Edifício I-1	Ralo	32	26/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	72	25/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	73	25/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Caixa de passagem	74	25/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	159	25/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	160	25/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	162	25/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	164	25/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	165	25/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	171	25/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	174	25/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	176	25/03/2024	0	0	
I-5 Auditórios	Ralo	177	25/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	57	25/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	58	25/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	59	25/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	60	25/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Caixa de passagem	67	25/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	139	25/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	140	25/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	141	25/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	142	25/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	143	25/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	144	25/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	145	25/03/2024	8	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	146	25/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	147	25/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	148	25/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	149	25/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	150	25/03/2024	0	0	
I-3 ADM/Biblioteca	Ralo	151	25/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	95	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	97	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	99	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	106	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	96	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	104	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	307	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	122	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	111	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	117	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	100	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	101	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	105	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	91	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	102	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	88	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	108	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	107	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	94	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	92	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	90	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	89	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	87	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	123	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	121	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	120	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	119	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	114	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	113	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	112	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	109	27/03/2024	0	0	
Central de Serviços I-4	Ralo	110	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	13	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	15	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	16	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	18	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	21	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	24	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	28	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	33	27/03/2024	0	0	


Edifício	Tipo	Ponto	Semana	PID	%LEL	Observação
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	37	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	38	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	39	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Caixa de passagem	40	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	32	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	34	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	36	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	37	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	38	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	40	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	41	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	42	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	43	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	44	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	45	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	46	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	47	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	48	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	49	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	50	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	53	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	54	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	55	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	56	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	57	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	58	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	60	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	61	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	62	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	63	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	64	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	65	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	66	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	67	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	69	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	70	27/03/2024	0	0	
Conjunto Laboratorial	Ralo	71	27/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	74	26/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	75	26/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	76	26/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	77	26/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	78	26/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	79	26/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	80	26/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	81	26/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	82	26/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	83	26/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	84	26/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	85	26/03/2024	0	0	
Conjunto Didático	Ralo	86	26/03/2024	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	53	28/03/2024	0	0	
Enfermaria	Caixa de passagem	55	28/03/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	124	28/03/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	125	28/03/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	126	28/03/2024	0	0	
Enfermaria	Ralo	127	28/03/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	136	25/03/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	137	25/03/2024	0	0	
CAT 1	Ralo	138	25/03/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	132	26/03/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	133	26/03/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	134	26/03/2024	0	0	
CAT 2	Ralo	135	26/03/2024	0	0	
Portaria 3	Ralo	186	25/03/2024	0	0	
Portaria 3	Ralo	187	25/03/2024	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	188	27/03/2024	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	189	27/03/2024	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	190	27/03/2024	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	191	27/03/2024	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	192	27/03/2024	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	193	27/03/2024	0	0	
Base Guarda Universitária	Ralo	194	27/03/2024	0	0	

ANEXO 5


EVOLUÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE METANO X PRESSÃO (ABRIL/2014 A MARÇO/2024)




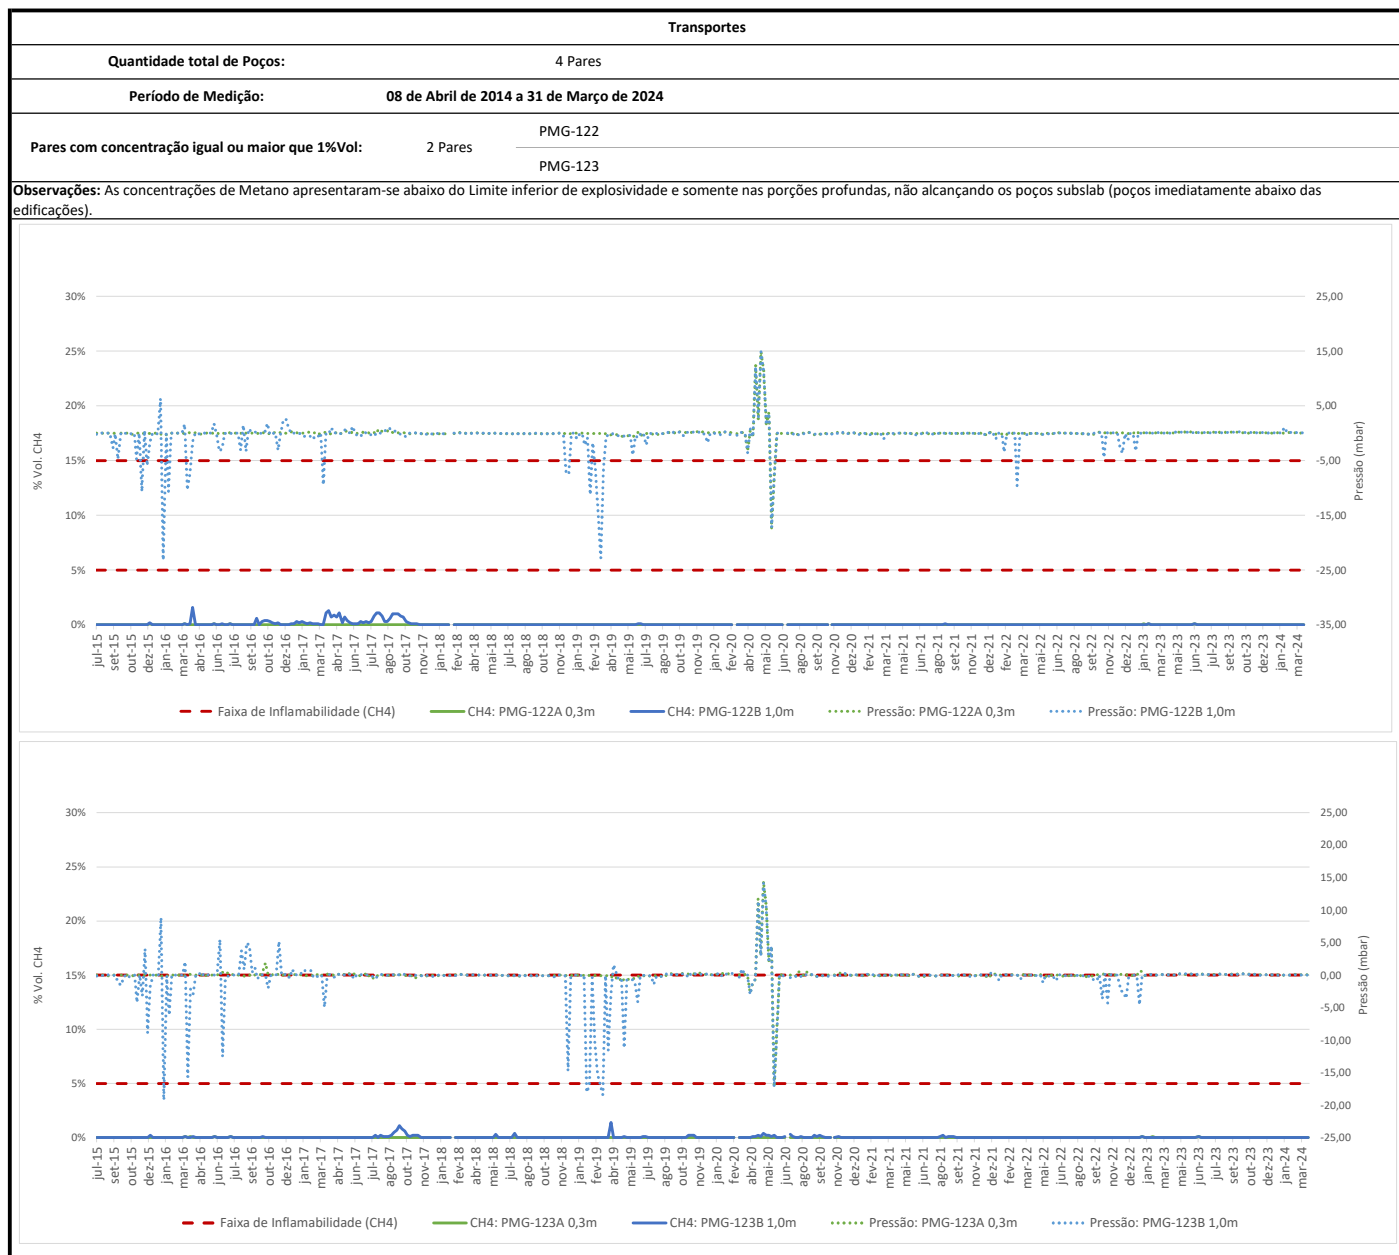

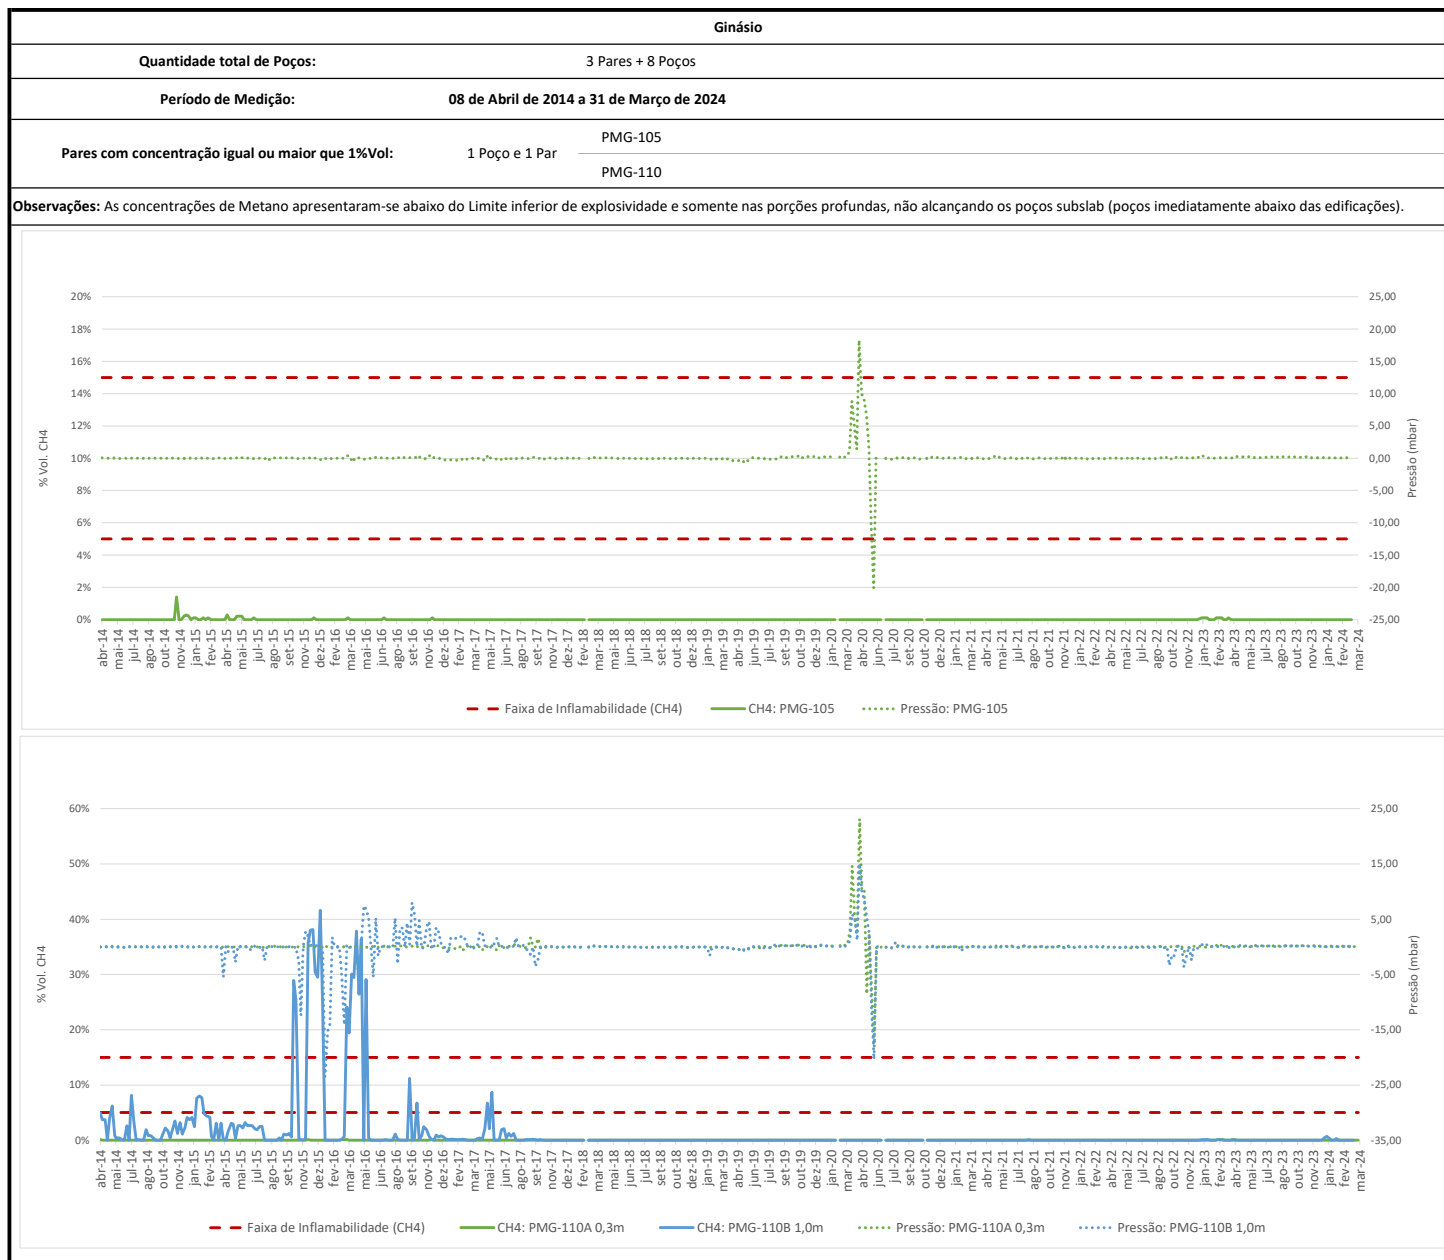




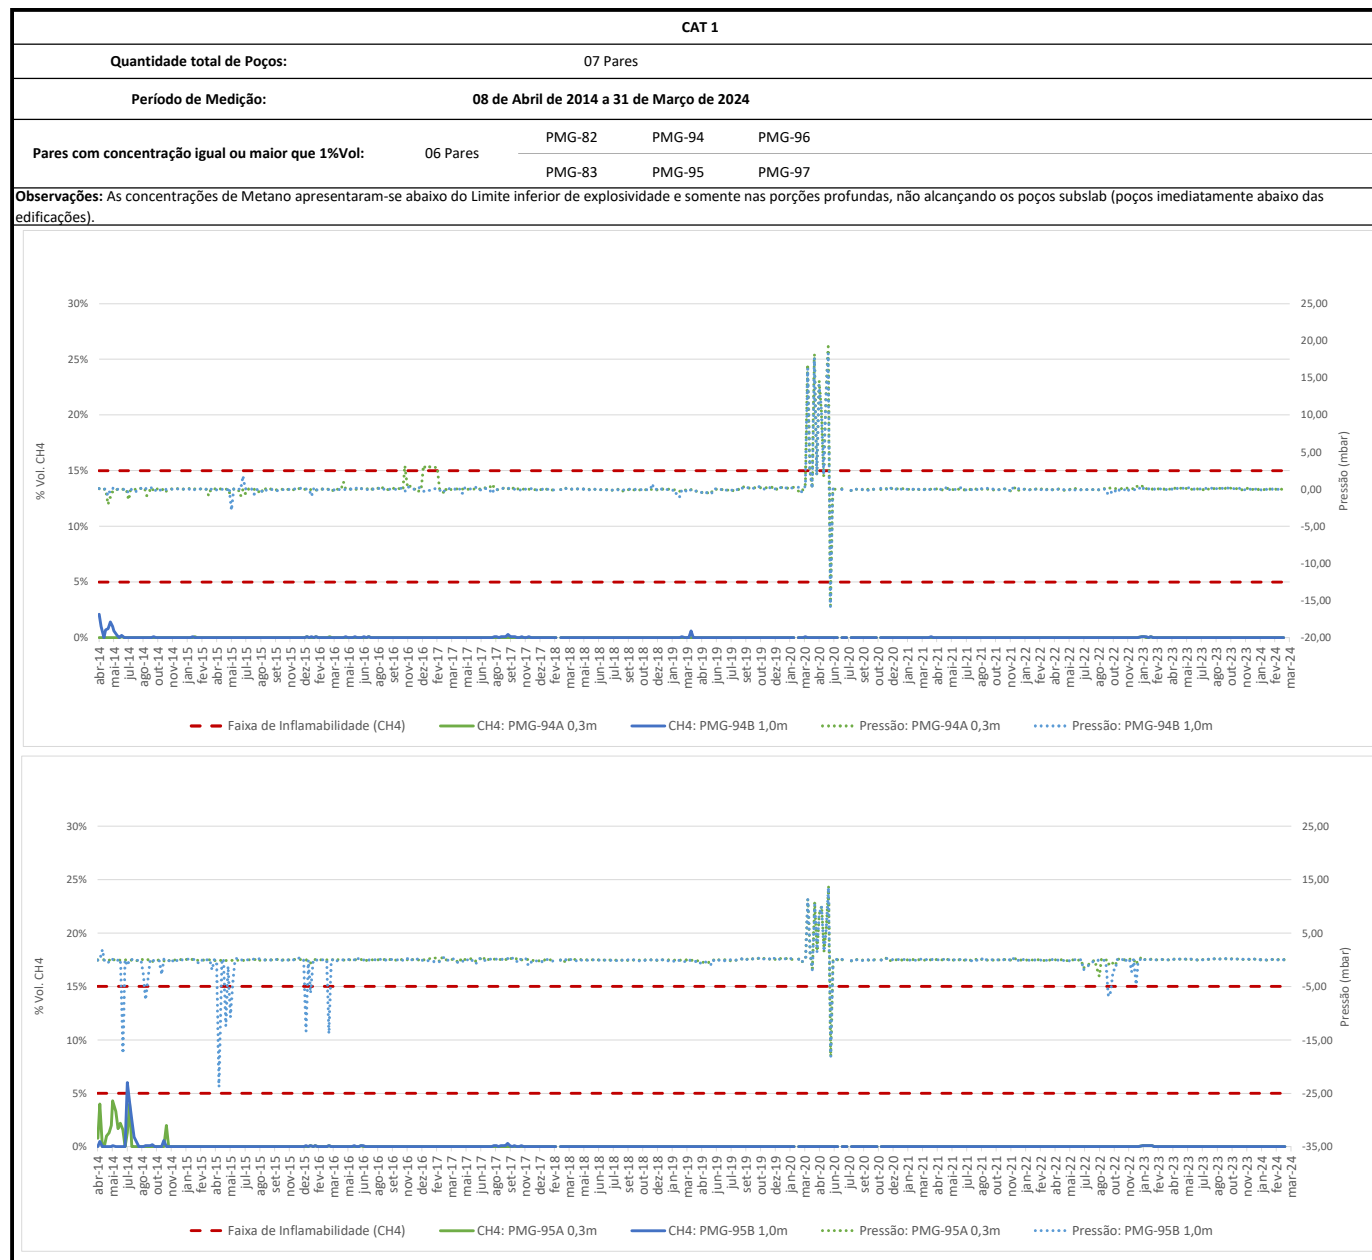


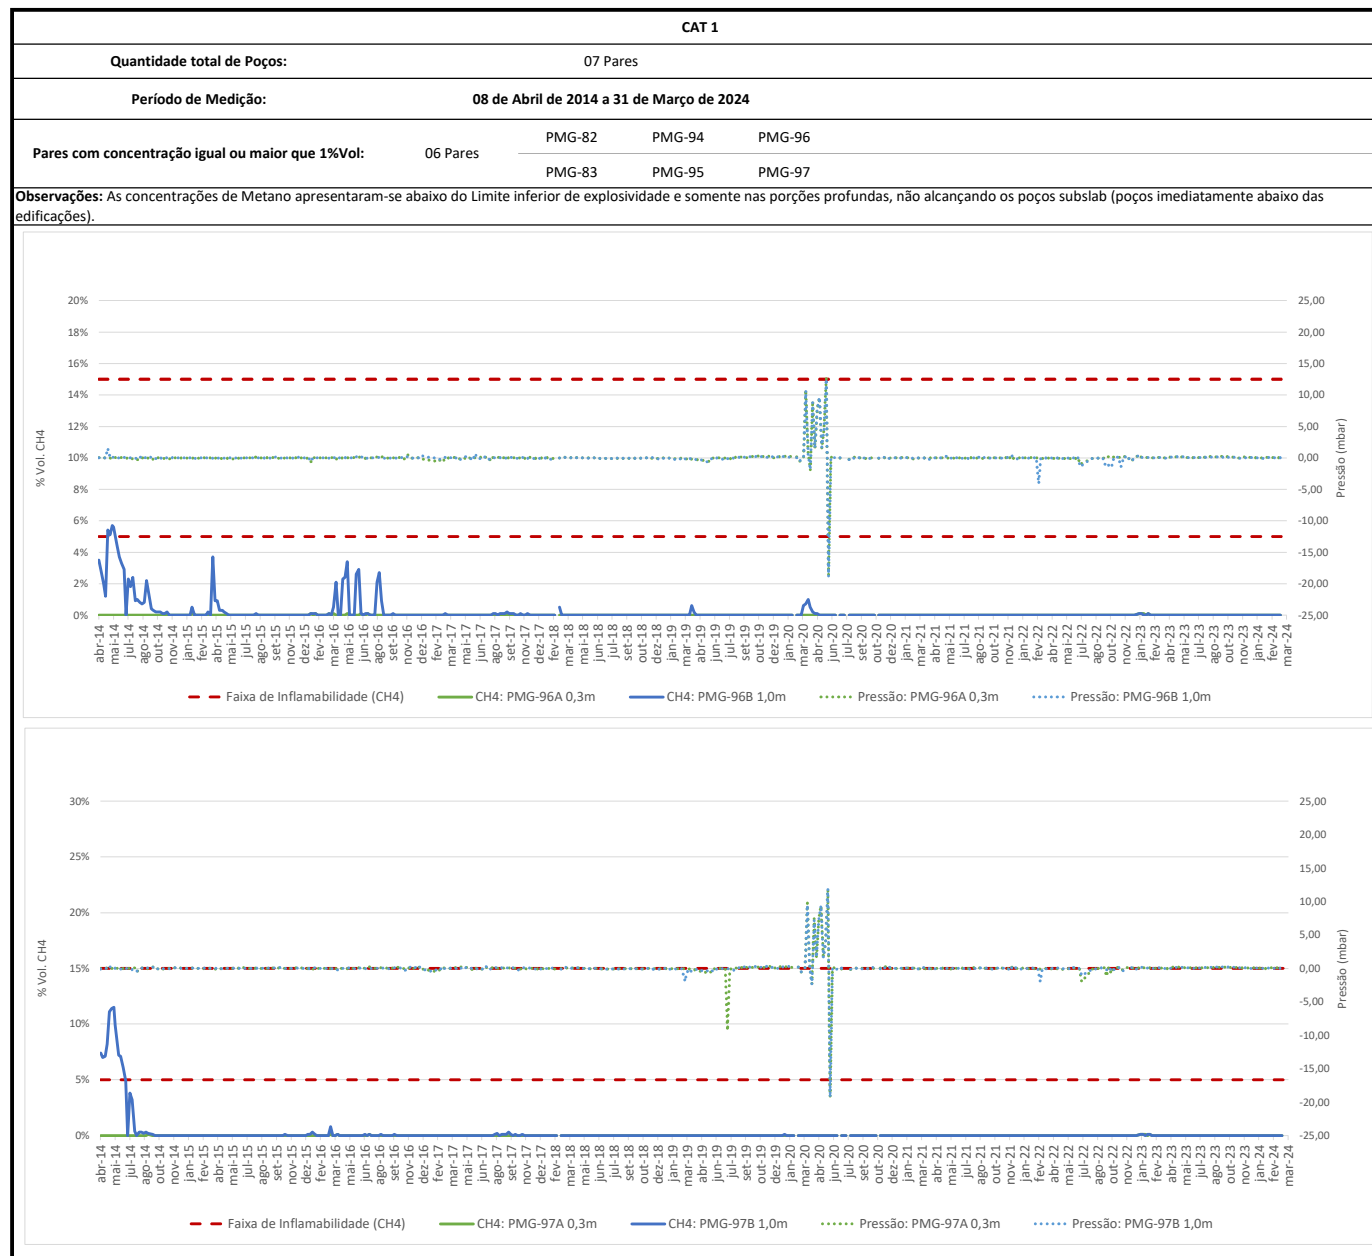





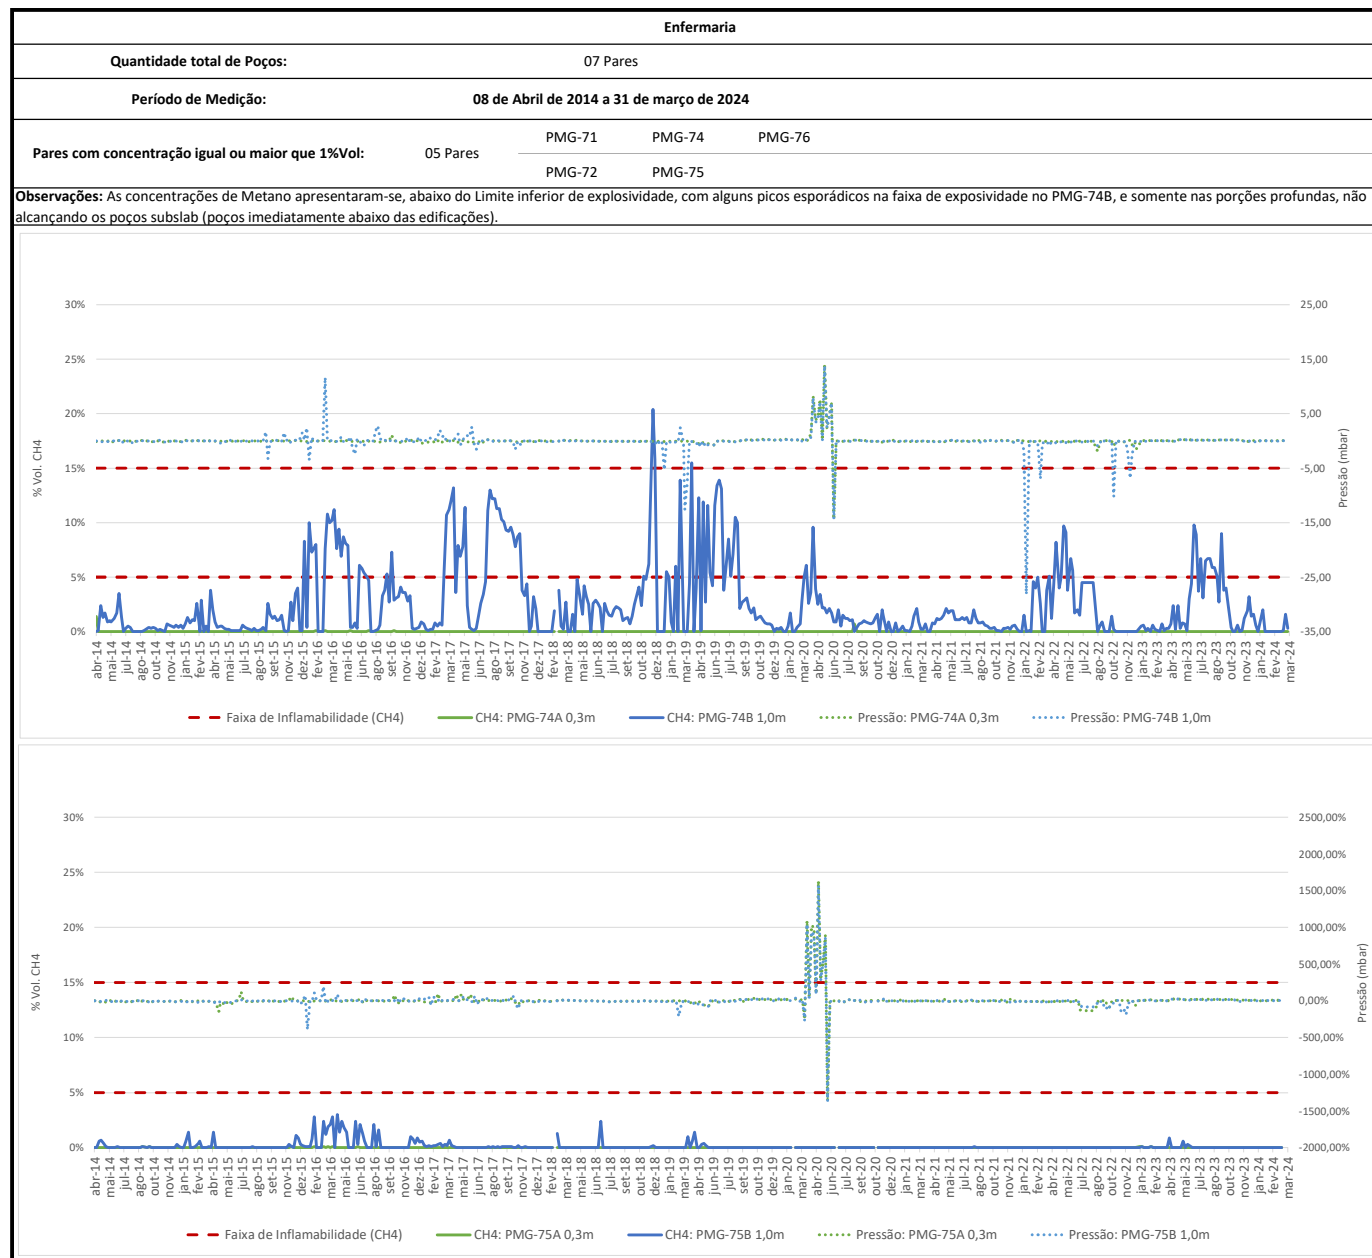





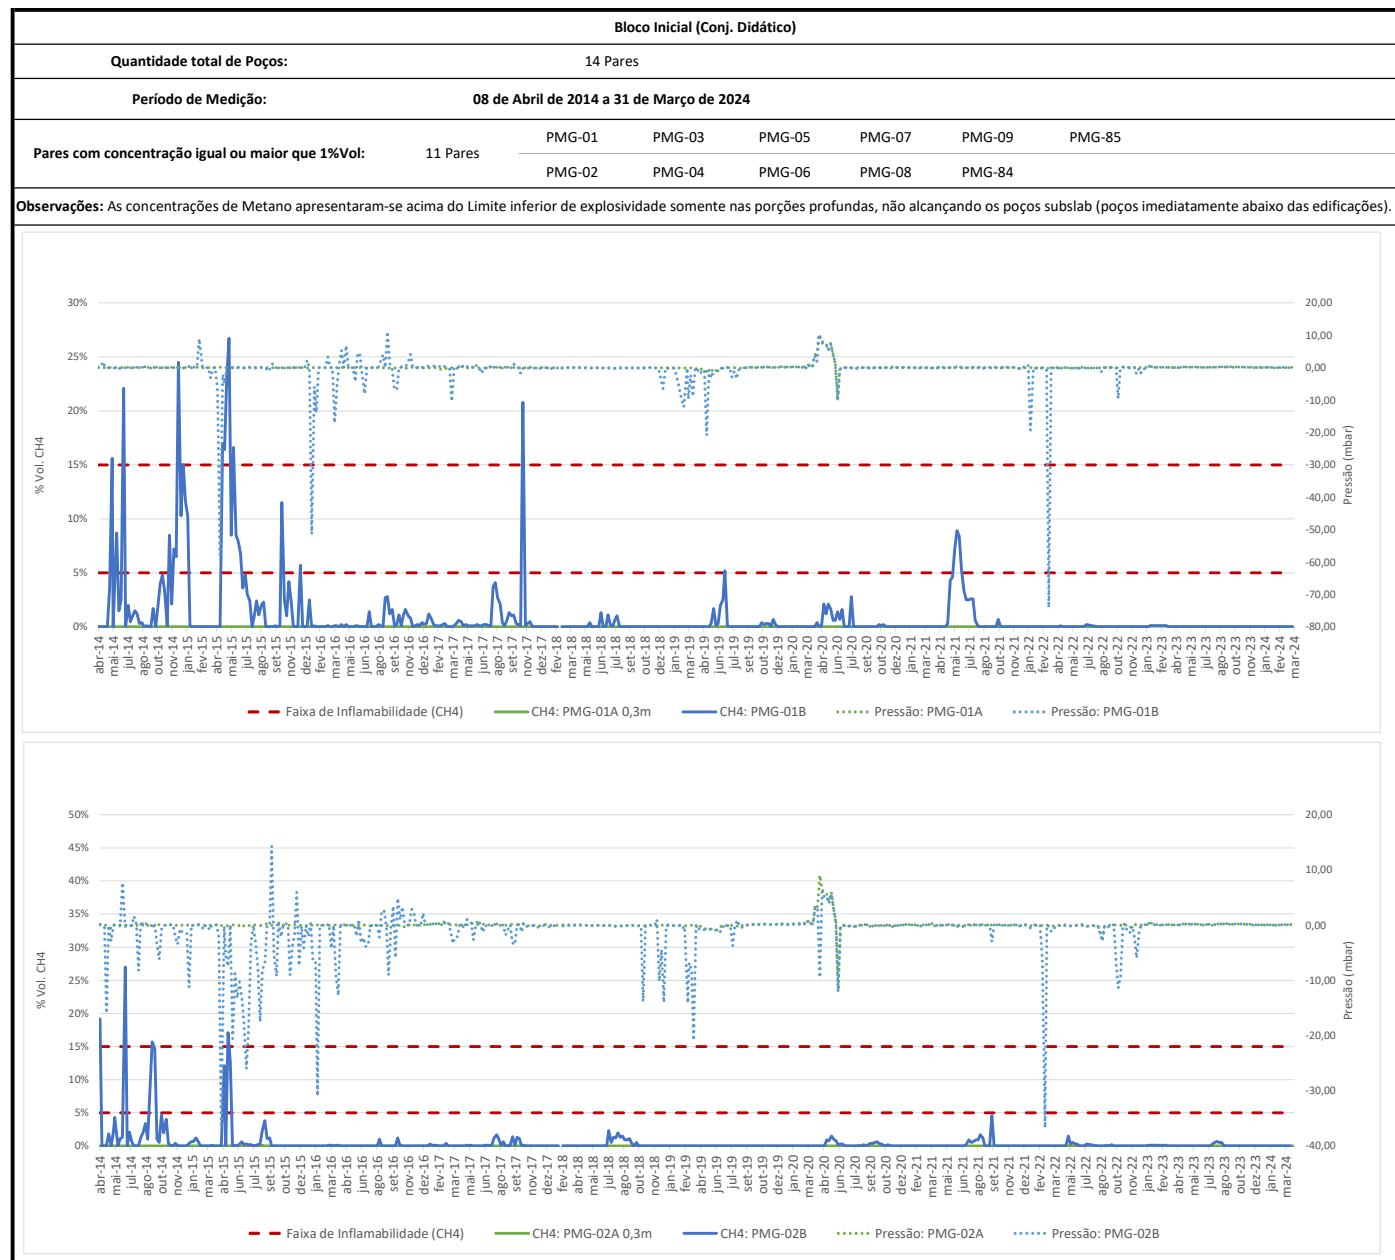

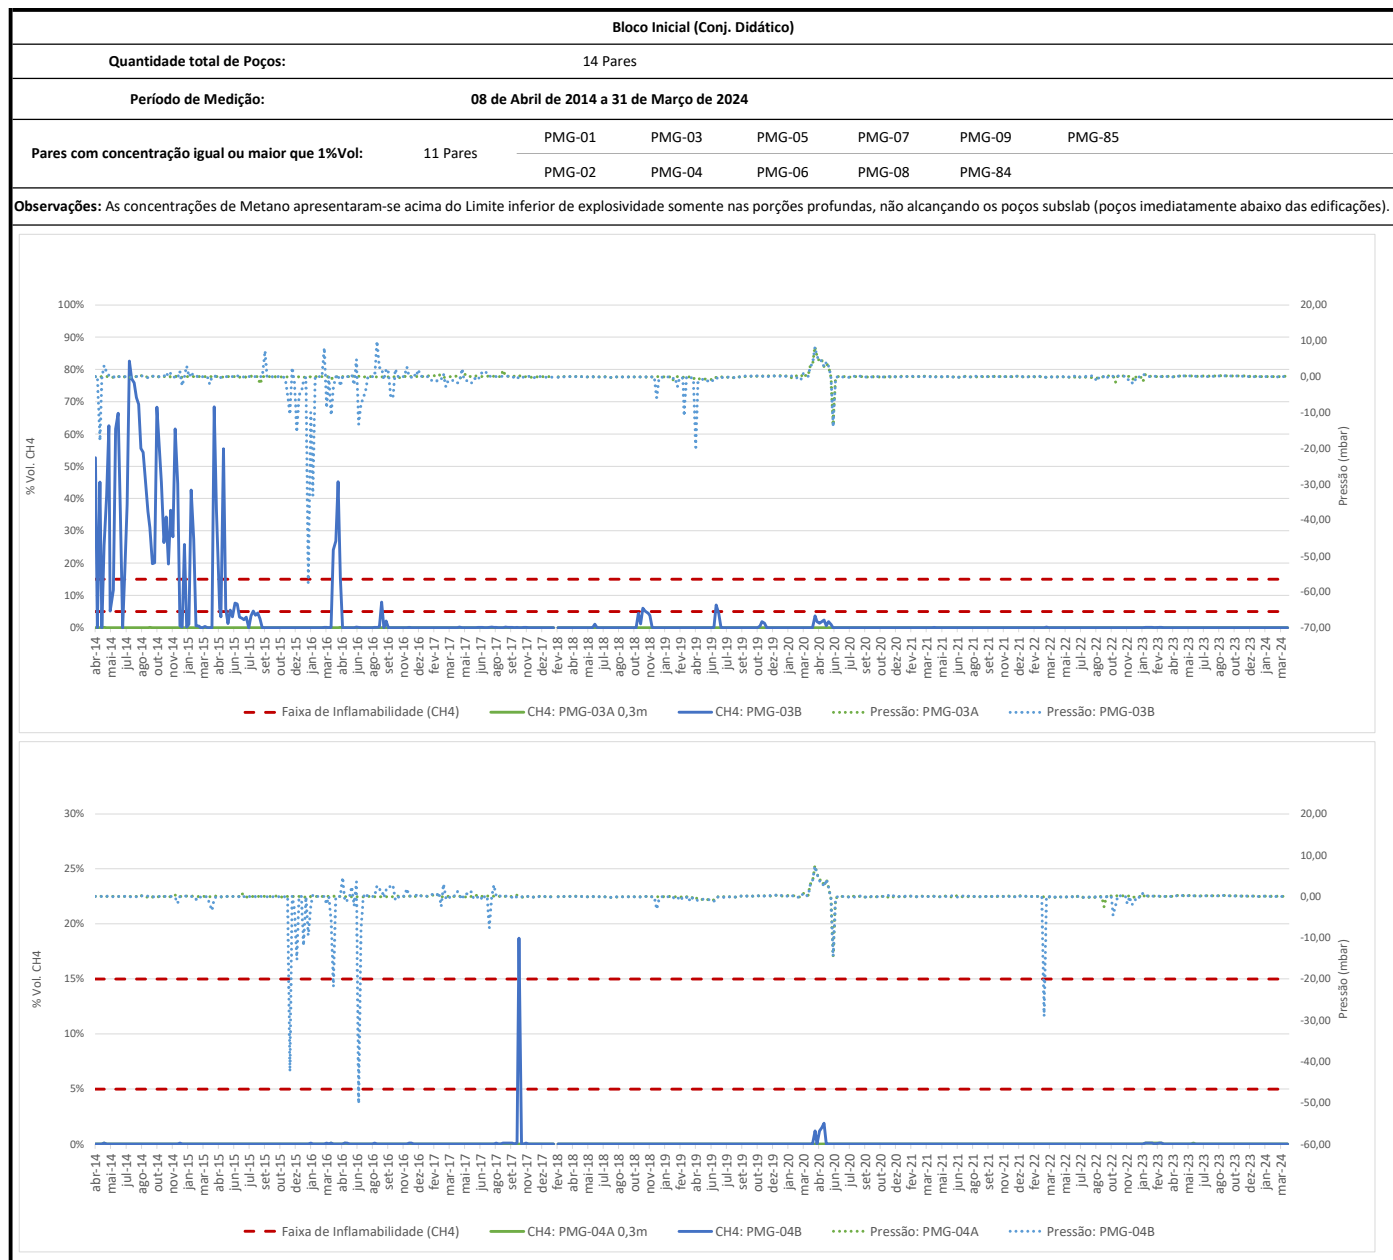


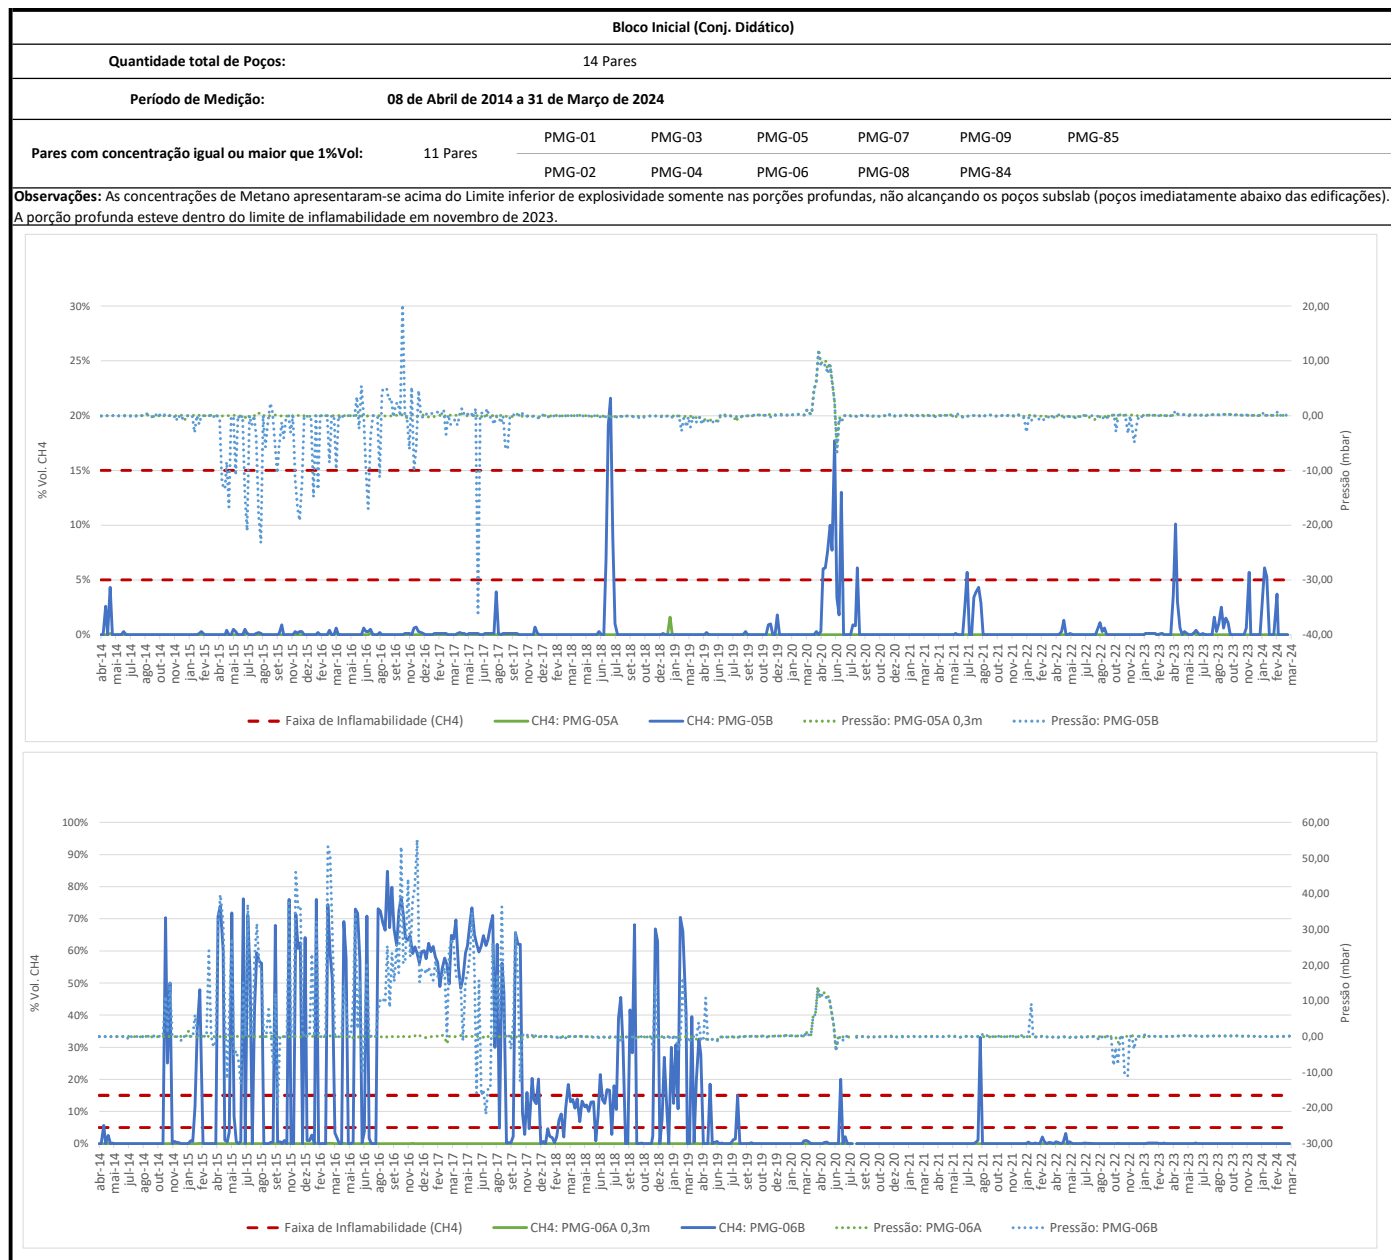


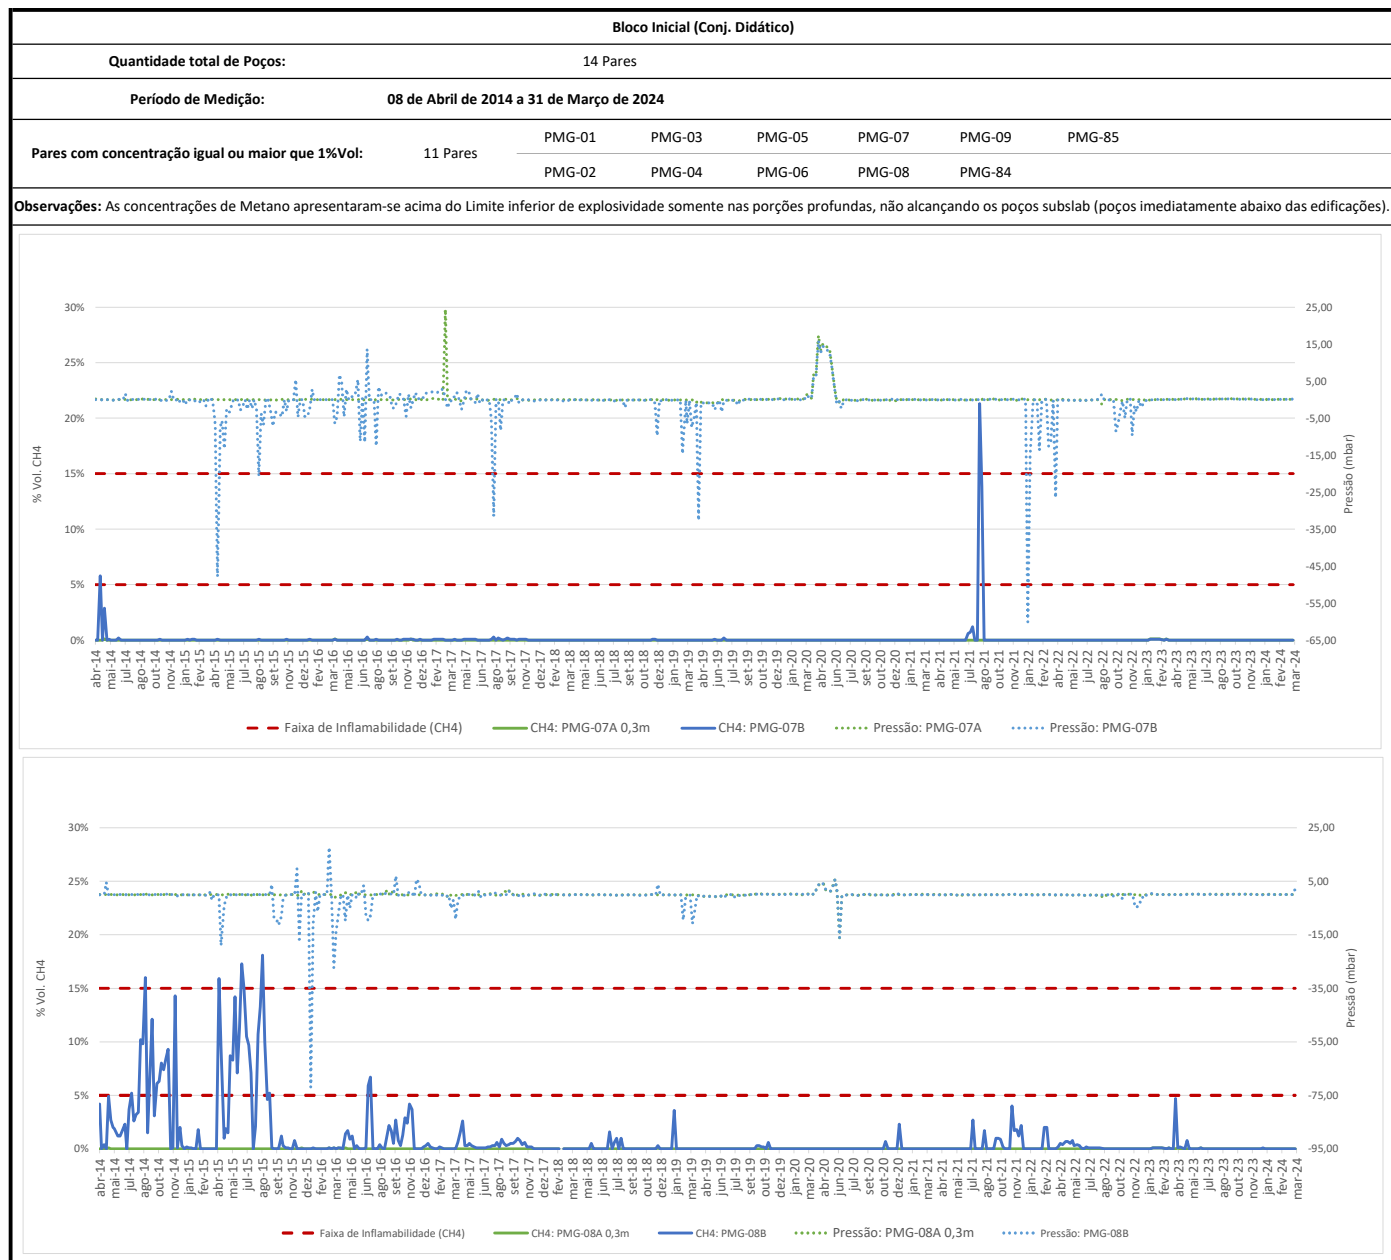


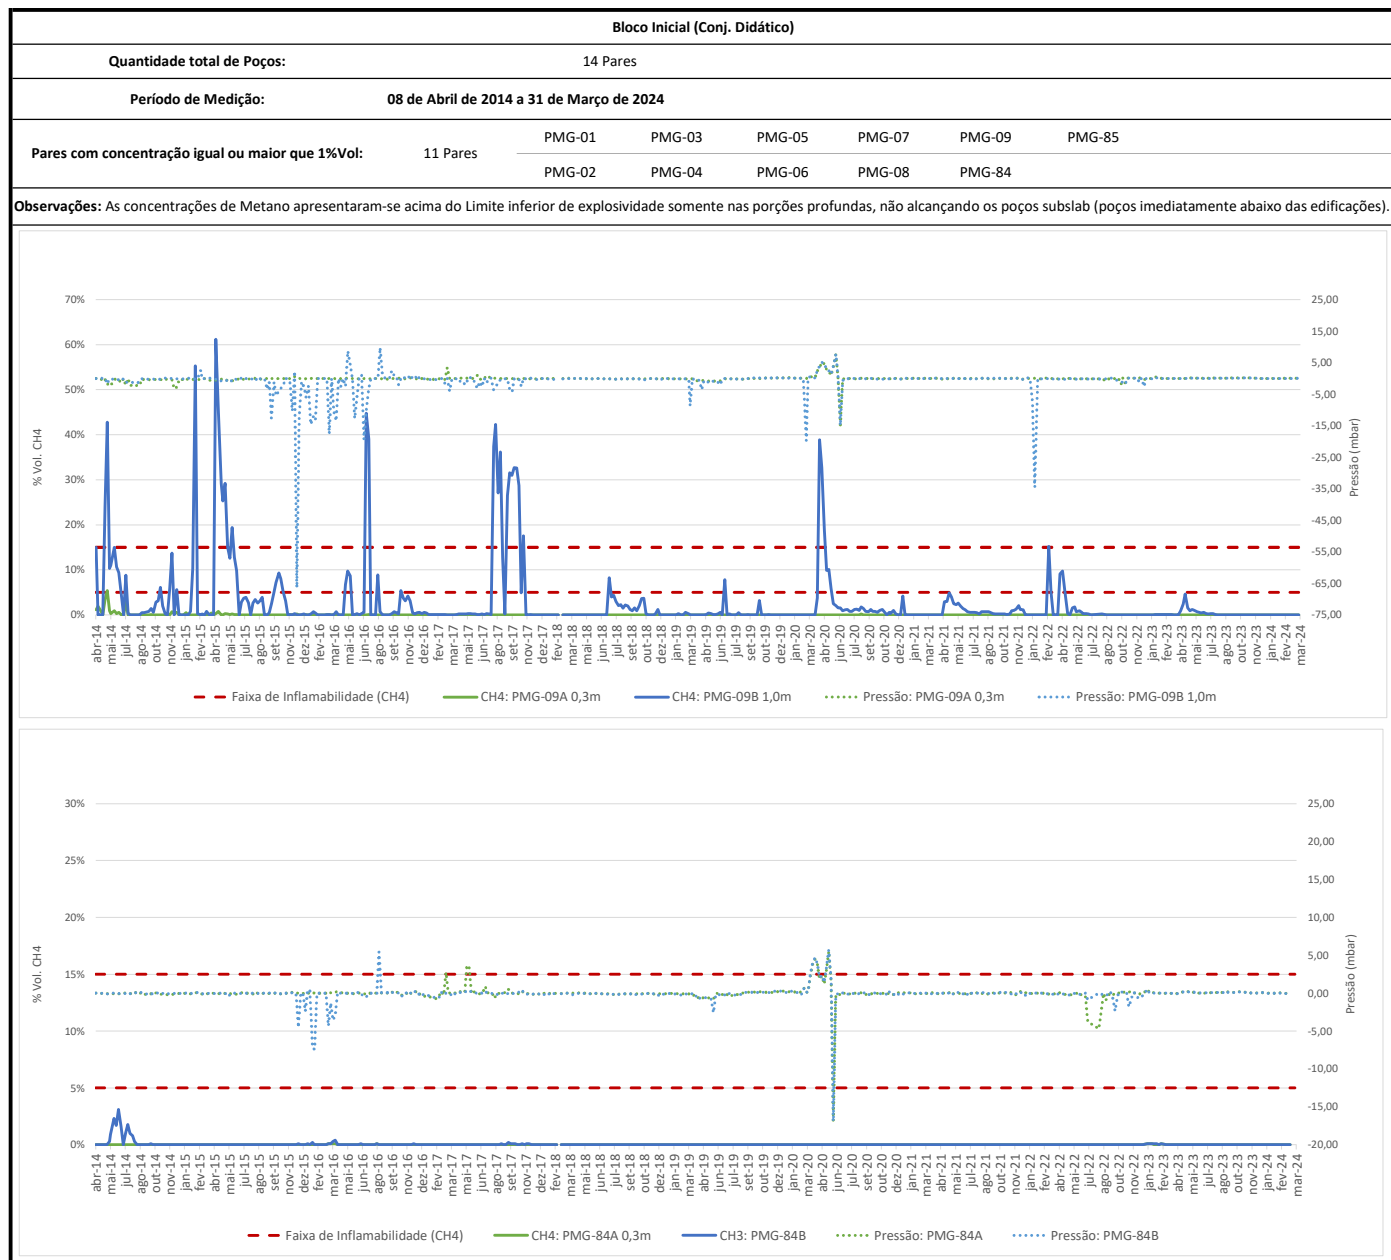





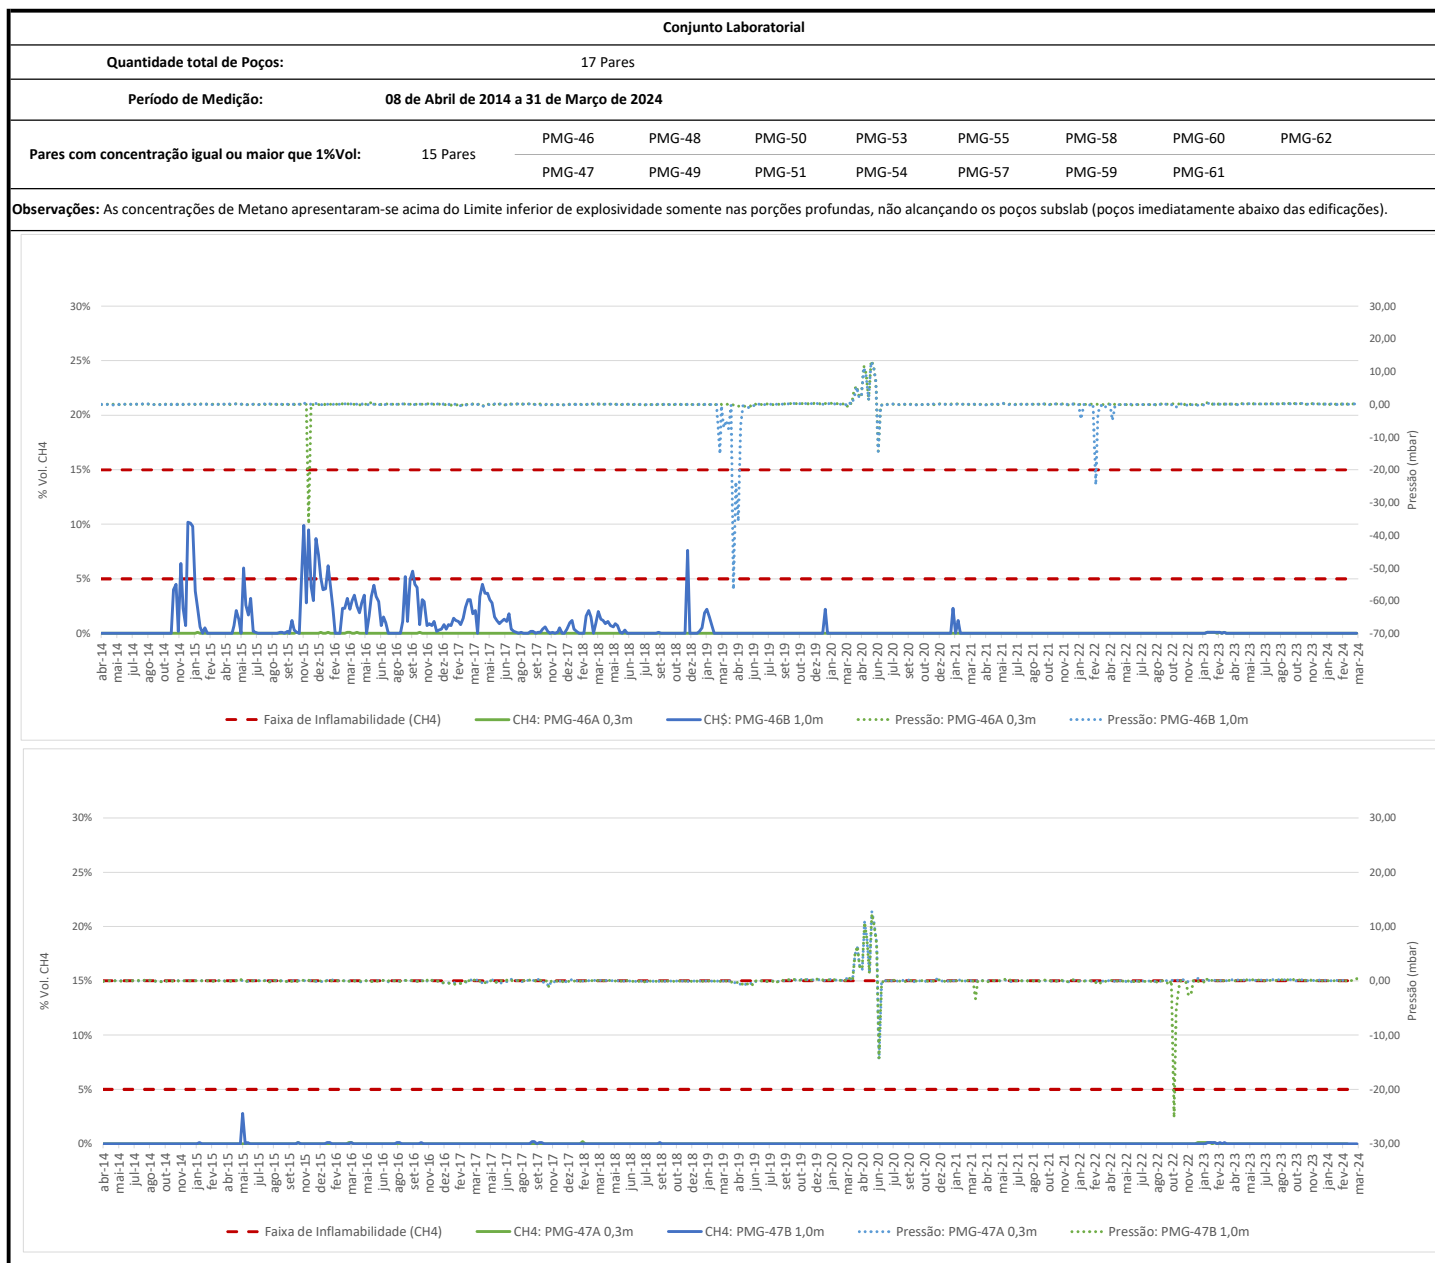


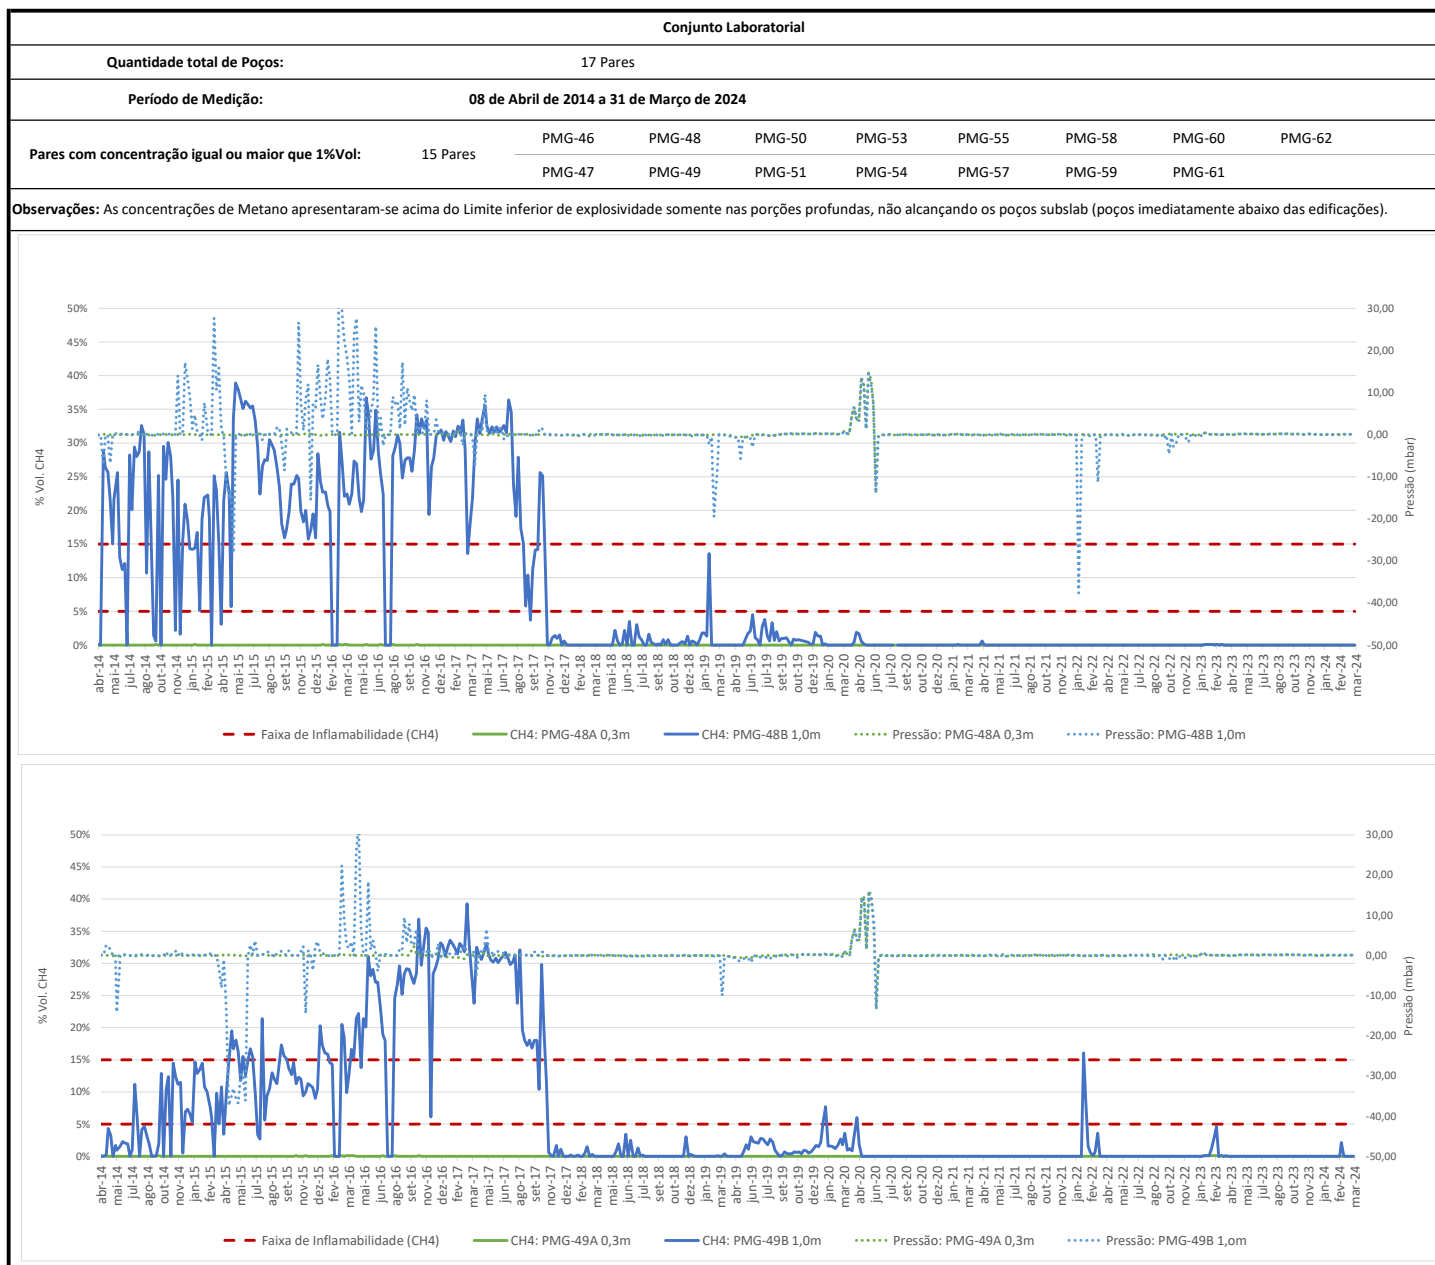


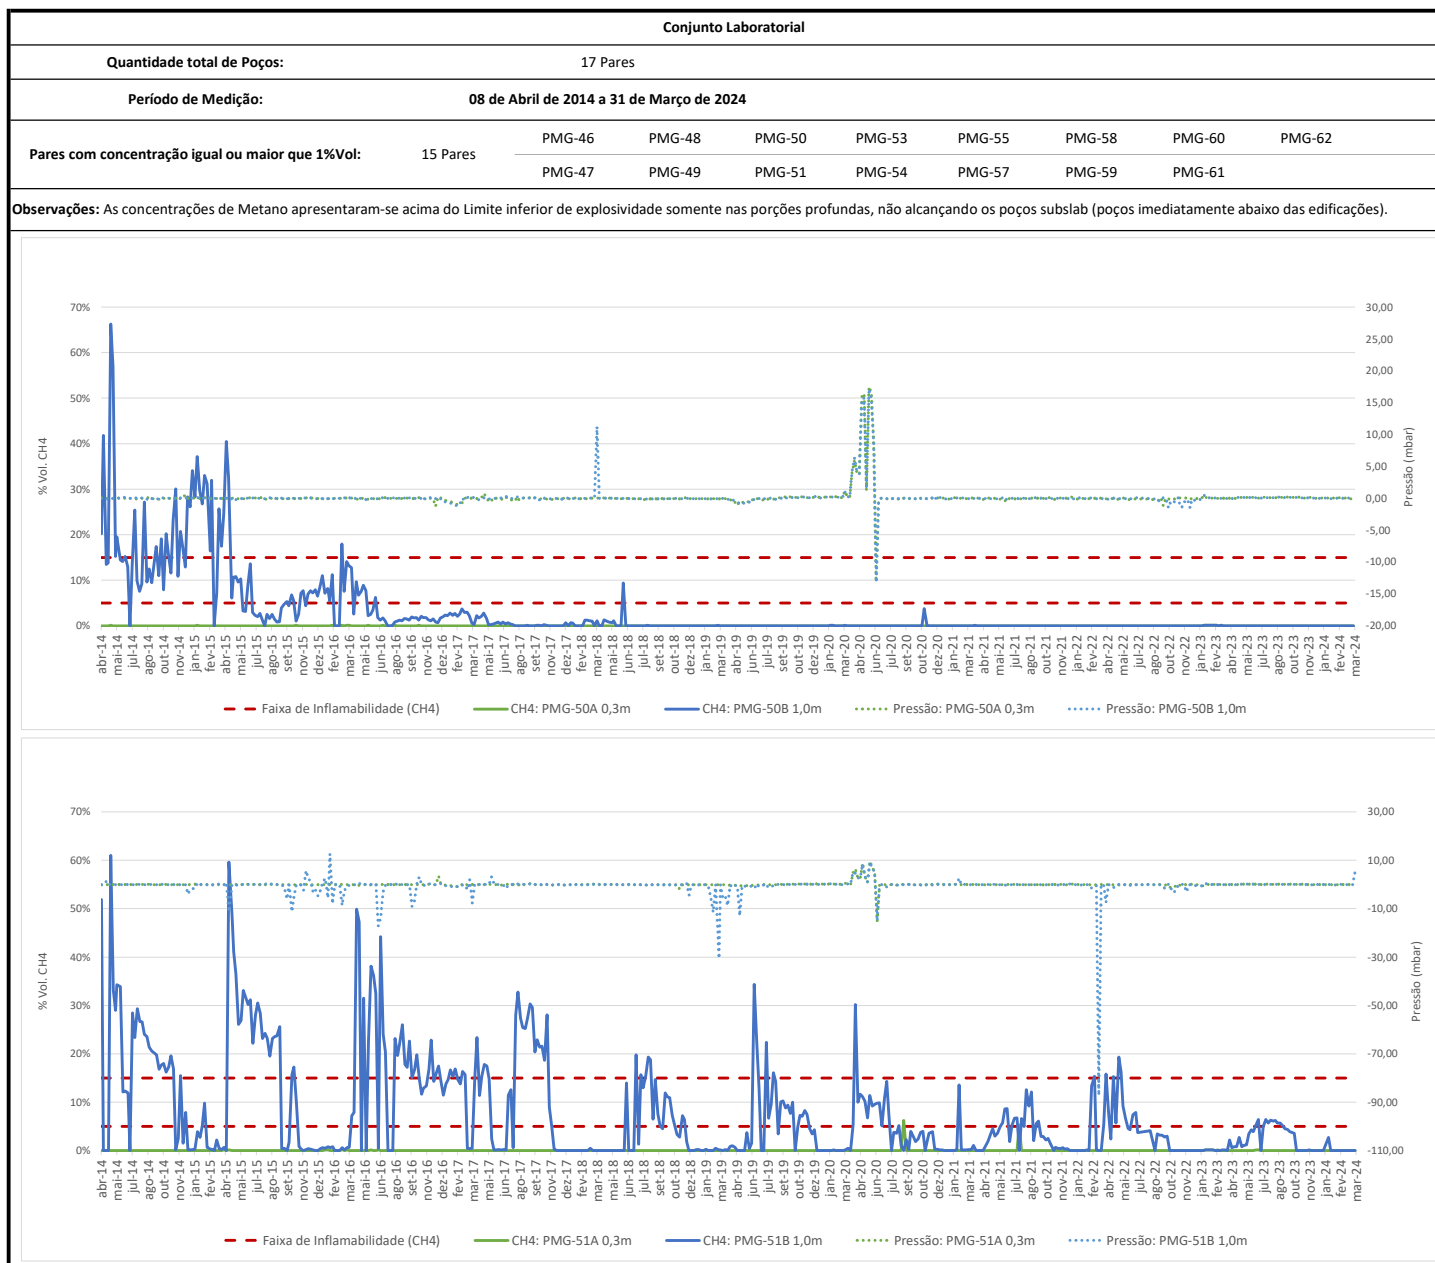


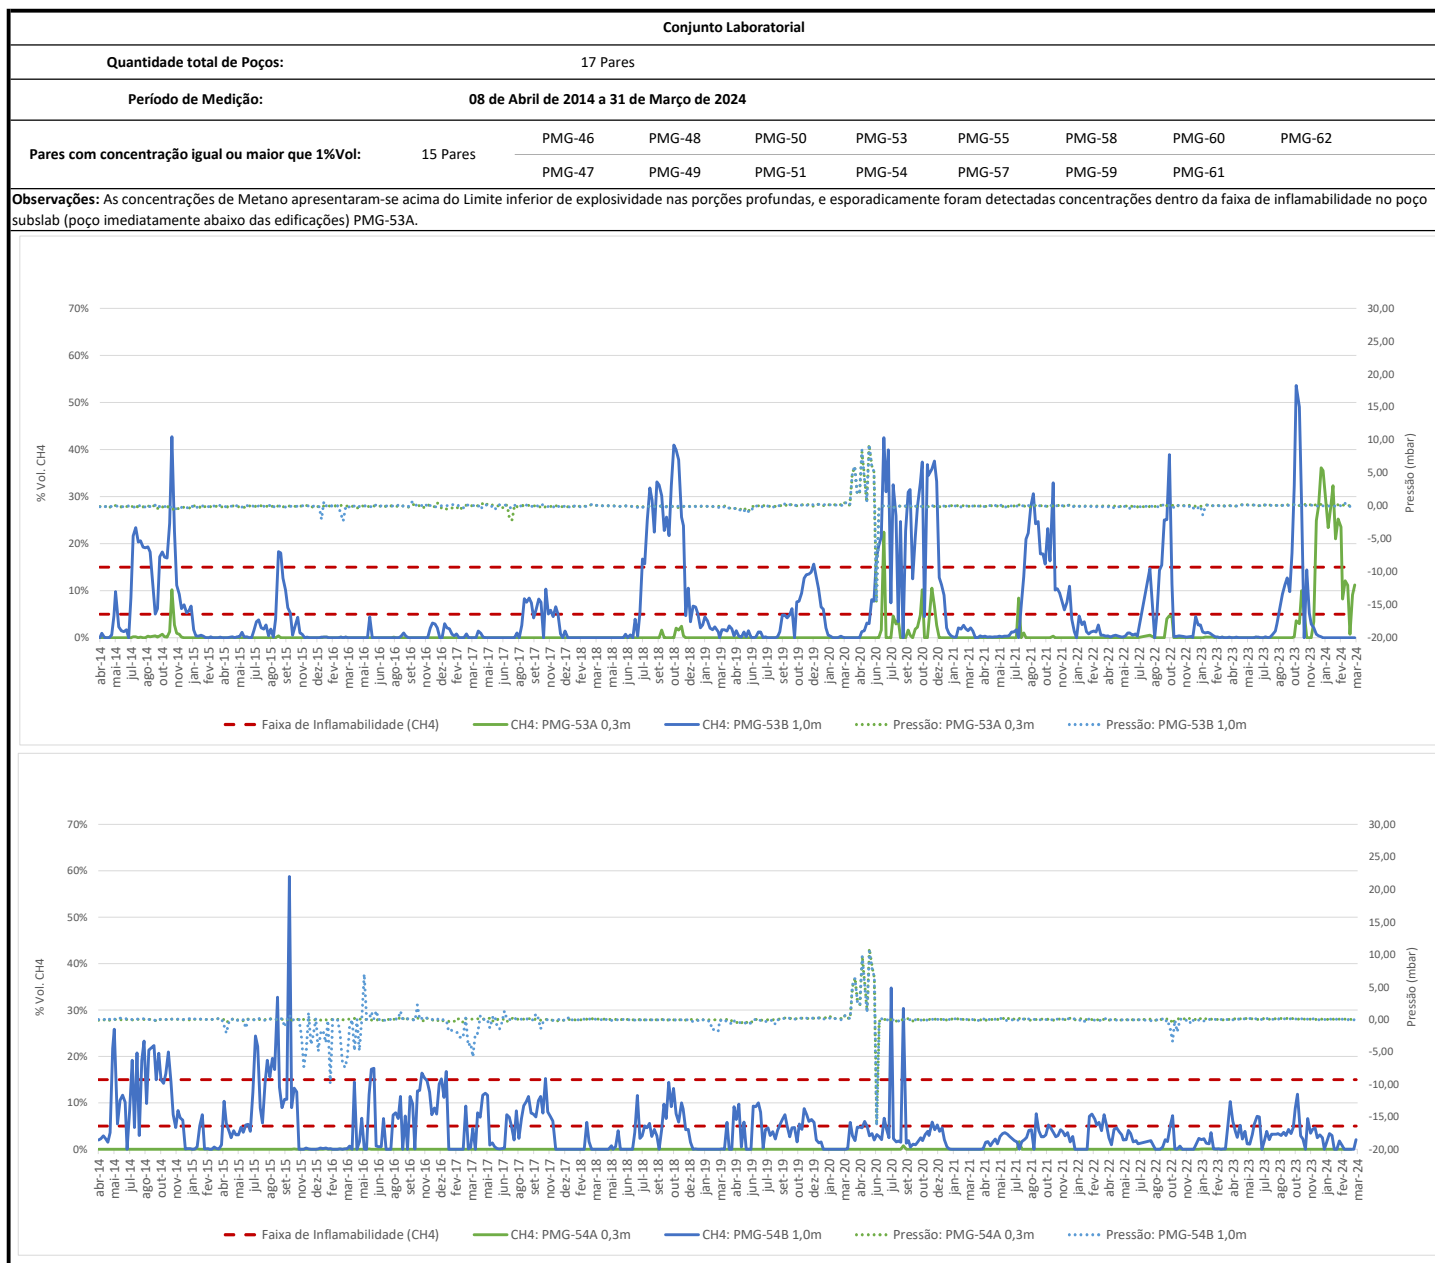


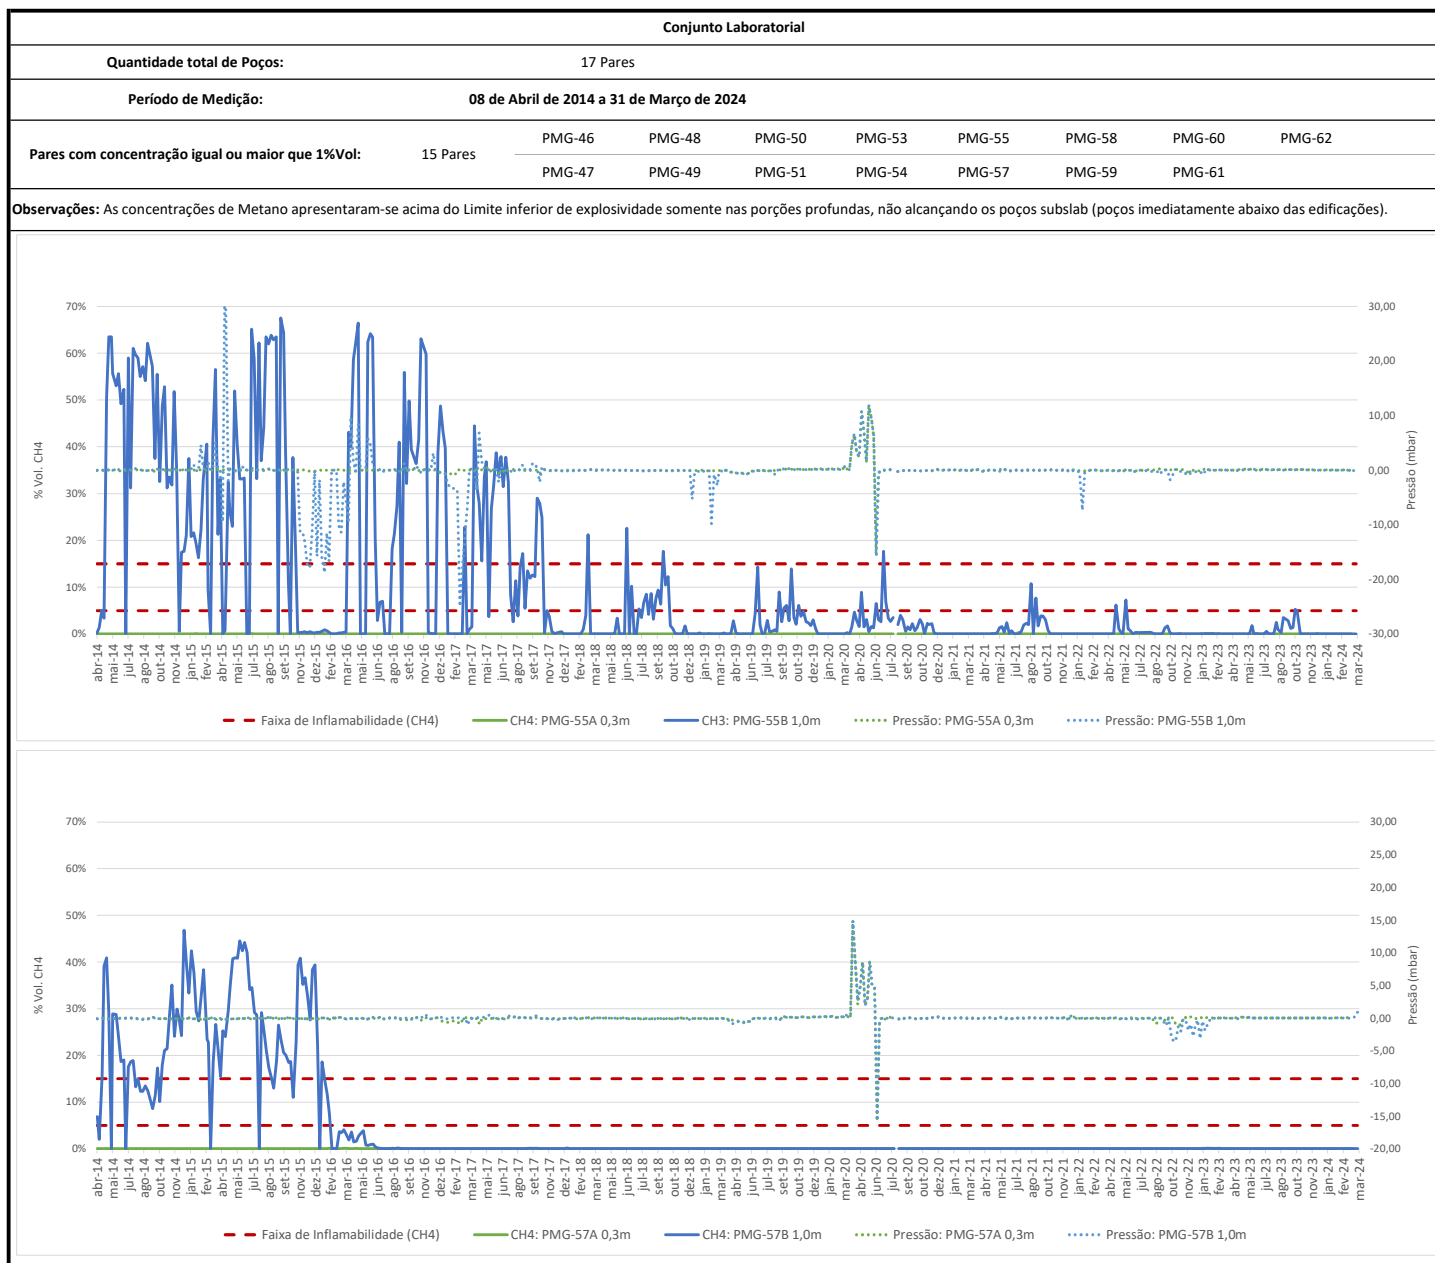


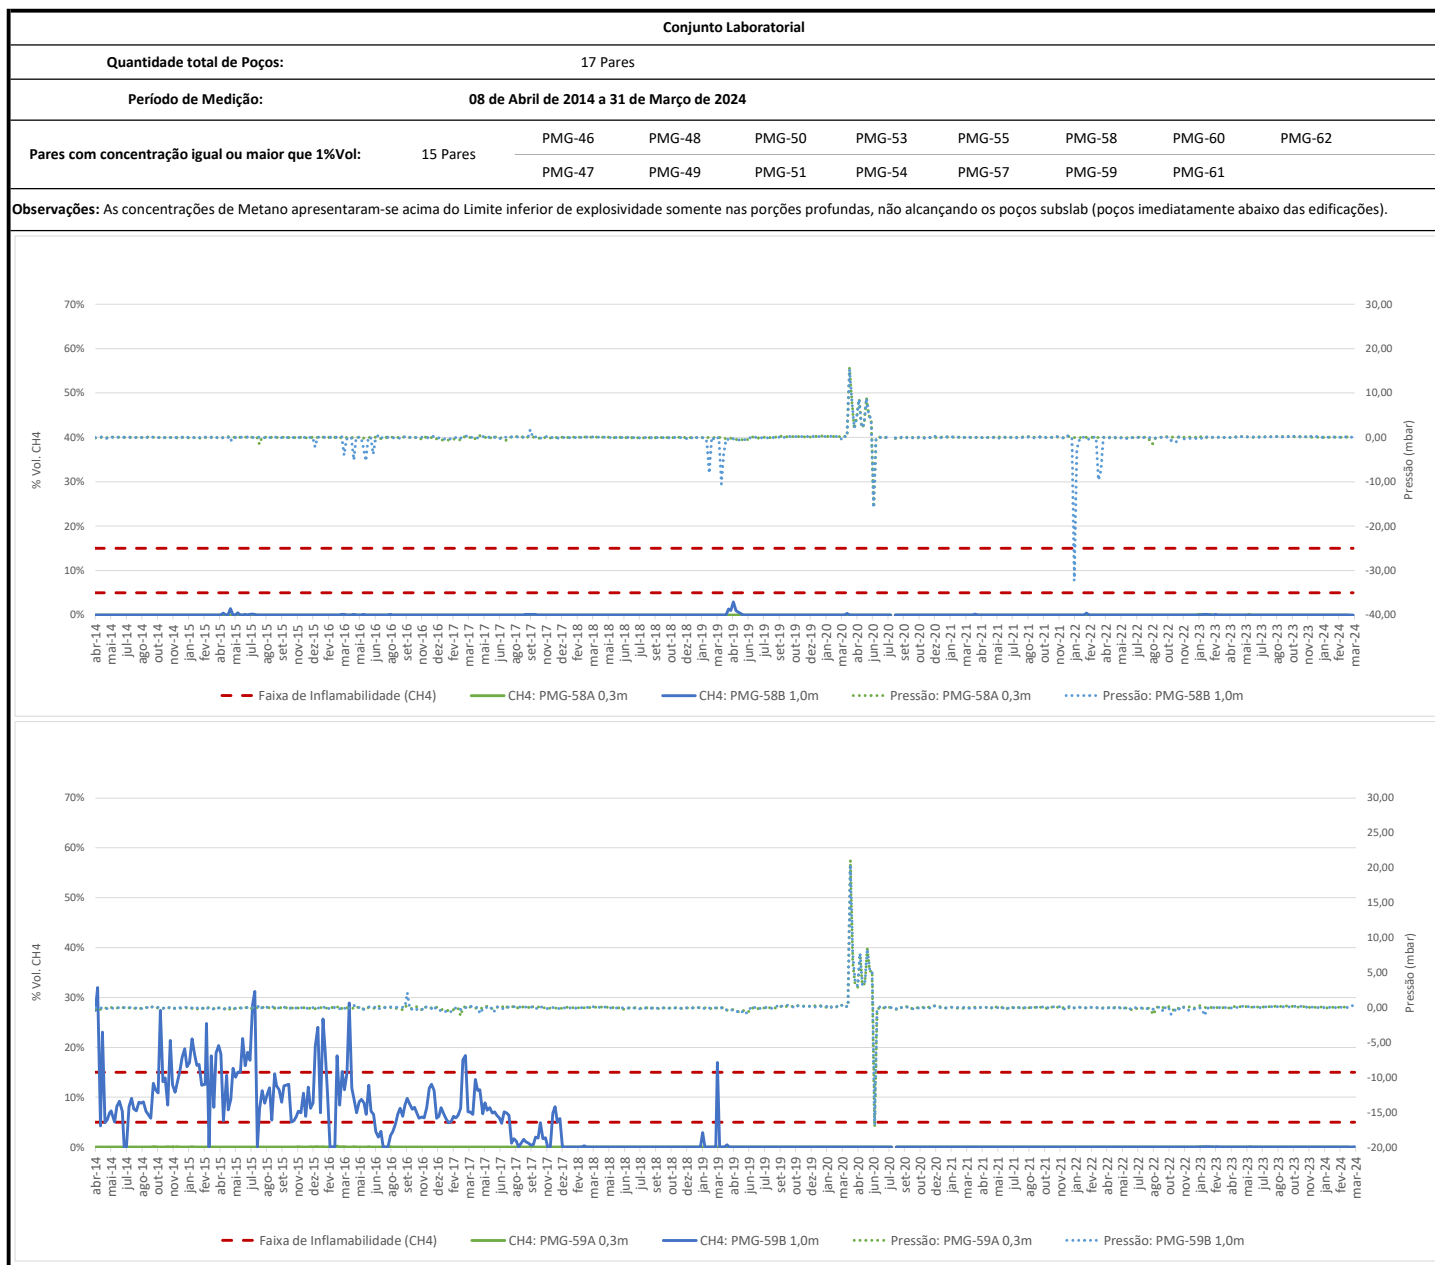

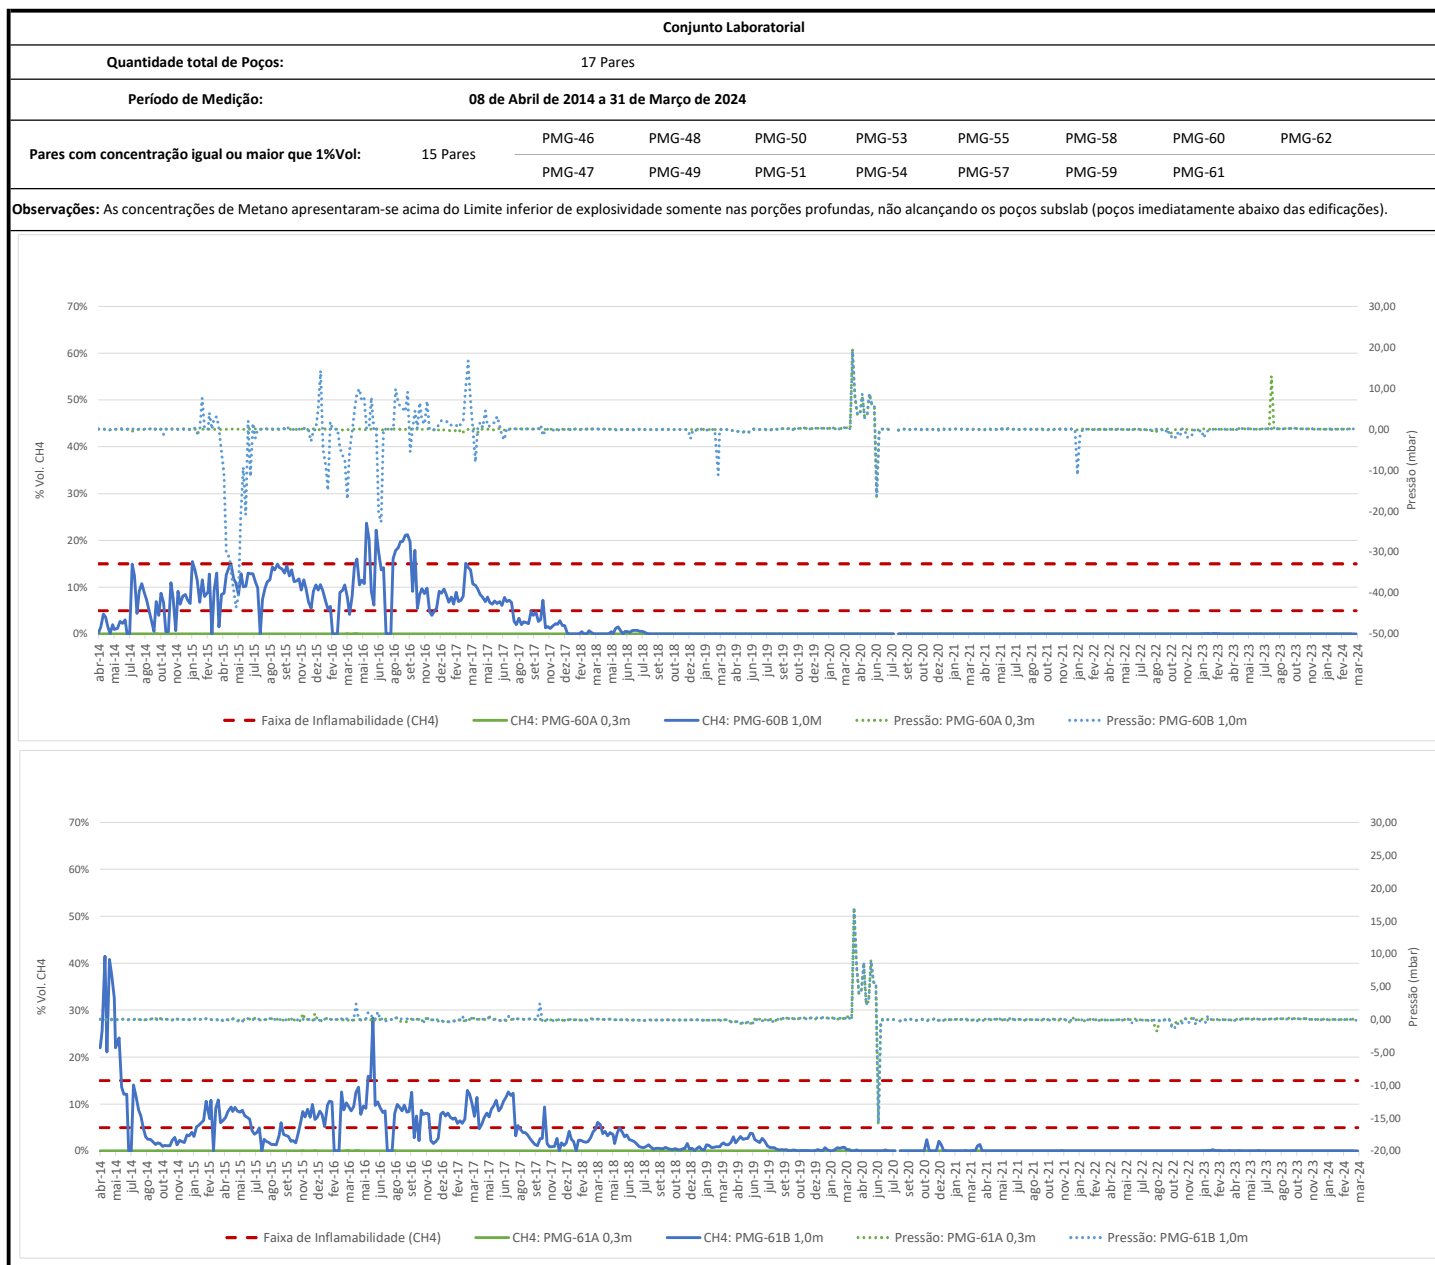


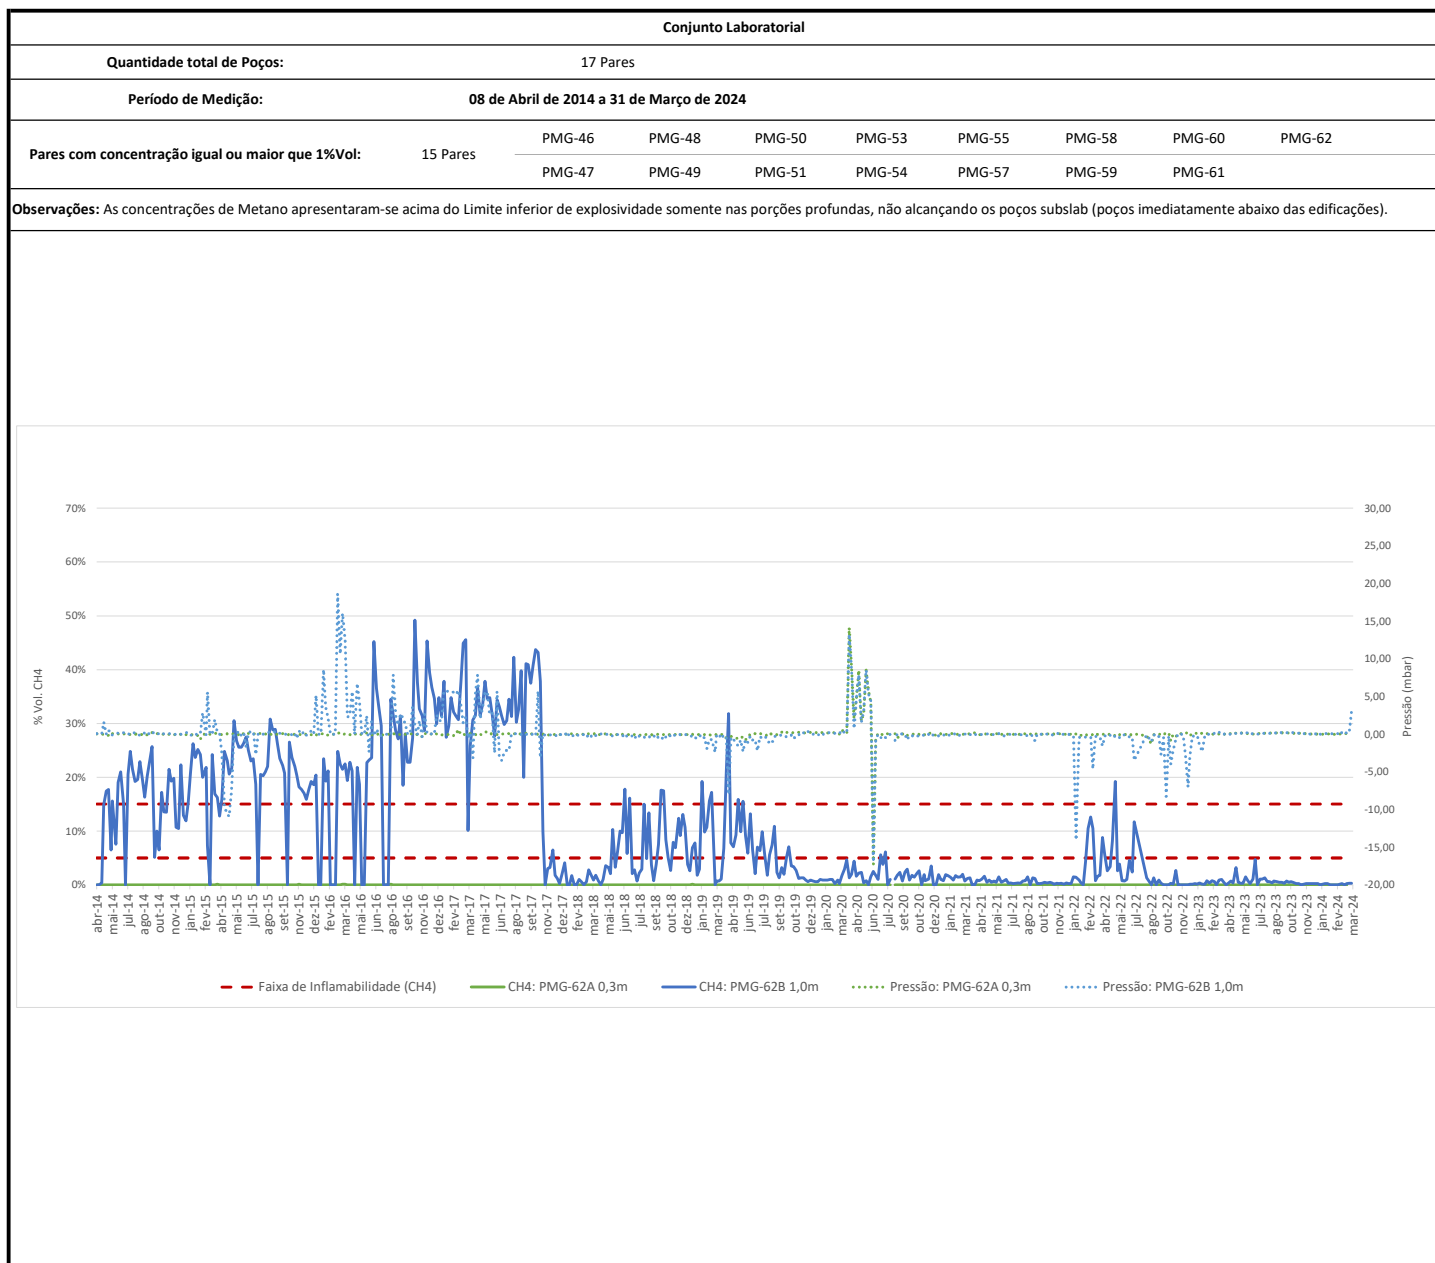


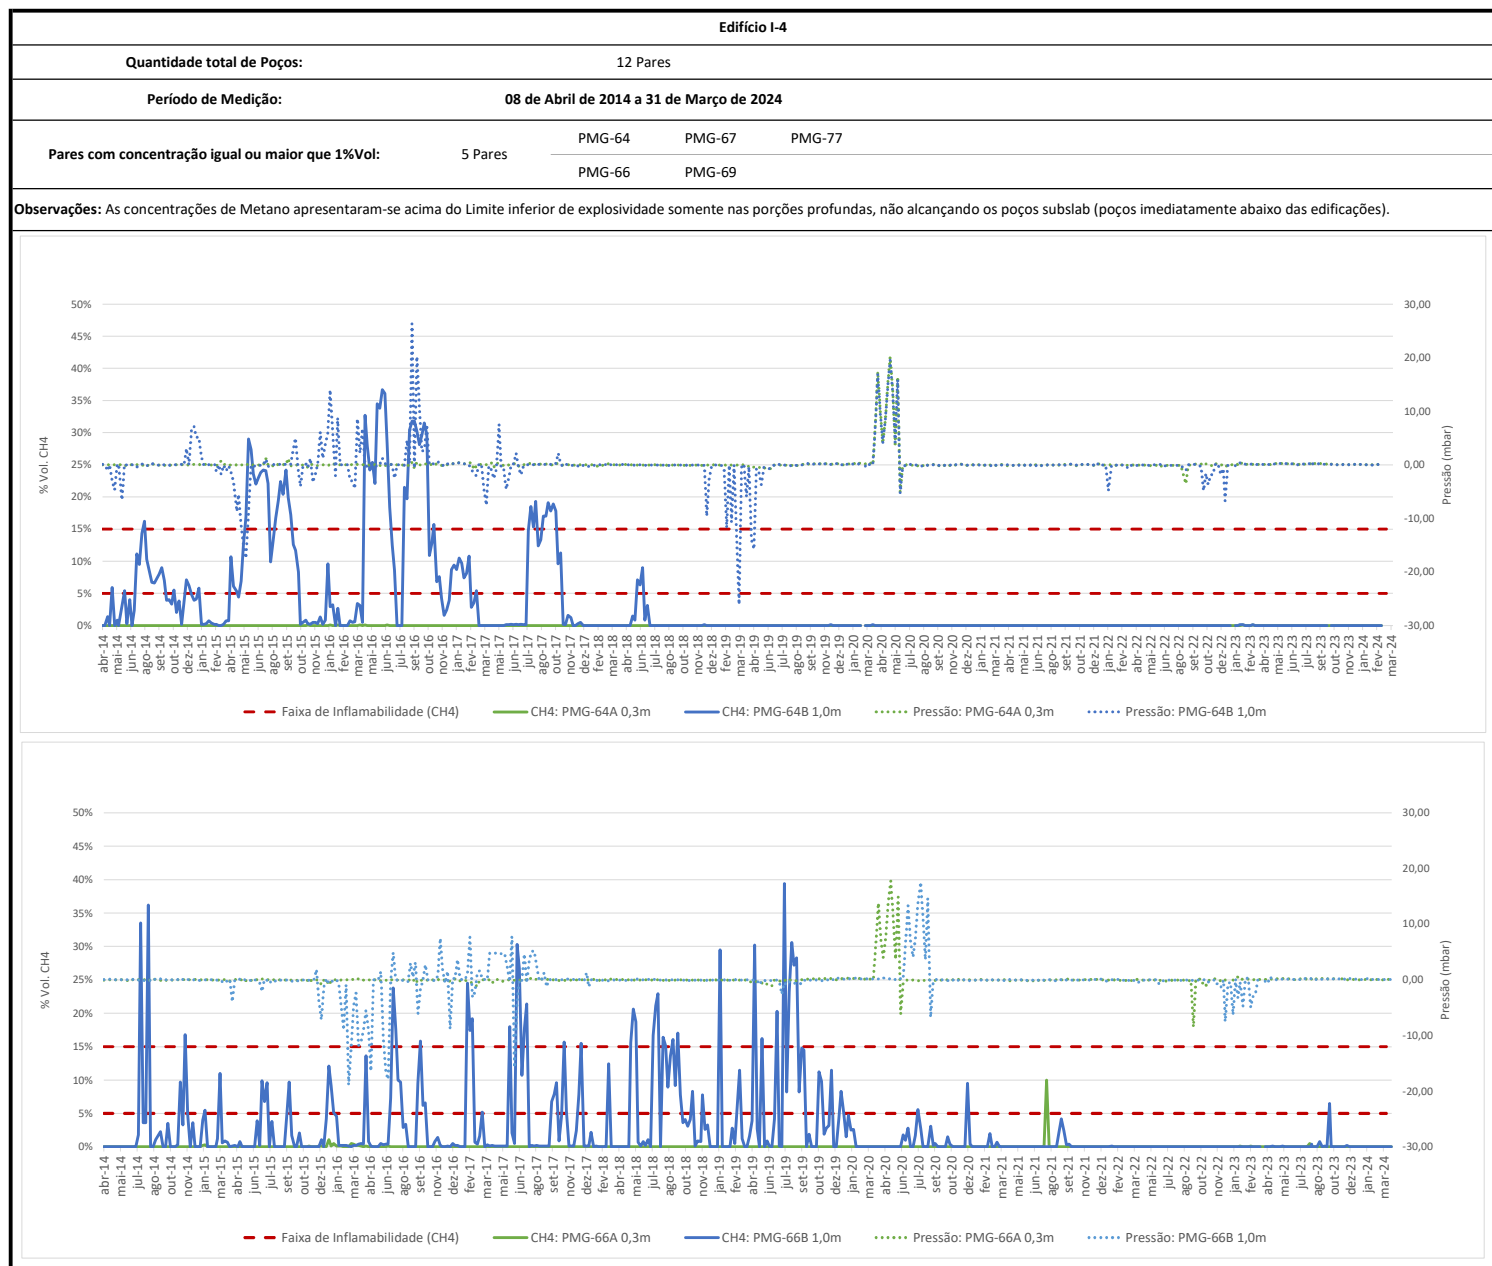

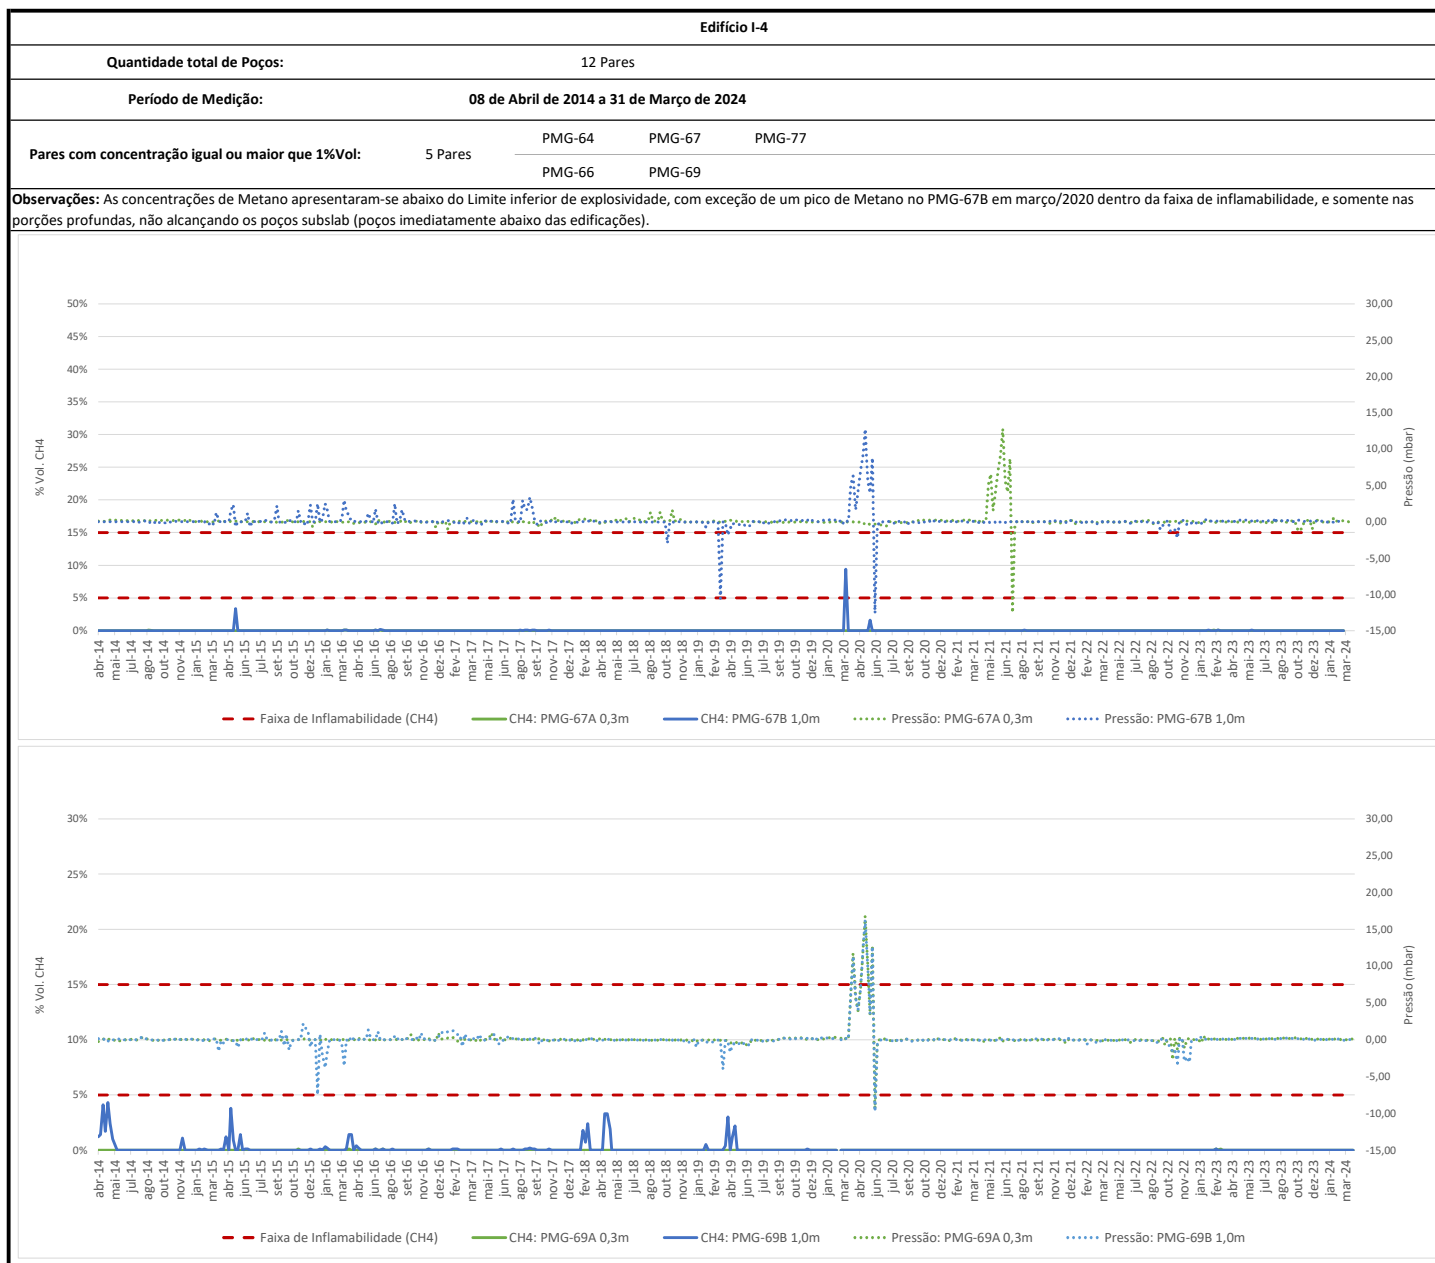



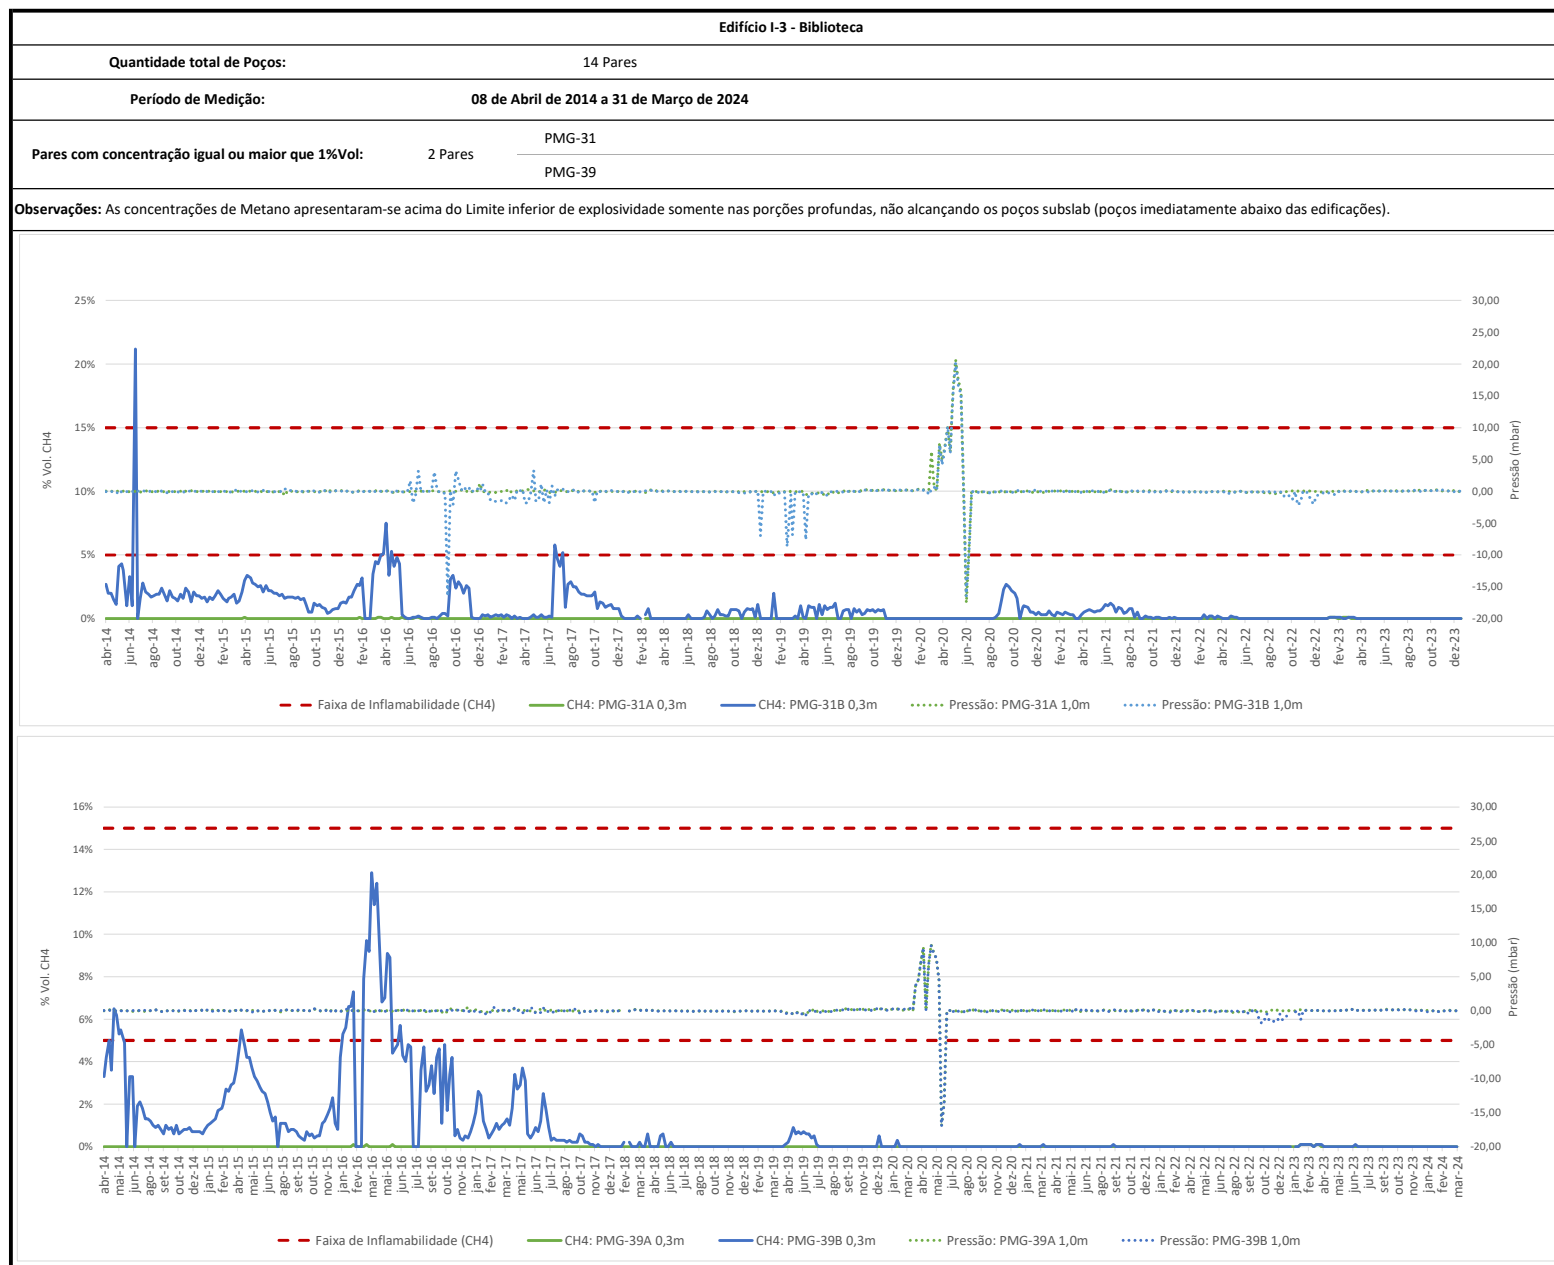

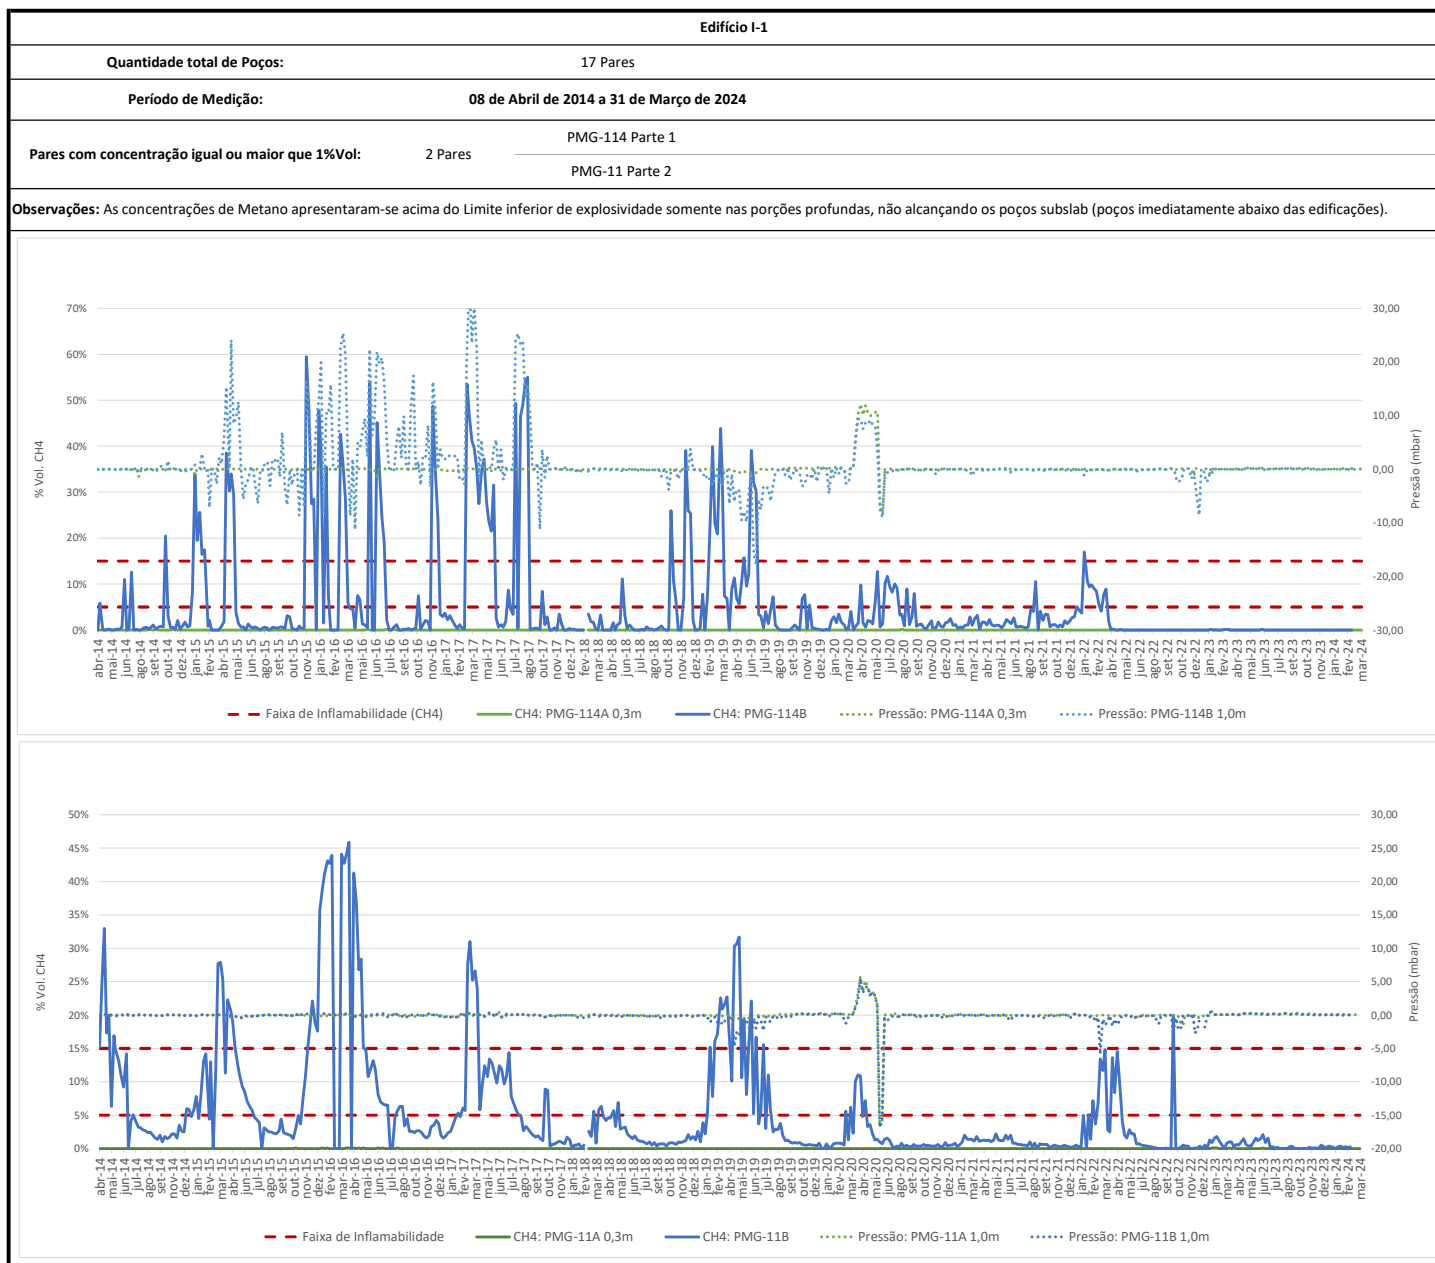

ANEXO 6

TABELA DE MEDIÇÕES SEMANAIS NOS EXAUSTORES

Identificação do Exaustor	Semana	Operação	Vácuo da celula		PID	%LEL	Pressão	Observação
			(mmHg)	(mBar)	(ppm)	(5%Vol.)	(mBar)	
Exaustor I1	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,81	
Exaustor I1 (2)	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,17	
Exaustor I5 Auditório	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,93	
Exaustor Biblioteca	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,90	
Exaustor Portaria 3	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,44	
Exaustor Ginásio	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,96	
Exaustor Enfermaria	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,22	
Exaustor CAT1	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,70	
Exaustor CAT2	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,94	
Exaustor Transportes	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,85	
Exaustor MI (B1)	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,73	
Exaustor MI (B2)	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,03	
Exaustor MI (B3)	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,63	
Exaustor Auditório 1	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,78	
Exaustor Auditório 2	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,50	
Exaustor Cantina	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,50	
Exaustor Corredor	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,38	
Exaustor Conj. Lab (A1)	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,20	
Exaustor Conj. Lab (A2)	12/01/2024	sim	-6,00	-2,66	0,00	0,00	-7,22	
Exaustor Conj. Lab (A3)	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,34	
Exaustor I4	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,26	
Exaustor Guarda	12/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,36	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,10	
Exaustor I1 (2)	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,09	
Exaustor I5 Auditório	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,96	
Exaustor Biblioteca	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,88	
Exaustor Portaria 3	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,28	
Exaustor Ginásio	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,62	
Exaustor Enfermaria	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,62	
Exaustor CAT1	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,54	
Exaustor CAT2	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,12	
Exaustor Transportes	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,16	
Exaustor MI (B1)	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,59	
Exaustor MI (B2)	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,21	
Exaustor MI (B3)	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,84	
Exaustor Auditório 1	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,28	
Exaustor Auditório 2	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,15	
Exaustor Cantina	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,46	
Exaustor Corredor	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,34	
Exaustor Conj. Lab (A1)	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,62	
Exaustor Conj. Lab (A2)	19/01/2024	sim	-6,00	-2,66	0,00	0,00	-7,43	
Exaustor Conj. Lab (A3)	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,56	
Exaustor I4	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,21	
Exaustor Guarda	19/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,83	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,03	
Exaustor I1 (2)	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,87	
Exaustor I5 Auditório	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,79	
Exaustor Biblioteca	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,84	
Exaustor Portaria 3	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,32	
Exaustor Ginásio	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,48	
Exaustor Enfermaria	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,57	
Exaustor CAT1	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,46	
Exaustor CAT2	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,23	
Exaustor Transportes	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,28	
Exaustor MI (B1)	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,61	
Exaustor MI (B2)	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,14	
Exaustor MI (B3)	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,85	
Exaustor Auditório 1	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,22	
Exaustor Auditório 2	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,19	
Exaustor Cantina	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,39	
Exaustor Corredor	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,26	
Exaustor Conj. Lab (A1)	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,54	
Exaustor Conj. Lab (A2)	26/01/2024	sim	-6,00	-2,66	0,00	0,00	-7,51	
Exaustor Conj. Lab (A3)	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,43	
Exaustor I4	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,15	
Exaustor Guarda	26/01/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,87	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,16	
Exaustor I1 (2)	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,19	
Exaustor I5 Auditório	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,51	
Exaustor Biblioteca	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,92	
Exaustor Portaria 3	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,29	
Exaustor Ginásio	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,47	
Exaustor Enfermaria	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,53	
Exaustor CAT1	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,41	
Exaustor CAT2	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,33	
Exaustor Transportes	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,29	
Exaustor MI (B1)	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,58	
Exaustor MI (B2)	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,19	
Exaustor MI (B3)	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,78	
Exaustor Auditório 1	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,24	
Exaustor Auditório 2	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,21	
Exaustor Cantina	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,42	
Exaustor Corredor	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,31	
Exaustor Conj. Lab (A1)	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,52	
Exaustor Conj. Lab (A2)	02/02/2024	sim	-6,00	-2,66	0,00	0,00	-5,49	
Exaustor Conj. Lab (A3)	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,39	
Exaustor I4	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,28	
Exaustor Guarda	02/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,17	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								

Identificação do Exaustor	Semana	Operação	Vácuo da célula		PID (ppm)	%LEL (%Vol.)	Pressão (mBar)	Observação
			(mmHg)	(mBar)				
Exaustor I1	08/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,25	
Exaustor I1 (2)	08/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,15	
Exaustor I5 Auditório	08/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,44	
Exaustor Biblioteca	09/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,95	
Exaustor Portaria 3	09/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,31	
Exaustor Ginásio	09/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,52	
Exaustor Enfermaria	09/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,59	
Exaustor CAT1	09/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,46	
Exaustor CAT2	09/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,35	
Exaustor Transportes	09/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,26	
Exaustor MI (B1)	09/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,54	
Exaustor MI (B2)	09/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,23	
Exaustor MI (B3)	09/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,65	
Exaustor Auditório 1	09/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,27	
Exaustor Auditório 2	09/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,19	
Exaustor Cantina	09/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,39	
Exaustor Corredor	09/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,36	
Exaustor Conj. Lab (A1)	08/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,56	
Exaustor Conj. Lab (A2)	08/02/2024	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,54	Pressão negativa diminuída devido aos baixos valores de metano.
Exaustor Conj. Lab (A3)	08/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,34	
Exaustor I4	09/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,26	
Exaustor Guarda	08/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,08	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Exaustor I1	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,42	
Exaustor I1 (2)	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,29	
Exaustor I5 Auditório	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,89	
Exaustor Biblioteca	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,08	
Exaustor Portaria 3	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,74	
Exaustor Ginásio	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,53	
Exaustor Enfermaria	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,14	
Exaustor CAT1	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,03	
Exaustor CAT2	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,41	
Exaustor Transportes	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,93	
Exaustor MI (B1)	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,64	
Exaustor MI (B2)	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,40	
Exaustor MI (B3)	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,44	
Exaustor Auditório 1	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,23	
Exaustor Auditório 2	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,11	
Exaustor Cantina	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,40	
Exaustor Corredor	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,80	
Exaustor Conj. Lab (A1)	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,04	
Exaustor Conj. Lab (A2)	16/02/2024	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,75	
Exaustor Conj. Lab (A3)	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,39	
Exaustor I4	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,67	
Exaustor Guarda	16/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,26	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Exaustor I1	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,45	
Exaustor I1 (2)	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,34	
Exaustor I5 Auditório	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,97	
Exaustor Biblioteca	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,13	
Exaustor Portaria 3	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,82	
Exaustor Ginásio	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,46	
Exaustor Enfermaria	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,10	
Exaustor CAT1	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,08	
Exaustor CAT2	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,37	
Exaustor Transportes	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,90	
Exaustor MI (B1)	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,08	
Exaustor MI (B2)	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,17	
Exaustor MI (B3)	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,86	
Exaustor Auditório 1	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,29	
Exaustor Auditório 2	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,04	
Exaustor Cantina	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,96	
Exaustor Corredor	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,55	
Exaustor Conj. Lab (A1)	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,28	
Exaustor Conj. Lab (A2)	23/02/2024	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,86	
Exaustor Conj. Lab (A3)	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,37	
Exaustor I4	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,73	
Exaustor Guarda	23/02/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,21	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Exaustor I1	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,37	
Exaustor I1 (2)	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,56	
Exaustor I5 Auditório	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,89	
Exaustor Biblioteca	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,47	
Exaustor Portaria 3	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,69	
Exaustor Ginásio	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,32	
Exaustor Enfermaria	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,36	
Exaustor CAT1	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,01	
Exaustor CAT2	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,49	
Exaustor Transportes	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,11	
Exaustor MI (B1)	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,04	
Exaustor MI (B2)	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,40	
Exaustor MI (B3)	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,70	
Exaustor Auditório 1	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,37	
Exaustor Auditório 2	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,08	
Exaustor Cantina	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,96	
Exaustor Corredor	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,82	
Exaustor Conj. Lab (A1)	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,50	
Exaustor Conj. Lab (A2)	01/03/2024	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,69	
Exaustor Conj. Lab (A3)	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,11	
Exaustor I4	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,02	
Exaustor Guarda	01/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,91	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								

Identificação do Exaustor	Semana	Operação	Vácuo da célula		PID	%LEL	Pressão	Observação
			(mmHg)	(mBar)	(ppm)	(%Vol.)	(mBar)	
Exaustor I1	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,96	
Exaustor I1 (2)	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,05	
Exaustor I5 Auditório	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,26	
Exaustor Biblioteca	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,25	
Exaustor Portaria 3	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,45	
Exaustor Ginásio	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,38	
Exaustor Enfermaria	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,07	
Exaustor CAT1	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,92	
Exaustor CAT2	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,69	
Exaustor Transportes	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,28	
Exaustor MI (B1)	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,41	
Exaustor MI (B2)	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,96	
Exaustor MI (B3)	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,28	
Exaustor Auditório 1	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,33	
Exaustor Auditório 2	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,01	
Exaustor Cantina	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,16	
Exaustor Corredor	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,76	
Exaustor Conj. Lab (A1)	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,25	
Exaustor Conj. Lab (A2)	08/03/2024	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,30	
Exaustor Conj. Lab (A3)	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,29	
Exaustor I4	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,63	
Exaustor Guarda	08/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,16	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,55	
Exaustor I1 (2)	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,14	
Exaustor I5 Auditório	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,42	
Exaustor Biblioteca	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,26	
Exaustor Portaria 3	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,37	
Exaustor Ginásio	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,38	
Exaustor Enfermaria	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,87	
Exaustor CAT1	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,92	
Exaustor CAT2	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,53	
Exaustor Transportes	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,12	
Exaustor MI (B1)	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,82	
Exaustor MI (B2)	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,16	
Exaustor MI (B3)	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,46	
Exaustor Auditório 1	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,26	
Exaustor Auditório 2	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-1,98	
Exaustor Cantina	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,96	
Exaustor Corredor	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,69	
Exaustor Conj. Lab (A1)	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,44	
Exaustor Conj. Lab (A2)	13/03/2024	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,38	
Exaustor Conj. Lab (A3)	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,49	
Exaustor I4	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,70	
Exaustor Guarda	13/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,01	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,27	
Exaustor I1 (2)	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,44	
Exaustor I5 Auditório	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,21	
Exaustor Biblioteca	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,34	
Exaustor Portaria 3	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,15	
Exaustor Ginásio	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,65	
Exaustor Enfermaria	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,35	
Exaustor CAT1	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,38	
Exaustor CAT2	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,31	
Exaustor Transportes	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,20	
Exaustor MI (B1)	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,87	
Exaustor MI (B2)	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,76	
Exaustor MI (B3)	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,39	
Exaustor Auditório 1	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,32	
Exaustor Auditório 2	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,06	
Exaustor Cantina	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,62	
Exaustor Corredor	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,50	
Exaustor Conj. Lab (A1)	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,69	
Exaustor Conj. Lab (A2)	22/03/2024	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,09	
Exaustor Conj. Lab (A3)	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,34	
Exaustor I4	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,58	
Exaustor Guarda	22/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,08	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								
Exaustor I1	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,40	
Exaustor I1 (2)	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,64	
Exaustor I5 Auditório	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,32	
Exaustor Biblioteca	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,43	
Exaustor Portaria 3	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,01	
Exaustor Ginásio	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,11	
Exaustor Enfermaria	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,24	
Exaustor CAT1	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,89	
Exaustor CAT2	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,75	
Exaustor Transportes	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,34	
Exaustor MI (B1)	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,76	
Exaustor MI (B2)	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,37	
Exaustor MI (B3)	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-4,07	
Exaustor Auditório 1	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-3,37	
Exaustor Auditório 2	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,11	
Exaustor Cantina	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,98	
Exaustor Corredor	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,92	
Exaustor Conj. Lab (A1)	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,38	
Exaustor Conj. Lab (A2)	28/03/2024	sim	-4,00	-2,66	0,00	0,00	-5,87	
Exaustor Conj. Lab (A3)	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-5,28	
Exaustor I4	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,80	
Exaustor Guarda	28/03/2024	sim	-2,00	-2,66	0,00	0,00	-2,42	
Exaustor Reserva 1								
Exaustor Reserva 2								
Estão localizados no Edifício I1								

ANEXO 7

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

_____, cujo CPF _____, em conjunto com Felipe Martins Chufi, cujo CPF 326.774.078-92, declaram, sob as penas da lei e de responsabilização administrativa, civil e penal, que todas as informações prestadas à CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no Relatório Técnico “Monitoramento de Intrusão de Gases em Ambientes Fechados – USP Leste – Relatório de Evolução 1º Trimestre/2024”, realizado na AI-1 da USP Leste, localizada na Rua Arlindo Béttio, 1.000, Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP, de Janeiro de 2024, são verdadeiras e contemplam integralmente as exigências estabelecidas pela CETESB e se encontram em consonância com o que determinam o regulamento da Lei nº 13.577/2009, aprovado pelo Decreto nº 59.263/2013, e os Procedimentos para Proteção da Qualidade do Solo e Gerenciamento de Áreas Contaminadas aprovado em Decisão de Diretoria da CETESB, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 10/02/2017.

Declaram, ainda estar cientes de que os documentos e laudos que subsidiam as informações prestadas à CETESB poderão ser requisitados a qualquer momento, durante ou após a implementação do procedimento previsto no documento Procedimentos para Proteção da Qualidade do Solo e Gerenciamento de Áreas Contaminadas, para fins de auditoria.

São Paulo, 15 de maio de 2024.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – CAMPUS LESTE

CNPJ: 63.025.530/0062-26

Nome do Responsável Legal:

RG:

CPF:

ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA

CNPJ 23.559.934/0001-63

Nome do Responsável Técnico: Felipe Martins Chufi

RG: 29.447.243-5

CPF: 326.774.078-92

1 O artigo 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece: “Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.

§ 2º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa”.

ANEXO 8

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230221208991

1. Responsável Técnico

FELIPE MARTINS CHUFI

Título Profissional: **Engenheiro Ambiental**

Empresa Contratada: **ENGESOLVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS INTEGRADAS LTDA**

RNP: **2608845975**

Registro: **5063256720-SP**

Registro: **2031192-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

CPF/CNPJ: **63.025.530/0114-91**

Endereço: **Rua ARLINDO BETTIO**

Nº: **1000**

Complemento: **Saída do km 17,5 da Rodovia Ayrton Senna**

Bairro: **VILA GUARACIABA**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **03828-000**

Contrato: **0000001/2022 - PUSP-CL**

Celebrado em: **01/08/2022**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **144.000,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua ARLINDO BETTIO**

Nº: **1000**

Complemento: **Saída do km 17,5 da Rodovia Ayrton Senna**

Bairro: **VILA GUARACIABA**

Cidade: **São Paulo**

UF: **SP**

CEP: **03828-000**

Data de Início: **03/08/2022**

Previsão de Término: **02/08/2023**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Ambiental**

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

Execução

1

Quantidade

Unidade

Execução

Qualidade Ambiental

1,00000

ano

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

AVALIAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL: Operação, Manutenção e Monitoramento de Poços de Gás, Pontos na Estrutura e de Sistemas de Ventilação de Gases □ EACH - USP Leste

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

0-NÃO DESTINADA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

São Paulo 03 de Agosto de 2022

Local

data

FELIPE MARTINS CHUFI - CPF: 326.774.078-92

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CPF/CNPJ: 63.025.530/0114-91

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
 Tel: 0800 017 18 11

E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ **233,94**

Registrada em: **02/08/2022**

Valor Pago R\$ **233,94**

Nosso Numero: **28027230221208991**

Versão do sistema

Impresso em: **03/08/2022 04:42:58**

